

| | | |
|---|---|--|
|  F-GC-22 Versión 10 Junio 2020 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
| | LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| # CONTRATO Y AÑO | ACTO 040 DEL 2021 | Acta N° | 1 Y FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA) | 6.545.400 |
| | | | | 2. VALOR ADICION | - |
| CONTRATISTA | HERNANDO ANTONIO VAN EJO HERRERA | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 6.545.400 |
| NIT O CC: | 4.413.512 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 925 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 6.289.400 |
| RP (#, rubro y fecha) | 1266 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 | | | 6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5) | 256.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Reposicion de aducción por emergencia sector Chamberi vereda Aguadita pequeña predio del señor Pedro Luis Giraldo y Jairo Sanchez en el municipio de Filadelfia Caldas | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | | | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | | | # FOLIOS |
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | | | | X |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. | | | | | NA |
| 3- Pagos al FIC | | | | | X |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | | | | X |
| 5- Informe de actividades o Bitácora. | | | | | X |
| 6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. | | | | | X |
| 7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20 | | | | | X |
| 8- Ensayos de densidad. | | | | | NA |
| 9- Diseño de Mezclas. | | | | | NA |
| 10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. | | | | | NA |
| 11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique) | | | | | NA |
| 12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 | | | | | NA |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final) | | | | | NA |
| 14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido) | | | | | X |
| 15- Acta parcial o final del contrato | | | | | X |

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 FIRMA

| | | |
|---|--|---|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | ✓ |
| Factura original o Documento equivalente | | X |
| Acta parcial o final del contrato. | | X |
| Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20 | | X |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 | | X |
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | X |
| COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL | | X |

Fecha de presentación _____

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| JUAN PABLO ZULUAGA CORREA | INGENIERO DE ZONA |  FIRMA |
| NOMBRE | CARGO | |

| | | |
|---|----------------|-----------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | CORRIENTE |

BANCOLOMBIA

AHORRO


70-55618386-7



 29-12-21


HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 21 DICIEMBRE AL 27 DICIEMBRE DEL 2021
 ACTA 040

| No | Gastos de Personal | | | | BASE SUELDO | Dias DIAS TRABAJADOS | Salario VLR DIAS TRABAJADOS | Auxilio TRANSPOR TE | Devengado TOTAL DEVENGADO | Salud | | Pensión | | NETO A PAGAR QUINCENAL | FIRMA |
|----|--------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | DOCUMENTO | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO | | | | | | 8,5% | 4,0% | 12,00% | 4,00% | | |
| 1 | 1054996263 | JUAN DAVID | VALLEJO GIRALDO | AUXILIAR | \$ 1.370.000 | 7 | 319.667 | 24.839 | 344.506 | - | 12.787 | - | 12.787 | 318.933 | <i>Juan David Vallejo</i> |
| 2 | 4416882 | VICTOR MANUEL | RINCON CORTES | AUXILIAR | \$ 908.526 | 7 | 211.989 | 24.839 | 236.829 | - | 8.480 | - | 8.480 | 219.870 | VICTOR RINCON |
| | | TOTAL | | | 2.278.526 | 14 | 531.656 | 49.679 | 581.335 | - | 21.266 | - | 21.266 | 538.802 | |



 HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 EMPLEADOR

JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

CC 15.902.864

T.P 26804-T

EL CONTADOR DE LA EMPRESA
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NTF 4.413.512-7

Que la empresa HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, con NIT 4.413.512, se encuentra a PAZ Y SALVO, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de noviembre-diciembre del 2021.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná - Caldas, a los Veintidós (22) días del mes Diciembre (12) de dos mil veintiuno 2021.

Atentamente:




JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

Contador Público Titulado

T.P. 26804-T - T.J.C. Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F0F0E0080950E54

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Ministerio de Comercio
Industria, Turismo y Transportación

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO
C.C. 15902854
RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

257582


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.902.864
GIRALDO NARIÑO

APellidos JOHN JAIRO

NOMBRES

John Jairo Nariño
FIRMA

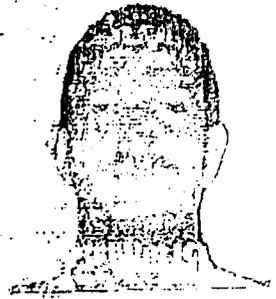

Ministerio de Comercio
Industria, Turismo y Transportación

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960
CHINCHINA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G S RH SEXO

12-JUL-1979 CHINCHINA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SIEMONE TORRES



A. 0403400-00090773-M-0016902864-20081008 0004109994A 1 4820002221



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RAZON SOCIAL : | HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA |
| IDENTIFICACION: | CC-4413512 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2021-12-02 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2021-12-03 |
| FECHA DE PAGO: | 2021-12-02 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2021-11 |
| PERIODO SALUD: | 2021-12 |
| NUMERO PLANILLA: | 21999723 |
| TOTAL COTIZANTES: | 3 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 21999723 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 109.400 | \$ 109.400 |
| Subtotal Salud | | 1 | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 109.400 | \$ 109.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 330.700 | \$ 330.700 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 106.700 | \$ 106.700 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 437.400 | \$ 437.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 190.300 | \$ 190.300 |
| Subtotal ARL | | 1 | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 190.300 | \$ 190.300 |
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 109.400 | \$ 109.400 |
| Subtotal CCF | | 1 | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 109.400 | \$ 109.400 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 846.500 | \$ 846.500 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/01/2022 |
|----------------------------------|------------|



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21999723
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-12-02

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZON SOCIAL | HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 4413512 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CR 10 2 13 | DEPARTAMENTO | CALDAS | MUNICIPIO | CHINCHINA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4322 | CORREO ELECTRÓNICO | CLAUDI3032@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 98403316 |
| FAX | 8403316 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Año: 2021 | ✓ Mes: 11 | Año: 2021 | ✓ Mes: 12 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 3 | | \$2.732.790 | | 21999723 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | Salario | |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1061624128 | 01 | No | No | No | 17 | 174 | Fijo | OCAMPO GIRALDO WILMAR JOVANNY | \$908.526 |
| CC-4416882 | 01 | No | No | No | 17 | 174 | Fijo | RINCON CORTES VICTOR MANUEL | \$908.526 |
| CC-1054996263 | 01 | No | No | No | 17 | 174 | Fijo | VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID | \$1.370.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|--|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RE | Fecha Ret | T D | T A | T D | T A | T V | Fecha Nov | V S | V S | Fecha Sln | Fecha Sln | I G | Fecha Ige | Fecha Ige | L M | Fecha Lma | Fecha Lma | V A | Fecha Vac | Fecha Vac | A V | V C | Fecha Vct | Fecha Vct | IRL | Fecha Irp | Fecha Irp | |
| CC - 1061624128 | | | X | 2021-11-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 4416882 | X | 2021-11-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1054996263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1061624128 | PORVENIR | 23 | \$696.537 | 0.1600000 | \$111.500 | \$0 | \$0 | \$111.500 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 4416882 | COLFONDOS | 22 | \$666.253 | 0.1600000 | \$106.700 | \$0 | \$0 | \$106.700 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1054996263 | PORVENIR | 30 | \$1.370.000 | 0.1600000 | \$219.200 | \$0 | \$0 | \$219.200 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1061624128 | SALUD TOTAL | 23 | \$696.537 | 0.0400000 | \$27.900 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 23 | \$696.537 | 17174 | 0.0696000 | \$48.500 |
| CC - 4416882 | SALUD TOTAL | 22 | \$666.253 | 0.0400000 | \$26.700 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 22 | \$666.253 | 17174 | 0.0696000 | \$46.400 |
| CC - 1054996263 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.370.000 | 0.0400000 | \$54.800 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.370.000 | 17174 | 0.0696000 | \$95.400 |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|
| SENA | 0 | \$0 | 0 | \$0 |
| CFE DE CALDAS | 3 | \$109.400 | 0 | \$0 |
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA |
| TOTAL A PAGAR | | TOTAL A PAGAR | | |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ADMINISTRA DORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR INCAPACIDA DES | VLR INCAPACIDA DES | VLR APORTES A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACION | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL | SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ADMINISTRA DORA | 3 | \$190.300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$190.300 | 0 | \$0 | \$190.300 | 0 | \$0 | \$0 | \$190.300 |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| ADMINISTRA DORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR AUT. IGE | VLR AUT. IGE | VLR AUT. DESC LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES AUT. IGE | VLR INTERESES AUT. DESC LMA | VLR AUT. IGE | VLR AUT. DESC LMA | TOTAL PAGAR |
| ADMINISTRA DORA | 3 | \$109.400 | \$0 | \$0 | \$0 | \$109.400 | 0 | \$0 | \$109.400 | \$0 | \$0 | \$0 | \$109.400 |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ADMINISTRADO RA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACION | VLR COTIZACION | VLR VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSION SOL | VLR APORTE FONDO PENSION SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| ADMINISTRADO RA | 2 | \$330.700 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$330.700 |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

TOTALES PARA EL PERIODO 2021 - 11

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | CCF | Tarifa | Aporte CCF | Tarifa SENNA | Aporte SENNA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1054996263 | CFE DE CALDAS | 30 | \$1.370.000 | 0.0400000 | \$54.800 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 |
| CC-4416882 | CFE DE CALDAS | 22 | \$666.253 | 0.0400000 | \$26.700 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 |
| CC-1061624128 | CFE DE CALDAS | 23 | \$696.537 | 0.0400000 | \$27.900 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 |

APORTES PARAFISCALES

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| SALUD | 1 | \$109,400 |
| PENSIONES | 2 | \$437,400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$190,300 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 1 | \$109,400 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$846,500 |

TOTAL A PAGAR

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| Minredu | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ESAP | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| ICBF | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |

Comprobante de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUÑOZ

Nro. de factura: 73364828

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 186.83.184.83

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 4413512

Fecha y hora de la transacción: Lunes 27 de Diciembre de 2021 05:20:49 PM

Nro. de comprobante: 0000061975

Valor pagado: \$ 45,426.00

Cuenta: *****7145

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8938 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadania

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

1

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra

040

Nombre Obra

EMERG SECTOR CHAMBERI

Fecha Terminación Obra

27/12/2021

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

6289400.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

040

Fecha Inicio Obra

21/12/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra

FILADEFIA

Año Periodo a Pagar

2021

Costo Total de Obra a Todo Costo

6289400.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

45426.00

Valor del Pago

45426.00

CÓMPROBANTE

| | | | | |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 73364828 | 1262508768 | 27/12/2021 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.83**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$45,426.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|----------------------|----------|--------------|----------------|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | \$45,426.00 | \$45,426.00 |



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
HERRERA
NIT 4.413.512-7
CR 10 2 13
Tel: (036) 3116183675
Chinchiná - Colombia
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-44

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL
NIT 890.803.239-9 **Teléfono** (036) 8867080
Dirección CR 23 75 82 **Ciudad** Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/12/2021, 17:40
Expedición 27/12/2021, 17:40
Vencimiento 27/12/2021

| Ítem | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|------|---|--------------|--------------|
| 1 | REPOSICION DE ADUCCION POR EMERGENCIA SECTOR CHAMBERI VEREDA AGUADITA PEQUEÑA PREDIO DEL SECTOR PEDRO LUIS GIRALDO Y JAIRO SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS | 4,660,541.00 | 4,660,541.00 |
| 2 | ADMINISTRACION | 1,118,530.00 | 1,118,530.00 |
| 3 | IMPREVISTOS | 233,027.00 | 233,027.00 |
| 4 | UTILIDADES | 233,027.00 | 277,302.13 |

Total ítems: 4

Total Bruto 6,245,125.00

Valor en Letras:

Seis millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte con trece cent.

IVA 19% 44,275.13

Total a Pagar 6,289,400.13

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 6,289,400.13

Observaciones:

ACTO No 040 DE 2021

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764017262915 aprobado en 20210831 prefijo FE desde el número 38 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: e07d0dacec4c2ba58f039b7219cf2c4cd6d76121618c65d7dae2ecc6903925297172b7acb2b817c51f922d408da2e648

INFORME**CONTRATO
N°:**

ACTO 040 DE 2021

OBJETO:

Reposición de aducción por emergencia sector Chamberi vereda Aguadita pequeña predio del señor Pedro Luis Giraldo y Jairo Sánchez en el municipio de Filadelfia Caldas

**CONTRATIST
A:****HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA****COSTO
DIRECTO**

Administración

24%

\$ 4.660.541

Imprevistos

5%

\$ 1.118.530

Utilidad

5%

\$ 233.027

Iva sobre
utilidades

19%

\$ 233.027

\$ 44.275

TOTAL:

\$ 6.289.400

**RECURSOS:
SUPERVISOR**

PROPIOS

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

**Cantidades
ejecutadas**

| ITEMS | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|--|------|----------|--------------|-----------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 2 | Localización y replanteo | ml | 30 | 6.680 | 200.400 |
| 3 | Demolición de concreto | m3 | 1,28 | 300.000 | 384.000 |
| 4 | EXCAVACIONES | | | | |
| 5 | Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m | m3 | 6,5 | 28.000 | 182.000 |
| 6 | Rellenos compactos con material seleccionado de excavación | m3 | 6 | 18.000 | 108.000 |
| 7 | Dispersión de material sobrante | m3 | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | ACUEDUCTO | | | | |
| 9 | Empalmes a la red existente | Und | 2 | 800.000 | 1.600.000 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------|----|---------|------------------|
| 10 | Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión. Incluye manejo de aguas y transportes | ml | 30 | 40.000 | 1.200.000 |
| 11 | Termo fusión de portaflanche de 6" | Un | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 12 | Anclajes y tubería galv. De longitud 2 m de 2". Debidamente con tortones de alambre galv. Cal. 13 | und | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 13 | Abrazaderas metálicas para amarre del tubo al viaducto | un | 0 | 250.000 | 0 |
| 14 | Corte de raíces de guaduas | gl | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | Transporte de tubería y accesorios desde Neira hasta el sitio de la obra | viaje | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | Ítem Nuevo | | | | |
| 16 | Trasporte de personal al sitio | Un | 2 | 250.000 | 500.000 |
| COSTO TOTAL | | | | | 6.289.400 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 4.660.541 |
| ADMINISTRACION | | | | 24% | 1.118.530 |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | 233.027 |
| UTILIDADES | | | | 5% | 233.027 |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | | 19% | 44.275 |
| COSTO TOTAL | | | | | 6.289.400 |



Informe de obra: A continuación se detalla el plazo contractual y la fecha de terminación de la obra:

Fecha de inicio 21 de diciembre del 2021
Plazo 15 días calendario
Fecha de terminación 4 enero 2022
Fecha acta de recibo 27 de diciembre del 2021

Descripción inicial

Las obras fueron ejecutadas el 22 y 23 de diciembre del 2021; las cuales consistieron en la instalación de 30 m de tubería de polietileno por termo fusión el valor ejecutado fue de 6.289.400.

REGISTRO FOTOGRAFICO

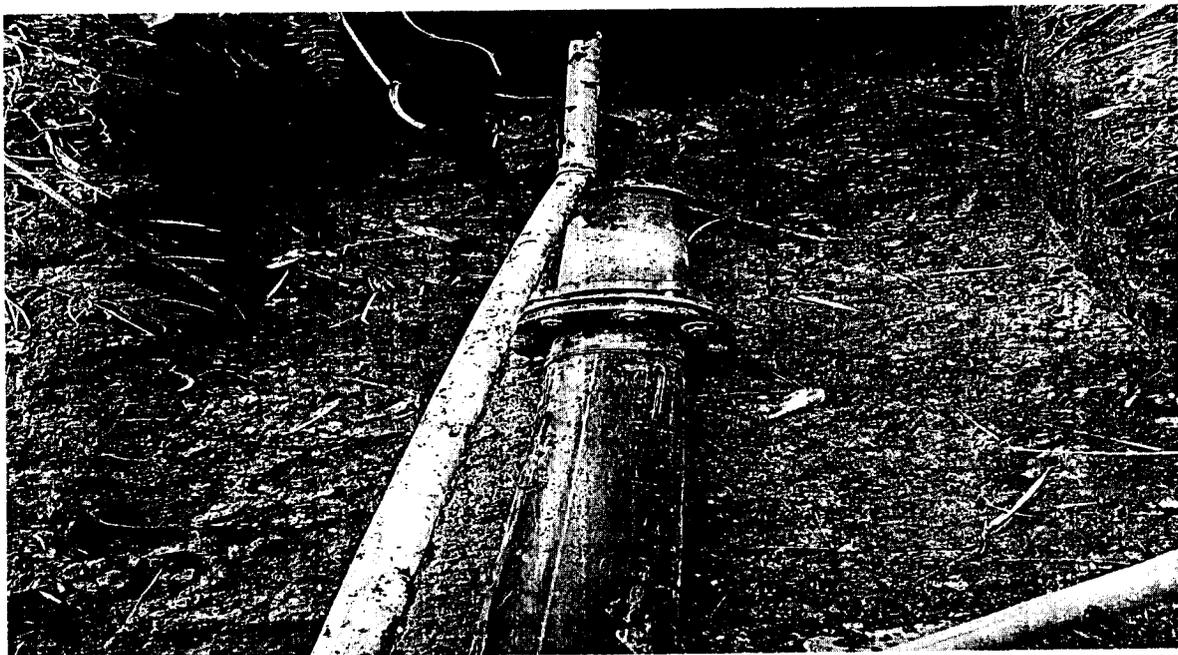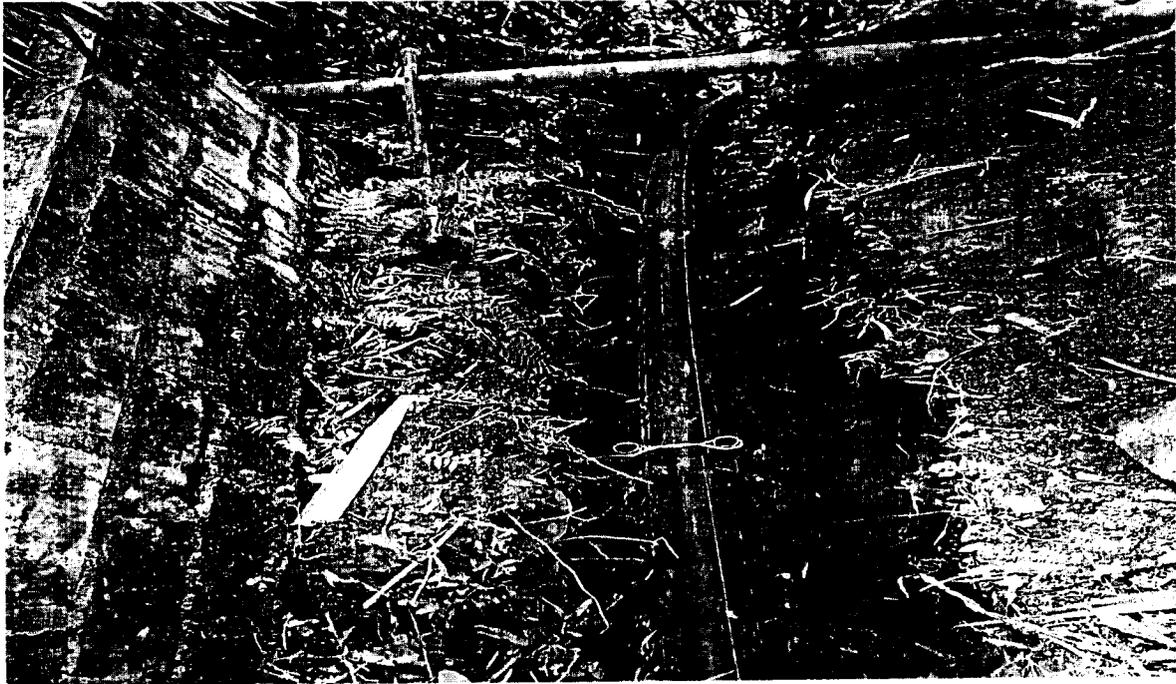




HERNANDO VALLEJO HERRERA
Contratista



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

| | | | | | | | |
|----------------|----|-------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|---|
| Informe Número | 01 | Fecha del informe | 27/12/2021 | Acta parcial | <input checked="" type="checkbox"/> | Acta final | X |
|----------------|----|-------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|---|

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Número del contrato | ✓ | ACTO 040 DE 2021 |
| Objeto: | ✓ | Reposición de aducción por emergencia sector Chamberí vereda Aguadita pequeña predio del señor Pedro Luis Giraldo y Jairo Sánchez en el municipio de Filadelfia Caldas |
| Nombre Contratista: | ✓ | HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA |
| Fecha del contrato: | ✓ | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Plazo de ejecución: | ✓ | 15 DÍAS CALENDARIO |
| Valor inicial: | ✓ | \$ 6.545.400 |
| Fecha de iniciación: | | 21-12-2021 |
| Fecha de suspensión: | | N/A |
| Fecha de reiniciación: | | N/A |
| Nueva fecha de terminación: | ✓ | 27-12-2021 |
| Adición (en valor): | | N/A |
| Prórroga (en tiempo): | | N/A |
| Supervisor: | ✓ | JUAN PABLO ZULUAGA CORREA |

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico del periodo: 100%

1.2. Avance físico acumulado: 100%

1.3. Actividades:

- Transporte de personal al sitio
- Transporte de tubería y accesorios desde Neira hasta el sitio de la obra
- localización y replanteo
- Demolición de concreto
- Corte de raíces de guadas
- Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m
- Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión. Incluye manejo de aguas y transportes
- Termo fusión de portaflanche de 6"
- Anclajes y tubería galvanizada 2 metros de longitud de 2".
- Abrazaderas metálicas para amarre del tubo al viaducto
- Empalmes a la red existente

- Rellenos compactos con material seleccionado de excavación
- Dispersión de material sobrante

1.4. Tubería:

| INSTALACIÓN DE TUBERÍA | | |
|------------------------|-----------|------------|
| SECCIONAL | SERVICIO | KILÓMETROS |
| FILADELFIA | ACUEDUCTO | 0.232 |

1.5. Avance en tiempo

| | |
|----------------------------|---------|
| Plazo de ejecución: | 15 días |
| Tiempo total transcurrido: | 6 días |
| Avance Porcentual: | 40% |

- Registro fotográfico



Imagen 1. Zona de la emergencia. Gradual y deslizamiento sobre la conducción



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

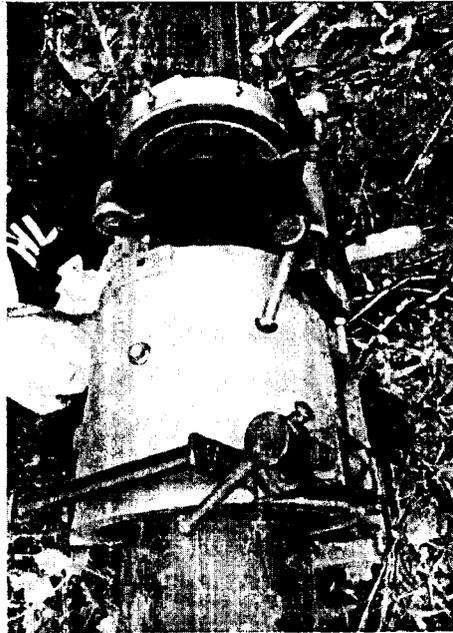


Imagen 2. Termofusion portaflanche



Imagen 3. Viaducto



Imagen 6. Tramo tubería polietileno por el gradual

1.6. Avance financiero

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Inversión Contratada: | \$ 6.545.400 |
| Inversión ejecutada en el periodo: | \$ 6.289.400 |
| Porcentaje ejecutado en el periodo: | 96% |
| Inversión total ejecutada: | \$ 6.289.400 |
| Porcentaje total ejecutado: | 96% |

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES - N/A

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC |
|------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| TODOS LOS TRABAJADORES | X | X | X | X | X |

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Persona natural: Hernando Antonio Vallejo pensionado. Salud y ARL de Diciembre.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

| Fecha de inspección | CASCO | OVEROL | GUANTES | BOTAS | CARNET | CHALECO | SEÑALIZACIÓN | CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
|----------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------------|---|
| Diciembre 23 de 2021 | A | N/A | A | A | | A | A | A |

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

| ITEMS | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|--|-----|------|--------------|-----------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 2 | Localización y replanteo | ml | 30 | 6.680 | 200.400 |
| 3 | Demolición de concreto | m3 | 1,28 | 300.000 | 384.000 |
| 4 | EXCAVACIONES | | | | |
| 5 | Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m | m3 | 6,5 | 28.000 | 182.000 |
| 6 | Rellenos compactos con material seleccionado de excavación | m3 | 6 | 18.000 | 108.000 |
| 7 | Dispersión de material sobrante | m3 | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | ACUEDUCTO | | | | |
| 9 | Empalmes a la red existente | Und | 2 | 800.000 | 1.600.000 |
| 10 | Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión. Incluye manejo de aguas y transportes | ml | 30 | 40.000 | 1.200.000 |
| 11 | Termo fusión de portaflanche de 6" | Un | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 12 | Anclajes y tubería galv. De longitud 2 m de 2". Debidamente con tortones de alambre | un | 2 | 350.000 | 700.000 |



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

| | galv. Cal. 13 | | | | |
|----|--|-------|---|---------|---------|
| 13 | Abrazaderas metálicas para amarre del tubo al viaducto | un | 0 | 250.000 | 0 |
| 14 | Corte de raíces de guaduas | Gl | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | Transporte de tubería y accesorios desde Neira hasta el sitio de la obra | viaje | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | Item Nuevo | | | | |
| 16 | Trasporte de personal al sitio | Un | 2 | 250.000 | 500.000 |

6.1. POBLACIÓN BENEFICIADA: Municipio de Filadelfia 1750 usuarios.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

| DOCUMENTO | SI | N/A |
|--|----|-----|
| Acta de entorno | | X |
| Acta de veeduría | | X |
| Acta de convenio de precios | | X |
| Plan de manejo ambiental | | X |
| Ensayos de laboratorio | | X |
| Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación) | | X |
| Bitácora de la obra o Informe | X | |
| Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación. | X | |
| Paz y Salvo oficina de trabajo. | X | |
| Paz y saivo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra. | X | |
| Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor. | X | |
| Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar | x | |

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

INFORME**CONTRATO
N°:**

ACTO 040 DE 2021

OBJETO:

Reposición de aducción por emergencia sector Chamberi vereda Aguadita pequeña predio del señor Pedro Luis Giraldo y Jairo Sánchez en el municipio de Filadelfia Caldas

**CONTRATIST
A:****HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA****COSTO
DIRECTO**Administración
Imprevistos
Utilidad
Iva sobre utilidades

| |
|-----|
| 24% |
| 5% |
| 5% |
| 19% |

\$ 4.660.541
 \$ 1.118.530
 \$ 233.027
 \$ 233.027
 \$ 44.275

TOTAL:

\$ 6.289.400

**RECURSOS:
SUPERVISOR**PROPIOS
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**Cantidades
ejecutadas**

| ITEMS | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|--|------|----------|--------------|-----------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 2 | Localización y replanteo | ml | 30 | 6.680 | 200.400 |
| 3 | Demolición de concreto | m3 | 1,28 | 300.000 | 384.000 |
| 4 | EXCAVACIONES | | | | |
| 5 | Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m | m3 | 6,5 | 28.000 | 182.000 |
| 6 | Rellenos compactos con material seleccionado de excavación | m3 | 6 | 18.000 | 108.000 |
| 7 | Dispersión de material sobrante | m3 | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | ACUEDUCTO | | | | |
| 9 | Empalmes a la red existente | Und | 2 | 800.000 | 1.600.000 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------|----|---------|------------------|
| 10 | Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión. Incluye manejo de aguas y transportes | ml | 30 | 40.000 | 1.200.000 |
| 11 | Termo fusión de portaflanche de 6" | Un | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 12 | Anclajes y tubería galv. De longitud 2 m de 2". Debidamente con tortones de alambre galv. Cal. 13 | und | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 13 | Abrazaderas metálicas para amarre del tubo al viaducto | un | 0 | 250.000 | 0 |
| 14 | Corte de raíces de guaguas | gl | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | Transporte de tubería y accesorios desde Neira hasta el sitio de la obra | viaje | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | Ítem Nuevo | | | | |
| 16 | Trasporte de personal al sitio | Un | 2 | 250.000 | 500.000 |
| COSTO TOTAL | | | | | 6.289.400 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 4.660.541 |
| ADMINISTRACION | | | | 24% | 1.118.530 |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | 233.027 |
| UTILIDADES | | | | 5% | 233.027 |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | | 19% | 44.275 |
| COSTO TOTAL | | | | | 6.289.400 |

Informe de obra: A continuación se detalla el plazo contractual y la fecha de terminación de la obra:

Fecha de inicio 21 de diciembre del 2021
Plazo 15 días calendario
Fecha de terminación 4 enero 2022
Fecha acta de recibo 27 de diciembre del 2021


Descripción inicial

Las obras fueron ejecutadas el 22 y 23 de diciembre del 2021; las cuales consistieron en la instalación de 30 m de tubería de polietileno por termo fusión el valor ejecutado fue de 6.289.400.

REGISTRO FOTOGRAFICO






HERNANDO VALLEJO HERRERA
Contratista

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| CONTRATO No.: | ACTO 040 DE 2021 | ACTA No.: | 01 de RECIBO FINAL | FECHA CORTE: | 27/12/2021 |
| OBJETO CONTRATO: | Reposicion de aduccion por emergencia sector Chambera vereda Aguadita pequeña predio del señor Pedro Luis Giraldo y Jairo Sanchez en el municipio de Fiadefia Caldas | FECHA INICIACION: | 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 | FECHA VENCIMIENTO: | 4 DE ENERO DEL 2022 |
| CONTRATISTA: | HERNANDE ANTONIO VALLEJO HERRERA | PLAZO ADICIONAL: | | VALOR ADICION: | |
| | | SUPERVISOR: | JUAN PABLO ZULUAGA CORREA | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO PRESENTE ACTA | |
|---------------------------------|---|-------|-------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | CANTIDAD | VR. TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 2 | Localizacion y replanteo | ml | 30,00 | 6.666 | 200.400 | 30 | 200.400 | 30,00 | 200.400 |
| 3 | Demolicion de concreto | m3 | 0,50 | 300.000 | 150.000 | 1,28 | 384.000 | 1,28 | 384.000 |
| 4 | EXCAVACIONES | | | | | | | | |
| 5 | Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m | m3 | 12,50 | 28.000 | 350.000 | 6,5 | 182.000 | 6,50 | 182.000 |
| 6 | Rellenos compactos con material seleccionado de excavacion | m3 | 10,00 | 18.000 | 180.000 | 6 | 108.000 | 6,00 | 108.000 |
| 7 | Dispersion de material sobrante | m3 | 1,00 | 15.000 | 15.000 | 1 | 15.000 | 1,00 | 15.000 |
| 8 | ACUEDUCTO | | | | | | | | |
| 9 | Empalmes a la red existente | Und | 2,00 | 800.000 | 1.600.000 | 2 | 1.600.000 | 2,00 | 1.600.000 |
| 10 | Instalacion de tuberia de 6" polietileno por termofusion. Incluye mano de obra y transportes | ml | 30,00 | 40.000 | 1.200.000 | 30 | 1.200.000 | 30,00 | 1.200.000 |
| 11 | Termofusion de portaflanjes de 6" | Un | 2,00 | 200.000 | 400.000 | 2 | 400.000 | 2,00 | 400.000 |
| 12 | Anciajes y tuberia galv. De longitud 2 m de 2". Desdibamto con tornillos de alambre galv. Cal. 13 | und | 2,00 | 350.000 | 700.000 | 2 | 700.000 | 2,00 | 700.000 |
| 13 | Abrazaderas metalicas para amarre del tubo al viaducto | un | 3,00 | 250.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Corte de raices de guaduas | pl | 1,00 | 500.000 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1,00 | 500.000 |
| 15 | Transporte de tuberia y accesorios desde Neira hasta el sitio de la obra | viaje | 1,00 | 500.000 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1,00 | 500.000 |
| | Item Nuevo | | | | | | | | |
| 16 | Transporte de personal al sitio | Un | | 250.000 | 0 | 2 | 500.000 | 2,00 | 500.000 |
| TOTAL | | | | | 6.545.400 | | 6.289.400 | | 6.289.400 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 4.850.241 | | 4.660.541 | | 4.660.541 |
| ADMINISTRACION 24% | | | | | 1.164.058 | | 1.118.530 | | 1.118.530 |
| IMPREVISTOS 5% | | | | | 242.512 | | 233.027 | | 233.027 |
| UTILIDAD 5% | | | | | 242.512 | | 233.027 | | 233.027 |
| IVA SOBRE UTILIDAD 19% | | | | | 46.077 | | 44.275 | | 44.275 |
| TOTAL ACTA No 01 Y FINAL | | | | | 6.545.400 | | 6.289.400 | | 6.289.400 |

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
Valor Acta No. 01 Y FINAL
Saldo No ejecutado Contrato
SUMAS IGUALES

| |
|-----------|
| 6.545.400 |
| 6.289.400 |
| 256.000 |
| 6.545.400 |

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA
INTERVENTORIA

HERNANDE ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista
