

# CONTRATO Y AÑO	No 0095/2018	Acta N°	01 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	142.406.631
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	142.406.631
NIT O CC:	10.247.750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00233 DE ENERO 23 DE 2018, 00245 DEL 23 DE ENERO DE 2018, 00257 DEL 24 DE ENERO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (+)	142.292.945
RP (#, rubro y fecha)	00238 DEL 26 DE ENERO DE 2018, 000239 DEL 26 DE ENERO DE 2018, 000240 DEL 26 DE ENERO DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	113.686
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO DESCOLE PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPO ALEGRE. PROTECCIÓN DE TUBERIA ACUEDUCTO Y LIMPIEZA CAÑO FINCA LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ. OBRA 2: REPARCHEO DE HUECO CON CONCRETO EN LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS. OBRA 3: REPOSICIÓN DE TUBERIA PVC DE 12" EN LA CLLE 32 D ENTRE CARRERAS 1 Y 2 BARRIO OCUZCA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA. OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DESCOLE PLANTA DE TRATAMIENTO NEIRA. OBRA 5: RECONSTRUCCIÓN CANAL DE DESCOLE SECTOR LAS FERIAS NEIRA CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		✓	
3- Pagos al FIC		✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.		✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		✓	
8- Ensayos de densidad.		✓	
9- Diseño de Mezclas.		✓	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		✓	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		✓	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		✓	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		✓	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.



Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 14/08/18.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		✓
Acta original		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G.	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
LUIS FERNANDO ARIAS V.	INGENIERO ZONA CENTRO	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	10247750	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA	CRA 15 No 4 A 19
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	1 - Independiente		
		DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		CALDAS	MANIZALES
		TELÉFONO	CORREO
		8860936	cuartasoritz@yahoo.es
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PERIODO COTIZACIÓN		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	
SALUD		DIFERENTE A SALUD		NÚMERO PLANILLA	
MES	AÑO	MES	AÑO		
1	2018	1	2018	24939793	
				TOTAL A PAGAR	
				\$210.400	

DETALLE POR COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				RESGOS LABORALES				SALUD				CCF				PARAFISCALES									
No. Tipo	No. de Identificación	Acreditados y Nombres										IBS AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBS EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBS ARL	Clase de Resgo	Cotización	Código CCF	IBS CCF	Aporte CCF	IBS otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
1	CC	10247750	GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO										3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
CC	10247750	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA	CRA 15 No 4 A 19	8890936	cuartasortiz@yahoo.es		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			CALDAS	MANIZALES		
				PERIODO COTIZACIÓN	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
				SALUD			
				MES	AÑO		
				3	2018	3	2018
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	97.700
				Licencia Maternidad	Valor		
				No. Autorización	0		
				Incapacidades	Valor		
				No. Autorización	0		
				Aporte Voluntario Aportante	Valor		
				Aporte Voluntario Afiliado	0		
				Aporte FSP - Substancia	0		
				Aporte FSP - Solidaria	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				97.700	0		
				NIT			
				900156264-2			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	97.700
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Aporte Voluntario Aportante	Valor		
				0	0		
				Aporte Voluntario Afiliado	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		
				0	0		
				Cotización Obligatoria	UPC Adicional		
				125.000	0		
				NIT			
				900336004-7			
				Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
				0	0	0	125.000
				No. Autorización	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Substancia	Valor		
				0	0		
				Aporte FSP - Solidaria	Valor		

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	10247750-3	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA	CRA 15 4 A 19	8990936	carlosgiraldom@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c			CALDAS	MANIZALES	SI	
PERIODO COTIZACIÓN		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		NÚMERO PLANILLA	
SALUD	DIFERENTE A SALUD	MES	AÑO	MES	AÑO		
3	2018	2	2018	E	16/03/2018	26281701	\$1.780.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	9.800	0	0	0	0	3	100	0	9.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	439.900	0	0	0	0	3	1.100	0	441.000	8
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	48.900	0	0	0	0	3	200	0	49.100	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	129.300	0	0	0	0	3	400	0	129.700	2
230301	Provenir	800224808-8	196.100	0	0	0	0	3	500	0	196.600	5
231001	Collondos	800227940-6	216.800	0	0	0	0	3	600	0	217.400	2
25-14	Colpensiones	900335004-7	95.900	0	0	0	0	3	300	0	96.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-28	ARF Sura	800256161-9	278.000	No. Autorización	Valor	278.000	3	700	278.700	2.780	2.780	278.700	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Flar Caldas	899096490-5	160.100	3	400	160.500	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
60.500	3	200	80.700	12
120.500	3	300	120.800	12

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	3	498.600	500.000	500.000
Pensión	4	638.100	639.900	639.900
Riesgos Laborales	1	278.000	278.700	278.700
CCF	1	160.100	160.500	160.500
ESAP	0	0	0	0
ICBF	1	120.500	120.800	120.800
MEN	0	0	0	0
SENA	1	80.500	80.700	80.700
TOTALES	11	1.775.800	1.780.600	1.780.600

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10247750
Primer Nombre ó Razón Social	CARLOS ALBERTO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO MEJIA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 15 A 19
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8890936
Correo electrónico	tere7750@hotmail.com
Código SHIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SHIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	095
Nombre Obra	Reposicion de alcantarillado
Fecha Inicio Obra	26/02/2018
Fecha Terminación Obra	26/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina-Neira-Anserma
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$142,406,631.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	12
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$234,373.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$234,373.00
Total Pagado	\$234,373.00
Valor Total	\$234,400.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. Transacción eCollect	61371623
Fecha Proceso	10/08/2018 01:43:27 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10247750
Primer Nombre ó Razón Social	CARLOS ALBERTO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO MEJIA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 15 A 19
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8890936
Correo electrónico	tere7750@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	095
Nombre Obra	Reposición de alcantarillado
Fecha Inicio Obra	26/02/2018
Fecha Terminación Obra	26/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina-Neira-Anserma
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$142,406,631.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	14
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$273,435.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$273,435.00
Total Pagado	\$273,435.00
Valor Total	\$273,450.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. Transacción eCollect	61371739
Fecha Proceso	10/08/2018 02:03:28 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10247750
Primer Nombre ó Razón Social	CARLOS ALBERTO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO MEJIA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 15 A 19
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8890936
Correo electrónico	tere7750@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	095
Nombre Obra	Reposicion de alcantarillado
Fecha Inicio Obra	26/02/2018
Fecha Terminación Obra	26/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina-Neira-Anserma
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$142,406,631.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor Total	\$97.700,00
IP Origen	190.9.213.65
Nro. Transacción eCollect	60999025
Fecha Proceso	25/05/2018 03:57:51 p.m.
Medio Seleccionado:	EFECTIVO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10247750
Primer Nombre ó Razón Social	CARLOS ALBERTO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO MEJIA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 15 A 19
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8890936
Correo electrónico	tere7750@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	095
Nombre Obra	Reposicion de alcantarillado
Fecha Inicio Obra	26/02/2018
Fecha Terminación Obra	26/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina-Neira-Anserma
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$142,406,631.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor Total	\$97,700.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. Transacción eCollect	61371772
Fecha Proceso	10/08/2018 02:07:55 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA
61068005


FECHA DE EXPEDICIÓN
13 06 2018

FECHA VENCIMIENTO
18 06 2018

Primer Nombre ó Razón Social :
CARLOS ALBERTO

Identificación :
10247750

Primer Apellido :
GIRALDO MEJIA

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$97,700.00
		
	NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	
	SUBTOTAL	\$97,700.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$97,700.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formularios de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)61068005(3900)097700(96)20180618



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61068005

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 10247750 Telefono:

Nombre del Pagador /Cuenta: CARLOS ALBERTO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$97,700.00

AREA PARA SELLO



JUN 18 2018 13:32:56 RBNICT 7.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS SANCANCIO
CRA 27A 66 30 LOC 860

C. UNICO: 3007024508

TER: ABC02199

RECIBO: 000851

RRN: 001042

APRO: 286965

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 61068005

VALOR: 97.170.0

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C. C: _____
EL: _____

*** COMERCIO ***

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 89899034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA
60999025


FECHA DE EXPEDICIÓN
25 05 2018

FECHA VENCIMIENTO
30 05 2018


Primer Nombre ó Razón Social :
CARLOS ALBERTO

Identificación :
10247750

Primer Apellido
GIRALDO MEJIA

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$97,700.00
 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	SUBTOTAL	\$97,700.00
	IVA	
	TOTAL	\$97,700.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago no debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60999025(3900)097700(96)20180530

BRANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 25-05-2018
 Com: 29232 - SENA FIC
 Suc: 373 - SAN CACIPIO
 Cuid: MANIZALES
 Caj: 004 Sec: 2476
 Valor Tot: \$ 97,700.00
 Forma de Pago Efectivo
 Pagador: 10247750
 Ref: 60999025

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 60999025

Ciudad: D M A Nro Cedula: 10247750 Telefono: _____
 Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ALBERTO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
		CHEQUE	
	TOTAL		\$97,700.00

7:08 Costo: 0.00
 CODIGO DE BARRA
ÁREA PARA SELLO



**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1


IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
60842525		
FECHA DE EMISIÓN		
17	04	2018
FECHA VENCIMIENTO		
22	04	2018

Primer Nombre o Razón Social : CARLOS ALBERTO Primer Apellido : GIRALDO MEJIA	Identificación : 10247750
--	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$234,400.00
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	SUBTOTAL	\$234,400.00
	IVA	
	TOTAL 	\$234,400.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papelas químicas tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60842525(3900)234400(96)20180422



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60842525

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	10247750	Teléfono
Nombre del Pagador /Cuenta: CARLOS ALBERTO						
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO			VALOR	
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.					CANTIDAD DE CHEQUES <input type="text"/>	EFECTIVO <input type="text"/>
					CHEQUE	
					TOTAL	\$234.400.00

ÁREA PARA SELLO



ABR 17 2018 19:02:09 RECIBO CT 7.01

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SANCANCIO
CRA 27A 66 30 LOC 860**
C. UNICO: 3007024508 TER: ABC02201
RECIBO: 018507 RRN: 018666
APRO: 248359

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE:
REF: 60862525

VALOR TOTAL DE LA TRANSACCION
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C. C: _____
TE: _____

*** COMERCIO ***

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA
60842550


FECHA DE EXPEDICIÓN
17 04 2018

FECHA VENCIMIENTO
22 04 2018

Primer Nombre ó Razón Social :
CARLOS ALBERTO

Identificación :
10247750

Primer Apellido :
GIRALDO MEJIA

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$273,450.00
		
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$273,450.00
	IVA	
	TOTAL 	\$273,450.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque esta no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 g/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60842550(3900)273450(96)20180422



CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 60842550

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 10247750 Teléfono:

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ALBERTO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO

CHEQUE

TOTAL \$273,450.00

AREA PARA SELLO



ABR 17 2018 19:02:25 REBUCT 7.01

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SANCANCIO**
CRA 27A 66 30 LOC 860
C. UNICO: 3007026508 TER: ABC02201
RECIBO: 010509 RRIS: 010668
APRO: 934537

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 60042550

WALCOMERENTIENSIENZIENZO

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C. C: _____
TF: _____

*** COMERCIO ***



CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJÍA

INGENIERO CIVIL

MATRÍCULA No. 17202-27153

CRA 15 N° 4A 19 TELEFAX 8890936 - MANIZALES

Resolución Dian N° 100000049638 Fecha 2009/03/11 Numeración Autorizada del CG 001 al CG 500

FACTURA DE VENTA

CG N° 0077

NIT. 10.247.750-3

I.V.A. RÉGIMEN COMÚN

FECHA, _____

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS S.A ESP

NIT: 890803239-9

DIRECCIÓN: CARR 23 # 75-82

TELÉFONO: 8867080

CONCEPTO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Acta de Reabto de obra N° 1 y final del contrato N° 095		141267988

TUAN CARLOS ARIAS MORENO NIT. 10.272.407-7

SON: Ciento cuarenta y dos millones de pesos noventa y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos / M/B
C-A-G-M

SUB-TOTAL	141267988
I.V.A.	1024957
TOTAL \$	142292945

FIRMA Y CEDULA RECIBIDO

FIRMA Y CEDULA ENTREGADO

La presente Factura de venta, se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, la mora en el pago ocasionará intereses de mora del 3% por mes o fracción.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18762002947896



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 1 0 2 4 7 7 5 0	6. DV 3	7. Primer apellido GIRALDO	8. Segundo apellido MEJIA	9. Primer nombre CARLOS	10. Otros nombres ALBERTO
---	------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

11. Razón social
GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas en Municipios

Cód.
1 0

24. Dirección
CR 15 4 A 19

25. País
Colombia

26. Departamento
Caldas

27. Municipio
Manizales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.


Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procederá la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 10247750 1004. DV 3
1005. Cod. Representación
1006. Organización GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION.
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2017-04-19 02:33:18

Señores:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Ciudad

Asunto: informe contratista Contrato No. 0095

A continuación, realizo breve resumen de las actividades y registro fotográfico de cada uno de los frentes de obra ejecutados para el Acta No. 1 y final del contrato 0095:

“REPOSICIÓN ALCANTARILLADO DESCOLE PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPO ALEGRE, PROTECCION DE TUBERIA ACUEDUCTO Y LIMPIEZA CAÑO FINCA LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS:

Se realiza la localización del sitio y se hace la respectiva limpieza procediendo a remover la tierra los escombros, se retira la tubería dañada y se procede a la instalación del tubo nuevo haciendo lo debido para que este quede en perfectas condiciones luego se procede a rellenar y luego a aplanar igualmente se traslada retroexcavadora al sitio de la obra para hacer ampliación y profundización del lecho de la quebrada donde se desagua la planta de tratamiento del municipio.

Se relacionan actividades ejecutadas de acuerdo al registro fotográfico anexo.

- Localización y replanteo.
- Excavaciones en material común.
- Entibado horizontal.
- Dispersión de material sobrante.
- Retiro de tubería de cemento existente.
- Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 24”.
- Se construyen bases y cañuelas.
- Se realiza empalme a cámara.
- Se instala arena para base y atraque de tubería.
- Lleno compactado con material de la obra.
- Suministro, transporte e instalación de gaviones de en malla galvanizada.
- Se instala valla institucional 2x4.
- Limpieza de caño con retroexcavadora de orugas.

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

"REPARCHEO DE HUECO CON CONCRETO EN LA CARREA 12 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS

Se realiza el cierre del sitio de la obra con tela verde y soportes en guadua, se hacen los procedimientos de señalización del sitio de trabajo y posteriormente realizaron las excavaciones, se instala la sub base y se compacta, luego se hizo el vaciado del concreto, una vez curado el concreto se procedió a retirar los escombros y el cerramiento para posteriormente dar vía.

Se relacionan actividades ejecutadas de acuerdo al registro fotográfico anexo.

- Localización y replanteo.
- Cerramiento en tela verde y soportes de guadua.
- Instalación de señales preventivas y reglamentarias.
- Excavaciones en conglomerado.
- Retiro de material sobrante en vehículo automotor.
- Instalación y compactación de sub base para pavimento.
- Instalación de concreto para pavimento 42MR hecho en obra.



Carrera 15 No 4 A – 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Cordialmente,

Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

REPOSICION TUBERIA PVC DE 12"EN LA CALLE 32D ENTRE CARRERAS 1 Y 2 BARRIO OCUZCA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Se realiza la socialización con la comunidad explicando de qué se trataba la obra, el plazo de ejecución y en que se está avanzando, procedimos señalizando y encintando el sitio de trabajo con cinta de precaución y bombones se procede también a hacer el techado provisional cerrando con tela verde y guadua.

Se continuaron realizando excavaciones y cortes mecanizados con disco donde existía concreto, posteriormente se procedió a la instalación de la tubería de alcantarillado, a hacer las cámaras de inspección y domiciliarias con sus respectivas cajas, luego se realizaron los llenos.

Se instaló la sub base y posterior vaciado del concreto.

Se relacionan actividades ejecutadas de acuerdo al registro fotográfico anexo.

- Localización y replanteo
- Techado provisional en plástico cal 6 y guadua.
- Cerramiento en tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.
- Suministro de transporte e instalación señalización preventiva y reglamentaria.
- Suministro e instalación de valla institucional 2x4.
- Demolición de pavimentos y andenes en concreto hidráulico.
- Corte mecanizado de pavimento en concreto hidráulico.
- Excavación en zanja – material común de 0,0 a 2,0 Mts.
- Instalación tubería PVC corrugada 315mm (12") para alcantarillado.
- Instalación tubería PVC corrugada de (6") para domiciliarias.
- Cajas de inspección de 0,50X0,50 para domiciliarias incluye tapa de concreto
- Instalación de silletas de 12"x6" incluye suministro y aplicación de adhesivo con 0,33 de ¼ de galón por silleta.
- Entibado horizontal / vertical tipo 1.
- Rellenos compactados con material de la obra.
- Sustitución de arena limpia para tuberías.
- Suministro transporte e instalación de cámara circular de inspección/caída D=1,2m en concreto 21Mpa.
- Suministro transporte e instalación de base-cañuela cámara circular de inspección/caída D1, 2m en concreto 21Mpa.

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

- Suministro e instalación de tapa Hf D=0,60m p/cámara inspección.
- Empalme a cámara existente.
- Suministro transporte e instalación de sub-base p/pavimentos en material granular seleccionado, compactado.
- Pavimentos de franjas en concreto hecho en obra clase B (MR42).
- Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor (incluye permiso de utilización de escombrera).
- Trabajadora social



A
6)
88
'alc

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

CONSTRUCCION DE CANAL DESCOLE PLANTA DE TRATAMIENTO NEIRA CALDAS

Se hace la localización de la obra del punto donde se hará la construcción del canal procediendo a hacer la rocería y limpieza, se continúa con la demolición y remoción de los escombros, se inician excavaciones y el transporte de materiales al hombro por fuerte pendiente ya que no tiene acceso en vehículo automotor.

Se realiza construcciones de cámaras, instalación de tubería, construcción de canal, construcción de gavionería para estabilización de taludes, se realizan llenos compactados con material seleccionado y perfilada de taludes.

A continuación se relacionan actividades ejecutadas de acuerdo al registro fotográfico anexo.

- Localización y replanteo.
- Rocería y limpieza.
- Construcción de canal de pantalla deflectores
- Solado de limpieza.
- Acero de refuerzo.
- Sobre acarreo al hombro en fuerte pendiente.
- Excavaciones.
- Concreto ciclópeo para entrega.
- Perfilada de taludes.
- Reconstrucción de base y cañuelas diámetro 1,20.
- Rellenos con material seleccionada.
- Construcción de drenes y filtros.

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.




Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

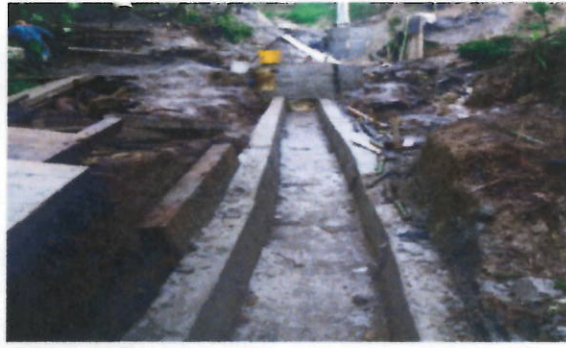

Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com



RECONSTRUCCION DE CANAL DESCOLE SECTO LAS FERIAS NEIRA CALDAS

Se realiza los preliminares que incluye localización y replanteo del sitio de la obra lo mismo que la rocería y limpieza para dar inicio a la demolición al canal en concreto encontrado en mal estado, se inicia adicionalmente el acarreo del material en fuerte pendiente dentro de la obra se hace control manejo de aguas al interior del canal y alrededor para proceder con la construcción del canal abierto una vez realizadas las demoliciones y las excavaciones lo mismo que la formaletada de cada uno de los sitios, y la formaletada y vaciado de la tapa del canal, adicionalmente se hace el figurado y amarre del acero de refuerzo, luego se hacen llenos y disposición del material sobrante de excavaciones y demoliciones.

Se relacionan actividades ejecutadas de acuerdo al registro fotográfico anexo.

- Localización y replanteo.
- Demolición de canal en concreto
- Control y manejo de aguas en el interior del canal y alrededor.
- Sobre acarreo al hombro en fuerte pendiente.
- Rocería y limpieza.
- Dispersión de material sobrante de excavación demoliciones y ubicarlos en sitios debidamente camuflados donde no perjudique la movilidad permanente de la comunidad del sector.
- Concreto de 4000psi para construcción del canal abierto, incluye pantallas disipadoras), formaleta, vibrador, mezcladora, sika dur 32.
- Acero de refuerzo.
- Cinta en PVC e=0,15m.
- Excavaciones en material común.
- Rellenos con material de la selección.

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.



CAGGM

Cordialmente,

e. a. g. m.

CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
C.C. 10.247.750 de Manizales

Carrera 15 No 4 A - 19 La Francia
Teléfono: (6) 8890936
Fax: (6) 8890936
e-mail: carlosagiraldom@gmail.com

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

CONTRATO EMPFOCALDAS

CHINCHIPA

DIAS: 03 MARZO 2016

Pago del 12 Marzo al 24 Marzo

DOS Y NOMBRE	CARGO	SALARIO	VALOR DIA	LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
Alexandro Gallego	Oficial	800.000	26667	14	373.338	Alexandro Gallego
Camilo Lopez Osorio	Ayudante	781.242	26041	14	364.574	Camilo Lopez Osorio
Señor Alejandro Alzate Aguirre	Ayudante	781.242	26041	14	364.574	STIVEN AIZATE
					1102.486	

Copia
Otra 5

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

Contrato empocaldas 0095

Neira las Ferias

DIA 7 MES 04 AÑO 2018

Pago del 26 Marzo al 8 Abril

Revisado

NUM	DOCUMENTO ID	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	SALARIO	VALOR DIA	DIA LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	10.286.006	Conrado Posada Arenas	Maestro	\$ 900.000	\$30.000	14	\$ 420.000	<i>Conrado Posada</i>
2	4.481.289	Albeiro Duque Castillon (4)	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Albeiro Duque Castillon</i>
3	75.074.532	Albeiro Albaran Acevedo (4+5)	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Albeiro</i>
4	16.139.461	Ruben Dario Castaño Serna	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Ruben Dario Castaño</i>
5	1.055.755.930	Alexander Lopez Quiñero	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Alexander Lopez Q</i>
6							\$ 1.878.318	

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

Contrato Empocaldas 0095

Neira Las Feñas

DIA 21 MES 04 AÑO 2018

Pago del 9 Abril al 22 abril

NUM	DOCUMENTO ID	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	SALARIO	VALOR DIA	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	10.286.006	Conrado Posada Arenas	Maestro	\$ 900.000	\$30.000	14	\$ 420.000	Conrad. Xambó
2	4.481.289	Albeiro Durque Castillon	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	Albeiro Durque Castillon
3	75.074.532	Albeiro Albaran Acevedo	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	Jose Alveiro Alvarado
4	16.139.461	Ruben Darío Castaño Serna	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	Ruben Darío Castaño
5	1.055.755.930	Alexander Lopez Quintero	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	12,5	\$ 325.518	Alexander Quintero
6							\$ 1.839.256	

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

Contrato Empocaldas 00915

Neira las Faldas

DIA 5 MES 05 AÑO 2018

Pago del 23 Abril al 6 Mayo

NUM	DOCUMENTO ID	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	SALARIO	VALOR DIA	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	10.286.006	Conrado Posada Arenas	Maestro	\$ 900.000	\$30.000	14	\$ 420.000	Conrado Posada
2	4.481.289	Albeiro Duque Castillon	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Albeiro Duque Castillon
3	75.074.532	Albeiro Albaran Acevedo	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Albeiro
4	16.139.461	Ruben Dairo Castaño Serna	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Ruben Dairo Castaño
5	1.055.755.930	Alexander Lopez Quintero	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Alexander Lopez Q
6							\$ 1.461.656	

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

Contrato empocaldas 0095

Neira las Feñas

DIA 7 MES 04 AÑO 2018

Revisado

Pago del 26 Marzo al 8 Abril

NUM	DOCUMENTO ID	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	SALARIO	VALOR DIA	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	10.286.006	Conrado Posada Arenas	Maestro	\$ 900.000	\$30.000	14	\$ 420.000	<i>Conrado Posada</i>
2	4.481.285	Alberto Duque Castrillon	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Alberto Duque Castrillon</i>
3	75.074.532	Alberto Albaran Acevedo	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Albaran</i>
4	16.139.461	Ruben Dario Castaño Serna	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Ruben Dario Castaño</i>
5	1.055.755.930	Alexander Lopez Quintero	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	<i>Alexander Lopez Q</i>
6							\$ 1.878.318	

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

Contrato Empocaldas 0095
Neira Las Feñas

DIA 21 MES 04 AÑO 2018

Pago del 9 Abril al 22 abril

NUM	DOCUMENTO ID	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	SALARIO	VALOR DIA	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	10.286.006	Conrado Posada Arenas	Maestro	\$ 900.000	\$30.000	14	\$ 420.000	Conrad Xambó
2	4.481.289	Albeiro Dirque Castillon	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	Albeiro Dirque Castillon
3	75.074.532	Albeiro Albaran Acevedo	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	Jose Aveiro Alvarez
4	16.139.461	Ruben Dario Castano Serna	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	14	\$ 364.580	Ruben Dario Castillon
5	1.055.755.930	Alexander Lopez Quintero	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	12,5	\$ 325.518	Alexander Quintero
6							\$ 1.839.256	

Ing. Carlos Alberto Giraldo M.

Contrato Empocaldas 00915

Neira las Fenás

DIA 5 MES 05 AÑO 2018

Pago del 23 Abril al 6 Mayo

NUM	DOCUMENTO ID	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	SALARIO	VALOR DIA	CLAS LABORA DOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	10.286.006	Conrado Posada Arenas	Maestro	\$ 900.000	\$30.000	14	\$ 420.000	Conrado Posada
2	4.481.289	Albero Duque Castillon	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Alberio Duque Castillon
3	75.074.532	Albero Albaran Acevedo	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Alb
4	16.139.461	Ruben Darío Castaño Serna	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Ruben Darío Castaño
5	1.055.755.930	Alexander Lopez Quintero	Ayudante	\$ 781.242	\$26.041	10	\$ 260.414	Alexander Lopez Q
6							\$ 1.461.656	
