

# CONTRATO Y AÑO	CONTRATO 0076 DE 2018	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	140.542.061 ✓
CONTRATISTA	ASTRO PROYECT S.A.S.			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	900.633.147-5 ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	140.542.061
CDP (#, rubro y fecha)	00159 DE ENERO 05 DE 2018 Y 00160 DE ENERO 05 DE 2018			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	53.929.817 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000211 DE ENERO 25 DE 2108 Y 000207 DE ENERO 25 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	30.001.138 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: OBRAS CIVILES VARIAS, CAPTACION Y PROLONGACIÓN DE DESCOLES DEL MATADERO, INSTITUTO JUAN XXIII, PARQUE RISARALDA, LAVA AUTOS, NUEVO HORIZONTE. MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.- OBRA 2:- REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESCOLE LOCALIZADO EN LA FINCA DE LOS SEÑORES CONRADO LÓPEZ Y FELIX LÓPEZ CON ACCESO AL INTERIOR DE LA VIVIENDA CARRERA 7 No. 4- 24.- MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.- ✓				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	56.611.106 ✓

Tenerific

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		X	
3- Pagos al FIC		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna Suárez A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**CONSULTOR, PROVEEDOR, CONSTRUCTOR E INTERVENTOR DE
PROYECTOS "ASTROPROYECT S.A.S" DEL MUNICIPIO DE SAMANA
CALDAS, LEGALMENTE CONSTITUIDA E INSCRITA EN LA CÁMARA
COMERCIO DE LA CIUDAD DE LA DORADA CON NIT. 900.633.147-5**

CERTIFICA

Que la Empresa **CONSULTOR, PROVEEDOR, CONSTRUCTOR E INTERVENTOR DE PROYECTOS ASTRID S.A.S con NIT N° 900.633.147-5**, se encuentra a paz y salvo en los respectivos pagos correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario, específicamente para el contrato 00076 del 2018 suscrito entre EMPOCALDAS S.A E.P.S y la empresa ASTRO PROYECT S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Se expide en Samaná Caldas a los 12 días del mes de Abril de 2018.

JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO
Representante Legal Astroproyect S.A.S

ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS-AUDITORIAS-REVISORIA FISCAL

MARTHA YANETH DIAZ GUTIERREZ

NIT 65.745.939-4

La suscrita contadora pública titulada **MARTHA YANETH DIAZ GUTIERREZ**, identificada con cedula de ciudadanía número **65.745.939** de Ibagué y con tarjeta profesional N° **T.P. 156516-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia.

CERTIFICA

Que la entidad **CONSULTOR, PROVEEDOR, CONSTRUCTOR E INTERVENTOR DE PROYECTOS ASTRID S.A.S** con **NIT N° 900.633.147-5**, se encuentra a paz y salvo en los respectivos pagos correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario..

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Se expide en Samaná Caldas a los 25 días del mes de Abril de 2018.


MARTHA YANETH DIAZ G

Contadora publica

T.P. 156516-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

4 0 A 2 0 B F B 6 2 3 9 5 0 E 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA YANETH DIAZ GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65745939 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 156516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.745.939**

DIAZ GUTIERREZ

APELLIDOS

MARTHA YANETH

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1969**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

B+

G.S RH


F

SEXO

19-JUL-1986 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



A-2900100-00058983-F-0065745939-20080824

0002610406A 1

8400010125


República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
156516-T



MARTHA YANETH
 DIAZ GUTIERREZ
 C.C. 65749055-21
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 058 FECHA: 10/02/2011
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL COLOMBIANO
 PRESENTE
 MAURICIO ESPAÑOL LEÓN 1566928

FIRMA DEL TITULAR 182270

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.



ENCUENTRO 1101 01 7002

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900633147
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASTRO PROYECT SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 11 N 7 37 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA.	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4214265112	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	PERIODO COTIZACIÓN AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/yy):	2018/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998686588

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		3	\$ 375.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 125.100
600224808	230301	230301-PORVENIR		4	\$ 500.600
SUBTOTAL:				8	\$ 1.001.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		9	\$ 282.000
SUBTOTAL:				9	\$ 282.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS		9	\$ 282.000
SUBTOTAL:				9	\$ 282.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		9	\$ 439.800
SUBTOTAL:				9	\$ 439.800

TOTAL PAGADO: \$ 2.004.800

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
CALLE 96 No. 12-53 Bogotá
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 857512312
Cajera: CASANCHEZ

Fecha: 12/04/2018 16:23:43
PS Recargos:
800971 SAMANA CALLE 8 :
Cantidad cupones:
Identificación: 900633147

Nombre: ASTROPROYECT SAS
Apellido: ASTROPROYECT SAS
Documento: CEDULA DE CIUDADANÍA
Teléfono: 4214265112
Código Planilla: 6658901
Período Pago: 2018/03/01
Valor Comisión: 0
Valor Via Comisión: 0
Referencia: 900633147
Monto recibido: \$2.004.800,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conservar este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación
Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verificación y autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1) 8510100
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTE
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

Bancoomaya

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 NOMBRE: **ALONSO DOMESTICO DE LA ROSA**
 N° IDENTIFICACION: **2010107877**
 N° IDENTIFICACION DEL APORTANTE: **2010107877**
 EMPRESA: **ALONSO DOMESTICO DE LA ROSA**
 N° DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA: **2010107877**
 N° DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE: **2010107877**
 N° DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE: **2010107877**
 N° DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE: **2010107877**
 N° DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE: **2010107877**

ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56

ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88

ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALORES										TOTAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PASO GENERAL

000

BARTOLOMÉ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE: MARTÍN J. BARTOLOMÉ DNI: 27.123.456 DOMICILIO: CALLE 1234, CABA FECHA DE NACIMIENTO: 15/08/1980 FECHA DE INGRESO: 01/01/2010 ASESOR: JUAN P. PEREZ		NÚMERO DE PLANILLA: 123456789 PERÍODO DE VALIDEZ: 01/01/2010 - 31/12/2010 MONEDA: PESOS ARGENTINOS	
DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES			
ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL APORTAMIENTO	VALOR	FECHA
1	APORTE MENSUAL	100000	01/01/2010
2	APORTE MENSUAL	100000	01/02/2010
3	APORTE MENSUAL	100000	01/03/2010
4	APORTE MENSUAL	100000	01/04/2010
5	APORTE MENSUAL	100000	01/05/2010
6	APORTE MENSUAL	100000	01/06/2010
7	APORTE MENSUAL	100000	01/07/2010
8	APORTE MENSUAL	100000	01/08/2010
9	APORTE MENSUAL	100000	01/09/2010
10	APORTE MENSUAL	100000	01/10/2010
11	APORTE MENSUAL	100000	01/11/2010
12	APORTE MENSUAL	100000	01/12/2010
TOTAL		1200000	

TOTAL \$ 2.004.800

105

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banque.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900633147
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ASTRO PROJECT SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 11 N 7 37 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		S/

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4214341420	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998667131

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		3	\$ 112.800
SUBTOTAL:				3	\$ 112.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		2	\$ 20.000
901097473	EPS045	EPS045-SUBS MEDIMÁS		1	\$ 8.500
SUBTOTAL:				3	\$ 28.500
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890806480	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS		3	\$ 28.400
SUBTOTAL:				3	\$ 28.400
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		3	\$ 48.100
SUBTOTAL:				3	\$ 48.100

TOTAL PAGADO: \$ 218.800

EMPRESA EFECTIVO S.A.
NIT 800.111.993-1
Calle 56 No. 12-55 Boyeta
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 8574854072
Código: 096741
BOYACASA

Fecha: 11/04/2018 18:56:51

PS Recaudador:
956617 SAMANA ALCALDIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 900633147

Nombre: ASTROPROJECT
Apellido 1: SAS
Apellido 2: SANA
TIPO DOCUMENTO: NNA
TELÉFONO: 8658901
Código Planilla: 4214341420
Período Pago: 2018/04
Valor Comisión: 0
Valor IVA Comisión: 0
Valor: \$218.800,00
Valor recibido: \$218.800,00
Forma de pago: EFECTIVO

Altra condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de la parte de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo S.A. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado. Línea de servicio al cliente: 111 6510101

servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

501

DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE:
 NOMBRE Y APELLIDOS: ALVARO PARRON...
 DNI: 4314341493
 FECHA DE NACIMIENTO: 20/05/1973
 DIRECCION: 2015 PUEBLO COCTACACAN...
 TELEFONO: 0994341493
 CORREO ELECTRONICO: alvaroparron@...
DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR:
 NOMBRE Y APELLIDOS: EMPRESA...
 DNI: 2015 PUEBLO COCTACACAN...
 RUC: 2015 PUEBLO COCTACACAN...
 DIRECCION: 2015 PUEBLO COCTACACAN...
 TELEFONO: 2015 PUEBLO COCTACACAN...
 CORREO ELECTRONICO: 2015 PUEBLO COCTACACAN...

FECHA	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR
01/01/2015	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR
CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00
TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00

CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR
CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00
TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00

CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR
CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00
TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00

CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR	CONTRIBUCION	VALOR
CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00	CONTRIBUCION	1.00
TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00	TOTAL	1.00

TOTAL \$ 218.800

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Sanromeo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900633147
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ASTRO PROJECT SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 11 N 7 37 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA	4214340416	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO: 2018	SALUD. AÑO: 2018
DÍAS DE MORA	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2018/04/12	NUMERO AUTORIZACIÓN: 9998667114

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 4.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 59.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 325.300
SUBTOTAL:			8	\$ 389.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 95.200
901097473	EPS045	EPS045-SUBS MEDIMÁS	1	\$ 2.200
SUBTOTAL:			8	\$ 97.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	8	\$ 97.300
SUBTOTAL:			8	\$ 97.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 169.300
SUBTOTAL:			8	\$ 169.300

TOTAL PAGADO: \$ 752.200

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 9b No. 12-15 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No. OS: 3574853932 DV: 44119L

Ca Serv: RIVACASA

Cliente beneficiario:
110263 PILA (CALDAS)

Fecha: 11/04/2018 18:55:38

PS Recaudador:
996607 SAMANA ALCALDIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 900633147

Nombre: ASTROPROJECT SAS

APELLIDO 1: SAMANA

APELLIDO 2: NIT

TIPO DOCUMENTO: NIT

TELÉFONO: 8658901

Código Planilla: 4214340416

Período Pago: 2018/04

Valor Consist: 0

Valor Consist: 0

Referencia: Valor \$752.200,00

900633147

Valor recibido: \$752.200,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario


Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a EFECTIVO LTDA., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contenido. Línea de servicio al cliente: (01) 6510101

serv@efectivo.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PASO GENERAL

SCJ



CONTRIBUYENTE: **INSTITUCIONES DE LA FAMILIA**
REGIMEN: **CONTRIBUYENTES DE PASO GENERAL**
PERIODO: **1987**
VALOR: **1.400.000,00**
IMPORTE: **1.400.000,00**

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Hancor Nueva

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA		DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS GENERALES DEL SUJETO PASIVO			DATOS GENERALES DEL PAGO			
NOMBRE COMERCIAL	HANCOR NUEVA	NOMBRE COMPLETO	NACIONALIDAD	NOMBRE COMPLETO	EDAD	NACIONALIDAD	CODIGO DE PAGO	TIPO DE PAGO	MONEDA	VALOR	FECHA DE PAGO
RUT	15.537.591-5	DIGITO VERIFICADOR	0	RUT	15.537.591-5	DIGITO VERIFICADOR	0	MONEDA	CLP	VALOR	FECHA DE PAGO
DETALLE DE APORTES											
CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	MONTO DE APORTES	FECHA DE APORTES	FECHA DE APORTES	FECHA DE APORTES	FECHA DE APORTES	FECHA DE APORTES	FECHA DE APORTES	FECHA DE APORTES
RESUMEN DE APORTES											
TOTAL											\$ 752.200

501

Redeban
 MULTIPAGOS
 BANCOLOMBIA
 C.A. 27A 86 20 LOC 860
 RECAUDO
 BANCOLOMBIA

**TE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
 CON CHEQUE DE GERENCIA**

ANTICIPARTE: Si el pago mediante el instrumento de pago
 no es efectivo, el cliente debe cancelar la operación en
 el momento de la emisión o a requerimiento del Banco y
 generar los costos aplicables.

REFERENCIA No. 60832026
 14 04 2015
 17 04 2015

Orden General:
IT S.A.S



Identificación:
900633147

Este documento es un cheque de gerencia emitido por el Banco para el pago de los valores
 indicados en el presente instrumento de pago. El cliente debe cancelar la operación en el momento
 de la emisión o a requerimiento del Banco y generar los costos aplicables. La impresión debe
 realizarse en papel tipo Bond de 75 gramos (papel para fotocopia). No se aceptan formatos
 impresos en papel reciclado tipo FAX. La impresión debe realizarse con impresora laser de alta
 resolución. Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la
 forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.

Nombre: _____
 C.C. _____
 Tel. _____
COMERCIO S.A.S

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		\$156,250.00
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$156,250.00
	IVA	
	TOTAL	\$156,250.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si se le concede un cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (solo efectivo o solo con cheque).
 La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gramos (papel para fotocopia).
 No se aceptan formatos impresos en papel reciclado tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(416)7707012100010(B020)00032026(3900)160260(98)20160419

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 60832026

Cantidad	Nr. de Cuenta	900633147	Teléfono
Nombre del Pagar o Recibir: ASTROPROYECT S.A.S.			
ORDEN No.	CUENTA No.	CORRUBIO	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES		EFFECTIVA	CHEQUE
Los cheques devueltos en esta sucursal son válidos de fecha posterior.		TOTAL \$156,250.00	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 900633147 ✓

Primer Nombre ó Razón Social: ASTROPROYECT S.A.S ✓

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Digito de Verificación (Si es persona Jurídica): 5

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CARRERA 11 N° 7-374

Ciudad de Domicilio: SAMANA

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 3126897523

Correo electrónico: astroproyectsas@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia o Contrato Obra: 076

Nombre Obra: OBRA CIVIL MARQUETALIA ✓

Fecha Inicio Obra: 26/01/2018

Fecha Terminación Obra: 29/03/2018

Ciudad de Ejecución de la Obra: MARQUETALIA CALDAS ✓

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2018

Mes Periodo a Pagar: MARZO ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$140,542,061.00

Costo Total Mano de Obra: \$9,542,947.00 ✓

Número de Trabajadores en el Periodo: 8

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$156,248.00 ✓

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$156,248.00 ✓

Total Pagado: \$156,248.00 ✓

Nro. Transacción eCollect: 60832026

IP Origen: 186.148.182.219

Valor Total: \$156,250.00

Fecha de Proceso: 18/04/2018 12:00:00 a.m.

Entidad Autorizadora: **BANCOLOMBIA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Número de Confirmación: **000000**



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Habilitada Res. 13028005116703
 Fecha: 18/07/2017
 Numeración 59 al 100

Factura de Venta
No. 80

Nit: 900633147-5

Nombre: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Fecha: / /2018

Tel: 8867080 C.C. o Nit.: 890803239-9 Dirección: CARRERA 23 No. 75-82 CIUDAD: MANIZALES

Cant.	Descripción	Referencia	IVA %	Vr. Unitario	TOTAL
1	ACTA FINAL CONTRATO No. 00076 DEL 2018 OBRA 1: OBRAS CIVILES VARIAS, CAPTACIÓN Y PROLONGACIÓN DE DESCOLES DEL MATADERO, INSTITUTOO JUAN XXII, PARQUE RISARARLDA, LAVA AUTOS, NUEVO HORIZONTE. OBRA 2: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESCOLE LOCALIZADO EN LA FINCA DE LOS SEÑORES CONRADO LÓPEZ Y FELIZ LOPEZ CON ACCESO AL INTERIOR DE LA VIVIENDA CARRERA 7 # 4-24. MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS	FACTURA ACTA FINAL		22.565.730	22.565.730
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					22.565.730
	ADMINISTRACION		25,0%	22.565.730	5.641.433
	IMPREVISTOS		2,0%	22.565.730	451.315
	UTILIDAD		5,0%	22.565.730	1.128.287
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					

Sub Total	\$	29.786.764
IVA	\$	214.374
TOTAL	\$	30.001.138

Referencia Bancaria

22 de Octubre de 2015

Señores

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que Consult Prov Const E Interv De identificado (a) con NIT 900633147, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	39299683862	2013-07-09	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede contactarse con la Central Telefónica Bancolombia al siguiente número: Medellín: (57) 412 2211 ext. 1000. Bogotá: (57) 412 2211 ext. 1000. Barranquilla: (57) 412 2211 ext. 1000. Cali: (57) 412 2211 ext. 1000. Resto país: 01800 69 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España: (34) 900 995 717 - Estados Unidos: (1) 1 866 379 97 14

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia



INFORME DE ACTIVIDADES OBRA 2

REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESCOLE LOCALIZADO EN LA FINCA DE LOS SEÑORES CONRADO LOPEZ Y FELIX LOPEZ CON ACCESO AL INTERIOR DE LA VIVIENDA CARRERA 7 No. 4-24 DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTATADA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	PRELIMINARES			
1.1	Localización y replanteo de redes ((Incl. Topografía y plano record)	mts	185,11	Del 01 al 10 de febrero se realizaron varias visitas donde está localizada la obra en compañía del ingeniero interventor y un funcionario de Empocaldas, para realizare las actividades de localización y replanteo, definir detalles topográficos.
1.2	Despeje de sendero (Rocería) y dispersión de sobrantes . Ancho aproximado 1,50 metros	mts	204,41	De la semana del 12 al 16 de febrero y Después de definir la localización y el replanteo. se iniciaron las labores de rocería con un promedio entre 2 (se respeto al máximo el cultivo de café)
2	DEMOLICIONES VARIAS			
2.1	Demoliciones varias en concreto simple, roca y otros materiales pétreos	m3	1,24	Se demolió una caja existente y un muro al pie de una domiciliaria, adecuaciones en la recamara existente.
3	SOBREACARREOS			
3,1	Transporte manual de material de préstamo	m3	16,61	Por las grandes distancias se invirtió gran cantida de tiempo y mano de obra para el trasporte del material para las obras de concreto y la tubería.
4	EXCAVACION			
4.1	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	187,22	En la semana del 18 al 25 de febrero simultáneamente se inicia las labores de excavación encontrando varias dificultades, la pendiente hacía que rodara la tierra y se trató de sostener con madero pero no se pudo lograr al cien por ciento, algunos tramos quedaron demasiado profundos y se utilizó el entibado y por las distancias de carga de



				material retrasó la obra..
4,2	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	52,30	Se utilizaron 100 metros de entibado aproximadamente, para evitar accidentes en los obreros, un tramos quedo con gran profundidad.
5	RELLENOS COMPACTADOS			
5,1	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	80,35	Se trato de utilizar al máximo el material excavado pero en algunos tramos, se rodaba por la ladera.
5,2	Rellenos compactados con material común de cantera préstamo	m3	16,61	En la semana del 26 de febrero al 03 de marzo. Por las condiciones del terreno, (pendientes muy pronunciadas) se rodaba la tierra para hacer el relleno compactado, se vio en la obligación de utilizar cantidad de matinal de préstamo.
6	SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTADOS			
6,1	Sustitución en arena limpia para tuberías	m3	40,87	A todo la tubería que se instalo se le coloco colchón de 10 centímetros de arena y sobre el tubo otros 10 centímetros de arena para garantizar el tiempo de vida útil de la tubería y las estabilidad de la obra.
7	ALCANTARILLADOS			
7,1	Instalación tubería corrugada PCV-s de 315mm (12"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	178,45	Se coloca la tubería en 12" para recolectar de la cámara uno que es la existente hasta la entrega en el caño, con un total de 183,9 metros lineales
7,2	Instalación tubería corrugada PCV-s de 160mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	62,45	Se hizo instalación de 6 domiciliarias con un total de 73 ml de tubería de 6"
7,3	Empalmes a cámaras d=1.20 m, debidamente anillada interna como externamente.	und	2,00	Se realizaron todos los empalmes de la tubería a cada cámara de inspección existente



7,4	Cámaras de Inspección D=1.20 - concreto 21 Mpa	und	7,51	Se construyeron 7 cámaras de inspección debido a las condiciones del terreno, unas por cambio de dirección y otras los de niveles del terreno y el difícil manejo (mucho roca)
7,5	Base/cañuela camra de D=1,20 m en concreto	unidad	7	Se construyó 7 bases y cañuelas para las respectivas camaras construida, para las cañuelas se utilizaron los recortes de tubería instalada.
7,6	Tapas en concreto 21 mpa para cámaras de D= 0,60	unidad	7	Se elaboro 6 tapas para las 6 cajas que se construyeron para conectar las domiciliarias existentes.
7,7	Acero refuerzo para base de cámara de inspección	kg	60	Las bases de las cámaras se reforzaron con 60 kg de hierro para fanatizar la estabilidad de la obra
7,8	Cajas de Inspección de 0.50 x 0.50 x 0.80 en concreto incluye tapa reforzada con acero de 3/8" cada 15 cms	und	6	Se construyeron 6 cajas de inspección con las respectivas tapas con las especificaciones técnicas recibidas por parte del supervisor
7,9	Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa	M3	1,02	En el descole se construyó un cabezote con una canal de 0,70 ancho y 4 de largo con unos reductores para la vellosidad del agua.
7,10	Transporte manual y a hombro de materiales locas hasta el sitio de la obra.	Unidad	63,30	Por las distancia donde se encontraba la obra del sitio donde loa vehículos dejan los materias, es así que se dedicó personal para hacer el respectivo transporte a hombros

JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO
Representante Legal ASTROPROYECT S.A.S
Nit: 900.633.147-5



INFORME DE ACTIVIDADES OBRA 1

OBRAS CIVILES VARIAS, EMPALME, CAPTACION DESCOLE DEL MATADERO, JUAN XXII, PARQUE RISARALDA, LAVAAUTOS NUEVO HORIZONTE, MARQUITALIA, CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UND		ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	PRELIMINARES			
1.1	Rocería y limpieza de la franja Ancho promedio 2 m.	mts	128	De la semana del 12 al 16 de febrero y Después de definir la localización y el replanteo. se iniciaron las labores de rocería con un promedio entre 2 y tres metros de ancho
1.2	Localización y replanteo de las redes	ml	120	Del 01 al 10 de febrero se realizaron varias visitas donde está localizada la obra en compañía del ingeniero interventor y un funcionario de Empocaldas, para realizare las actividades de localización y replanteo, definir detalles topográficos.
1.3	valla alusiva a la obra	und	1,00	Del 01 al 10 de febrero se le hizo el ajuste a la información a la valla, se realizaron las cotización se imprimió y se instaló la valla de 2 x 4 metros, instalada al pie del lavaautos Nuevo Horizonte.
2	DEMOLICIONES VARIAS			especialmente la 16".
2.1	Demoliciones de cuneta existente y otros	m3	0,07	En la semana del 19 al 24 de febrero se realizaron demoliciones de un concreto existen en los descoles de la tubería existente, también se realizaron demoliciones varias rocas que se encontraban en el trazado de la tubería especialmente la 16".
	Otras demoliciones (muro existente, anclajes etc)	m3	8,96	Del 20 al 23 de febrero. Se demolieron parte de los muros que sostenían los descoles de las tuberías existente para poder anclar y adecuar las nuevas cajas para los empalmes de la nueva tubería.
3	EXCAVACION			
3.1	Excavaciones en	m3	74,23	En la semana del 19 al 24 de febrero



	zanja - material común			simultáneamente se inicia las labores de excavación encontrando varias dificultades, no solo por el fluido de las aguas servidas de las viviendas si no que también las que suministra la central de sacrificio de ganado cuando esta matando reces, esto hizo muy dispendiosa e incomoda la labor.
3,2	Excavaciones en conglomerado	m3	8,04	Del 26 al 28 de febrero. Por la condiciones del terreno se presentaron varios tramos de excavaciones en conglomerado que debió realizarse con personal más adecuado para cumplir con la labor
3,3	Transporte manual y a hombro de materiales locas hasta el sitio de la obra.	M3	85,61	Por las distancia donde se encontraba la obra del sitio donde loa vehículos dejan los materias, es así que se dedicó personal para hacer el respectivo transporte a hombros, por las condiciones del clima se dificultaba la labor.
4	RELLENOS COMPACTADOS			
4,1	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación.	m3	134,82	Fue poco el material que se pudo utilizar de la misma excavación debido al fluido de agua servidas por lo tanto se tubo que reponer
4,2	Rellenos compactados con material comun de cantera préstamo.	M3	34,62	Por las condiciones del terreno debido a los nacimientos de agua por el sector y evitar la utilización de material contaminado, se vio en la obligación de traer material de cantera distante del sitio de la obra.
4,3	Dispersión de material sobrante de excavacion y demoliciones y ubicarlos en sitios debidamente camuflados donde no perjudique la movilidad permanente de la comunidad del sector.	M3	31,23	Por el terreno pantanoso y el derrumbe con el muro que se presento, hubo alto volumen de material de tierra contaminado, material vegetal y demoliciones, además de las que presentaron normalmente en la obra.
4,4	Sustitución en arena limpia para tuberías	m3	11,22	A todo la tubería que se instalo se le coloco colchón de 10 centímetros de arena y sobre el tubo otros 10 centímetros de arena para garantizar el tiempo de vida útil de la tubería y



				las estabilidad de la obra.
5	ALCANTARILLADOS			
5,1	Colocación de tubería de 10" tipo novafort - incluye manejo de aguas	ml	18	Se coloco la tubería de 10" en el descole de lava autos nuevo horizonte y se conectó a la primera recamara
5,2	Colocación de tubería de 12" tipo novafort - incluye manejo de aguas	ml	13,40	Se coloca la tubería en 12" para recolectar el descole del sacrificio de ganado y del parque Risaralda hasta la primera recamara.
3,3	Colocación de tubería de 16" tipo novafort - incluye manejo de aguas	ml	94	Se coloca la tubería en 16" para recolectar el descole del sacrificio de ganado, del parque Risaralda y el lavaautos nuevo horizonte hasta la primera recamara.
5,4	Cámaras de Inspección D=1.20 m terminada en cono en concreto de 3000 psi	ml	8,50	Se construyeron 7 cámaras de inspección debido alas condiciones del terreno, unás por cambio de dirección y otras los de niveles del terreno y el difícil manejo (mucha roca)
5,5	Base y cañuelas para camara D=1.20 concreto 3000 psi	unidad	7	A cada una de las cámaras construidas se les hizo la respectiva cañuela con sobrantes de los tubos para mayor durabilidad de la obra.
5,8	Cajas en concreto 3000 psi de 1,20 x 1,20 x 1,70 incluye tapa reforzada, acero de refuerzo No. 4 cada 015 m	unidad	3	Se construyó tres cajas en concreto para hacer la recolección del descole del matadero del parque Risaralda y lava autos nuevo horizonte y conectarlos con la red de alcantarillado de 16"
5,9	Base y cañuela de caja de 1,20 x 1,20 x 0,20 m E=0,20	unidad	3	A cada caja de concreto de 1,20 x 1,2 m se le cosntruyo la respectiva base y cañuela con las especificaciones técnicas recibidas por parte del supervisor.
6	OBRAS EN CONCRETO			
6,1	Muro en concreto ciclópeo 40% piedra + 60% concreto simple	m3	0,45	Se hace entrega de aguas servidas por medio de un muro que de 0,45 m3, reforzado con hierro de ½ debido a la ubicación (ene i centro del callo) para garantizar estabilidad de la obra.
Np 1	Tapas en concreto 21 mpa para cámaras de D= 0,60	unidad	7	Se elaboro 6 tapas para las 6 camaras que se construyeron para conectar las domiciliarias existentes.





	Suministro y colocación de dren en piedra y tubería dren de 65 mm y geotextil 1500 nt debidamente terminado 0,30 x 0,50m	ml	30	Por los nacimientos de agua presentado se vio en la obligación de construir unos drenes en diferentes sitio para poder hacer los rellenos compactado y proteger la tubería instalada.
Np 2	cajas de concreto de 0,80 x 0,80 m con tapa reforzada con acero de ½" aca 15 cm incluye base y cañuela	unidad	2	Por la orientación de la tubería que se presento en el replanteo de la obra se debido construir 3 cajas de 0,80 x 0,80.

JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO
Representante Legal ASTROPROYECT S.A.S
Nit: 900.633.147-5





REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA 2

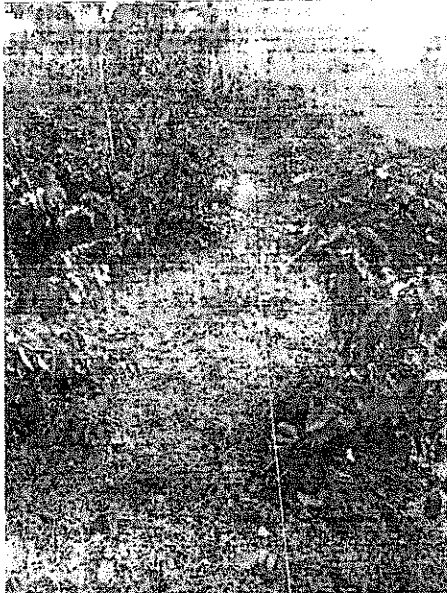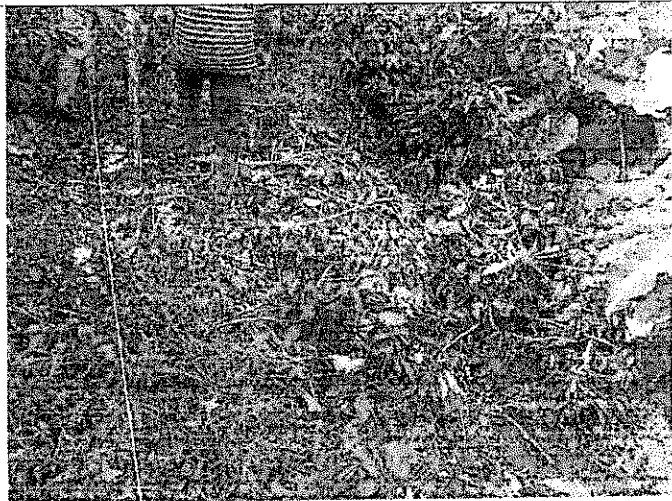



REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESCOLE LOCALIZADO EN LA FINCA DE LOS SEÑORES CONRADO LOPEZ Y FELIX LOPEZ CON ACCESO AL INTERIOR DE LA VIVIENDA CARRERA 7 No. 4-24 DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	PRELIMINARES	
1.1	Localización y replanteo de redes ((Incl. Topografía y plano record)	
1.2	Despeje de sendero (Rocería) y dispersión de sobrantes . Ancho aproximado 1,50 metros	
2	DEMOLICIONES VARIAS	


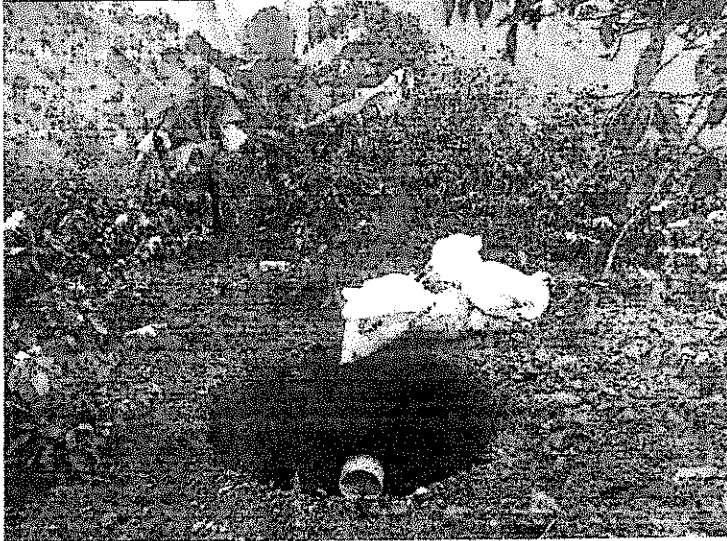
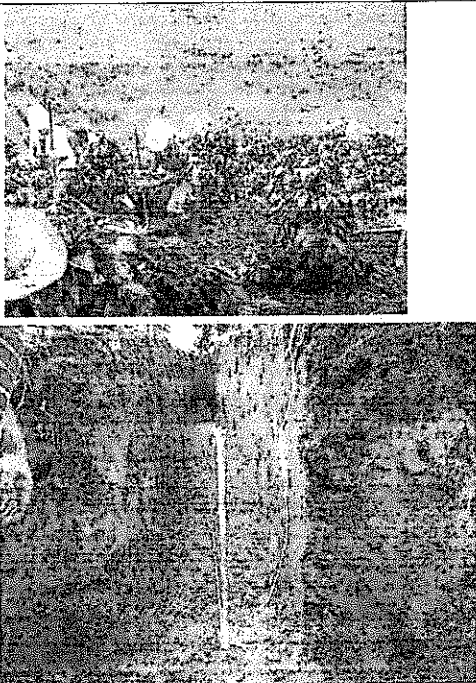


2.1	Demoliciones varias en concreto simple, roca y otros materiales pétreos	
3	SOBREACARREOS	
3,1	Transporte manual de material de préstamo	
4	EXCAVACION	
4.1	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	



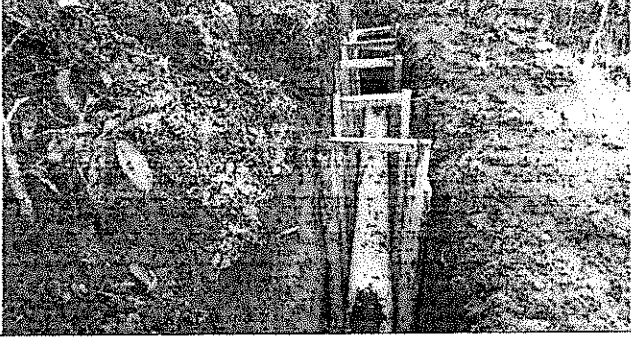


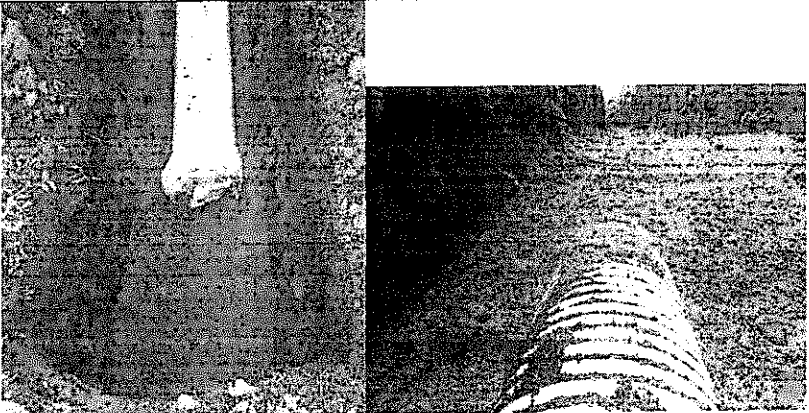4.2	Entibado horizontal / vertical tipo 1	
5	RELLENOS COMPACTADOS	
5.1	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	
5,2	Rellenos compactados con material común de cantera préstamo	
6	SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTADOS	
6,1	Sustitución en arena limpia para tuberías	



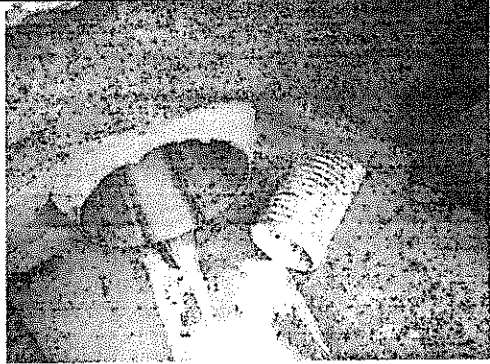


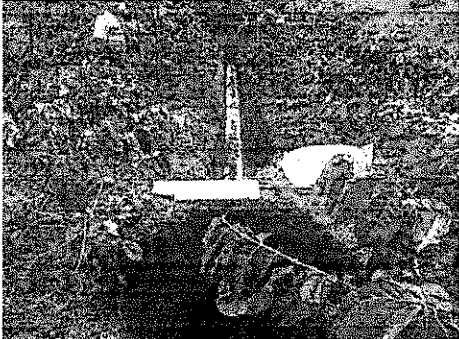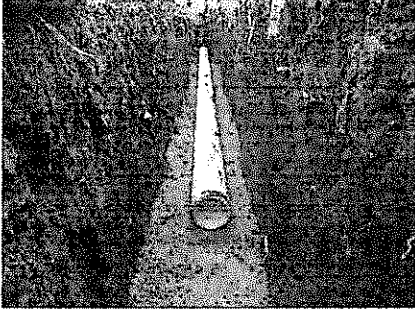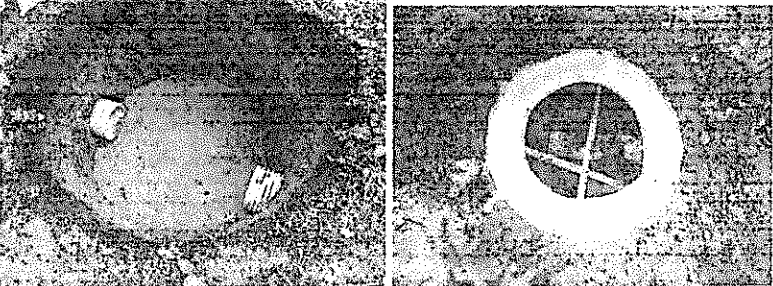7	ALCANTARILLADOS	
7,1	Instalación tubería corrugada PCV-s de 315mm (12"), incluye manejo de aguas en zanja.	
7,2	Instalación tubería corrugada PCV-s de 160mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja.	
7,3	Empalmes a cámaras d=1.20 m, debidamente anillada interna como externamente.	
7,4	Cámaras de Inspección D=1.20 - concreto 21 Mpa	

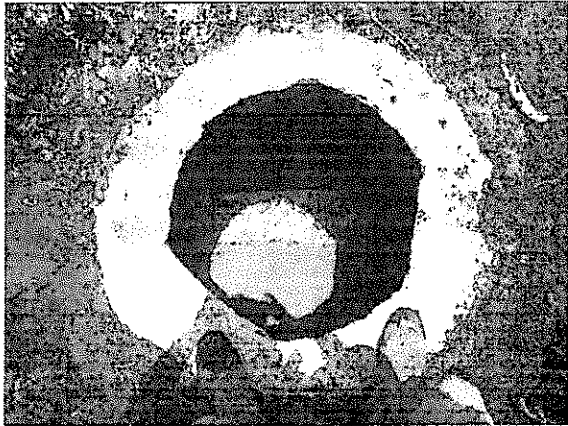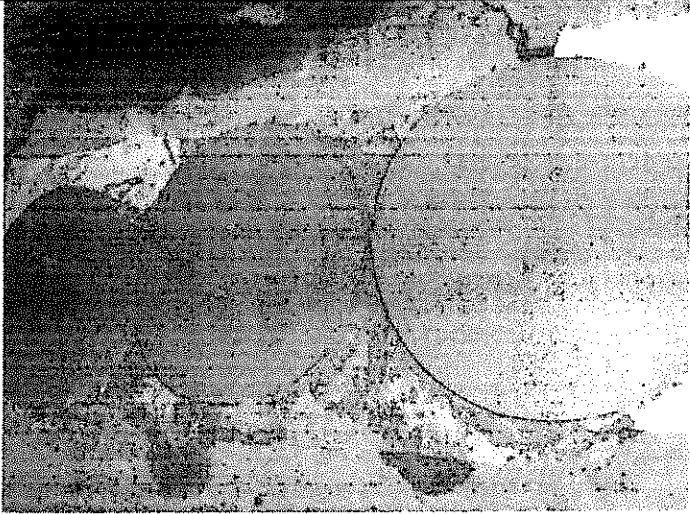

7,5	Base/ cañuelas camara D=1.20 m en concreto	
7,6	Tapas en concreto 21 mpa para cámara D=0,60 m	
7,7	Acero de refuerzo para base de Cámara de inspección	






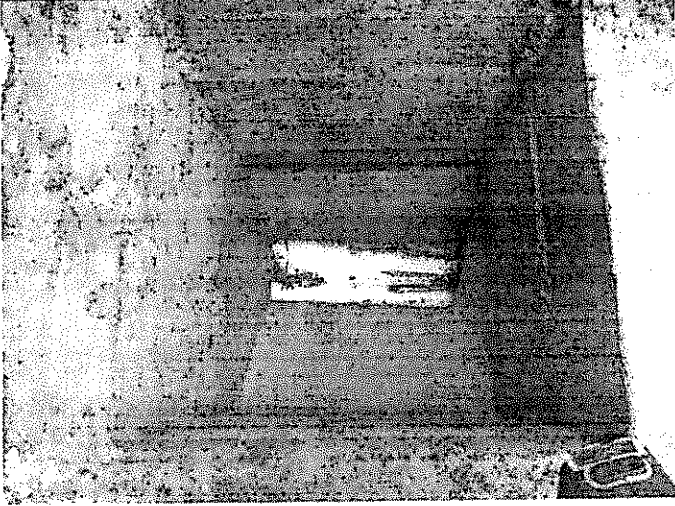7,8	Cajas de Inspección de 0.50 x 0.50 x 0.80 en concreto incluye tapa reforzada con acero de 3/8" cada 15 cms	
7,9	Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa	
7,1	empalmes a cajas de Inspección existente	






REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA 1





OBRAS CIVILES VARIAS, EMPALME, CAPTACION DESCOLE DEL MATADERO, JUAN XXII, PARQUE RISARALDA, LAVAAUTOS NUEVO HORIZONTE, MARQUTALIA, CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	PRELIMINARES	
1.1	Rocería y limpieza de la franja Ancho promedio 2 m.	
1.2	Localización y replanteo de las redes	
1,3	valla alusiva a la obra	
2	DEMOLICIONES VARIAS	

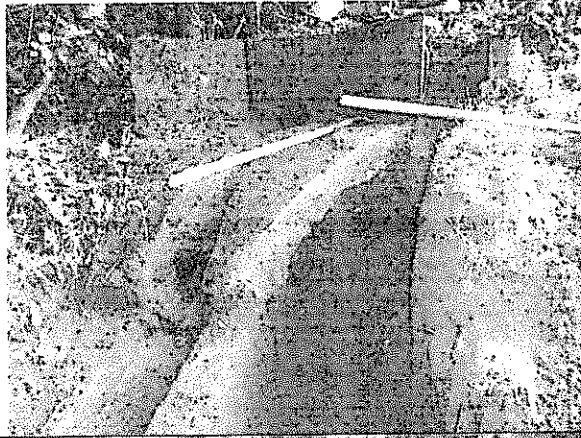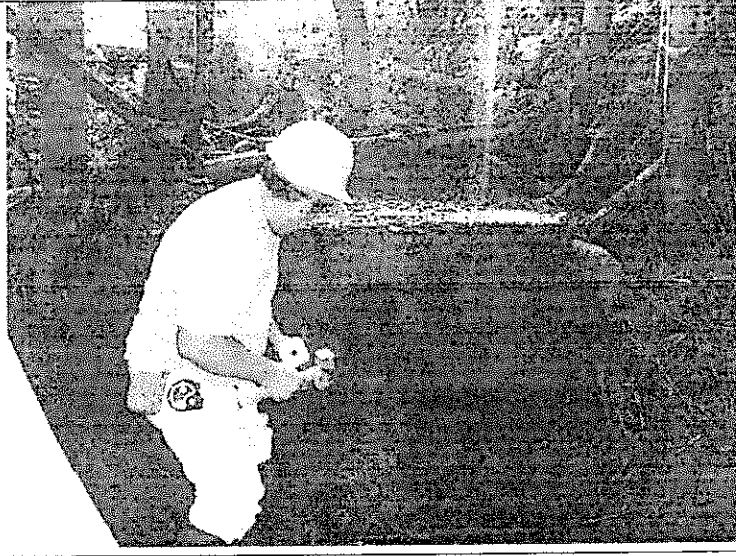



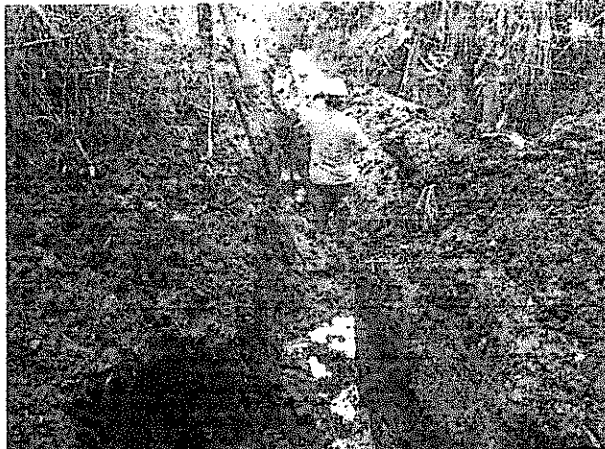

2.1	Demoliciones de cuneta existente y otros	
	Otras demoliciones (muro existente, anclajes etc)	
3	EXCAVACION	
3.1	Excavaciones en zanja - material común	


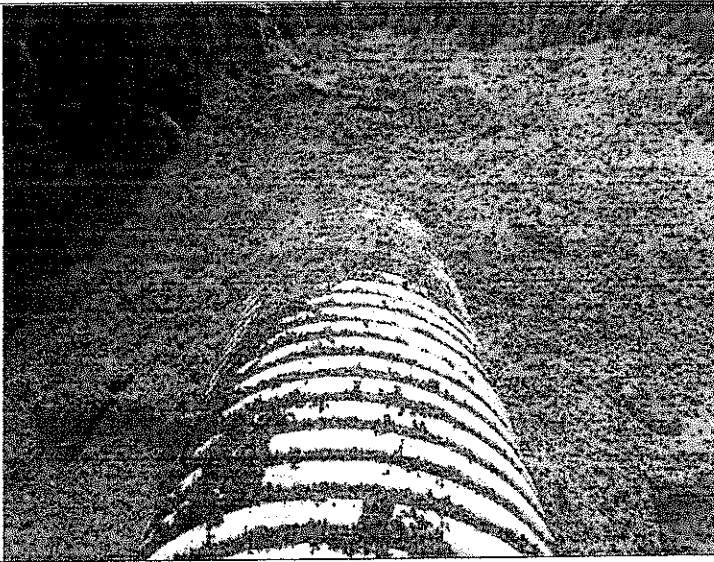


		
3,2	Excavaciones en conglomerado	 
3.3	Transporte manual y a hombro de materiales locas hasta el sitio de la obra.	



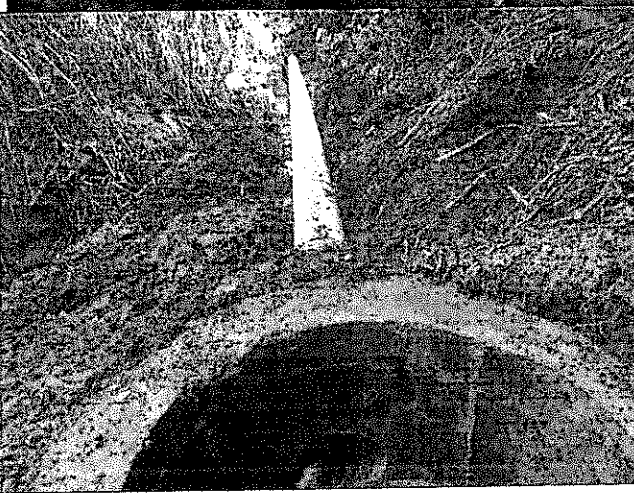


		
4	RELLENOS COMPACTADOS	
4,1	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación.	 
4,2	Rellenos compactados con material común de cantera préstamo.	






4,3	Dispersión de material sobrante de excavación y demoliciones y ubicarlos en sitios debidamente camuflados donde no perjudique la movilidad permanente de la comunidad del sector.	
4,4	Sustitución en arena limpia para tuberías	
5	ALCANTARILLADOS	



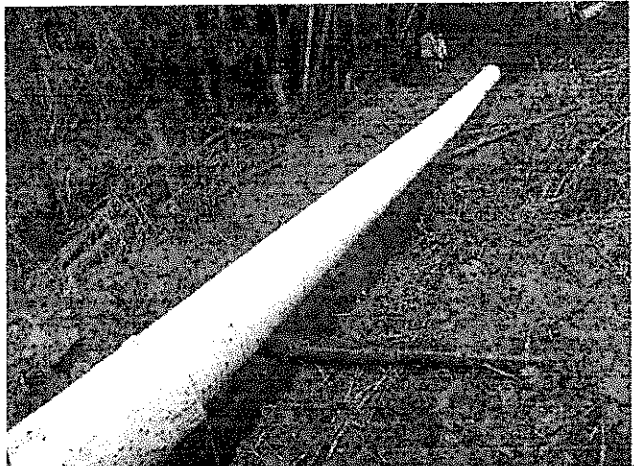


5,1	Colocación de tubería de 10" tipo novafort - incluye manejo de aguas	
5,2	Colocación de tubería de 12" tipo novafort - incluye manejo de aguas	
3,3	Colocación de tubería de 16" tipo novafort - incluye manejo de aguas	

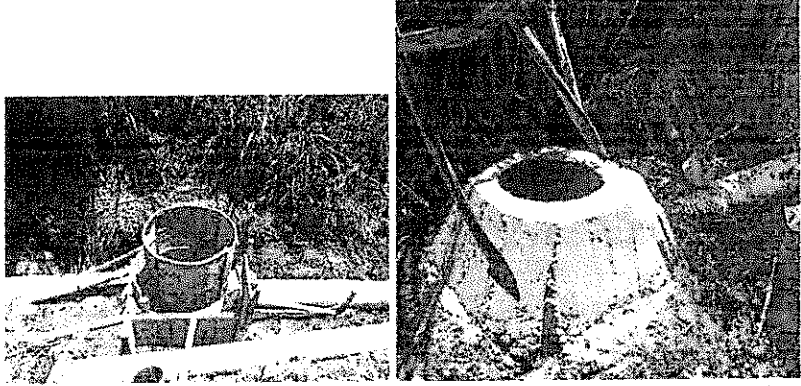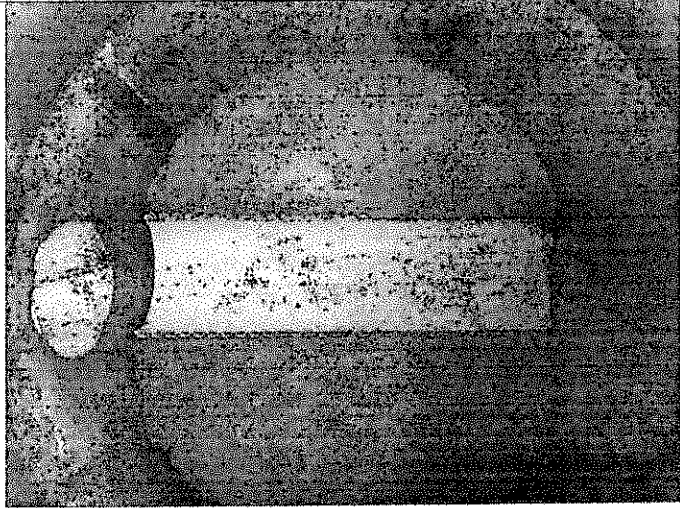

5,4	Cámaras de Inspección D=1.20 m terminada en cono en concreto de 3000 psi	
5,5	Base y cañuelas para cámara D=1.20 concreto 3000 psi	
5,6	Empalmes a cámaras de inspección D=1,20m	

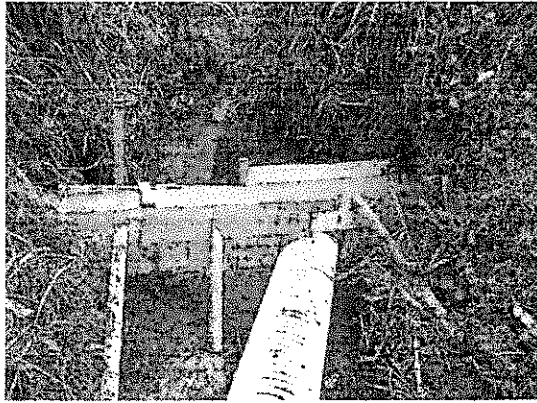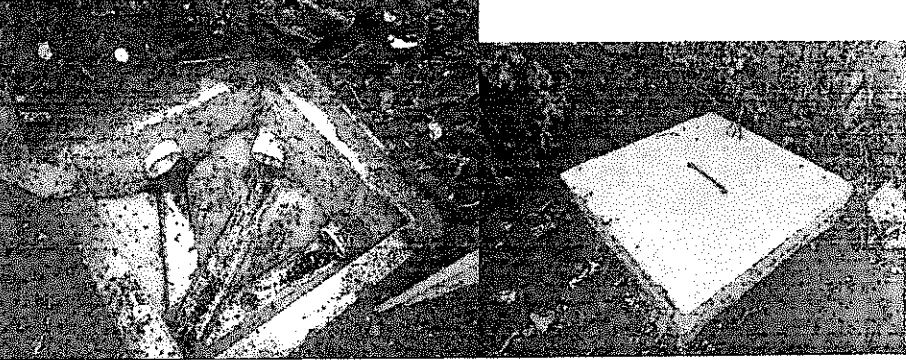

6,1	Muro en concreto ciclópeo 40% piedra + 60% concreto simple	
Np 2	Suministro y colocación de dren en piedra y tubería dren de 65 mm y geotextil 1500 nt debidamente terminado 0,30 x 0,50m	
Np 3	cajas de concreto de 0,80 x 0,80 m con tapa reforzada con acero de 1/2" aca 15 cm incluye base y cañuela	

JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO
Representante Legal ASTROPROYECT S.A.S
Nit: 900.633.147-5

MEMORIA PERSONAL DE EMPAQUETADORA MARQUETIA S.A.S. DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2011

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉBULA	CARGO	SUELDO	IAS	SUELDO	HORAS EXTRA	TOTAL HORAS EXTRAS	TOTAL	DESCUENTOS		TOTAL DESCUENTO	TOTAL PAGAR	FIRMA
									SAUJIO	PENSIÓN			
1. JUAN FELIX...	54,000	...	11,000	...	27,517	...	JUAN FELIX...
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOTAL							332,000	2,534,807	142,182	142,182	204,378	3,295,996	

[Handwritten Signature]
 JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO
 GERENTE ADMINISTRATIVO S.A.S.

NOMINA MARQUETALIA DEL 5 AL 17 DE MARZO DE 2018 CONTRATO No. EMPOCALDAS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SUELDO	DIAS	SUELDO	TOTAL	DESCUENTOS		TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGAR	FIRMA	
								SALUD	PENSION				
1	JHON FREDY ZULUAGA SALAZAR	75.003.780	OBRAERO	781.300	14	364.607	364.607	14.584	14.584	29.169	335.438	Jhon F. V. y Zuluzaga	
2	JAIKE ALBERTO SEPULVEDA OCAMPO	75.004.662	OBRAERO	781.300	14	364.607	364.607	14.584	14.584	29.169	335.438	JAIKE ALBERTO	
3	LUIS FELIPE JARAMILLO BETANCOURT	75.002.017	MAESTRO DE OBRA	2.700.000	16	1.440.000	1.440.000	57.600	57.600	115.200	1.324.800		
4	DANIEL ALEJANDRO ORTIZ TORRES	1.053.851.606	OBRAERO	781.300	9	234.360	234.360	9.376	9.376	18.751	215.639	DANIEL ALEJANDRO OT	
5	LUIS ALBERTO GONZALES OSPINA	75.000.066	OFICIAL	1.800.000	14	840.000	840.000	33.600	33.600	67.200	772.800	Alberto Gonzalez	
6	EDWIN CAMILO HERNANDEZ CARDONA	1.061.857.022	OBRAERO	781.300	16	416.663	416.663	16.668	16.668	33.335	383.358	Edwin Camilo Hernandez	
7	NESTOR LIBRO HERNANDEZ SANCHEZ	18.115.451	OBRAERO	781.300	14	364.607	364.607	14.584	14.584	29.169	335.438	Nestor Hernandez	
TOTAL								4.024.903	160.986	160.986	321.992	3.702.911	

3.702.911

Consig. Soc. Sueldo
Felipe Jaramillo

Redeban
Municipal
MAR 27 2018 18:25:34 RENDIC 7.00
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SAMANA CALDAS
CALLE 7 8 - 08
TEL: 30070428
TELEFONO: 30070428
C.C. 9064363892
DEPOSITO
MAR 27 2018 15:27:200

El banco no es responsable por los servicios prestados por el CB. El cliente no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verificar que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos consulte al 01800072345. Corrija esta falla como soporte.


*** COMERCIO ***


FORMA
C.C.
TEL:

JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO
GERENTE ASTRO PROYECT S.A.S

NOMINA MARQUETALIA DEL 16 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2010

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SUELDO	DIAS	SUELDO	TOTAL	DESCUENTOS		TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGAR	
								SALUD	PENSION			
1	RODRIGUEZ, ANA MARIA	1250357	OBRAERO	781.300	17	442.727	442.727	17.709	17.709	35.419	407.318	
2	MELERO, RAFAEL	1250357	OBRAERO	781.300	17	442.732	442.732	17.709	17.709	35.419	407.318	
3	ESTEBAN, ARMANDO BETANCOURT	1250357	MAESTRO DE OBRA	2.700.000	12	1.080.000	1.080.000	43.200	43.200	86.400	993.600	
4	MARIN, ALBERTO	1250357	OBRAERO	781.300	12	312.520	312.520	12.501	12.501	25.002	287.518	
5	ALBERDI, RONDALES OSPINA	1250357	OFICIAL	1.800.000	12	720.000	720.000	28.600	28.600	57.200	662.800	
6	MARTINEZ, HENRIQUEZ CARDONA	1250357	OBRAERO	781.300	12	312.520	312.520	12.501	12.501	25.002	287.518	
7	MESTRE, LUIS HERNANDEZ SANCHEZ	1250357	OBRAERO	781.300	12	312.520	312.520	12.501	12.501	25.002	287.518	
TOTAL								3.823.033	144.921	144.921	289.843	3.333.181


 JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO
 GERENTE ASTRO PROTECT S A S

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	ABRIL 16 DE 2018.	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	00076 DE ENERO 24 DE 2018
Objeto:	OBRA 1: OBRAS CIVILES VARIAS, CAPTACIÓN Y PROLONGACIÓN DE DESCOLE S DEL MATADERO, INSTITUTO JUAN XXII, PARQUE RISARALDA, LAVA AUTOS, NUEVO HORIZONTE. – OBRA 2: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESCOLE LOCALIZADO EN LA FINCA DE LOS SEÑORES CONRADO LÓPEZ Y FÉLIX LÓPEZ, CON ACCESO AL INTERIOR DE LA VIVIENDA CARRERA 7 No. 4-24 .
Contratista:	ASTRO PROYECT S.A.S..
Representante Legal.	JOSÉ GABRIEL BEDOYA BUITRAGO.
Fecha del contrato:	ENERO 24 DE 2018 /
Plazo de ejecución:	SESENTA (60)DÍAS CALENDARIOS /
Valor inicial:	\$ 140.542.061,00 /
Fecha de iniciación:	ENERO 26 DE 2018 /
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MARZO 29 DE 2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO


1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	21.35%
Avance físico Acumulado	59.72%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	60
Avance Porcentual:	100%





1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

OBRA No. 1-




Handwritten signature or initials.

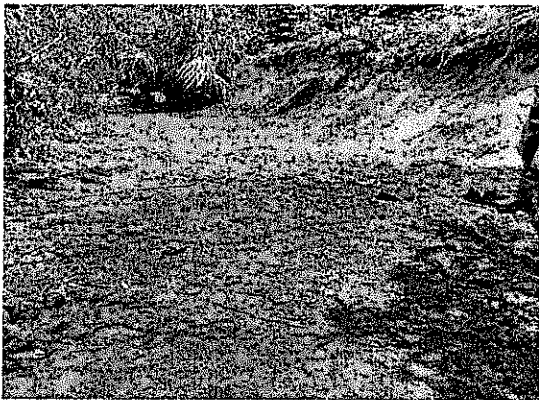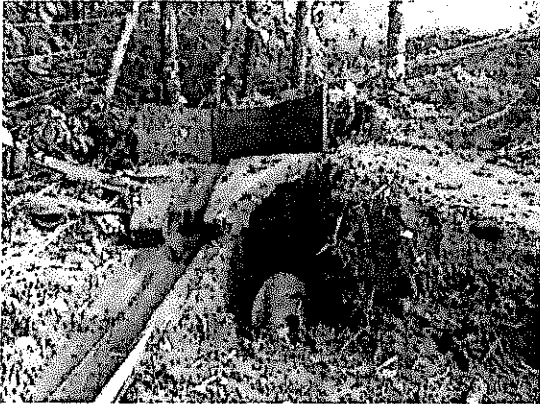

ASR

DERRUMBE AFECTANDO TRAMO DE TUBERÍA Y CÁMARA DE INSPECCIÓN (POZO)

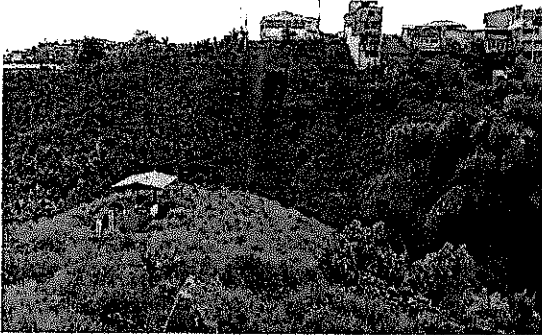

RESIDUOS DEL MATADERO






20180417_133549.mp4

OBRA No. 2




A/P

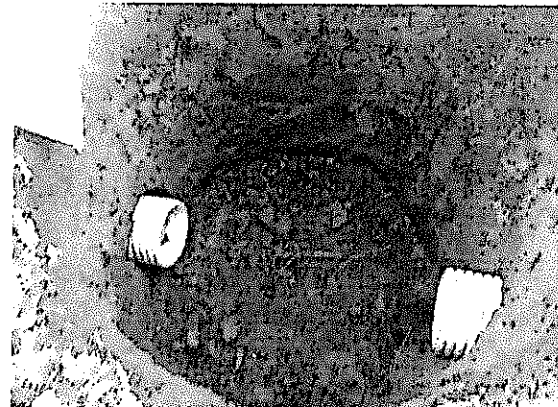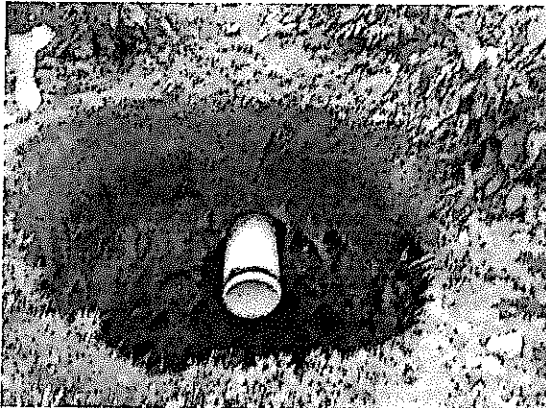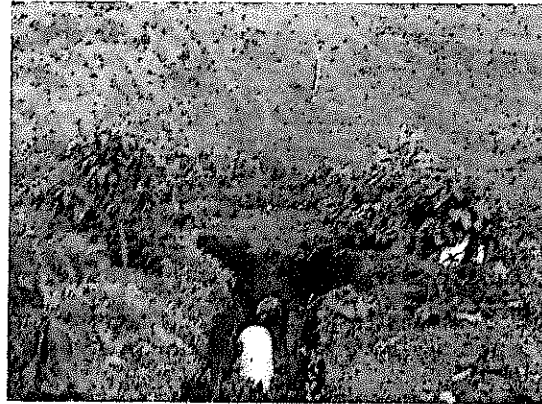

AJK



AJR

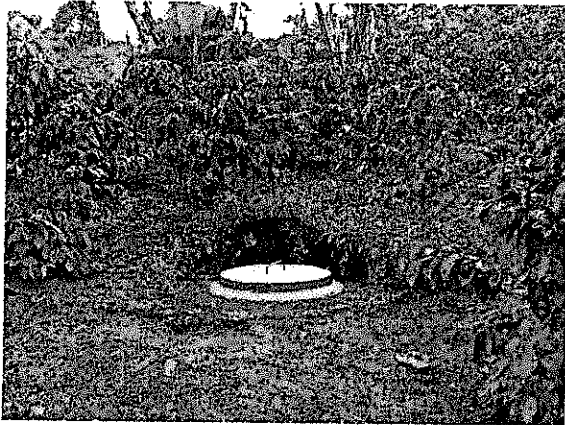

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

OBRA No.1:

-Debido a los malos olores que se presentaban en el sector y sobre todo las aguas y sangre que venían del matadero, dio lugar a sendos derechos de petición y un fallo judicial donde se involucraban al Municipio de Marquetalia, determinándose en la Audiencia Judicial que antes del mes de Junio de 2018, EMPOCALDAS daría cumplimiento para ejecutar el descole y llevarlo a una distancia prudencial donde no causara perjuicio a los moradores del sector, y el Municipio de Marquetalia a corregir y darle un tratamiento a las aguas del Matadero.

OBRA 2:

- El descole existente vierte sus aguas a una cañada a cielo abierto en una longitud de 40 metros aproximadamente, dando lugar a que las aguas residuales vertidas por la comunidad recorran y dañen el medio ambiente del sector provocando deslizamientos y olores desagradable no aptos para la salud.


-Las aguas de las domiciliarias del sector no se pueden conectar a la carrera 7 debido a que los sótanos están por debajo de la red de alcantarillado y requieren reposición y conexión a la nueva red de alcantarillado.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBRA 1:

-Lo que pretende es recoger las aguas que vienen del Matadero, Parque Risaralda, Lava autos, Nuevo horizonte, Instituto Juan XXII captarlas mediante dos Cajas de Inspección y llevarlas a una Cámara de Inspección en tuberías de 10", 12" para luego direccionarla en tubería de 16" al descole en una longitud aproximada de 95 metros.

-Como la trayectoria planteada se torno difícil fue necesario Cambiar alinamientos y pendiente debido al terreno conformado por roca y material de alto contenido de



pedra de gran tamaño dificultando la Colocación de la Tubería dando lugar a construir Cámaras de inspección para conservar las pendiente y los alineamientos proyectados.

-Debido a la gran cantidad de agua que circula por el sector fue necesario hacer cambios de dirección y tratar en lo posible que el flujo no perjudicara las bases de apoyos de las tuberías en el proceso de instalación.

-En la fase final del la construcción del descole, se presentaron Inconvenientes no previstos que dieron lugar a ejecutar obras adicionales tales como construcción de dren en piedra y manto geotextil 1500 NT, con el fin de encausar estas aguas y llevarlas a una de las cámaras del colector. Estas aguas son productos de nacimientos y modificados su Caudal por las fuertes lluvias presentadas las cuales causaron mucho daño a las obras ejecutadas.

- Durante la ejecución se detectaron varios problemas constructivos tales Tapas construidas irregulares, Cañuelas en regular estado constructivo, tubería desalineada, muro del descole final sin ningún tipo de Desagües o lloraderos; los cuales se determino ejecutar las correcciones del caso y poder hacer la entrega en otra ocasión.

- Se hace indispensable oficiar al Municipio de MARQUETALIA sobre los residuos sólidos y otros que vierte el matadero al nuevo colector ya que es un riesgo a futuro que este colector se tape y deje de funcionar produciendo represamientos, perjudiciales para el sector. (Registro fotográfico)

-El Día 19 de Abril de 2018, se presento el Volcamiento de un muro de Contención localizado en la parte alta del acceso al Matadero Municipal, provocando daños en el descole recientemente construido. El precitado muro se deslizo sobre la parte inclinada del talud con destino final la Cañada donde se ubico la tubería y una Cámara del Colector finalizado y entregado el 29 de marzo de 2019. En la Actualidad El Contratista corrige el daño presentado.


OBRA 2:

-Con el Cambio de Alineamiento la tubería se proyecto siguiendo la cuchilla, para no causar perjuicio a los cultivos de Café, y sus propietarios.

-Se proyectaron la construcción de 6 Cámaras de Inspección debidas a los cambios de alineamiento y pendiente, ayudando a que el trazado no perjudicara y fuera más eficiente la colección de aguas residuales del sector.

-Se determina la construcción de sendas domiciliarias que vierten sus aguas en la superficie y siguen aguas abajo perjudicando la estabilidad del talud y perjuicio a los moradores del sector.

-Todas las Cámara se les coloco la respectiva tapa circular reforzada y de 10 cms de espesor que en su totalidad fueron 6 Unidades.





F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- Se construyeron 6 Unidades de Cámaras con sus respectivas bases y Cañuelas, y una existente al iniciar el Colector donde se Construyo la Base y Cañuela por encontrarse totalmente deteriorada con fisuras en el fondo apto para infiltraciones.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	140.542.061
Inversión ejecutada en el periodo:	30.001.138
Porcentaje ejecutado en el periodo:	21.35%
Inversión total ejecutada:	83.930.955
Porcentaje total ejecutado:	59.72%

2.1.-CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros del Estado S.A.	42-44-101106701	24/01/2018	25/03/2021	\$ 28.108.412,20
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado S.A.	42-44-101106701	24/01/2018	25/01/2023	\$ 28.108.412,20
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A.	42-44-101106701	24/01/2018	25/06/2018	\$ 42.162.618,30
Responsabilidad Civil	Seguros del Estado S.A.	42-40-101026301	24/01/2018	25/01/2023	\$ 42.162.618,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes					

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	x	X	X	X	X

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural) *APP*
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OCTUBRE 17 DE 2107	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica


5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ABEL ROJAS RUBIANO
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR

 <p>F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015</p>	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN CONTRATACIÓN</p>
	<p>TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS</p>

FECHA _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR DURMAN

NIT O CEDULA 800.033.159

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
NUMERO DEL CONTRATO <u>076</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	NTC 3722-3 Resolución 1166
Organismo de certificación del	ICONTEC
Numero de Lote	9287T - 9287D - 9286N - 9229T - 9283T - 9248N - 9314T - 9313T
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	800.033.159-6

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Abel Parra
NOMBRE

Ases Forast
FIRMA

Municipio: Macaparra

CONTRATO No: 0076

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	OBRA 1	24.2	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9287T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
2	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	6	40.3	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9287T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
3	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	6	21.5	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9287D	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
4	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	6	13.5	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9287D	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
5	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	6	25.7	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9288N	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
6	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	6	62	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9288N	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
7	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	6	12	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9288N	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
1	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	13	18	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9288T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
2	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	3	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9288T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
3	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	11	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9288T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A

UBINA 2

1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6	15	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9214T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6	6	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9214T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
3	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6	6	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9214T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
4	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6	6	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9214T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
5	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6	7.5	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9248N	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
6	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6	18	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9248N	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	17	15.8	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9229T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	43.2	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9229T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
3	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	40.9	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9229T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
4	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	17.8	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9229T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
5	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	29.75	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9283T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
6	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	9.1	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9283T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A
7	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	12	20.5	PVC 12454	Instalacion con apertura de junta	✓	3722.3	ICONTEC	9283T	DURVAN	800 031 159 6	15/02/2018	9.4	N/A	N/A

Suplente de la firma de la Empresa

NO. 4045 RUMIC

Apefornis

MUNICIPIO: COPIACATIA
CASA COMUNITARIA

ATRO: PONGAS, R. J. Calle del Barrio Barro

Apefornis
