	F-GC-22 Versión 7 Abril 2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0075 de 2018	Acta N°	01 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	143.817.097	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			3. VALOR TOTAL (1+2)	143.817.097	
NIT O CC:	10.280.643			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00162 DEL 5 DE ENERO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	109.943.896	
RP (#, rubro y fecha)	00205 DEL 24 DE ENERO DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	33.873.201	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 38 ENTRE CARRERAS 7 Y 9. OBRA 2: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE SUPIA					
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					✓	
3- Pagos al FIC					✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓	
8- Ensayos de densidad.					✓	
9- Diseño de Mezclas.					✓	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					✓	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					✓	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					✓	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					✓	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 08-06-2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		
Acta original		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		

Fecha de presentación

Mayo 31 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	Ingeniero de Zona	[Firma]
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
<u>086160012069</u>	<u>CORRIENTE</u>	<u>DAVLEONDA</u>
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-03-06, 03:15:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
NIT	NI 10280643
Código Sucursal (Nombre)	91 (SUIPIA EMPOCALDAS ALCANTARILLADO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	36105760
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	319744056
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.146.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 199.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	4	\$ 179.200	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 536.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 191.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	7	\$ 79.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 56.000	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	2	\$ 32.400	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	3	\$ 49.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	\$ 10.400	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 24.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 26.000	\$ 0
N880011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	16	\$ 482.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	16	\$ 279.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.146.400	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 2.146.400	\$ 0





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información: ARUS (antes Entace Operativo)
 Descripción: Pago de Seguridad Social
 Fecha: 2018-04-09, 09:40:32 AM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos: marzo de 2018
 Periodo de Cotización Para Salud: abril de 2018
 Empresa: JAVIER DE JESUS GARCIA P
 NIT: NI 10280643
 Código Sucursal (Nombre): 91 (SUPIA EMPOCALDAS ALCANTARILLADO)
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 36358825
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 328083955
 Banco: (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor: \$ 3.915.200
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	\$ 499.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	\$ 399.700	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	8	\$ 807.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 312.500	\$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 246.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 58.000	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	3	\$ 80.400	\$ 0
N817001773	EPBIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	2	\$ 48.000	\$ 0
N830074184	EPSC33	SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO	1	\$ 20.900	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 2.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 52.000	\$ 0
N880011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18	\$ 879.200	\$ 0
N890806480	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	18	\$ 510.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 3.915.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 3.915.200





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información: ARUS (antes Enlace Operativo)
 Descripción: Pago de Seguridad Social
 Fecha: 2018-05-08, 10:50:50 AM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos: abril de 2018
 Periodo de Cotización Para Salud: mayo de 2018
 Empresa: JAVIER DE JESÚS GARCIA P
 NIT: NI 10280643
 Código Sucursal (Nombre): 91 (SUIPIA EMPOCALDAS ALCANTARILLADO)
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 36648375
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 335582028
 Banco: (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor: \$ 1.858.800
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	\$ 252.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	2	\$ 144.400	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 440.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 108.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S A	9	\$ 131.400	\$ 0
N900088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 56.000	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	2	\$ 27.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 22.600	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13	\$ 412.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	13	\$ 263.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.858.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.858.800





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-02-06, 04:46:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
CEDULA CIUDADANIA	CC 10280643
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	35858862
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	312831520
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.950.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.700.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.250.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.950.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.950.000





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-03-08, 04:35:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
CEDULA CIUDADANIA	CC 10280643
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	36161279
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	320404482
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.950.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.700.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.250.000	\$ 0

SubTotales: \$ 2.950.000 \$ 0
Total a Pagar: \$ 2.950.000





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-04-05, 10:52:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
CEDULA CIUDADANIA	CC 10280643
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	36358906
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	327179179
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.950.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.700.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.250.000	\$ 0

SubTotales: \$ 2.950.000 \$ 0
Total a Pagar: \$ 2.950.000





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-05-08, 08:33:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
CEDULA CIUDADANIA	CC 10280643
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	36641387
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	335519353
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.950.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.700.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.250.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.950.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.950.000



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0075
Nombre Obra	REPOSICION RED ACUEDUCTO Y ALC
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	30/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	SUPIA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$143,817,097.00
Costo Total Mano de Obra	\$6,919,375.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$253,904.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$253,904.00
Total Pagado	\$253,904.00
Valor del Pago	\$253.904,00
IP Origen	190.28.95.49
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60751736
Fecha de Creación	23/03/2018 03:32:48 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0075
Nombre Obra	REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO Y ALC
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	30/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	SUPIA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$143,817,097.00
Costo Total Mano de Obra	\$12,619,791.00
Número de Trabajadores en el Periodo	18
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$351,559.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$351,559.00
Total Pagado	\$351,559.00
Valor del Pago	\$351.559,00
IP Origen	190.28.72.217
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60819743
Fecha de Creación	11/04/2018 02:46:25 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0075
Nombre Obra	REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO Y ALC
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	30/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	SUPIA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$143,817,097.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,912,100.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$253,904.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$253,904.00
Total Pagado	\$253,904.00
Valor del Pago	\$253.904,00
IP Origen	190.28.103.151
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60934823
Fecha de Creación	09/05/2018 02:21:48 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

Javier de Jesús García Pareja

Ingeniero Civil

NIT. 10.280.643-2 - RÉGIMEN COMÚN

Calle 64A Nº 21-50 Oficina 1507 Edificio Portal del Cable

Telefax: 886 1419 - Cel: 310 455 8948 - Manizales

e-mail: javiergarciapareja@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
6	6	2018

Nº **412**

Señor(es):	EMPOCALDAS S.A E.S.P.		
Dirección:	CARRERA 23 No. 75 -82 BARRIO MILAN		
Teléfono:	8867080	Nit.	890.803.239-9

CONCEPTO	VALOR
<p>VALOR ACTA DE OBRA Nº 01 Y FINAL AL CONTRATO No. 0075 CUYO OBJETO ES: "REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 ENTRE CRAS 9 y 10 DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.</p>	
<p>COSTO DIRECTO</p>	81.470.097,00
<p>ADMINISTRACION 24%</p>	19.552.823,00
<p>IMPREVISTOS 5%</p>	4.073.505,00
<p>UTILIDAD 5%</p>	4.073.505,00
SUBTOTAL \$	109.169.930,00
<p>HABILITA RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762002936071 FECHA: ABRIL 18 DE 2017 RANGO: 00000000000357 AL 00000000010000</p>	<p>I.V.A. \$ 773.966,00</p>
TOTAL \$	109.943.896,00

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

<p>Recibí,</p> <hr/> <p>Nombre: _____</p> <p>NIL: _____</p> <p>Fecha de recibido: _____</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">/s/</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: center;">Firma.</p>
---	---

DOCUMENTO ORIGINAL DE AUTENTICACIÓN DE ANOTACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN N.º 18762002936071
 FECHA: ABRIL 18 DE 2017 HABILITACION BRANDES DISCÓN EST. MANIZALES
 IMPRESO POR MOLANO LONDONO E HIJOS LTDA - ENTORRAL ZAPATA - NIT. 886.858.883 MANIZALES



INFORME FINAL ✓

CONTRATO DE OBRA: 0075 de 2018 ✓

EMPOCALDAS ✓

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10. OBRA 2: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 38 ENTRE CARRERAS 7 Y 9. ✓

ELABORADO POR:

ING. JUAN JOSE TORRES GIL.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan', is located to the right of the 'ELABORADO POR:' text.

En el siguiente informe se dará a conocer de forma general lo que se realizó en la Reposición de la red de acueducto y alcantarillado calle 33 entre carreras 9 y 10 obra 2: En la calle 38 entre carreras 7 y 9

OBRA 1 Reposición de la red de acueducto y alcantarillado calle 33 entre carreras 9 y 10:

Se inicia actividades de obra el día martes 6 de Febrero del presente año en esta obra se realizó reposición de la red de acueducto y alcantarillado en tubería de 24" para alcantarillado y 4" red principal de acueducto. Se iniciaron labores de corte mecanizado y demoliciones con ayuda de compresor en la red principal de alcantarillado la cual tiene una longitud de 60m y un ancho de 1,10m; Red principal de acueducto longitud=61,80m y un ancho de 0,50m luego de esto se procede a realizar excavación manual la cual tiene una altura promedio de 1,48m y 1,20m respectivamente para instalación de tubería de 24" y 4" que se encuentran apoyada en un colchón de arena de 5cm y se llena de arena hasta la mitad de la tubería para su protección; se hacen llenos con afirmados en buenas condiciones exigidos por interventoría con su respectivo compactado con ayuda de canguro. Se prosiguen con cortes y demolición para instalación de red domiciliarias en tubería de 4" con sus respectivas cajas de inspección de 50x50 cm y silletas yee 24x6"; las cuales están ubicadas 6 del lado derecho y 5 del lado izquierdo de la red principal.se procede a la Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo principal de 3" hasta el medidor con accesorios correspondientes (válvula, tee, acoples y reducciones) por último se realizan llenos con afirmado.



OBRA 2 Reposición de la red de acueducto y alcantarillado en la calle 38 entre carreras 7 y 9.

Se inicia actividades de obra el día martes 6 de Febrero del presente año en esta obra se realizó reposición de la red de acueducto y alcantarillado en tubería de 12" para alcantarillado y 6" red principal de acueducto, se iniciaron labores de corte mecanizado y demoliciones con ayuda de compresor en la red principal la cual tiene una longitud de 64,4 m y un ancho de 80cm ;Red principal de acueducto longitud=62,50m en ambos costados y un ancho de 0,50m luego de esto se procede a realizar excavación manual la cual tiene una altura promedio de 1,80m y 1m respectivamente para instalación de tubería de 12" y 4 "que se encuentra apoyada en un colchón de arena de 5cm y se llena de arena hasta la mitad de la tubería para su protección. Se realiza entibado correspondiente para brindar seguridad al personal en obra se hacen llenos con afirmados en buenas condiciones exigidos por interventoría con su respectivo compactado con ayuda de canguro. Se prosiguen con cortes y demolición para instalación de red domiciliarias en tubería de 6" con sus respectivas cajas de inspección de 50x50 cm y silletas yee 12x6"; las cuales están ubicadas 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo de la red principal.se procede a la Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo principal de 3" hasta el medidor con accesorios correspondientes (válvula, tee, acoples y reducciones) por último se realizan llenos con afirmado






Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.



Jan

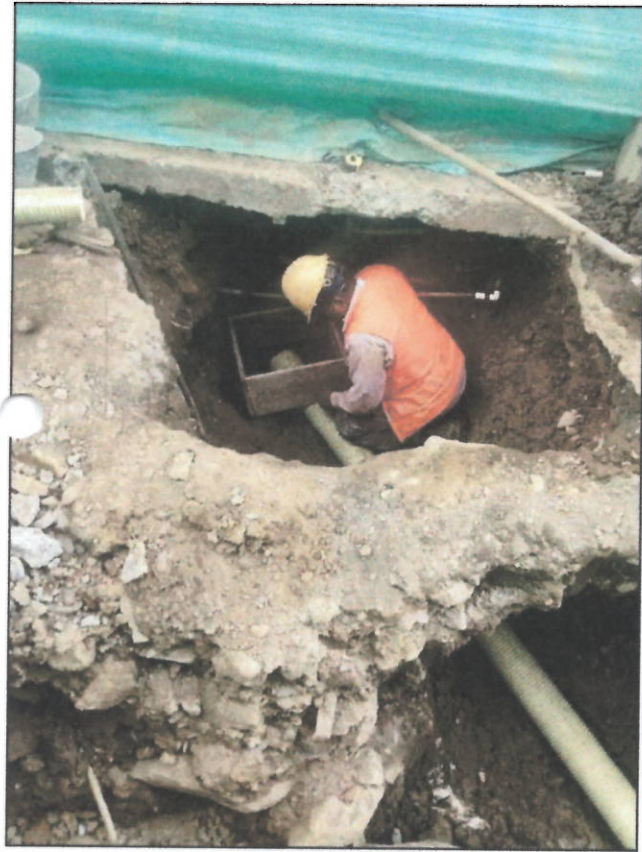


kur




Handwritten signature



Juan

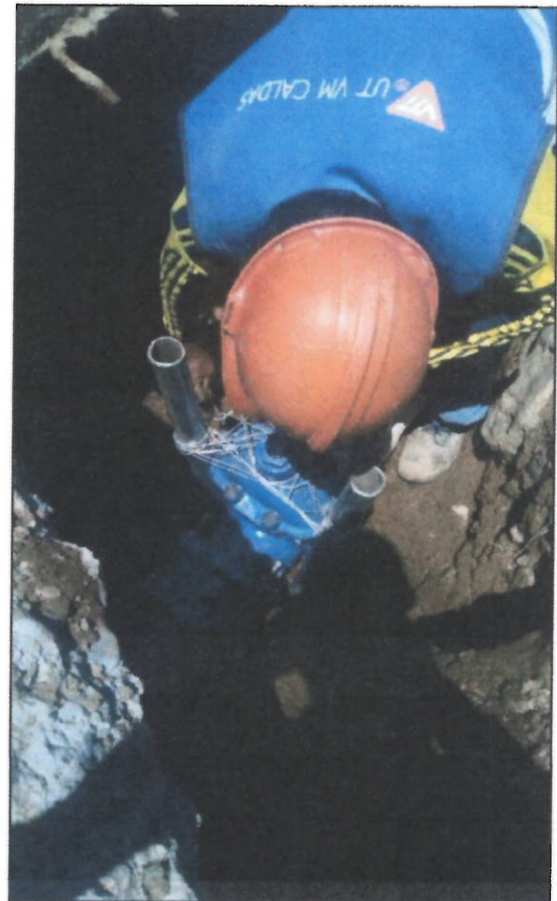

JCS

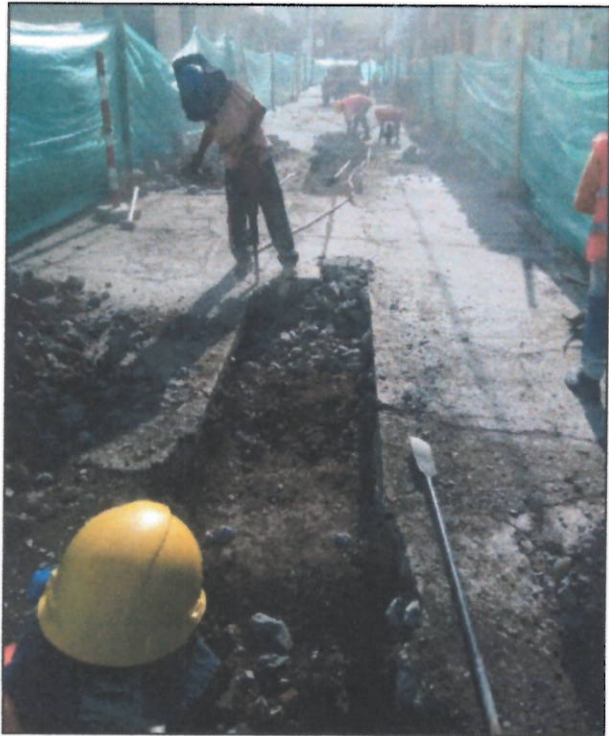

Jun


OBRA 2 Reposición de la red de acueducto y alcantarillado
calle 38 entre carreras 7 y 9



Jans



Handwritten signature or mark.

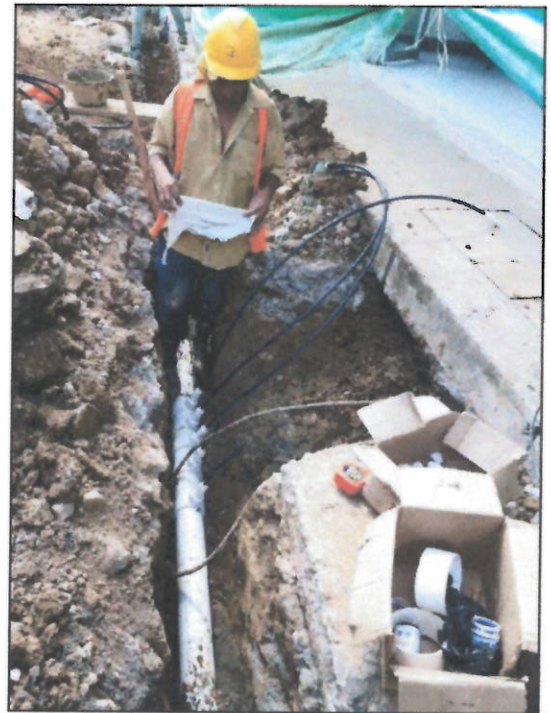


Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.




Handwritten signature

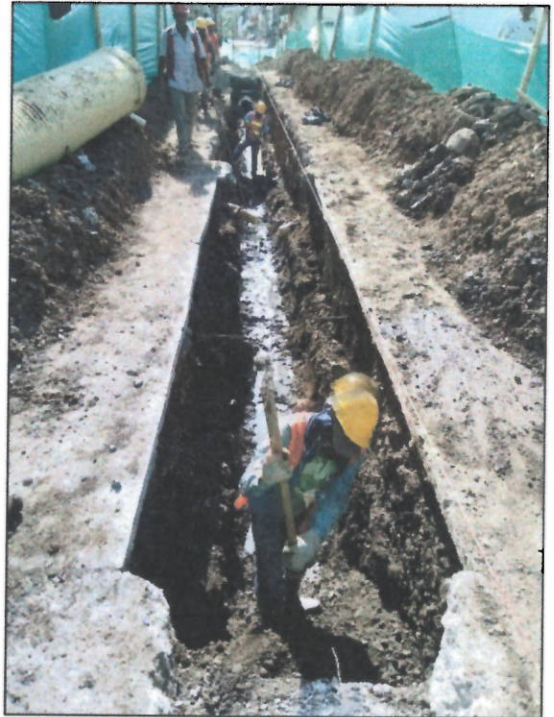

Handwritten signature or mark.

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA 1 Reposición de la red de acueducto y alcantarillado calle 33 entre carreras 9 y 10:

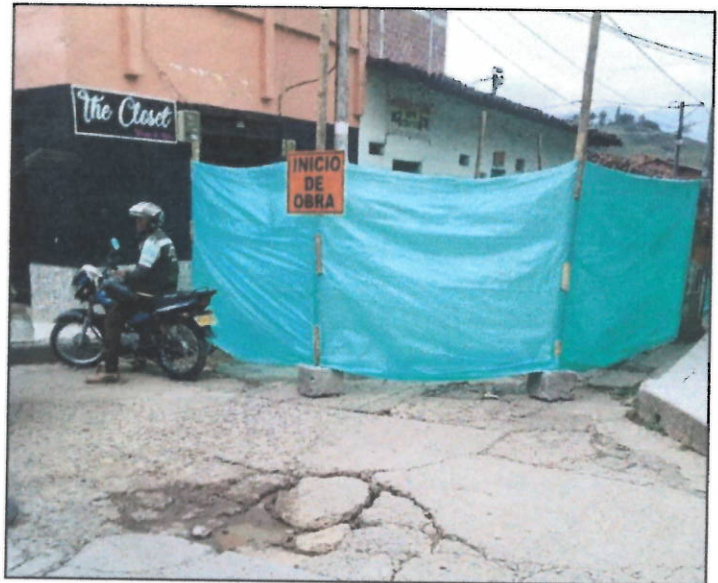

Law

CARRERA 7


REPOSICION RED
ACUEDUCTO
GALLE 38 ENTRE CARRERA
7 Y 9

CALLE 38


CARRERA 7

REPOSICION RED
ALCANTARILLADO
7 Y 9
CALLE 38 ENTRE CARRERA

CALLE 38




DETALLE DE CAJAS DE INSPECCION TAPA EN CONCRETO REFORZADO




NORMAS APLICABLES A REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS:

- RAS 2000
 - NTC 1500
 - NTC 1087
 - NTC 1341
 - NTC 1748
 - NTC 2697
 - NTC 382
 - NTC 539
- Reglamento de agua potable y saneamiento básico
Codigo colombiano de fontanería.
Tubos de pvc rígido para uso sanitario.
Accesorios pvc rígidos para tuberías sanitarias
Tubos pvc rígido para alcantarillas
Accesorios pvc rígido para tuberías de alcantarillado
Tubos pvc y cpvc para conducción de agua potable



CARRERA 9



DETALLE DE CAJA DEL MEDIDOR


⑤ MEDIDOR VOL CLASE C
⑤ LLAVE DE DORTE Ø=1"

CARRERA 9

10

CONTIENE		UBIGACION	
ES GIL	PLANOS GENERALES DE LOS PROYECTO	SUPIA	CALDAS

[Handwritten signature]



CARRERA 9

CARRERA 9

1

3

5

ESC.

PROYECTO

DISEÑO


REPOSICION RED

AGUEDUCTO CALLE 38 ENTRE


7 Y 9

ING. JUAN JOSE TORR

REPOSICION RED
ACUEDUCTO
CALLE 33 ENTRE CARRERA
9 Y 10



CARRERA 2 A LA 3



Handwritten signature or initials.


CARRERA 9

REPOSICION RED
ALCANTARILLADO
CALLE 33 ENTRE CARRERA
9 Y 10



CALLE 33

CARRERA 10

REGION
ACQUEDUCTO
INDICADO
DISE



[Handwritten signature]

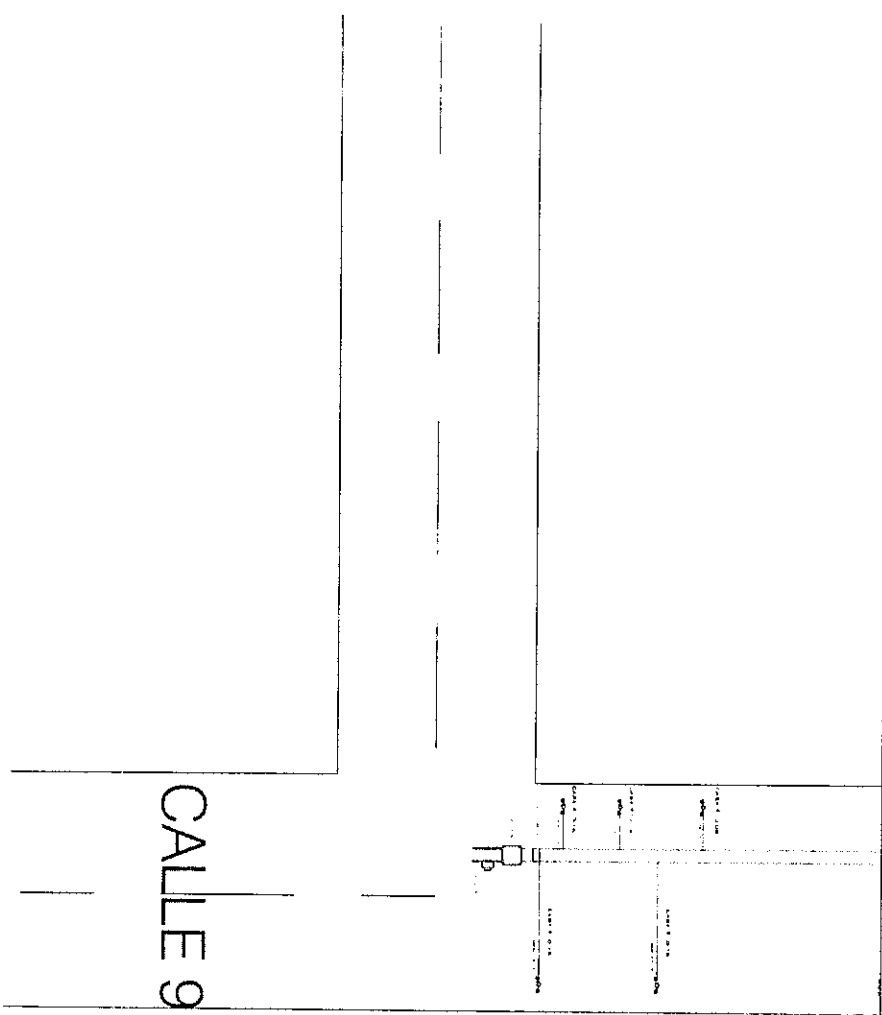

10

	CONTIENE	UBICACION
ES GIL	PLANOS GENERALES DE LOS PROYECTO	SUPIA CALDAS

Handwritten signature

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
INGENIERO CIVIL U.N.

OBRA: "CONTRATO N° 0075 OBRA N° 1: REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9. OBRA. 2: REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9Y 10. EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS."


NOMINA ING. JAVIER DE J. GARCIA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

NOMINA DE FEBRERO 01 AL 15 DE 2018

No	NOMBRE	CEDULA	SALARIO BASICO	VALOR QUINC.	INCA	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL		RECIBI CONFORME
											A PAGAR	TOTAL	
1	FERNELLY GIRALDO GARCIA	75,031,026	1,400,000	700,000	15	44,106	744,106	28,000	28,000	56,000	688,106		<i>[Signature]</i>
2	LUIS FERNANDO MONTAÑO GAÑAN	1,060,590,041	781,250	26,042	1	2,940	28,982	1,042	1,042	2,084	26,898		<i>[Signature]</i>
3	GABRIEL TAPASCO HERNANDEZ	15,932,825	781,250	286,458	11	32,344	318,802	11,458	11,458	22,916	295,886		<i>[Signature]</i>
4	DIEGO ARMANDO BECERRA RIVERA	1,069,699,492	781,250	286,458	11	32,344	318,802	11,458	11,458	22,916	295,886		<i>[Signature]</i>
5	VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO	1,060,597,551	781,250	286,458	11	32,344	318,802	11,458	11,458	22,916	295,886		<i>[Signature]</i>
6	MARLON STEVEN GUZMAN SERNA	1,053,845,715	781,250	312,500	12	35,284	347,784	12,500	12,500	25,000	322,784		<i>[Signature]</i>
7	GILBERTO DE JESUS RIOS CORREA	6,272,847	781,250	208,333	8	23,523	231,856	8,333	8,333	16,666	215,190		<i>[Signature]</i>
8	FREDY ANTONIO BUENO BUENO	15,933,246	781,250	208,333	8	23,523	231,856	8,333	8,333	16,666	215,190		<i>[Signature]</i>
9	ANDRES FELIPE CASTAÑO MONTAÑA	1,054,995,504	781,250	182,292	7	20,583	202,875	7,292	7,292	14,584	188,291		<i>[Signature]</i>
10	SANTIAGO ARIAS MONTAÑA	1,060,596,272	781,250	208,333	8	23,523	231,856	8,333	8,333	16,666	215,190		<i>[Signature]</i>
TOTALES				92	2,705,207	0	270,514	108,207	108,207	216,414	2,759,307		

TOTAL 2,759,307

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1	Fecha del informe	Mayo 15 de 2018	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	-----------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0075/2018
Objeto:	OBRA 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 38 ENTRE CARRERAS 7 Y 9. OBRA 2: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
Nombre Contratista:	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Fecha del contrato:	Enero 24 de 2018
Plazo de ejecución:	45 días calendario
Valor inicial:	\$ 143.817.097
Fecha de iniciación:	26 de enero de 2018
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	26 de marzo de 2018
Nueva fecha de terminación:	25 de abril de 2018
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	30 días
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

En la ejecución del contrato se atendieron dos frentes de trabajo teniendo como obra 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS: En este frente de obra se realizó la reposición de la red principal de alcantarillado en una longitud de 59.25 ml y un diámetro de 24", se realiza la reposición de once domiciliarias en tubería de 6" con su respectiva silleta, y caja de inspección; también se realizó la reposición de red de acueducto en una longitud de 61.80 ml y un diámetro de 4". La obra se ejecuta con total normalidad sin inconveniente alguno.



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



En la ejecución del contrato se atendieron dos frentes de trabajo teniendo como obra 2: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 38 ENTRE CARRERAS 7 Y 9: En este frente de obra se realizó la reposición de la red principal de alcantarillado en una longitud de 64.4 ml y un diámetro de 12", se realiza la reposición de doce domiciliarias en tubería de 6" con su respectiva silleta, y caja de inspección; también se realizó la reposición de red de acueducto en una longitud de 125 ml y un diámetro de 6", esta red se encontraba por ambos costados de la vía. La obra se ejecuta con total normalidad sin inconveniente alguno.

La obra se ejecuta sin ningún inconveniente y se finaliza de forma oportuna el día 30 de marzo.


1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60 días
Prorroga	30 días
Tiempo total transcurrido:	90 días
Avance Porcentual:	100%



1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

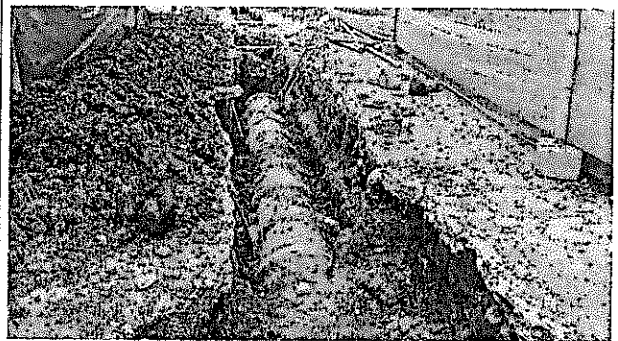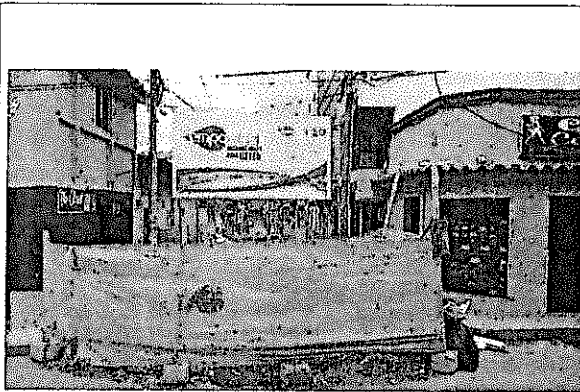

REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 33

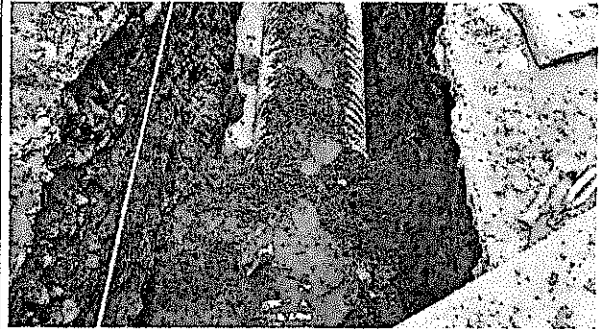

REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 33

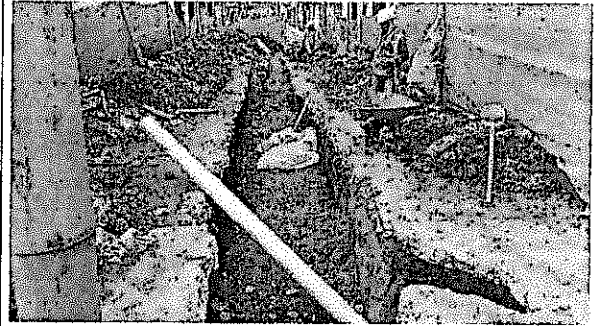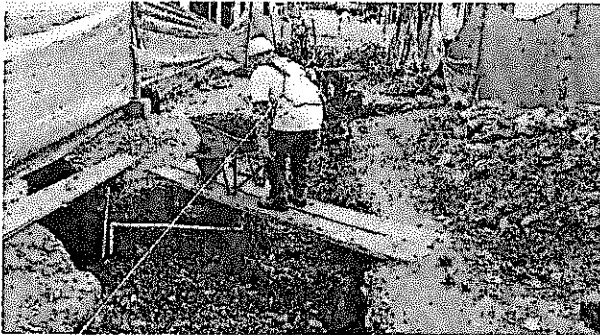

REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 33



REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 33




F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 38

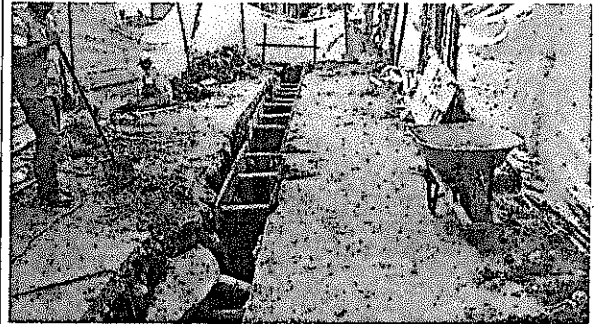

REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 38








F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

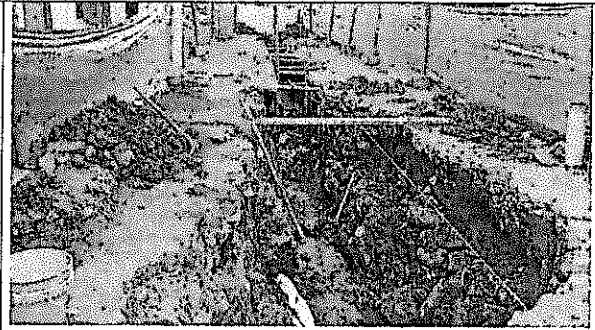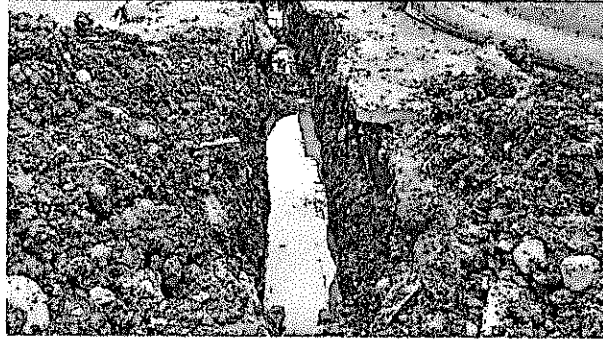

REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 38

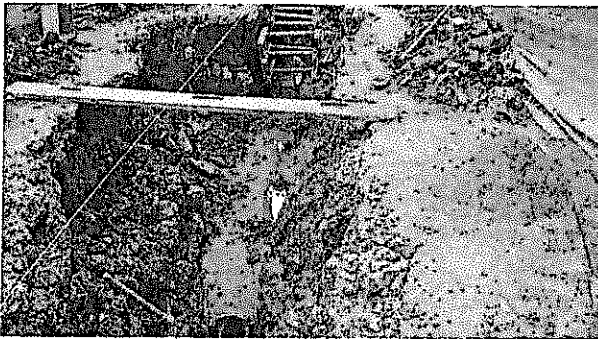

REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 38

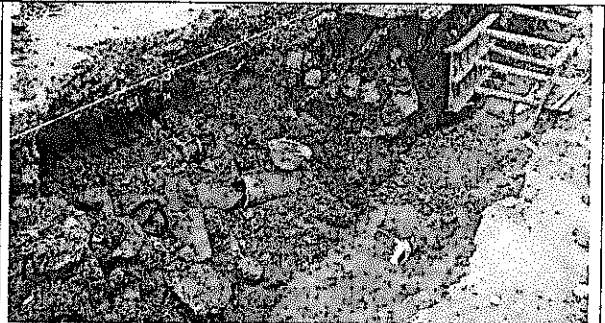



REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 38




F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

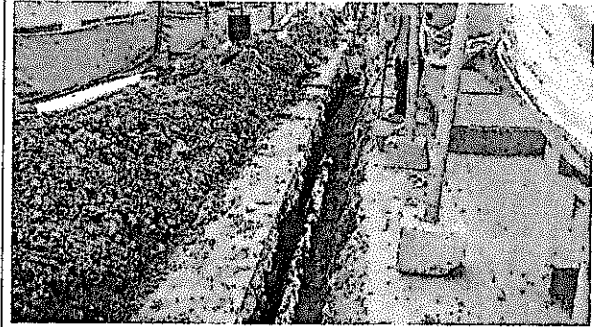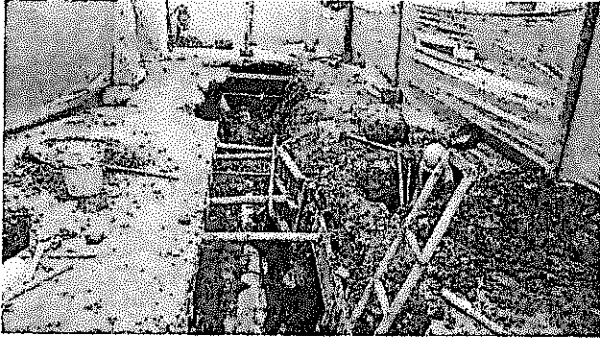

REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 38

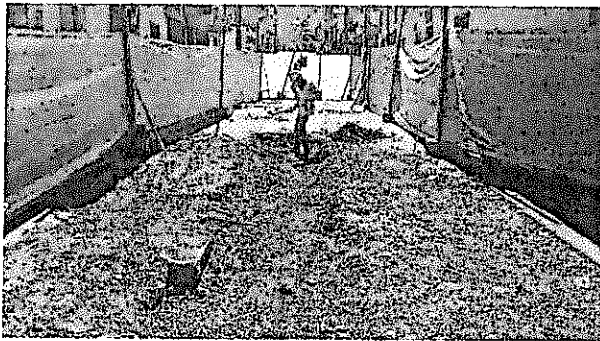


REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 38

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 143.817.097
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 109.943.896
Porcentaje ejecutado en el periodo:	77%
Inversión total ejecutada:	\$ 109.943.896
Porcentaje total ejecutado:	77%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra).

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

MUNICIPIO	VARIAS SECCIONALES
VALOR	\$143.817.097,00
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
CC	10.280.643

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	16 GU066619
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
EXTRA CONTRACTUAL No.	16 RE002352
COMPANIA DE SEGUROS	CONFIANZA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	23-mar-18	24-jul-18	\$ 43.145.129,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	23/03/2018	24-abr-21	\$ 28.763.419,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	23-mar-18	23-mar-23	\$ 28.763.419,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	23-mar-18	23-jul-18	\$ 43.145.129,10

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	SI

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X


4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social integral de los trabajadores.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
5/3/2018	A	A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO No		75		SUPIA - CALDAS													
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGI(m)	MUNICIPIO	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HERRALUCO (HUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	15/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	15/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	15/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	16/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	16/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	16/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	16/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	17/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	17/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	17/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	17/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	20/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	20/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	21/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	21/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	22/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	23/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
1	Conduccion	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	6"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			9313	PAVCO	21/01/2018	23/03/2018	6"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			10234	PAVCO	12/11/80112	24/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			1105	PAVCO	12/11/17127	24/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			441	PAVCO	12/11/80112	24/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			540	PAVCO	12/11/80112	26/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			624	PAVCO	12/11/17127	26/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			640	PAVCO	12/11/17127	26/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			423	PAVCO	12/11/80112	27/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			620	PAVCO	12/11/17127	27/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			353	PAVCO	12/11/80112	28/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	
2	Conduccion	CALLE 33 ENTRE CARRERA 9 Y 10	4"	6	PVC	Instalacion con apertura de zanja		NO			255	PAVCO	12/11/80112	28/03/2018	4"	ASBESTO-CEMENTO	

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	LUIS FERNANDO ARMAS VASQUEZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	
NOMBRE CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION .
COORDINADOR ACUEDUCTO

CONTRATO No		0075		MUNICIPIO		SUPIA - CALDAS										
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO (LONG(m))	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	27	13/03/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	10420	14/03/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	1	14/03/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	449	14/03/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	21301	14/03/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	10527	17/03/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	20609	17/03/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	956	3/04/2018	24"	CEMENTO	
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	24"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			2721180209	GERFOR	540	5/04/2018	24"	CEMENTO	
2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	12"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			9322D	GERFOR	104741	13/02/2018	12"	CEMENTO	
2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	12"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			9322D	GERFOR	132531	14/02/2018	12"	CEMENTO	
2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	12"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			9322D	GERFOR	133255	15/02/2018	12"	CEMENTO	
2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	12"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			9322D	GERFOR	165003	19/02/2018	12"	CEMENTO	
2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 38 ENTRE CARRERA 7 Y 9	12"	NOVAFORT	Instalación con apertura de zanja	NO			9322D	GERFOR	112354	20/02/2018	12"	CEMENTO	

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

NOMBRE CONTRATISTA
FIRMA CONTRATISTA

JAVIER DE LA FUENTE PAREJA

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO
