	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 007-2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2.791.984	
				2. VALOR ADICION		
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.791.984	
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
CDP (#, rubro y fecha)	0002,2320101001030812, 01/01/ 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.791.984	
RP (#, rubro y fecha)	000280, 2320101001030812, 24/01/2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAGUALITO SECTOR LLEGANDO A LAS MARRANERAS MUNICIPIO DE SALAMINA					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					NA	
9- Diseño de Mezclas.					NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X	
15- Acta parcial o final del contrato.					X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**


Andrés Felipe Giraldo Rios.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

07/03/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	SUPERVISOR DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA ✓ Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2023-02-07 Fecha limite de pago: 2023-02-03 Fecha de pago: 2023-02-07 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2023-01 ✓ Período salud: 2023-02 ✓ Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25523369	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$2.100	\$439.900	\$442.000	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		1	2	\$0	\$0	\$2.100	\$439.900	\$442.000	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$300	\$63.600	\$63.900	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$0	\$0	\$300	\$46.400	\$46.700	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		2	2	\$0	\$0	\$600	\$110.000	\$110.600	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$1.000	\$191.500	\$192.500	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	2	\$0	\$0	\$1.000	\$191.500	\$192.500	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$600	\$110.000	\$110.600	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	2	\$0	\$0	\$600	\$110.000	\$110.600	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$4.300	\$851.400	\$855.700	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 25523369  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2023-02-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM
FAX	8403316	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			TELEFONO
			98403316
			0
			Empleado
			CHINCHINA
			B menor a 200 empleados
			Cédula de Ciudadanía
			TIPO DE DOCUMENTO

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
	SEGUNDO NOMBRE

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023 Mes: 01	Año: 2023 Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vir. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
2	\$2.749.200	25523369



TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$439.900	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$2.100	\$0	\$0	\$442.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQIDA INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$46.40	0	\$0	0	\$46.40	4	\$300	\$0	\$46.70	\$0	\$46.70	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46.70
SALUD TOTAL	1	\$63.60	0	\$0	0	\$63.60	4	\$300	\$0	\$63.90	\$0	\$63.90	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.90

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQIDA ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$191.500	0	\$0	\$0	\$191.500	4	\$1.000	\$1.000	\$192.500	0	\$0	\$1.925	\$192.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$110.000	4	\$600	\$110.600
SENA	0	\$0	4	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	4	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	4	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	4	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR		VALOR
	TOTAL ENTIDADES		
SALUD	2		\$110.600
PENSIONES	1		\$442.000
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$192.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$110.600
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$855.700

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2023-02-07 Fecha limite de pago: 2023-02-03 Fecha de pago: 2023-02-07 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2023-01 Período salud: 2023-01 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25335100	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$700	\$145.000	\$145.700	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$400	\$80.800	\$81.200	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$1.100	\$225.800	\$226.900	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)





**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	85341764	1932925680	23/02/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.152**

**Su transacción fue**

**<strong>APROBADA</strong> por la**

Total Pagado

**\$ 58,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 58,000.00	COP\$ 58,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

85341764

No. Autorización/CUS

1932925680

Fecha y Hora

23/02/2023

**Número de Identificación**

4413512

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

VALLEJO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 7 No. 6 - 27

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

claudi3032@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

007

**Nombre Obra**

EMERGENCIA SALAMINA

**Fecha Terminación Obra**

02/02/2023 ✓

**Tipo FIC**

Mensual ✓

**Mes Periodo a Pagar**

2 ✓

**Costo Total Mano de Obra**

2791984.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

HERNADO ANTONIO ✓

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8446597

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

007 ✓

**Fecha Inicio Obra**

24/01/2023 ✓

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

4413512

**Año Periodo a Pagar**

2023 ✓

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

2791984.00 ✓

**Número de Trabajadores en el Periodo**

2

**Aporte FIC**

58000.00

**Valor del Pago**

58000.00



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
HERRERA**  
NIT 4.413.512-7  
CR 10 2 13  
Tel: (036) 3116183675  
Chinchiná - Colombia  
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 83

<b>Señores</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
<b>NIT</b>	890.803.239-9	<b>Teléfono</b>	(036) 8867080
<b>Dirección</b>	CR 23 75 82	<b>Ciudad</b>	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	06/03/2023, 10:18 ✓
<b>Expedición</b>	06/03/2023, 10:18
<b>Vencimiento</b>	05/04/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION CHAGUALITO SECTOR LAGANDO A LAS MARRANERAS MUNICIPIO DE SALAMINA	2,068,903.00	2,068,903.00
2	ADMINISTRACION	599,982.00	599,982.00
3	UTILIDADES	103,455.00	123,111.45

**Total ítems: 3**

**Valor en Letras:**

Dos millones setecientos noventa y un mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-05 por \$ 2,791,996.45

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	2,772,340.00
<b>IVA 19%</b>	19,656.45
<b>Total a Pagar</b>	2,791,996.45

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
CUFE: 2ddc3708b900bb5f980791da3ba6eb0b85a0cf54ff72eb52f3862e6e83b2fee78c27338bed96efeabb9314be4f503c9

<b>EMPOCALDAS S.A E.SP.</b>			
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>			
<b>SECCIONAL SALAMINA- CALDAS</b>			
<b>CONTRATO No.:</b> ACTO 007 / DE 2023	<b>INFORME DE OBRA</b> 1		<b>FECHA FINAL:</b> FEBRERO 2 DE 2023
REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION CHAGUALITO SECTOR LLEGANDO A LAS MARRANERAS MUNICIPIO DE SALAMINA			
<b>MUNICIPIO:</b> SALAMINA, CALDAS.	<b>VALOR ACTO:</b> \$ 2.791.984 /		
<b>CONTRATISTA:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA /			
<b>SUPERVISION:</b> ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA /			<b>FECHA:</b> 20-02-23 /

**INFORME DE OBRA**


- Inicio de obra: 24 de Enero de 2023 /
- Plazo contractual: 10 días /
- Fecha de término de la obra: 2 de Febrero de 2023 /
- Recibo de Obras: 25 de Enero de 2023 /
- Total, de días para ejecución de obras: 10 días /

**AVANCE DE OBRA**

Avance acumulado ejecutado a 25 de Enero de 2023:

100%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

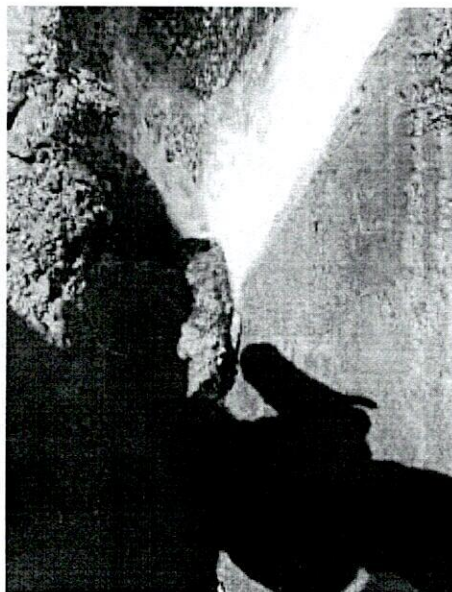




**ACTIVIDADES: REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS**

Que mediante "memorando e informe de fecha 24 de enero de 2023 enviado por la señora administradora de la seccional Salamina, Caldas, Claudia Janneth Olarte Gómez donde informa que Salamina se presenta un Bajo caudal después de que se ha despegado una T que se encuentra termofusionada a una tubería de 10" de polietileno perteneciente a la conducción principal que viene de la bocatoma de chaqualito en el sector La Quebra, por tal motivo trabajadores de mantenimiento, se dirigen inmediatamente a verificar conducción en la cual se encontró salida en gran cantidad de agua por donde pasa un tubo de polietileno de 10", razón por la cual el caudal que llega a la planta viene mermando paulatinamente Se solicita se solicite se realice DECLARATORIA DE EMERGENCIA para subsanar dicho situación" lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

- Desplazamiento al sitio del evento
- Transporte de tubería y accesorios desde Chinchiná al sitio de la obra
- Localización y replanteo, actividades de rocería y limpieza
- Actividades de excavación para instalación de polietileno en las zonas del daño
- Sobre acarreo de tubería y accesorios de máquina de termofusión

**INFORME DE OBRA**  
**ENERO DE 2023**

- Instalación de tubería de polietileno
- Suministro e instalación de portaflanche de 6"
- Anclajes con tubería galvanizada de 2"
- Llenos con material de la excavación





---

**HERNANDO A. VALLEJO HERRERA**  
**Contratista**

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 NIT:4.413.512  
 NOMINA DEL 16 DE ENERO HASTA EL DE 31 DE ENERO  
 2023

ACTA 007

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE	Dias	Salario	Auxilio	Devengado	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS						CARGO	VLR DIAS TRABAJADOS	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO		
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	\$ 1.589.200	15	794.600	70.000	864.600	31.784	31.784	31.784	801.032		
2	939486	JOSE EDGARDO	PRINS MENDEZ	\$ 1.160.000	15	580.000	70.000	650.000	23.200	23.200	23.200	603.600		
		<b>TOTAL</b>		<b>2.749.200</b>	<b>30</b>	<b>1.374.600</b>	<b>140.000</b>	<b>1.514.600</b>	<b>0</b>	<b>54.984</b>	<b>0</b>	<b>1.404.632</b>		

*HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA*

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 NIT :4.413.512



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	20-02-2023	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	ACTO 007-2023
Objeto:	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION CHAGUALITO SECTOR LLEGANDO A LAS MARRANERAS MUNICIPIO DE SALAMINA
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓
Fecha del contrato:	24-01-2023
Plazo de ejecución:	10 días calendario ✓
Valor inicial:	\$ 2.791.984 ✓
Fecha de iniciación:	24 de Enero de 2023 ✓
Fecha de terminación:	2 de Febrero de 2023 ✓
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

##### 1.2. Informe de actividades



INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SALAMINA	ACUEDUCTO	0,001

##### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días
Tiempo total transcurrido:	10 días
Avance Porcentual:	100 %



1.4. Registro fotográfico

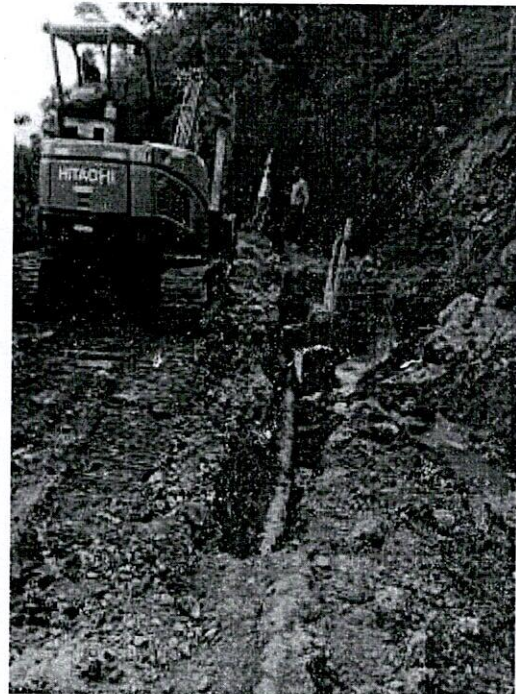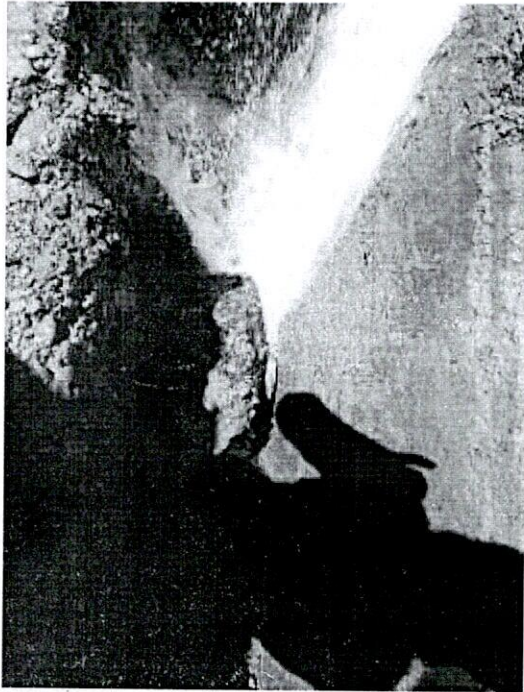




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

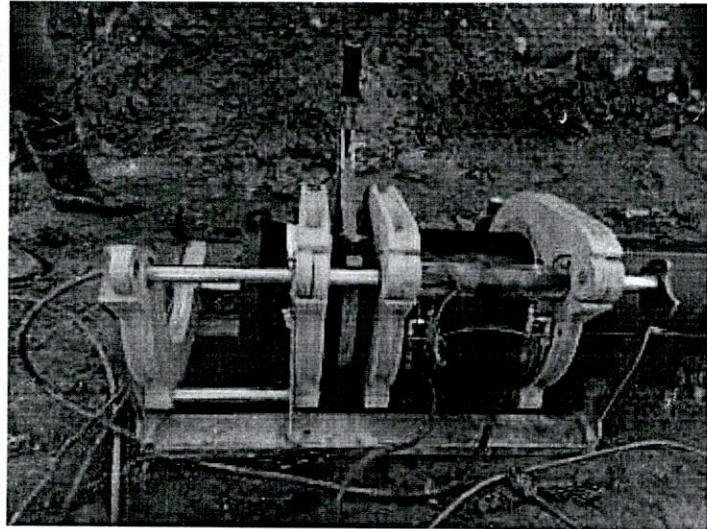



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.5. Problemáticas con la obra

Las fuertes lluvias y el invierno aumentaron la inestabilidad del terreno, sin embargo, se logró atender la contingencia sin ningún contrat tiempo.

Que mediante "memorando e informe de fecha 24 de enero de 2023 enviado por la señora administradora de la seccional Salamina, Caldas, Claudia Janneth Olarte Gómez donde informa que Salamina se presenta un Bajo caudal después de que se ha despegado una T que se encuentra termofusionada a una tubería de 10" de polietileno perteneciente a la conducción principal que viene de la bocanoma de chaqualito en el sector La Quebra, por tal motivo trabajadores de mantenimiento, se dirigen inmediatamente a verificar conducción en la cual se encontró salida en gran cantidad de agua por donde pasa un tubo de polietileno de 10", razón por la cual el caudal que llega a la planta viene mermando paulatinamente Se solicita se solicite se realice DECLARATORIA DE EMERGENCIA para subsanar dicha situación" lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 2.791.984
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 2.791.984
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 2.791.984
Porcentaje total ejecutado:	100%

#### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

#### 3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	x	x	x	x	x
JOSE EDGARDO PRINS MEDEZ	x	x	x	x	x

#### 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

- Certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo, mes de Enero de 2023.
- Pago del FIC
- Nomina empleados



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
27-12-2022	CASCO	A
27-12-2022	OVEROL	NU
27-12-2022	GUANTES	NU
27-12-2022	BOTAS	A
27-12-2022	CARNE	NU
27-12-2022	CHALECO	A
27-12-2022	SEÑALIZACION	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

#### 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
Reparación por emergencia conducción Las Carolas Frutas sector el Lago municipio de Chinchiná Caldas					
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	Gl	1,00	150.000	\$ 150.000
3	EXCAVACIONES				
4	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	2,93	28.000	\$ 81.984
6	ACUEDUCTO				\$ -
7	Empalmes a la red existente incluye tornillería y empaque	Un	1,00	1.100.000	\$ 1.100.000
8	Instalación de tubería de 10" polietileno por termo fusión.	Pega	1,00	450.000	\$ 450.000
9	Termo fusión de portaflanche de 10"	Un	1,00	450.000	\$ 450.000
11	Trasporte de personal y equipos	Día	2,00	280.000	\$ 560.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2.791.984</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 2.068.903</b>
ADMINISTRACION		29%			\$ 599.982
IMPREVISTOS		0%			\$ -
UTILIDADES		5%			\$ 103.445
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 19.655
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2.791.984</b>

#### 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

##### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

2 empleos directos X 15 días calendario

##### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Usuarios y suscriptores del servicio de acueducto en el Municipio de Salamina, Caldas



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Bitácora de la obra		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



**EMPOCALDAS S.A E.S.P.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**ZONA CENTRO NORTE**

<b>CONTRATO No.:</b>	Acto 007 del 24 de Enero de 2023	<b>ACTA No.:</b>	Acta 01 y Final
<b>OBJETO CONTRATO:</b>	Reparación por emergencia conducción Chaguallito sector llegando a las marañeras municipio de Salamina	<b>FECHA INICIACIÓN:</b>	24 de Enero de 2023
<b>CONTRATISTA:</b>	Hernando Antonio Vallejo Herrera	<b>PRORROGA:</b>	NA
		<b>SUPERVISOR:</b>	Ingeniero Zona Centro-Norte
		<b>FECHA CORTE:</b>	25 de Enero de 2023
		<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	2 de Febrero de 2023
		<b>VALOR ADICION:</b>	NA
		<b>FECHA:</b>	20 de Febrero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA		
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
<b>Reparación por emergencia conducción Las Carolas Frutas sector el Lago municipio de Chinchiná Caldas</b>											
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo	Gl	1,00	150.000	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000
3	EXCAVACIONES										
4	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	2,93	28.000	\$ 81.984	2,93	\$ 81.984	\$ 81.984	2,93	\$ 81.984	\$ 81.984
6	ACUEDUCTO										
7	Empalmes a la red existente incluye tornillería y empaque	Un	1,00	1.100.000	\$ 1.100.000	1,00	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	1,00	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
8	Instalación de tubería de 10" polietileno por termo fusión.	Pega	1,00	450.000	\$ 450.000	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000
9	Termo fusión de portaflanche de 10"	Un	1,00	450.000	\$ 450.000	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000
11	Transporte de personal y equipos	Día	2,00	280.000	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000	\$ 560.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2.791.984</b>		<b>\$ 2.791.984</b>	<b>\$ 2.791.984</b>		<b>\$ 2.791.984</b>	<b>\$ 2.791.984</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 2.088.903</b>		<b>\$ 2.088.903</b>	<b>\$ 2.088.903</b>		<b>\$ 2.088.903</b>	<b>\$ 2.088.903</b>
ADMINISTRACION					\$ 599.982		\$ 599.982	\$ 599.982		\$ 599.982	\$ 599.982
IMPREVISTOS					\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
UTILIDADES					\$ 103.445		\$ 103.445	\$ 103.445		\$ 103.445	\$ 103.445
IVA SOBRE UTILIDADES					\$ 19.655		\$ 19.655	\$ 19.655		\$ 19.655	\$ 19.655
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2.791.984</b>		<b>\$ 2.791.984</b>	<b>\$ 2.791.984</b>		<b>\$ 2.791.984</b>	<b>\$ 2.791.984</b>

**SON: MIL PESOS MCTE**

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato  
 Valor Acta 1 y final  
 Saldo No ejecutado  
**SUMAS IGUALES**

2.791.984	\$ 2.791.984
	\$ -
	\$ -
<b>\$ 2.791.984</b>	<b>\$ 2.791.984</b>

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE  
 SUPERVISOR


  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
 Contratista

Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

06-03-2023 06-03-2023 FE FEB3 Facture electrónica 4413512 HERNANDO ANTONI... 690603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Fectura Electrónica \$2,751,996



	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 007-2023	Acta Nº	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2.791.984
				2. VALOR ADICION	
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.791.984
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	0002,2320101001030812, 01/01/ 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.791.984
RP (#, rubro y fecha)	000280, 2320101001030812, 24/01/2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAGUALITO SECTOR LLEGANDO A LAS MARRANERAS MUNICIPIO DE SALAMINA				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓
					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					NA
9- Diseño de Mezclas.					NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**


**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Andrés Felipe Giraldo Rios.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 07/03/23

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	SUPERVISOR DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*Handwritten notes:*  
05-03-23  
2147
