

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			Versión:07 2022-11-04	
# CONTRATO Y AÑO	065 DE 2023	Acta N°	12	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 25.371.662
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$ 12.685.831,00
CONTRATISTA	ANDRÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 38.057.493
NIT O CC:	C.C 1.110.491.286			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 31.724.578
CDP (#, rubro y fecha)	0170 DEL 17 DE ENERO DE 2023 20230765 DEL 28/08/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 1.585.728
RP (#, rubro y fecha)	0191 DEL 24 DE ENERO DE 2023 922 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 1.585.728

OBJETO DEL CONTRATO:BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			N/A
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			N/A

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 15/12/2023

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
Juan Pablo Zuluaga Correa	JEFE DEPTO PLANEACION Y PROYECTOS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
59772826189	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

  
14/12/23  
11-00



Manizales, 15 de Diciembre 2023

## INFORME DE ACTIVIDADES NO. 12 DEL CONTRATO NUMERO 065 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:


### 1. VISITA TÉCNICA, REVISIÓN GENERAL Y CONTROL DE LA OBRA DE LOS LABORATORIOS EN LA PLANTA ELLANO, LA DORADA CALDAS.

#### • Tareas realizadas:

- Tercera Visita técnica, Revisión general y re estructuración del proyecto de remodelación de la los laboratorios y baños.
- Revisión y chequeo de puntos eléctricos.
- Revisan general de acabados.
- Archivo fotográfico e informe general al supervisor del contrato.

### LISTADO DE ACTIVIDADES

#### 1.1 Archivo fotográfico visita técnica.

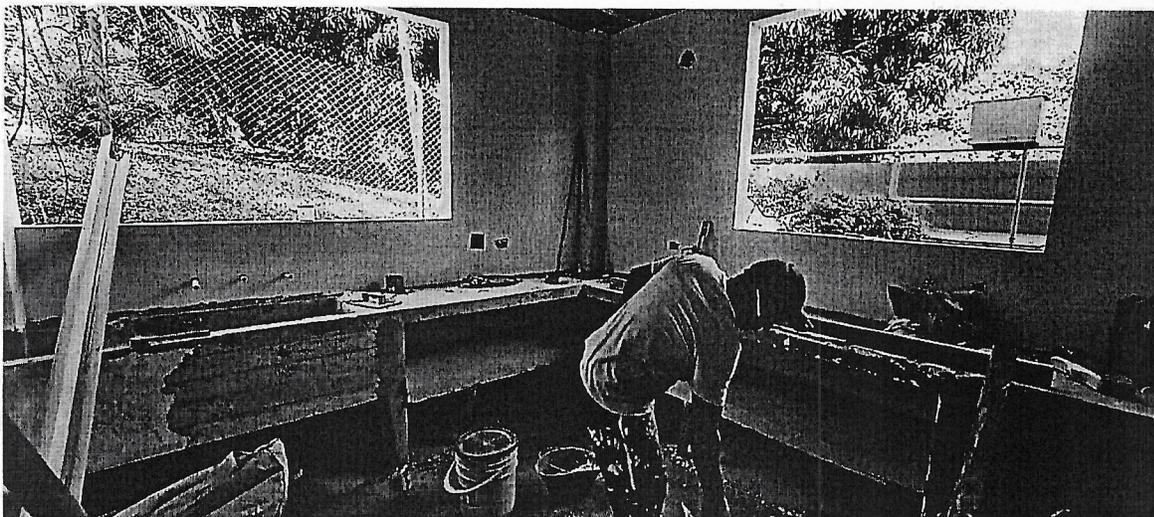

Prolongación de mesón, construcción de entrepaño y nivelación de piso.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar




Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**


Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co


www.empocaldas.com.co

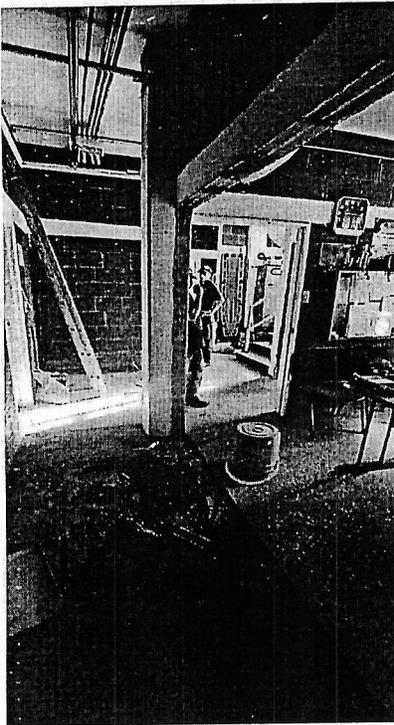


Ampliación de oficina

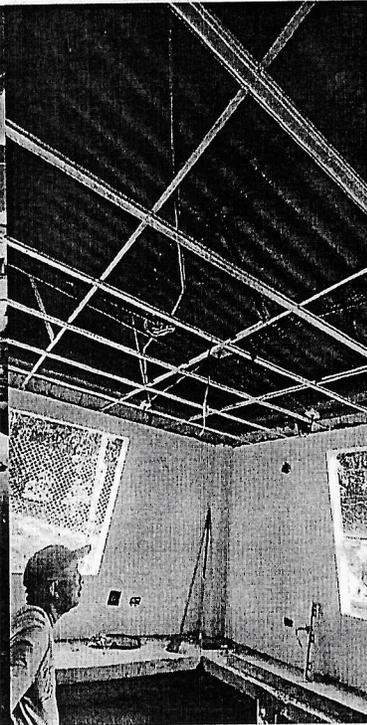

instalaciones eléctricas

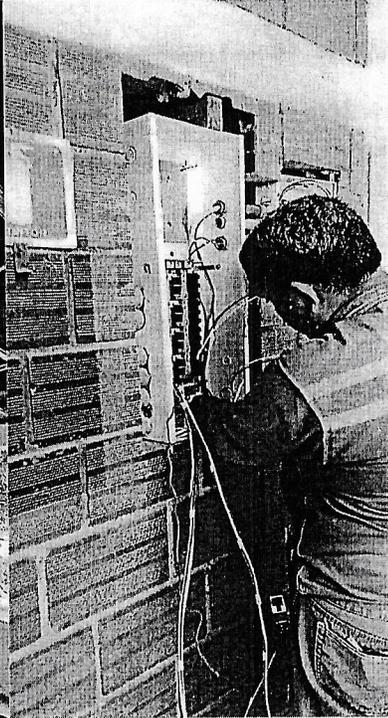


instalación tablero

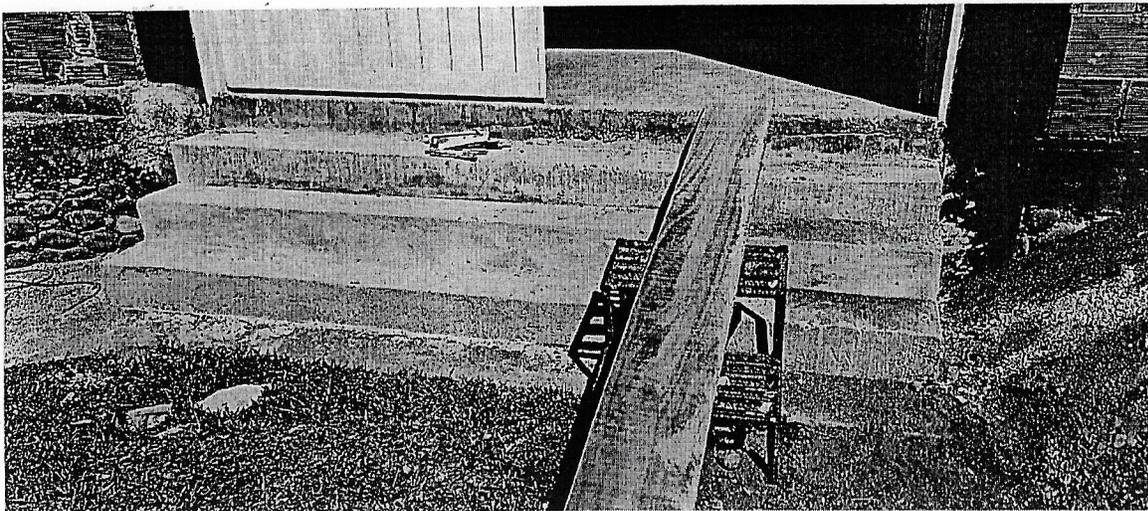


Escalera de acceso ppal. al edificio.



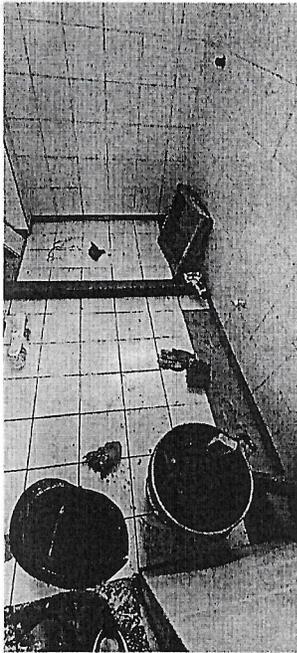

Revisión de enchape general del baño, el cual debe ser remplazado la división de dicha y enchape por la proyección que no coincide con los ejes laterales lo que genera un desnivel visual y una mala instalación, con diferencia de casi 5 cms.

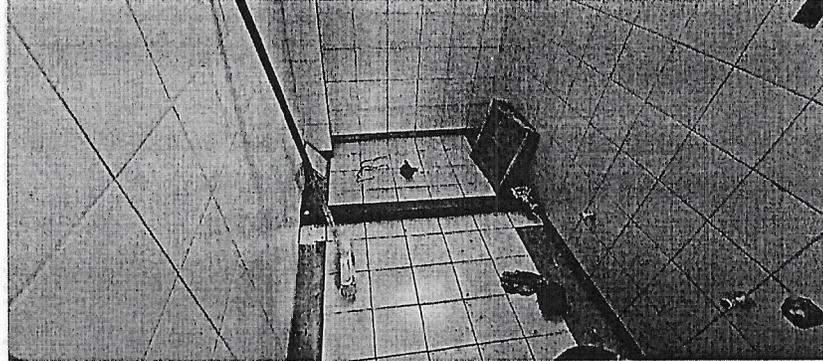

### 1.1.1 INFORME GENERAL DE LA VISITA REALIZADA.

La visita realizada a la Planta El Llano tenía como propósito llevar a cabo funciones de interventoría y revisión en diferentes áreas de la construcción, con un enfoque especial en la obra negra, la construcción de mesones, las instalaciones eléctricas, el cielo raso, las instalaciones hidrosanitarias, las cajas de inspección y los puntos eléctricos.

#### 1.1.2. **\*\*Laboratorios:\*\***

- **\*Obra Negra:\*** Se realizó una revisión exhaustiva de la obra negra en los laboratorios, verificando la calidad de los materiales utilizados y la correcta ejecución de las estructuras así como la nivelación de los mesones, la construcción del entrepaño y la nivelación del piso.

#### 1.1.2. **\*\*Oficina:\*\***

- **\*Instalaciones Eléctricas:\*** Se llevó a cabo una revisión detallada de las instalaciones eléctricas en la oficina, asegurándose de que cumplan con las normativas de seguridad y estén correctamente cableadas.

- **\*Instalación de Cielo Raso:\*** Se evaluó la instalación del cielo raso, verificando la alineación y la calidad de los materiales utilizados.

#### 1.1.3. **\*\*Baños:\*\***

- **\*Instalaciones de enchape cerámico en muros y pisos,** el cual tras verificación de niveles se concluye repetir en trabajo en el área de piso para una correcta nivelación e instalación.







- \*Cajas de Inspección: \* Se verificó la existencia y ubicación adecuada de las cajas de inspección para facilitar futuras revisiones y mantenimiento.

## 2. VISITA TÉCNICA, REVISIÓN Y PRESUPUESTO GENERAL PARA EL CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.

- Tareas realizadas:
- Visita técnica, medición y revisión general.

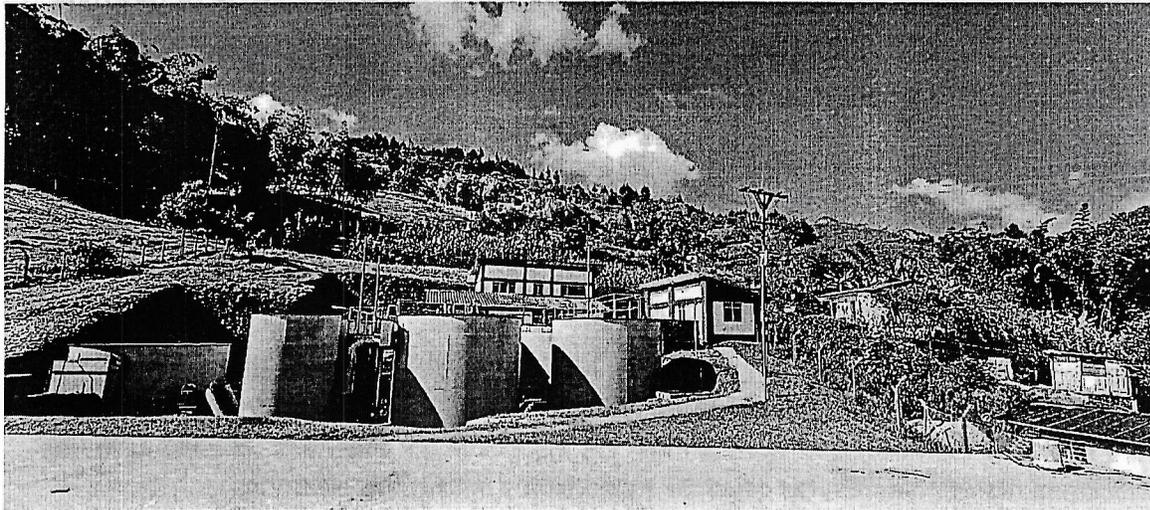

Vista general de la planta.

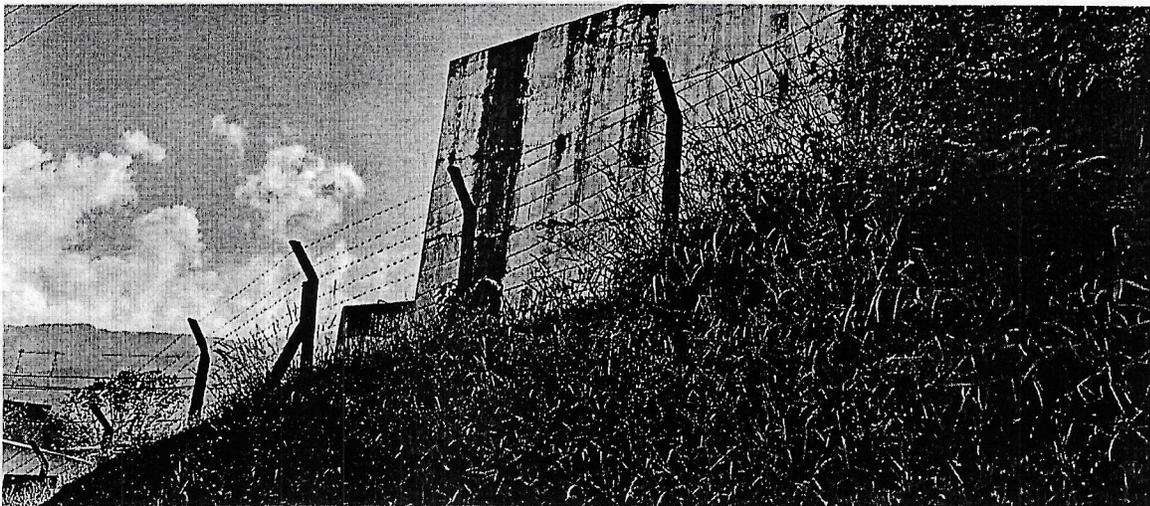

Revisión del cerramiento actual y medición del perímetro





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**


Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co



Medición del perímetro

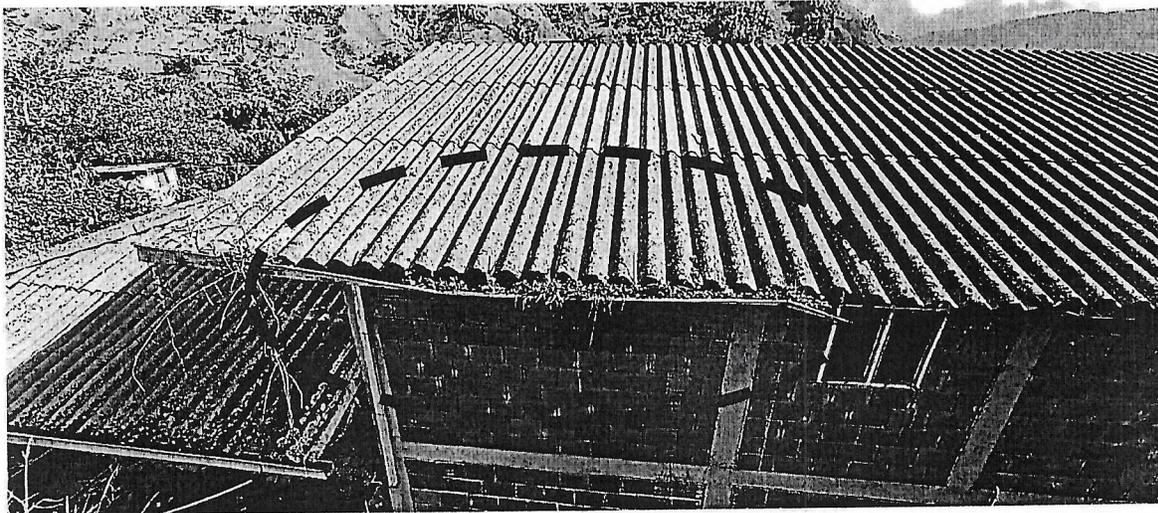

Canal en mal estado y algunas tejas rotas, bajantes inexistentes.



• 2.1 Presupuesto general de obra

 <b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b> <b>SECCIONAL MANZANARES - CALDAS</b>						
<b>OBJETO: INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA Y LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS</b>						
<b>MUNICIPIO MANZANARES, CALDÁS</b> <b>FECHA : dic-23</b>						
<b>FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS</b>						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL	
1	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				<b>47.256.929,56</b>	
1.1	Desmontaje de cerramiento en postes de concreto y alambre de púas simple anclados sobre terreno, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor, incluye cargue y retiro de escombros.	MTL	255	\$ 16.885,00	\$ 4.305.675,00	
1.2	Suministro, transporte e instalación malla eslabonada H=2.00 mts Cal=12 postes 250 cada 2 MTS, tapa superior y ganchos para alambre, 2 hiladas de alambre de púas templada soldado y anclado sobre Placa. apertura de huecos, relleno de concreto para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto	MTL	98,88	\$ 359.637,00	\$ 35.560.906,56	
1.3	Suministro, transporte e instalación puerta de acceso posterior a la planta de 1,00x2.00 (rectificar medidas en obra) en malla eslabonada cal 12, Perfilera de soporte en tubería galvanizada, incluye cerrajería, pasadores superior e inferior y manivela sencilla con abertura para candado central.	MT2	2	\$ 351.620,00	\$ 703.240,00	
1.4	Suministro, transporte e instalación de adición para puerta principal superior y reforzamiento de 1,00x2.00 (rectificar medidas en obra) en malla eslabonada cal 12, Perfilera de soporte en tubería galvanizada, torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro. incluye cerrajería, pasadores superior e inferior y manivela sencilla con abertura para candado central.	MT2	8,25	\$ 351.620,00	\$ 2.900.865,00	
1.5	Suministro, transporte e instalación de Canal cuadrada de PVC, color blanco, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio, incluye impermeabilizante conectores y piezas especiales, precio incluye desmonte de canal actual.	MTL	19	\$ 97.600,00	\$ 1.854.400,00	
1.6	suministro, transporte e instalación de Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color blanco, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales. precio incluye desinstalación de tubería actual.	MTL	35	\$ 38.825,00	\$ 1.358.875,00	
1.7	suministro, transporte e instalación Remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero (flancho) mediante lámina plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 2 pliegues, con junta de estanqueidad.	MTL	22	\$ 26.044,00	\$ 572.968,00	
<b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>					<b>47.256.929,56</b>	
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)</b>					<b>11.814.232,39</b>	
Administración				19,0%	8.978.817	
Imprevistos				1,0%	472.569	
Utilidad				5,0%	2.362.846	
<b>VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD</b>				<b>19%</b>	<b>448.940,83</b>	
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>59.520.102,78</b>	



## • 2.2 Informe

La visita a la planta de tratamiento en el municipio de Manizales tuvo como objetivo principal realizar la medición perimetral del lote para la elaboración de un presupuesto general del cerramiento en malla eslabonada. Además, se llevó a cabo una inspección del edificio de operaciones con el fin de identificar posibles mejoras y necesidades de mantenimiento.

### 2.2.1. Medición Perimetral del Lote:

- Se procedió a realizar la medición precisa del lote con el propósito de obtener los datos necesarios para el presupuesto del cerramiento en malla eslabonada.

- La medición incluyó la longitud total del perímetro, teniendo en cuenta las dimensiones específicas del área que se planea cercar.

### 2.2.2. Inspección del Edificio de Operaciones:

- \*Tejas Rotas: \* Durante la inspección del techo del edificio de operaciones, se identificaron tejas rotas que requieren ser reemplazadas para prevenir filtraciones de agua.

- \*Cambio de Canal de Aguas Lluvias:\* Se constató la necesidad de cambiar el canal de aguas lluvias para garantizar un adecuado drenaje y prevenir posibles daños estructurales.

- \*Instalación de Plancha:\* Se recomendó la instalación de un planche en puntos estratégicos para evitar filtraciones de agua en los laboratorios, garantizando así un ambiente seco y seguro.

### 2.2.3 Presupuesto:

Basándonos en las observaciones realizadas, se ha elaborado un presupuesto para las mejoras mencionadas. El valor total estimado del presupuesto es de \$59,520,102 (Cincuenta y nueve millones quinientos veinte mil ciento dos pesos).

### 2.2.4 Recomendaciones:

- Priorizar la reparación de las tejas rotas y el cambio del canal de aguas lluvias para prevenir daños mayores en el edificio de operaciones.

- Proceder con la instalación de flanches en los puntos críticos identificados para evitar filtraciones de agua en los laboratorios.

- Implementar medidas preventivas de mantenimiento periódico para asegurar el buen estado de las instalaciones.





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

**Gobierno de CALDAS**

**PRIMERO LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**3. Avance general, nueva seccional Salamina, contiene presupuesto general, APU, cantidades de obra, lista de materiales, cronograma general, honorarios etc.**

- Tareas realizadas:
- Avance general en el presupuesto general de la nueva seccional.

EMPICALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA - CALDAS OBJETO: CONSTRUCCION NUEVA SECCIONAL DE LA EMPRESA EMPICALDAS S.A.E.S.P EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS FECHA: DICIEMBRE DE 2023									
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS									
ID	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VR SUBTOTAL	VR UNIDAD	VR TOTAL	% CANTIDAD	% CANTIDAD
<b>PRELIMINAR</b>									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL EDIFICIO INCLUYE TOPOGRAFO CADENERO Y EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	124.98	\$ 3.805	\$ 303	\$ 4.108	\$ 5.117.775	0,13%	
1.2	ROCEA Y LIMPIEZA	M2	400	\$ 1.214	\$ 635	\$ 1.850	\$ 740.000	0,19%	
1.3	NIVELACION MANUAL DEL TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO	M2	400	\$ 5.359	\$ 2.030	\$ 7.359	\$ 2.943.600	0,77%	
1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	M2	2,88	\$ 314.509	\$ 26.491	\$ 341.000	\$ 982.080	0,28%	
1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	24	\$ 144.916	\$ 3.443	\$ 148.359	\$ 3.560.516	0,30%	
1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	MTL	80	\$ 10.132	\$ 486	\$ 10.616	\$ 849.280	0,22%	
1.7	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	UNO	1	\$ 284.002	\$ -	\$ 284.002	\$ 284.002	0,07%	
1.8	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UNO	1	\$ 133.646	\$ -	\$ 133.646	\$ 133.646	0,03%	
1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN BLOQUE ESABONADA CAL. 12 DE 2.147 X 2.147 + ANCHO 24 X 1,6" + ANTI CORROSIVO + PINTURA TUSO ACILAS NEGROS PARA CERRAMIENTO 2". CONCRETINA DIAMETRO 1" PES SPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUJILLAS EN ACERO INOXIDABLE AIS-430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 28MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SECCIONAL DETALLE	MTL	81,99	\$ 359.637	\$ 17.763	\$ 377.401	\$ 30.943.108	8,00%	
1.10	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M. EN SUELO DE ARCILLA SEMIDURA, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL A CAMION EL PRECIO NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES EXCAVADOS.	M3	81,99	\$ 30.997	\$ 6.060	\$ 37.057	\$ 3.036.303	0,79%	
							<b>\$ 35.241.836</b>	<b>9,22%</b>	
<b>2. ESTRUCTURA</b>									
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	2,98	\$ 46.222	\$ 756	\$ 46.978	\$ 139.997	0,04%	
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,12m	M2	99,2	\$ 98.966	\$ 2.171	\$ 101.129	\$ 10.031.997	2,62%	
2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA DE ENTREPISO E=0,12m CONCRETO 3000 PSI	M2	58,8	\$ 125.573	\$ 47.062	\$ 172.635	\$ 10.150.938	2,55%	
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	M3	2,16	\$ 914.299	\$ 201.073	\$ 1.115.372	\$ 2.409.204	0,63%	
2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,45	\$ 844.559	\$ 188.664	\$ 1.033.224	\$ 2.531.359	0,65%	
2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA DE CUBIERTA E=0,12m CONCRETO 3000 PSI	M2	58,8	\$ 108.376	\$ 61.323	\$ 169.699	\$ 9.978.301	2,51%	
							<b>\$ 37.478.715</b>	<b>9,80%</b>	
<b>3. MAESTRERIA</b>									
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO LADRILLO FACHADA 0,3x2x11,5cm INCLUYE CROQUETS, DOVELAS 2,900 pm	M2	173,6	\$ 170.496	\$ 3.021	\$ 173.516	\$ 30.122.378	7,88%	
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE NO 5 ARCILLA INTERIORS (INCLUYE ANCLAJES) 33x23x11,5cm	M2	134,85	\$ 53.590	\$ 961	\$ 54.552	\$ 7.356.337	1,92%	
							<b>\$ 13.936.368</b>	<b>3,54%</b>	
<b>4. REVOCOS</b>									
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOCO LISO MUROS 1,3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	413,18	\$ 13.757	\$ 428	\$ 14.185	\$ 5.860.958	1,53%	
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOCO LISO MUROS 1,3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	236,76	\$ 22.290	\$ 1.818	\$ 34.108	\$ 8.075.410	2,11%	
<b>5. PINTURA, DRYWALL Y SUPERBOARD</b>									
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO ACRILTEX (DOS CARAS) INCLUYE PEGUE PISA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	42,53	\$ 216.691	\$ 4.404	\$ 221.295	\$ 9.411.719	2,46%	
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE, FILOS Y DILATACIONES), COLOR SEGUN DISEÑO POR M. POR CADA CASA	ML	43,6	\$ 9.731	\$ 799	\$ 10.530	\$ 459.108	0,12%	
<b>6. ENCHAPES</b>									
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1,3 IMPERMEABILIZADO	M2	99,2	\$ 35.623	\$ 609	\$ 36.232	\$ 3.591.214	0,94%	
6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO LISO TIPO ALFA O SIMILAR 0,6x0,6m. COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA) INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACION	M2	95,80	\$ 103.477	\$ 641	\$ 104.118	\$ 9.983.875	2,61%	
6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO MUROS CORONA COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILADA, MORTERO DE NIVELACION Y DILATACIONES)	M2	40,28	\$ 62.586	\$ 10.651	\$ 73.237	\$ 2.949.996	0,77%	
6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA TIPO CORONA COCINA ESTILO MADERA O SIMILAR, COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACION	M2	6,6	\$ 291.923	\$ 2.506	\$ 294.429	\$ 1.943.225	0,51%	
							<b>\$ 9.750.678</b>	<b>2,55%</b>	
<b>7. CARPINTERIA EN ALUMINIO</b>									
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA TIPO 1 EN ALUMINIO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNO	1	\$ 1.513.405	\$ 9.005	\$ 1.522.500	\$ 1.522.500	0,40%	
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA TIPO 2 EN ALUMINIO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNO	6	\$ 693.092	\$ 9.005	\$ 702.187	\$ 4.213.122	1,10%	
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA TIPO 3 EN ALUMINIO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNO	3	\$ 351.302	\$ 9.005	\$ 360.297	\$ 1.081.191	0,28%	
7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA TIPO 4 EN ALUMINIO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNO	1	\$ 116.338	\$ 9.005	\$ 125.433	\$ 125.433	0,03%	
7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA TIPO 5 EN ALUMINIO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNO	1	\$ 1.513.405	\$ 9.005	\$ 1.522.500	\$ 1.522.500	0,40%	
7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA TIPO 6 EN ALUMINIO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNO	1	\$ 1.276.837	\$ 9.005	\$ 1.285.932	\$ 1.285.932	0,34%	



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

**f** Empocaldas **@** empocaldas\_oficial

**✉** empocaldas.com.co

**globe** www.empocaldas.com.co

8. INSTALACIONES HIDRAULICAS									
8.1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMO TIPO AYANTI Color Blanco Ref. J0338 100K Tipo Corona o similar (Incluye 8 unidades de accesorios para el montaje de la manija de pedestal a anti accesorios de conexión e instalación) más Conjunto Ref. La manija de pedestal 4" con 11 en botella, después de envío y grapas	UND	2	\$ 518.930	\$ 10.236	\$ 558.166	\$ 1.118.332	0,25%	
8.2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACCESORIOS PARA BANO DE DISCAPACITADOS, TIPO ABATIBLE COLOR NEGRO CROMADO, INCLUIE ACCESORIOS	UND	1	\$ 347.080	\$ 10.236	\$ 357.316	\$ 357.316	0,08%	
8.3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANGUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT SOBRE PLACA INCLUIE ACCESORIOS	UND	1	\$ 440.760	\$ -	\$ 440.760	\$ 440.760	0,12%	
8.4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2" AGUA FRIA (RDE DE SUMINISTRO) INCLUIE ACCESORIOS	ML	27,8	\$ 14.605	\$ 665	\$ 15.274	\$ 421.562	0,11%	
8.5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2" AGUA FRIA (RDE DE SUMINISTRO) INCLUIE ACCESORIOS	ML	6	\$ 14.350	\$ 763	\$ 15.113	\$ 90.954	0,02%	
8.6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CON TUBERIA TUBERICO D 1/2" INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1	\$ 93.270	\$ 763	\$ 94.033	\$ 94.033	0,02%	
8.7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2" AGUA FRIA (RDE DE SUMINISTRO) INCLUIE ACCESORIOS	UND	2	\$ 28.054	\$ 763	\$ 28.817	\$ 53.634	0,01%	
8.8.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P INCLUIE ACCESORIOS DE INSTALACIONES HASTA 3 MTS	UND	8	\$ 28.268	\$ 1.301	\$ 27.568	\$ 220.544	0,06%	
9. INSTALACIONES HIDROALUMINARIAS									
9.1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"	ML	14,05	\$ 24.253	\$ 841	\$ 25.094	\$ 351.538	0,09%	
9.2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	19,5	\$ 37.123	\$ 641	\$ 37.764	\$ 748.068	0,20%	
9.3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8"	ML	8	\$ 84.777	\$ 641	\$ 85.418	\$ 392.208	0,10%	
9.4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE SAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUIE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	5	\$ 91.851	\$ 1.360	\$ 93.211	\$ 462.205	0,12%	
9.5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE SAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUIE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	2	\$ 185.835	\$ 2.844	\$ 188.679	\$ 378.994	0,10%	
9.6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION C.A. DE INSPECCION 0,20x 80x 100m (INCLUIE LADRILLO COAJUN MARCO EN ANGULO 2 1/2 x 2 1/2" 3/4" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3" x 3/8" CON PARRILLA EN VARILLA DE 3/8" CAL. 100m)	UND	2	\$ 1.131.051	\$ 14.234	\$ 1.145.285	\$ 2.200.570	0,60%	
10. CARPINTERIA METALICA									
10.1.	PUERTA (P1) 2 (5'4" X 2'0" MTS EN MARCO DE 3"1/2", NAVE EN PERFILERA 1101 CON PISA VIDRIO 177, PARTIDOR EN TABLILLA EN LA PARTE SUPERIOR, VIDRIO DE 8 MM TEMPLADO DIMENSIONES DE	UND	1	\$ 1.690.252	\$ 7.826	\$ 1.698.078	\$ 1.698.078	0,44%	
10.2.	PUERTA EN ALUMINIO (P2) 1 X 2 1/8 ANODIZADO MATE NATURAL O VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELICULA SAND BLASTING, SEGUN PLANOS SEGUN DETALLE INCLUIE EN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	2	\$ 1.781.647	\$ 7.826	\$ 1.789.473	\$ 3.578.946	0,94%	
10.3.	PUERTA (P3) EN MARCO DE 3"1/2", NAVE EN PERFILERA 1101 CON PISA VIDRIO 177, PARTIDOR EN TABLILLA EN LA PARTE SUPERIOR, VIDRIO DE 6 MM TEMPLADO DIMENSIONES DE	UND	1	\$ 1.375.904	\$ 67.855	\$ 1.443.759	\$ 1.443.759	0,38%	
10.4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA Y MARCO (P4) 0,90 X 2,18 METALICA ENTAMBORADA EN LAMINA COLD ROED CAL. 18 DISEÑO PERSONALIZADO / INCLUIE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LAMINA CALANDRADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO) INCLUIE EN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1	\$ 1.348.947	\$ 7.826	\$ 1.356.773	\$ 1.356.773	0,35%	
10.5.	PUERTA EN ALUMINIO (P5) 0,70 X 2 1/8 ANODIZADO MATE NATURAL O VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELICULA SAND BLASTING, SEGUN PLANOS SEGUN DETALLE INCLUIE EN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1	\$ 1.258.274	\$ 7.826	\$ 1.266.100	\$ 1.266.200	0,33%	
10.6.	PUERTA (P6) 2 (1'6" X 2'0" MTS EN MARCO DE 3"1/2", NAVE EN PERFILERA 1101 CON PISA VIDRIO 177, PARTIDOR EN TABLILLA EN LA PARTE SUPERIOR, VIDRIO DE 8 MM TEMPLADO DIMENSIONES DE	UND	1	\$ 2.782.285	\$ 146.235	\$ 2.928.520	\$ 2.908.500	0,76%	
10.7.	PUERTA EN ALUMINIO (P7) 0,90 X 2 1/8 ANODIZADO MATE NATURAL O VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELICULA SAND BLASTING, SEGUN PLANOS SEGUN DETALLE INCLUIE EN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	2	\$ 1.607.221	\$ 7.826	\$ 1.615.047	\$ 3.230.294	0,84%	
10.8.	PUERTA EN ALUMINIO (P7) 0,90 X 2 1/8 ANODIZADO MATE NATURAL O VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELICULA SAND BLASTING, SEGUN PLANOS SEGUN DETALLE INCLUIE EN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1	\$ 1.607.221	\$ 7.826	\$ 1.615.047	\$ 1.615.147	0,42%	
10.9.	PUERTA GARAJE CON MARCO DE 3"1/2" CUATRO NAVES CON PERFILERA 1105 CON PUERTA AUXILIAR Y CHAPA VALE 370 CINCO FALLEBAS Y ENCHAFE EN F06 CON PARTIDOR CENTRAL Y PISA VIDRIO 177, DIMENSIONES DE 3,952 x 5MTS	UND	1	\$ 671.189	\$ 163.123	\$ 834.312	\$ 834.312	0,21%	
10.10.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALERA METALICA CON PERFIL CENTRAL 0,20x 80m (SEGUN DE TALLE PLANO) SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO	UND	1	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	0,78%	
11. CARPINTERIA DE MADERA									
11.1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA SUPERIOR DE VACIO DE ESCALERA EN MADERA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR SEGUN DISEÑO	ML	4,1	\$ 223.320	\$ 4.448	\$ 227.768	\$ 933.848	0,24%	
12. INSTALACIONES ELECTRICAS									
12.1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W, 60ALBTO ELECTRONICO 2X3276 INCLUIE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32A T8	UND	5	\$ 224.483	\$ 5.575	\$ 230.058	\$ 1.150.340	0,30%	
12.2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMA CORRIENTE NORMAL DOBLE ET EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" ALAMBRE No. 12 AWG	UND	19	\$ 124.566	\$ 3.229	\$ 127.795	\$ 2.428.903	0,64%	
12.3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL 1200m INCLUIE DRIVER CC	UND	6	\$ 253.873	\$ 5.968	\$ 259.841	\$ 1.558.028	0,41%	
13. OTROS									
13.1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA EN IMITACION GRANITO PLAZO ZONA LABORATORIO ANCHO 60 M INSTALADO CON SOPORTES EN MARCO DE LADRILLO PAROL PANCREATA, INCLUIE PUJADA Y BRILLADO	ML	11,1	\$ 303.771	\$ 11.382	\$ 315.153	\$ 3.497.976	0,91%	
13.2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MÓDULO DE CAJONES Y ALMACENAMIENTO CON FACHADA MADECOR 19 MM INTERIOR MADECOR 15 MM TIPO PIZANO O SIMILAR, ACABADO SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR, INCLUIE HOJAS PARA PUERTAS CON 3 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO O ZURRÓN CON TRES CAJONES, TAPA TERRO, 3 ENTREPANOS PARA CAMISAS, MALETERO BOLLITO, TAPA SOBRE EL POYO DEL CLOSET, HERRAJES, MANAJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACION	UND	1	\$ 35.029	\$ 0.039	\$ 44.068	\$ 44.068	0,01%	
13.3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MÓDULO DE CAJONES Y ALMACENAMIENTO CON FACHADA MADECOR 19 MM INTERIOR MADECOR 15 MM TIPO PIZANO O SIMILAR, ACABADO SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR, INCLUIE HOJAS PARA PUERTAS CON 3 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO O ZURRÓN CON TRES CAJONES, TAPA TERRO, 3 ENTREPANOS PARA CAMISAS, MALETERO BOLLITO, TAPA SOBRE EL POYO DEL CLOSET, HERRAJES, MANAJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACION	UND	1	\$ 142.019	\$ 23.571	\$ 165.590	\$ 165.590	0,04%	
14. ACARREO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA									
14.1.	EVALUACION ESCOMBROS Y SOBRIANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	24,8	\$ 12.600	\$ 64.306	\$ 76.906	\$ 1.909.550	0,50%	
14.2.	ASEO GENERAL	M2	69,2	\$ 1.863	\$ 229	\$ 2.092	\$ 207.536	0,05%	
<b>COSTO DIRECTO</b>									
<b>ADMINISTRACION</b>									
IMPREVISTOS 10%									
UTILIDADES 1%									
SUMA ANTES I.V.A 6%									
I.V.A. SOBRE UTILIDADES 10%									
<b>COSTO TOTAL</b>									

**ANDRÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO**  
CONSTRATISTA  
Arquitecto de apoyo al Depto. De planeación y proyectos.  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
andres.quintero@empocaldas.com.co  
Manizales-Caldas



## ACTA DE PAGO No. 12

CONTRATO	No. 065 de 2023.
OBJETO	BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS.SA. E.S.P.
CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO
C.C. No.	1110.491.286
VALOR DEL ACTA	\$ 1,585.728

En Manizales, Caldas al día (15) del mes de Diciembre de 2023, se reunieron: **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, jefe del departamento de planeación y proyectos, en calidad de supervisor del presente contrato, en representación de la empresa de obras sanitarias de Caldas, **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**, y el contratista **ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO**, con el fin de dar trámite al pago correspondiente al acta No. 12.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

El valor correspondiente al pago que se realizara del informe de actividades No. 12 Un millón, Quinientos Ochenta y cinco mil, setecientos veintiocho pesos S. 1,585.728m/cte). <b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$25,371.662</b>
<b>VALOR ADICION</b>	<b>\$12,685.831</b>
ACTA No. 1	\$ 5,074.382
ACTA No. 2	\$ 1,691.440
ACTA No. 3	\$ 1,691.440
ACTA No. 4	\$ 3,382.880
ACTA No. 5	\$ 3,382.880
ACTA No. 6	\$ 3,382.880
ACTA No. 7	\$ 3,382.880
ACTA No. 8	\$ 3,382.880
ACTA No. 9	\$ 3,171.457
ACTA No. 10	\$ 3,171.457
ACTA No. 11	\$ 3,171.457
ACTA No. 12	\$ 1,585.728
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,585.728</b>

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Jefe Dpto de Planeación y Proyectos

  
**ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO**  
Contratista



Manizales, 15 de Diciembre de 2023

**EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE  
EMPOCALDAS S.A E.S.P, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 065 DE 2023  
CERTIFICA QUE:**

El contratista **ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1110491286 de Ibagué, Tolima, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta número **12**, del treinta (30) de Noviembre, al quince (15) de Diciembre de 2023.

Para constancia, se firma a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2023.



**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**

Jefe Depto. de Planeación y Proyectos.





## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit	890803239	CIU	3600
Dirección	Av Santander 75 - 82	Resolución DIAN	18764053338248
Responsabilidad Fiscal	R-99-PN	Autorizada	del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	RÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO	NIT/CEDULA	1110491286
DIRECCIÓN	CALLE 72A#40A-13	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3118973604	EMAIL	RESQUINTERO@EMPOCALDAS.CO
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	15/12/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento de Planeación y Proyecciones	COD. CENTRO DE COSTO	106001
NRO. CONTRATO	65		
ACTA NRO.	12		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P

TOTAL 1.585.728,00

VALOR EN LETRAS

UN MILLON, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

NOMBRE: ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO  
CÉDULA: 1110491286

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	1.052.764,82
ALCANTARILLADO	532.963,18
TOTAL	1.585.728,00



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 CEDULA DE CIUDADANIA: 111581296  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL  
 DIRECCIÓN: CLE 72 4 13 ARANJUEZ TELEFONO: 222-2322  
 TIPO EMPRESARIAL: 02 INGENIERIA PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA  
 FORMA DE REPRESENTACIÓN: UNICO  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 47845980111  
 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2023  
 TIPO DE PLANILLA: 0  
 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 20231230  
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20231230

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 47845980111  
 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2023  
 TIPO DE PLANILLA: 0  
 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 20231230  
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20231230

MESES: Noviembre AÑO: 2023  
 INDEPENDIENTES: 2023  
 9996601112

CÓDIGO	SUBTOTAL:	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
23030	230301-FORVENIR	1	\$ 203.000	1	\$ 203.000	1	\$ 203.000	1	\$ 203.000	1	\$ 203.000
SUBTOTAL:		1	\$ 203.000	1	\$ 203.000	1	\$ 203.000	1	\$ 203.000	1	\$ 203.000

CÓDIGO	SUBTOTAL:	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
EP302	EP302-SALUD TOTAL	1	\$ 158.600	1	\$ 158.600	1	\$ 158.600	1	\$ 158.600	1	\$ 158.600
SUBTOTAL:		1	\$ 158.600	1	\$ 158.600	1	\$ 158.600	1	\$ 158.600	1	\$ 158.600

CÓDIGO	SUBTOTAL:	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1423	14-23-PCSBITRA COPIAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 13.300	1	\$ 13.300	1	\$ 13.300	1	\$ 13.300	1	\$ 13.300
SUBTOTAL:		1	\$ 13.300	1	\$ 13.300	1	\$ 13.300	1	\$ 13.300	1	\$ 13.300

N.º IDENTIFICACION	NOMBRES COTIZANTE	TIPO DE SALUD	SUBTIPO COTIZANTE	VALOR	PENSIÓN		SALUD		SEGURIDAD SOCIAL		PARAFISCALES	
					FSP	INDICADOR	IBF	IBF	ADMIN	ADMIN	CCF	SENA
1	111091296	CC	111091296	\$ 203.000	\$ 0	Normal	\$ 203.000	\$ 158.600	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:		1	\$ 203.000	\$ 0	Normal	\$ 203.000	\$ 158.600	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL \$ 374.900**



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 897

FECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230740

BENEFICIARIO Orozco Gomez Carolina


C.C. N° 24344200

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°056 DE 2023

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	15,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>15,000,000.00</b>



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto

