

# CONTRATO Y AÑO	309 DE 2021	Acta N°	01 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (Incluido A.I.U e IVA)	37.185.171
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL			3. VALOR TOTAL (1+2)	37.185.171
NIT O CC:	75.031.358			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	253 del 18 de enero del 2022, rubro 2320101001030808			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	29.742.501
RP (#, rubro y fecha)	203 del 19 de enero de 2022, rubro 2320101001030808			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	7.442.670

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------


DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A
3- Pagos al FIC	N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
5- Informe de actividades o Bitácora.	X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
8- Ensayos de densidad.	N/A
9- Diseño de Mezclas.	N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
15- Acta parcial o final del contrato.	X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X
Fecha de presentación	6/04/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
0870-0007-2451	AHORROS	DAVIVIENDA


 abril 8/2022



Tecnología - Información - Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	9999000891045
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2022-01-20, 11:53:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2022 ✓
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2022 ✓
Empresa	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL ✓
CEDULA CIUDADANIA	CC 75031358
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	53758139
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1291258086
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 290.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.205.8

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860013816	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 160.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 125.000	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 5.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 290.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 290.200 ✓

GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
358		QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS /	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL	CRA 24 22 36	MANIZALES-CALDAS	8827112	SI	

GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-02	1358869330	9432110430	E	2022/02/14	2022/03/08	BANCO DANVIENDA		\$2,443,000	

MEN DE PAGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$1,269,600	\$0	\$1,269,600		
FONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$10,700	\$0	\$10,700		
PENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$101,400	\$0	\$101,400		
VENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,098,800	\$0	\$1,098,800		
TECCION	230201	800,229,739	0	1	\$58,700	\$0	\$58,700		
ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$552,800	\$0	\$552,800		
TIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$552,800	\$0	\$552,800		
ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$303,000	\$0	\$303,000		
FAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	15	\$303,000	\$0	\$303,000		
ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$317,600	\$0	\$317,600		
ET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$188,200	\$0	\$188,200		
ISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$14,700	\$0	\$14,700		
IMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$64,000	\$0	\$64,000		
IMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	3	\$50,700	\$0	\$50,700		
				15	\$2,443,000	\$0	\$2,443,000		

GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE e ICBF	
Identificación	dv	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JAIAR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL	CRA 24 22 36	MANIZALES-CALDAS	8827112	SI							

GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	9432110430	E	2022/02/14	2022/03/08	BANCO DAVIVIENDA	\$2,443,000				

ACCION DETALLADA DE APORTES

Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
		ing	rec	lde	tde	tad	top	vsp	cor	vst	sh	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1002643517	ARENAS BEDOYA HUMBERTO																	230301	30	\$1,000,000	\$140,000	ES562	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	SI	\$306,000
79002895	BUITRAGO AGUIRELO JOSE FABIAN																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5044	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	SI	\$306,000
1311933	DUQUE MEJIA ROGELIO	X																25-14	18	\$600,000	\$96,000	ES562	18	\$600,000	\$24,000	CCF11	18	\$600,000	\$24,000	14-23	18	\$600,000	\$11,800	1	\$2,400	SI	\$185,800
15990439	GAYBIA HOYOS WILLIAM ALBERTO	X																230301	1	\$33,334	\$5,400	ES562	1	\$33,334	\$1,400	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-23	1	\$33,334	\$2,400	1	\$0	SI	\$10,500
105786527	GERALDO QUINTERO FENIET	X																230301	18	\$600,000	\$96,000	EP5045	18	\$600,000	\$24,000	CCF11	18	\$600,000	\$24,000	14-23	18	\$600,000	\$41,800	18	\$0	SI	\$185,800
1002731353	LOPEZ MORALES RICARDO	X																230301	11	\$366,667	\$58,700	EP5017	11	\$366,667	\$14,700	CCF11	11	\$366,667	\$14,700	14-23	11	\$366,667	\$25,600	11	\$0	SI	\$113,700
100259647	MARILANDA OSPINA JESUS ANTONIO	X																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ES562	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	SI	\$306,000
1002596787	MARULANDA OSPINA LAUREANO	X																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ES562	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	SI	\$306,000
1057785356	MONTOYA GIRAMDO JHONNATAN RAMIRO	X																230301	18	\$600,000	\$96,000	ES562	18	\$600,000	\$24,000	CCF11	18	\$600,000	\$24,000	14-23	18	\$600,000	\$41,800	18	\$0	SI	\$185,800
1002940096	MURVAEZ TORO CARLOS ANDRES	X																230301	11	\$366,667	\$58,700	ES562	11	\$366,667	\$14,700	CCF11	11	\$366,667	\$14,700	14-23	11	\$366,667	\$25,600	11	\$0	SI	\$113,700
15991289	PALACIO MEJIA JOSE JHON JABRO	X																230301	18	\$600,000	\$96,000	EP5044	18	\$600,000	\$24,000	CCF11	18	\$600,000	\$24,000	14-23	18	\$600,000	\$41,800	18	\$0	SI	\$185,800
15990502	QUINTERO GUTIERREZ WILLIAM	X																25-14	1	\$33,334	\$5,400	ES562	1	\$33,334	\$1,400	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-23	1	\$33,334	\$2,400	1	\$0	SI	\$10,500
1057786880	RIVERA VALENCIA JHAIKER GONZALO	X	X															231001	2	\$66,667	\$10,700	EP5045	2	\$66,667	\$2,700	CCF11	2	\$66,667	\$2,700	14-23	2	\$66,667	\$4,700	2	\$0	SI	\$20,800
94418088	MELASQUEZ GARCIA ANTONIO JOSE	X																230301	18	\$600,000	\$96,000	EP5045	18	\$600,000	\$24,000	CCF11	18	\$600,000	\$24,000	14-23	18	\$600,000	\$41,800	18	\$0	SI	\$185,800
1057785669	VILLEGAS VASQUEZ JOSE YAMID	X	X															230301	2	\$66,667	\$10,700	ES562	2	\$66,667	\$2,700	CCF11	2	\$66,667	\$2,700	14-23	2	\$66,667	\$4,700	2	\$0	SI	\$20,800
Afiliados(15)																				\$7,933,336	\$1,269,600			\$7,933,336	\$317,600			\$7,561,342	\$303,000			\$7,933,336	\$52,800			\$2,443,000	



Jair de Jesus Quintero Carvajal
 NIT 75.031.358-
 Cra 21 # 30 - 03
 Tel: (320) 6862886
 Manizales - Colombia
 djquintero@hotmail.es



Factura electrónica de venta
 No. FE-18

Fecha y hora Factura

Generación	07/04/2022, 09:31
Expedición	07/04/2022, 09:31
Vencimiento	07/04/2022

Señores	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	Carrera 23 No 75-82	Ciudad	Manizales - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo	1.00	22,039,645.00
2	Administración	1.00	5,289,515.00
3	Imprevistos	1.00	1,101,982.00
4	Utilidades	1.00	1,101,982.00
5	IVA sobre utilidades	1.00	209,377.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Veintinueve millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 29,742,501.00

Observaciones:

Esta factura corresponde al Acta 01 Parcial del contrato 309 - 2021. Por favor consignar a la cuenta Ahorros Davivienda No. 0870-0007-2451 a nombre de la empresa Q&Q INGENIERIA S.A.S con NIT 901 446 821-3.

Total Bruto	29,742,501.00
Total a Pagar	29,742,501.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764026296418 aprobado en 20220307 prefijo FE desde el número 14 al 100 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 6.9
 CUFE: 444874aee4f28f3f2ac05241cb9552b71444b21967d6552e7c0dec629093e4f9bcf0147b3a1b8ef820bd0d410e2e90

Manizales, 06 de abril de 2022.


SEÑORES

EMPOCALDAS S.A E.S.P


REFERENCIA: AUTORIZACION PARA CONSIGNAR RECURSOS. CONTRATO 390-2021

JAIR DE JESÚS QUINTERO CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 75.031.358 de Neira, Caldas en calidad de contratista del contrato de la referencia que tiene por objeto "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS.", Autorizo que el pago correspondiente al acta No. 01 parcial hasta por valor de VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE (\$ 29.742.50100) sea consignado a la cuenta de ahorros DAVIVIENDA No. 0870-0007-2451 a nombre de la empresa Q&Q INGENIERIA S.A.S con NIT 901.446.821-3, representada legalmente por JESUS DAVID QUINTERO GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.817.082 de Manizales.

Para constancia de lo anterior se firma en Manizales a los 06 días del mes de abril de 2022.



JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL.
C.C 75.31.358
Contratista

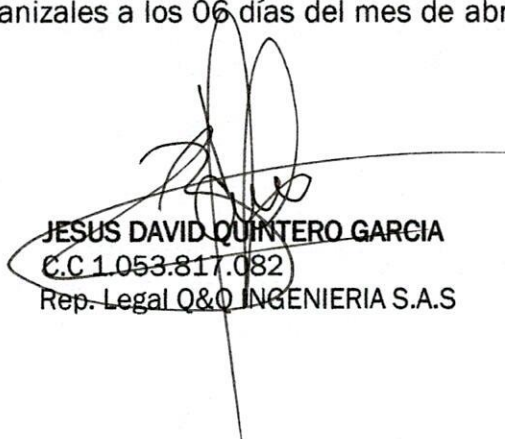

JESUS DAVID QUINTERO GARCIA
C.C 1.053.817.082
Rep. Legal Q&Q INGENIERIA S.A.S

INFORME DE OBRA CONTRATO No. 390 DE 2021

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P



CONTRATISTA

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

MANIZALES, CALDAS

ENERO DE 2022

ALCANCE DE LA OBRA:

Optimizar el sistema de red de acueducto, para prestar un mejor servicio a todos los usuarios del sector a fin de brindar agua potable y garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de la red.

1.1 FICHA TECNICA

CONTRATO:	390 de 2021
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD ÚNICA DE OFERTAS
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S.P R.L ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
OBJETO :	"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS."
CONTRATISTA:	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 37.185.171
FECHA DE INICIACION:	11 DE ENERO DE 2022
FECHA FINALIZACION INICIAL :	30 DE ENERO DE 2022 ✓

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS"

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio de Risaralda, cabecera Urbana Sector el Paraíso.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:

2.1 RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

RESUMEN DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO		37.185.171	
VALOR ADICION			
VALOR PRESENTE ACTA			29.742.501
SALDO SIN EJECUTAR			7.442.670
SUMAS IGUALES		37.185.171	37.185.171

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	

ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA.

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA No. 01 PARCIAL		EJECUTADO		%EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
8	EXCAVACIÓN									
	Excavación en material común de	M3	75.84	\$32.008	\$ 2.427.487	75.84	\$ 2.427.487	75.84	\$ 2.427.487	100%
10	Retiro de material sobrante en	M3	7.45	\$37.862	\$ 282.072	7.20	\$ 272.606	7.20	\$ 272.606	97%
11	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO									
15	Termofusión de portaflanche 14"	UN	6	\$661.138	\$ 3.966.828	6,00	\$ 3.966.828	6,00	\$ 3.966.828	100%
16	Empalmes a tubería de 14"	UN	2	\$1.479.919	\$ 2.959.838	2,00	\$ 2.959.838	2,00	\$ 2.959.838	100%
	INSTALACION DE codo oridado de	UN	1	\$599.400	\$ 599.400	1,00	\$ 599.400	1,00	\$ 599.400	100%
	Suministro Brida loca 14"	UN	2	\$649.350	\$ 1.298.700	2,00	\$ 1.298.700	2,00	\$ 1.298.700	100%
	INSTALACION BRIDALOCA DE 14"	UN	4	\$299.700	\$ 1.198.800	4,00	\$ 1.198.800	4,00	\$ 1.198.800	100%
	Suministro de portaflanche de 14"	UN	2	\$1.416.083	\$ 2.832.166	2,00	\$ 2.832.166	2,00	\$ 2.832.166	100%
	Acero de refuerzo	KG	122	\$8.143	\$ 993.446	120,00	\$ 977.160	120,00	\$ 977.160	98%
	Maquinaria para excavaciones de reparaciones (retroexcavadora)	HR	48	\$89.910	\$ 4.315.680	23,00	\$ 2.067.930	23,00	\$ 2.067.930	48%
	Concreto de 4000 PSI usado en	M3	2,5	\$879.120	\$ 2.197.800	2,50	\$ 2.197.800	2,50	\$ 2.197.800	100%
20	LLENOS									
22	Lleno compactado con material de	M3	176,65	\$20.679	\$ 3.652.945	175,20	\$ 3.622.961	175,20	\$ 3.622.961	99%
	Lleno compactado con material de la obra a maquina	M3	176,65	\$15.385	\$ 2.717.760	175,20	\$ 2.695.452	175,20	\$ 2.695.452	99%
23	Acompañamiento social durante	MES	1	\$1.933.065	\$ 1.933.065	0,50	\$ 966.533	0,50	\$ 966.533	50%
24	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagarán	GL	1	\$2.491.506	\$ 2.491.506		\$ 0	-	\$ 0	0%
25	Trabajador siso	MES	1	\$3.317.679	\$ 3.317.679	0,50	\$ 1.658.840	0,50	\$ 1.658.840	50%
	COSTO DIRECTO				\$ 27.554.777		\$ 22.039.645		\$ 22.039.645	
	ADMINISTRACION	%	24,0		6.613.146		\$ 5.289.515		\$ 5.289.515	
	IMPREVISTOS	%	5,0		1.377.739		\$ 1.101.982		\$ 1.101.982	
	UTILIDADES	%	5,0		1.377.739		\$ 1.101.982		\$ 1.101.982	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		261.770		\$ 209.377		\$ 209.377	
	TOTAL				37.185.171		\$ 29.742.501		\$ 29.742.501	

REGISTRO FOTOGRAFICO:



En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se han realizado en las diferentes veredas durante la ejecución el contrato de obra cuyo objeto es la "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS" Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ el cual aprobó cada una de estas.



JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
75.031.358 DE NEIRA-CALDAS
CONTRATISTA



NOMINA OPERATIVA MAIZANARES DEL 12 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2022

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	FIRMA
								PENSION	SALUD	TOTAL		
ROGELIO DUQUE MEJIA	1.311.933	AYUDANTE	18,0	\$ 1.000.000	\$ 600.000	\$ 70.303	\$ 670.303	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 48.000	\$ 622.303	Rogelio Duque Mejia
JOSE JHON PALACIO MEJIA	15.991.289	AYUDANTE	18,0	\$ 1.000.000	\$ 600.000	\$ 70.303	\$ 670.303	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 48.000	\$ 622.303	Jose Jhon Palacio
JHONNATAN RAMIRO MONTOYA GRALDO	1.057.785.356	AYUDANTE	18,0	\$ 1.000.000	\$ 600.000	\$ 70.303	\$ 670.303	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 48.000	\$ 622.303	Jhonattan R. Montoya
TOTAL NOMINA OBRA			54,0	\$ 3.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 210.909,60	\$ 2.010.909,60	\$ 72.000,00	\$ 72.000,00	\$ 144.000,00	\$ 1.866.909,00	

JJM

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	30/01/2022	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Objeto:	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS.
Nombre Contratista:	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
Fecha del contrato:	28/12/2021
Plazo de ejecución:	30 DÍAS
Valor inicial:	\$ 37.185.171
Fecha de iniciación:	11/01/2022
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	30/01/2022
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	-
Adición en tiempo:	30 DÍAS
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	79.98%
Avance físico Acumulado	79.98%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de obra)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
RISARALDA	ACUEDUCTO	0.06

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución inicial:	30 DIAS
Plazo adicional:	0
Tiempo total transcurrido:	19 DIAS
Avance Porcentual:	63,3 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe) **(ANEXO)**

1.5. Problemáticas con la obra:

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 37.185.171
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 29.742.501
Porcentaje ejecutado en el periodo:	79.98%
Inversión total ejecutada:	\$ 29.742.501
Porcentaje total ejecutado:	79.98%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101050458	11/01/2022	30/04/2022	\$11.155.551,30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101050458	11/01/2022	30/01/2025	\$ 7.437.034,20



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101050458		5 AÑOS	\$ 7.437.034,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101038524	11/01/2022	30/04/2022	\$11.155.551,30

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
ROGELIO DUQUE MEJIA	X	X	X		
JOSE JHON PALACIO MEJIA	X	X	X		
JHONNATAN RAMIRO MONTOYA GIRALDO	X	X	X		

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO

No. DE PLANILLA 9432110430 OPERADOR: APORTES EN LINEA

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
04/01/2022	A	A	A	A	A	A	A	A	
20/01/2022	A	A	A	A	A	A	A	A	

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación).

SE ANEXA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población Urbana Municipio de Risaralda, específicamente sector el paraíso.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

NOMBRE DEL SUPERVISOR:


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ANEXO 1: INFORME DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA No. 01 PARCIAL		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
8	EXCAVACIÓN									
	Excavación en material común de	M3	75,84	\$32.008	\$ 2.427.487	75,84	\$ 2.427.487	75,84	\$ 2.427.487	100%
10	Retiro de material sobrante en	M3	7,45	\$37.862	\$ 282.072	7,20	\$ 272.606	7,20	\$ 272.606	97%
11	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO									
15	Termofusión de portaflanche 14"	UN	6	\$661.138	\$ 3.966.828	6,00	\$ 3.966.828	6,00	\$ 3.966.828	100%
16	Empalmes a tubería de 14"	UN	2	\$1.479.919	\$ 2.959.838	2,00	\$ 2.959.838	2,00	\$ 2.959.838	100%
	INSTALACION DE codo oridado de	UN	1	\$599.400	\$ 599.400	1,00	\$ 599.400	1,00	\$ 599.400	100%
	Suministro Brida loca 14"	UN	2	\$649.350	\$ 1.298.700	2,00	\$ 1.298.700	2,00	\$ 1.298.700	100%
	INSTALACION BRIDALOCA DE 14"	UN	4	\$299.700	\$ 1.198.800	4,00	\$ 1.198.800	4,00	\$ 1.198.800	100%
	Suministro de portaflanche de 14"	UN	2	\$1.416.083	\$ 2.832.166	2,00	\$ 2.832.166	2,00	\$ 2.832.166	100%
	Acero de refuerzo	KG	122	\$8.143	\$ 993.446	120,00	\$ 977.160	120,00	\$ 977.160	98%
	Maquinaria para excavaciones de reparaciones (retroexcavadora)	HR	48	\$89.910	\$ 4.315.680	23,00	\$ 2.067.930	23,00	\$ 2.067.930	48%
	Concreto de 4000 PSI usado en	M3	2,5	\$879.120	\$ 2.197.800	2,50	\$ 2.197.800	2,50	\$ 2.197.800	100%
20	LLENOS									
22	Lleno compactado con material de	M3	176,65	\$20.679	\$ 3.652.945	175,20	\$ 3.622.961	175,20	\$ 3.622.961	99%
	Lleno compactado con material de la obra a maquina	M3	176,65	\$15.385	\$ 2.717.760	175,20	\$ 2.695.452	175,20	\$ 2.695.452	99%
23	Acompañamiento social durante	MES	1	\$1.933.065	\$ 1.933.065	0,50	\$ 966.533	0,50	\$ 966.533	50%
24	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagarán	GL	1	\$2.491.506	\$ 2.491.506		\$ 0		\$ 0	0%
25	Trabajador siso	MES	1	\$3.317.679	\$ 3.317.679	0,50	\$ 1.658.840	0,50	\$ 1.658.840	50%
	COSTO DIRECTO				\$ 27.554.777		\$ 22.039.645		\$ 22.039.645	
	ADMINISTRACION	%	24,0		6.613.146		\$ 5.289.515		\$ 5.289.515	
	IMPREVISTOS	%	5,0		1.377.739		\$ 1.101.982		\$ 1.101.982	
	UTILIDADES	%	5,0		1.377.739		\$ 1.101.982		\$ 1.101.982	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		261.770		\$ 209.377		\$ 209.377	
	TOTAL				37.185.171		\$ 29.742.501		\$ 29.742.501	

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	37.185.171	
VALOR ADICION		
VALOR PRESENTE ACTA		29.742.501
SALDO SIN EJECUTAR		7.442.670
SUMAS IGUALES	37.185.171	37.185.171

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ANEXO 2: CONTROL DE CANTIDADES.

CONTROL DE CANTIDADES								
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS								
Fecha			Excavación en material común de 0 a 4 mts					
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3	
30/1/2022		60,00	1,00	1,26	1,00	75,84	75,84	
						0,00	75,84	
	Total					75,84		
Fecha	ITEM:		Retiro de material sobrante en vehículo automotor				Total Acumulado	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3	
30/1/2022		60,00	1,00	0,12	1,00	7,20	7,20	
						7,20		
	Total					7,20		
Fecha	ITEM:		Termofusión de portaflanche				Total	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022					1,00	1,00	1,00	
						6,00		
	Total					6,00		
Fecha	ITEM:		Empalmes a tubería de 14"				Total Acumulado	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022					1,00	1,00	1,00	
					1,00	1,00	2,00	
	Total					2,00		
Fecha	ITEM:		Instalación de codo bridado de 14 x 45				Total Acumulado	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						1,00	1,00	
						1,00		
	Total					1,00		
Fecha	ITEM:		Suministro de BRIDA loca de 14" de polietileno				Total Acumulado	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						2,00	2,00	
						2,00		
	Total					2,00		
Fecha	ITEM:		Instalación de brida loca de 14"				Total Acumulado	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						4,00	4,00	
						4,00		
	Total					4,00		
Fecha	ITEM:		Suministro de portflanche de 14"				Total Acumulado	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						2,00	2,00	
						2,00		
	Total					2,00		

922



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha	ITEM:		Acero de refuerzo				Total Acumulado
	Ubicación	No. Barra	Peso X ml	Longitud	Cantidad	Total KG	Total KG
30/1/2022		4,00	1,00	1,50	20	120,00	120,00
	Total						120,00
Fecha	ITEM:		Maquinaria para excavaciones de reparaciones (retroexcavadora)				Total Acumulado
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total HR	Total HR
30/1/2022					6,00	6,00	6,00
					5,50	5,50	11,50
					6,00	6,00	17,50
					5,50	5,50	23,00
						0,00	23,00
						0,00	23,00
						0,00	23,00
						0,00	23,00
						0,00	23,00
	Total						23,00
Fecha	ITEM:		Concreto de 4000 PSI usado en anclaje de semicodo				Total Acumulado
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3
30/1/2022		1,50	1,50	1,10	1,00	2,50	2,50
	Total						2,50
Fecha	ITEM:		Lleno compactado con material de obra				Total Acumulado
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3
30/1/2022		60,00	1,60	3,65	0,50	175,20	175,20
	Total						175,20
Fecha	ITEM:		Lleno compactado con material de obra a maquina (retroexcavadora)				Total Acumulado
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3
30/1/2022		60,00	1,60	3,65	0,50	175,20	175,20
	Total						175,20

ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRAFICO






F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

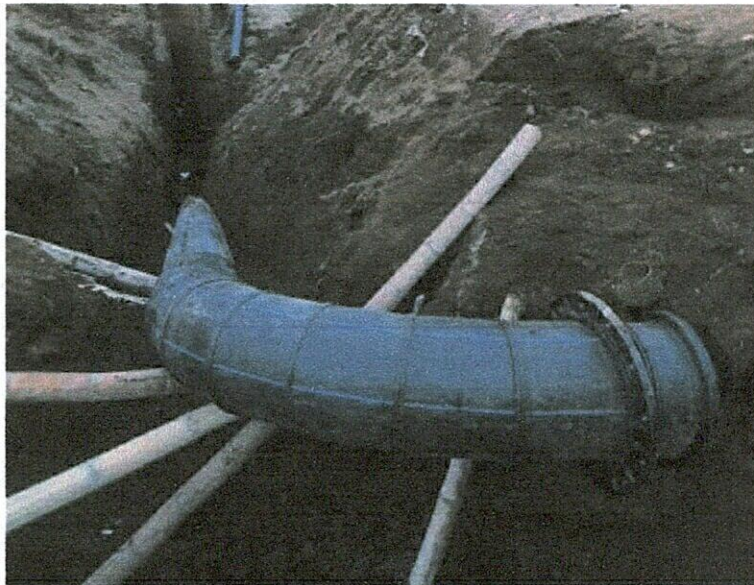

JMA

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C.

CONTRATO

X

O.C.

CONTRATO

309/2021

Acta N°

01 PARCIAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14105 RISARALDA GASTOS COMPARTIDOS	13C1107 Reposición de Redes	29.533.124	209.377	29.742.501	ACUEDUCTO	29.742.501	-	29.742.501
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-


SUBTOTAL FACTURA PAG-1	29.533.124	209.377	29.742.501	-	29.742.501
------------------------	------------	---------	------------	---	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---

CONTINUA 2

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	

ACTA No. 01 PARCIAL

CONTRATO N°: 309 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACION: SOLICITUD ÚNICA DE OFERTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A.E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

CONTRATISTA: JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
C.C: 75031358
MUNICIPIO: RISARALDA-CALDAS


COSTO INICIAL:	\$ 37.185.171
ADICION	\$ 0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL	\$ 29.742.501
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7.442.670

COSTO CONTRATO


RECURSOS: PROPIOS
SUPERVISOR JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
CDP: 01019 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021
RP 001235 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de enero de 2022, se reunieron los señores JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL contratista, con el fin de realizar el acta No. 01 PARCIAL del contrato de obra No. 309 DE 2021

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
contratista

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS



CONTRATO	309 DE 2021	ACTA No.: 01 PARCIAL	FECHA CORTE: ENERO 30 DE ENERO 2022
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS.		FECHA INICIACIÓN: 11 DE ENERO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: 30 DE ENERO DE 2022
MUNICIPIO: RISARALDA		VALOR CONTRATO: \$ 37.185.171	VALOR ADICIÓN: \$ 0
REPRESENTANTE LEGAL:		SUPERVISIÓN: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA: ENERO 30 DE 2022

9 febrero.

CONT #	309 DE 2021	EMPOCALDAS S.A.E.S.P	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
OBJETO:	<u>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS</u>		


ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA No. 01 PARCIAL		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
8	EXCAVACIÓN									
	Excavación en material común de 2 a 4 m	M3	75,84	\$32.008	\$ 2.427.487	75,84	\$ 2.427.487	75,84	\$ 2.427.487	100%
10	Retiro de material sobrante en vehículo	M3	7,45	\$37.862	\$ 282.072	7,20	\$ 272.606	7,20	\$ 272.606	97%
11	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO									
15	Termofusión de portaflanche 14"	UN	6	\$661.138	\$ 3.966.828	6,00	\$ 3.966.828	6,00	\$ 3.966.828	100%
16	Empalmes a tubería de 14"	UN	2	\$1.479.919	\$ 2.959.838	2,00	\$ 2.959.838	2,00	\$ 2.959.838	100%
	INSTALACION DE codo oridado de 14 X 45	UN	1	\$599.400	\$ 599.400	1,00	\$ 599.400	1,00	\$ 599.400	100%
	Suministro Brida loca 14" polietileno	UN	2	\$649.350	\$ 1.298.700	2,00	\$ 1.298.700	2,00	\$ 1.298.700	100%
	INSTALACION BRIDALOCA DE 14"	UN	4	\$299.700	\$ 1.198.800	4,00	\$ 1.198.800	4,00	\$ 1.198.800	100%
	Suministro de portaflanche de 14"	UN	2	\$1.416.083	\$ 2.832.166	2,00	\$ 2.832.166	2,00	\$ 2.832.166	100%
	Acero de refuerzo	KG	122	\$8.143	\$ 993.446	120,00	\$ 977.160	120,00	\$ 977.160	98%
	Maquinaria para excavaciones de reparaciones (retroexcavadora)	HR	48	\$89.910	\$ 4.315.680	23,00	\$ 2.067.930	23,00	\$ 2.067.930	48%
	Concreto de 4000 PSI usado en anclaje de	M3	2,5	\$879.120	\$ 2.197.800	2,50	\$ 2.197.800	2,50	\$ 2.197.800	100%
20	LLENOS									
22	Lleno compactado con material de la obra	M3	176,65	\$20.679	\$ 3.652.945	175,20	\$ 3.622.961	175,20	\$ 3.622.961	99%
	Lleno compactado con material de la obra a maquina (retroexcavadora)	M3	176,65	\$15.385	\$ 2.717.760	175,20	\$ 2.695.452	175,20	\$ 2.695.452	99%
23	Acompañamiento social durante toda la obra	MES	1	\$1.933.065	\$ 1.933.065	0,50	\$ 966.533	0,50	\$ 966.533	50%
24	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagarán según factura más AIU	GL	1	\$2.491.506	\$ 2.491.506		\$ 0		\$ 0	0%

1/2


25	Trabajador siso	MES	1	\$3.317.679	\$ 3.317.679	0,50	\$ 1.658.840	0,50	\$ 1.658.840	50%
	COSTO DIRECTO				\$ 27.554.777		\$ 22.039.645		\$ 22.039.645	
	ADMINISTRACION	%	24,0		6.613.146		\$ 5.289.515		\$ 5.289.515	
	IMPREVISTOS	%	5,0		1.377.739		\$ 1.101.982		\$ 1.101.982	
	UTILIDADES	%	5,0		1.377.739		\$ 1.101.982		\$ 1.101.982	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		261.770		\$ 209.377		\$ 209.377	
	TOTAL				37.185.171		\$ 29.742.501		\$ 29.742.501	

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	37.185.171
VALOR ADICION	
VALOR PRESENTE ACTA	29.742.501
SALDO SIN EJECUTAR	7.442.670
SUMAS IGUALES	37.185.171

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	



JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
Contratista



JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Supervisor

CONTROL DE CANTIDADES								
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS								
Fecha	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3	
30/1/2022		60,00	1,00	1,26	1,00	75,84	75,84	
						0,00	75,84	
						75,84		
Fecha	ITEM:	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3	
30/1/2022		60,00	1,00	0,12	1,00	7,20	7,20	
							7,20	
						7,20		
Fecha	ITEM:	Termofusión de portaflanche					Total	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022					1,00	1,00	1,00	
							6,00	
						6,00		
Fecha	ITEM:	Empalmes a tubería de 14"					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022					1,00	1,00	1,00	
					1,00	1,00	2,00	
						2,00		
Fecha	ITEM:	Instalación de codo bridado de 14 x 45					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						1,00	1,00	
							1,00	
						1,00		
Fecha	ITEM:	Suministro de BRIDA loca de 14" de polietileno					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						2,00	2,00	
							2,00	
						2,00		
Fecha	ITEM:	Instalación de brida loca de 14"					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						4,00	4,00	
							4,00	
						4,00		
Fecha	ITEM:	Suministro de portflancho de 14"					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	Total UN	
30/1/2022						2,00	2,00	
							2,00	
						2,00		
Fecha	ITEM:	Acero de refuerzo					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	No. Barra	Peso X ml	Longitud	Cantidad	Total KG	Total KG	
30/1/2022		4,00	1,00	1,50	20	120,00	120,00	
							120,00	
						120,00		
Fecha	ITEM:	Maquinaria para excavaciones de reparaciones (retroexcavadora)					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total HR	Total HR	
30/1/2022					6,00	6,00	6,00	
					5,50	5,50	11,50	
					6,00	6,00	17,50	
					5,50	5,50	23,00	
					0,00	0,00	23,00	
					0,00	0,00	23,00	
					0,00	0,00	23,00	
					0,00	0,00	23,00	
						23,00		
Fecha	ITEM:	Concreto de 4000 PSI usado en anclaje de semicodo					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3	
30/1/2022		1,50	1,50	1,10	1,00	2,50	2,50	
							2,50	
						2,50		
Fecha	ITEM:	Lleno compactado con material de obra					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3	
30/1/2022		60,00	1,60	3,65	0,50	175,20	175,20	
							175,20	
						175,20		
Fecha	ITEM:	Lleno compactado con material de obra a maquina (retroexcavadora)					Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3	
30/1/2022		60,00	1,60	3,65	0,50	175,20	175,20	
							175,20	
						175,20		

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
Contratista

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Supervisor
