

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	101-2022	Acta N° 03 LIQUIDACIÓN	1. VALOR INICIAL (incluido IVA e IVM)	99.501.704
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S.		2. VALOR ADICIONAL	N/A
NIT O CC:	900 545.440-8		3. VALOR TOTAL (1+2+3)	99.412.682
CDP (#, rubro y fecha)	FECHA 26/01/2022 00376 RUBRO 2320101001030810		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	79.601.353
RP (#, rubro y fecha)	FECHA 26/01/2022 000359 RUBRO 2320101001030810		5. VALOR PRESENTI ACTA (-)	19.811.319
			6. SALDO	89.022

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS - CONVENIO 277/21 MPIO ANSERMA	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO
------------------	---	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autorizaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		X	
9- Diseño de Mezclas.		X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		X	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Solo aplica para el acta final)		X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	
16- Certificado de existencia de lectura electrónica como título valor		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Factura original o Documento equivalente.		X
Acta parcial o final del contrato		X
Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autorizaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

De PATT
08-08-2022
A.02 m

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
550046169986901	CORRIENTE	DAVIVIENEV
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bucaramanga, 29 de julio de 2.022

Dirigido A:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A ESP

Yo, DIEGO ALEXANDER VELASCO VILLAMIZAR, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.098.789.260, en mi condición de Contador Público, manifiesto bajo la gravedad de juramento que RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con Nit. 900.945.440-8, ha cumplido con las obligaciones de los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha Y se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Firma

Diego Velasco

Nombre DIEGO ALEXANDER VELASCO VILLAMIZAR

C.C No 1.098.789.260 de Bucaramanga.

T.P 251926-T

Cargo CONTADOR PÚBLICO

Nota: lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

CALLE 35 N° 17-77 OFICINA 1308 EDIFICIO BANCOQUIA
BUCARAMANGA – S/DER
contabilidadredimac@gmail.com
318 5168450

214

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

251926-T

DIEGO ALEXANDER VELASCO VILLAMIZAR
C.C. 1098789260
RES. INSCRIPCIÓN 1136 DEL 21/12/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



259883

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

280462

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F R F 1 2 R 4 8 4 4 2 5 F F C 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALEXANDER VELASCO VILLAMIZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098789260 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 251926-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *.....
*.....
*.....

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.789.260**
VELASCO VILLAMIZAR

APELLIDOS
DIEGO ALEXANDER

NOMBRES
Diego Velasco

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-SEP-1996**

GUACA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-OCT-2014 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2700100-00854059-M-1098789260-20150103

0042147027A 1 43022124

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO
IS	REGISTRADA	UBI DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS	CL. 36 17 77 OFICINA 308	31273263	COBENICOL@GMAIL.COM
FORMA PRESTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	COORDO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ONCA	S - EMPRESA DE 2014		SANTANDER		BUCARAMANGA
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ANTERIOR (REVALUACION)	FECHA PAGO (REVALUACION)	TIPO PLANILLA	NUMERO PLANILLA	CONTENIDO EMPLEADO SPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PAGO			TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-08	E	8009801	850.208	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					
Código EPS	Nombre	MT	Contrato Obligatorio	UPC Adicional	No. Aducciones
EP502	SISA Total EPS	80173007-4	90.000		
EP507	Nuevo EPS	80173004-2	40.000		

Valor	No. Aducciones	Lizencia Maternidad		Etapas	Valor More Subsidio	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		Valor	No. Aducciones					
0	0	0	0	0	0	0	40.000	1
0	0	0	0	0	0	0	40.000	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	MT	Contrato Obligatorio	UPC Adicional	No. Aducciones
20079	Produccion (M + Produccion)	80329030-6	10.000		0
20089	Pension	80329030-4	200.000		0

Valor More Subsidio	Valor More Colocacion	Etapas	Valor More Subsidio	Valor More PGP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0.000	1
0	0	0	0	0	200.000	2

TOTALES REGIMEN LABORALES

Código ARL	Nombre	MT	Contrato Obligatorio	No. Aducciones	Incapacidades
14-11	ARL SURSA	80030306-5	140.200		140.200

Valor More Colocacion	Valor More Subsidio	No. Recibido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Subsidio	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	1.400	140.200	1
0	0	0	0	0	200.000	2

TOTALES GAFAS

Código CDP	Nombre	MT	Valor Aporte	Dias More	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CDP11	Comp Tasa Cobros	800804180-5	40.000	0	0	40.000	2
CCF48	Contribucion Sal Social	800811233-7	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias More	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Type Aducciones	No. Aducciones Reportadas	Valor antes de IGC, LMA, ISP y MSA	Total a Pagar
Salud	2	80.000	80.000
Pension	2	300.000	300.000
Regimen Laborales	1	140.200	140.200
CDP	2	80.000	80.000
ESAF	0	0	0
CCF	0	0	0
MCN	0	0	0
CCNA	0	0	0
TOTALES	7	500.200	500.200

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLABILLA			
SPD	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	FORMA DE PAGO AUTOLIQUIDACION	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLABILLA	CANTIDAD
10	RED DE INCLUSION MACROBANCARIA Y CONSTRUCCION SAS	CL 36 17 OFICINA 1008	310213243	MEMBRO PLABILLA	01/08/2022	MEMBRO PLABILLA	IMPORTE 2
FORMA PRESENTACION	NOMBRE APORTANTE	CODIGO DEPARTAMENTO	CODIGO MUNICIPIO	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	TOTAL A PAGAR
EP2037	RED DE INCLUSION MACROBANCARIA Y CONSTRUCCION SAS	BOGOTA	BOGOTAS	MEMBRO PLABILLA	MEMBRO PLABILLA	MEMBRO PLABILLA	MEMBRO PLABILLA

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLABILLA			
SPD	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	FORMA DE PAGO AUTOLIQUIDACION	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLABILLA	CANTIDAD
10	RED DE INCLUSION MACROBANCARIA Y CONSTRUCCION SAS	CL 36 17 OFICINA 1008	310213243	MEMBRO PLABILLA	01/08/2022	MEMBRO PLABILLA	IMPORTE 2
FORMA PRESENTACION	NOMBRE APORTANTE	CODIGO DEPARTAMENTO	CODIGO MUNICIPIO	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	TOTAL A PAGAR
EP2037	RED DE INCLUSION MACROBANCARIA Y CONSTRUCCION SAS	BOGOTA	BOGOTAS	MEMBRO PLABILLA	MEMBRO PLABILLA	MEMBRO PLABILLA	MEMBRO PLABILLA

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	MT	Cobertura Obligada
EP2002	Salud Total EPS	800130674	0
EP2037	Salud EPS	800192364	18.758

Inscripciones		Límites Individuales		Valor	No. Autorizaciones	Valor	No. Autorizaciones	Valor	Valor More Cobertura	Valor More UPD	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.758	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN	
Código AFP	Nombre
200301	Pensión
MT	800218844
Cobertura Obligatoria	214,170

TOTALES PENSIÓN	
Código AFP	Nombre
200301	Pensión
MT	800218844
Cobertura Obligatoria	214,170

TOTALES RECURSOS LABORALES

TOTALES RECURSOS LABORALES	
Código ARL	Nombre
18-11	ARL SURA
MT	800017955
Cobertura Obligada	102.100

TOTALES RECURSOS LABORALES	
Código ARL	Nombre
18-11	ARL SURA
MT	800017955
Cobertura Obligada	102.100

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre
CCF11	Comp Fier Calles
CCF48	Comercio Sotender
MT	800200181
Valor Aporte	43.300
Días Aporte	0
Valor More Aporte	0
Total a Pagar	43.300
No. Afiliados	1

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre
CCF11	Comp Fier Calles
CCF48	Comercio Sotender
MT	800200181
Valor Aporte	43.300
Días Aporte	0
Valor More Aporte	0
Total a Pagar	43.300
No. Afiliados	1

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Aporte	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, por y More	Total a Pagar
Salud		2	58.708	58.708
Pensión		1	214.170	214.170
Recursos Laborales		1	102.100	102.100
CCF		2	50.100	50.100
ESAP		0	0	0
CCF		0	0	0
MEN		0	0	0
SENA		0	0	0
TOTALES		6	455.078	455.078

TIPO		DATOS DEL APORTANTE				CORREO		DIRECCIONADO PAGO ADJUDICACIONES Y SALUD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	UBICACION	TELEFONO	DOMICILIO	DOMICILIO	BOLETA DE IDENTIFICACION	
UNICA	El - Inicial de 2017	NOMBRE APORTANTE	CI. 58 11707838	3352/37843	CIUDAD / MUNICIPIO	BUENOS AIRES	SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ADJUDICADA	FORMA PAGO APORTACION (BOLETA DE IDENTIFICACION)	FECHA PAGO (NUMERADOR)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO INGRESOS			IMPUESTOS
2022-08	2022-07	11/09/2022	88888888	2
				TOTAL A PAGAR
				3434.000

DETALLE POR COTIZANTE

No. Tipo Cotizante	REFERENCIAL	APELLIDO Y NOMBRE	ESTADOCIVIL	CATEGORIA	DIA	MES	AÑO	VALOR COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR	REDES LABORALES			DOP			PARAMETRALES		
												REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA
1	02	RODRIGUEZ						15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70
2	02	LOPEZ						15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	76534583	1580162589 /	01/08/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900945440**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.183.245.38**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 49,528.00** /
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 49,528.00	COP\$ 49,528.00

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

76534583

No. Autorización/CUS

1580162589

Fecha y Hora

01/08/2022

Número de Identificación

900945440

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

8

Departamento

SANTANDER

Dirección de Domicilio

CL 35 17 77 OFICINA 1308

Localización

Nacional

Correo electrónico

contabilidadredimac@gmail.com

Regional

Santander

Número Licencia de Obra

101

Nombre Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha Terminación Obra

27/07/2022

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

7

Costo Total Mano de Obra

3567139.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA T

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad de Domicilio

BUCARAMANGA

Teléfono de Contacto

+57,318 2753543

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-068-000000

Número Contrato de Obra

101

Fecha Inicio Obra

16/04/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

19811319.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

49528.00

Valor del Pago

49528.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	74350966	1361345593	09/03/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900945440**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **167.0.48.82**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 31,427.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 31,427.00	\$ 31,427.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	74350966	1361345593	09/03/2022

Número de Identificación

900945440

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

68

Dirección de Domicilio

CL 35 17 77 OFICINA 1308

Localización

1

Correo electrónico

contabilidadredimac@gmail.com

Regional

68

Número Licencia de Obra

101

Nombre Obra

OBRAS COLPLEMENTARIAS

Fecha Terminación Obra

09/03/2022

Tipo FIC

2

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

2866667.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA T

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

6800100

Ciudad de Domicilio

BUCARAMANGA

Teléfono de Contacto

+57,318 2753543

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-068-000000

Número Contrato de Obra

101

Fecha Inicio Obra

04/02/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

12570683.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4

Aporte FIC

31427.00

Valor del Pago

31427.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	75708458	1499220871	10/06/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900945440**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.253.29.151**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 167,577.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 167,577.00	COPS 167,577.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	75708458	1499220871	10/06/2022

Número de Identificación

900945440

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

68

Dirección de Domicilio

CL 35 17 77 OFICINA 1308

Localización

1

Correo electrónico

contabilidadredimac@gmail.com

Regional

68

Número Licencia de Obra

101

Nombre Obra

OBRAS COLPLEMENTARIAS

Fecha Terminación Obra

15/04/2022

Tipo FIC

2

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

4612405.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA T

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

6800100

Ciudad de Domicilio

BUCARAMANGA

Teléfono de Contacto

+57,318 2753543

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-068-000000

Número Contrato de Obra

101

Fecha Inicio Obra

09/03/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

67030680.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7

Aporte FIC

167577.00

Valor del Pago

167577.00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8380f5c57853f3b53eeeb1ac6ade731cf698b6a7094e8a0866fb64264e41cfe
 88f77d68bc2a69b11f467a0a147be7b89

Número de Factura: RED-9 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 01/08/2022 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
 Fecha de Vencimiento: 04/08/2022 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
 Nombre Comercial: RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
 NIT del Emisor: 900945440 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Santander
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Bucaramanga
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA Dirección: CL 35 17 77 OF 1308
 Actividad Económica: 4290 Teléfono / Móvil: 6848442
 Correo: contabilidadredimac@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP
 Nombre Comercial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 890803239 Departamento: Caldas
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Manizales
 Régimen fiscal: O-13 Dirección: CR 23 75 82
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA Teléfono / Móvil: 8867080
 Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	45200000-9	Acta recibo final contrato 101 de 2022 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA NOVIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2 ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANGERMA CALDAS.	NIU	1,00	\$ 14.680.488,33	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.680.488,33
2	45200000-9	Administración 30%	NIU	1,00	\$ 4.110.536,73	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.110.536,73
3	45200000-9	Imprevistos 1%	NIU	1,00	\$ 146.804,88	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 146.804,88
4	45200000-9	Utilidad 3%	NIU	1,00	\$ 724.024,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.464,04	10,00			\$ 724.024,42

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-01 11:16:20
 Documento generado el: 2022-08-01 11:16:19
 Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.471.854,36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	734.024,42
IVA	139.464,64
IVC	0,00
Bollos	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	139.464,64
Total neto factura (=)	19.811.319,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 19.811.319,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18769025702347

Rango desde: 6

Rango hasta: 100

Vigencia: 2023-02-22

MR



CERTIFICADO

**BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,**

11/01/2019

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S A S** con NIT número **9009454408**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

0560046169996991 ✓

Fecha de apertura

08/08/2018

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

OBJETO:

“OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS”

INFORME DE CONTRATISTA



INFORME DE LIQUIDACIÓN 03

CONTRATO N.º 101 DE 2022



INTRODUCCIÓN



El proyecto "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

Se encuentra localizado en el municipio de Anserma, Departamento de Caldas en el barrio San Isidro, el cual se da mediante asociación de las partes y permiten la continuidad del mejoramiento de la movilidad y reposición redes de acueducto y alcantarillado en el sector.

1. TIPO DE CONTRATO: OBRA N.º 101

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	101 DE 2022
OBJETO:	"OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".
VALOR INICIAL:	\$99.501.704,00
VALOR ADICIONAL:	\$0,00
VALOR EJECUTADO:	\$99.412.682,00
SALDO:	\$89.022,00
PLAZO INICIAL:	60 días calendario a partir de la fecha de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	75 días calendario
CONTRATISTA:	RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN
SUPERVISOR:	ING. JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIRAZ
ANTICIPO (30%)	N.A.
FECHA DE INICIACION:	04-02-2022
FECHA DE TERMINACION:	04-04-2022
MUNICIPIO:	ANSERMA
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	29-07-2022

1.2. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Durante el presente período se presentaron dos (02) prórrogas al contrato de la siguiente forma:

- Prórroga No.1 (30 días calendario)
- Prórroga No.2 (45 días calendario)

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LOS FRENTES DE LA OBRA.

2.1. ACTIVIDADES TECNICAS

2.1.1. ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO

- ✓ Se realiza instalación de rejilla en sumidero lineal y las reparaciones requeridas.
- ✓ Se suministra e instala tapas de hierro fundido en los pozos del tramo 3 con D=0.60m.

2.1.2. LLENOS

- ✓ Se instala arena para base y atraque.
- ✓ Se realiza llenos con material de obra.
- ✓ Se realiza llenos con material de cantera de préstamo.

Las actividades anteriores fueron afectadas por las jornadas invernales del municipio en los meses de abril, mayo y junio lo cual generó retrasos y algunas pérdidas de material, posteriormente se presentan las evidencias en registro fotográfico.

2.1.3. EXCAVACIÓN

- ✓ Se realizan excavaciones de 0 a 2m para zanja principal y domiciliarias de acueducto.
- ✓ Se realiza retiro de todo el material de obra.

2.1.4. ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO

- ✓ Se hace instalación de tubería PVC de 2" (red principal) para la reposición de la red de suministro, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas de Empocaldas.
- ✓ Se realizan las instalaciones de tubería de 1/2" para domiciliarias, adicionalmente se adiciona otra domiciliaria para los lotes no intervenidos, acorde con lo requerido por el dueño y el cual fue imposible

contactarse y hasta mediados de Junio se hace presente.

- ✓ Se realiza la conexión hasta el medidor para las 9 domiciliarias.
- ✓ Se instalan las Tee de reducción de 2" a 1/2" para las 9 domiciliarias.
- ✓ De acuerdo con lo requerido por la supervisión del proyecto, se realiza prueba de hermeticidad sobre la tubería de acueducto instalada durante 2 días, la cual presentaron pequeñas fugas y estos fueron reparados.
- ✓ Al terminar la prueba se realiza el empalme de la red de suministro nueva con la red de suministro existente, luego de realizar esta actividad se dejan las excavaciones abiertas para la inspección al momento de abrir el suministro de agua potable y poder corregir a tiempo cualquier novedad presentada. Verificada por personal de Empocaldas y así asegurando el cumplimiento en su totalidad de las especificaciones pertinentes.
- ✓ Y se realiza el empalme de la tubería a la red municipal, iniciando la calle 25 y al final en la calle 25A.

De acuerdo con la ubicación de la red principal de suministro al encontrarse muy cerca de la excavación, nuevamente la miniretroexcavadora rompió el tubo al terminar el tramo 3 y este daño requirió repararse.

2.1.5. LLENOS

- ✓ Se realiza llenos con material de obra para la red de suministro.
- ✓ Se realiza llenos con material de cantera de préstamo para la red de suministro, adicionalmente se le deja como protección y cama, arena.
- ✓ Se terminan los llenos con material de préstamo de cantera y material de obra en los empalmes de la red principal de suministro de acueducto, se le deja como protección y cama, arena.

2.1.6. DEMOLICIONES

- ✓ Demolición de estructuras de concreto hidráulico, pavimento, gradería y andenes demás que no se relacionaron en las instalaciones de tubería de alcantarillado y acueducto, pero están reflejados con las viviendas de la zona de intervención.

2.1.7. EXCAVACIÓN

- ✓ Se realizan excavaciones de 0 a 2 m para las demás actividades requeridas que no se tenían previstas en las instalaciones de tubería de alcantarillado y acueducto, pero están reflejados con las viviendas de la

zona de intervención.

- ✓ Se realiza retiro de todo el material de obra.

2.1.8. LLENOS

- ✓ Se realiza mejoramiento del terreno con material de subbase de acuerdo con el estudio de suelos realizado en la zona.
- ✓ Suministro e instalación de subbase granular tipo Invias con espesor 0,27 m en el tramo ubicado entre las abscisas K0+000 a K0+051 del tramo 3, según la estructura de pavimento flexible aprobada por la supervisión técnica del proyecto.
- ✓ Suministro e instalación de base granular tipo Invias con espesor 0,20 m en el tramo ubicado entre las abscisas K0+000 a K0+051 del tramo 3, según la estructura de pavimento flexible aprobada por la supervisión técnica del proyecto.

En las actividades anteriores, se han presentado retrasos por las jornadas invernales del municipio en los meses de abril, mayo y junio, lo cual generó retrasos y algunas pérdidas de material esencialmente por los incrementos de humedad natural o arrastre de material, posteriormente se presentan las evidencias en registro fotográfico.

2.1.9. ACERO

- ✓ Se realiza el figurado de acero para sumidero lineal y losas de pozos sépticos intervenidos al 50%.

2.1.10. CONCRETOS

- ✓ Se terminan de fundir el bordillo en concreto de 21 MPa para confinamiento de pavimento.
- ✓ Suministro e instalación de plástico para protección de consolidación de pavimento, bordillos y talud de predios no intervenidos.
- ✓ Se realiza concreto de 21 MPa para sumidero lineal y losas de pozos sépticos intervenidas al 50%.
- ✓ Se termina la reposición de andenes y entradas a viviendas.

2.1.11. SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO MDC-19 NO INCLUYE IMPRIMACIÓN

- ✓ Se realizan las actividades de suministro transporte e instalación de

concreto asfáltico MDC-19 en el tramo 3 con 7 cm de espesor de capa asfáltica.

2.1.12. SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

- ✓ Antes de la instalación de la capa asfáltica, se aplicó una imprimación con emulsión asfáltica sin material, la cual preparará la base granular como mejor adherencia cuando se aplique la capa de asfalto.

2.1.13. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Para una correcta ejecución del proyecto se propuso el cumplimiento total de los protocolos de bioseguridad con el personal de seguridad y salud en el trabajo, para esto se cumplió con todo lo establecido de tomas de temperatura, dotación de tapabocas quirúrgicos, alcohol, jabón y la desinfección con alcohol de ropa, herramientas de trabajo y personal, se llevó registro y control de la limpieza para protección contra el COVID.
- ✓ Hubo compañía en el transcurso de estas actividades de la profesional social de la obra.
- ✓ Se realizó el debido acompañamiento de la profesional SISO y la auxiliar SISO para dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad.

2.1.14. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID-19

- ✓ Para una correcta ejecución del proyecto se propuso el cumplimiento total de los protocolos de bioseguridad con el personal de seguridad y salud en el trabajo, para esto se cumplió con todo lo establecido de tomas de temperatura, dotación de tapabocas quirúrgicos, alcohol, jabón y la desinfección con alcohol de ropa, herramientas de trabajo y personal, se llevó registro y control de la limpieza para protección contra el COVID.

2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- ✓ Seguimiento a la programación de obra.
- ✓ Correspondencia enviada y recibida.

2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

- ✓ Pago a proveedores en la ejecución de las actividades realizadas en el presente periodo.

2.4. ACTIVIDADES SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Vinculación de personal a sistema de seguridad social, ARL, caja de compensación y pensión.
- ✓ Entrega de dotación a trabajadores.

2.5. CUADRO DE GENERACION DE EMPLEO

- ✓ Objetivo: Generar empleo a los mismos habitantes del barrio que será intervenido para así contribuir con una mejor calidad de vida del trabajador
- ✓ Lugar = Carrera 2E entre calles 25 a 25ª, Barrio: San Isidro
- ✓ Contratista= Red de ingeniería, maquinaria y construcción

Personal	Total	Mes de empleo	Forma de pago	Tiempo de ocupación	Trabajadores beneficiados	Población beneficiada
Auxiliar sst	1	Febrero	Quincenal	Duración de la obra	5	180 personas
Maestro	1	Febrero	Quincenal	Duración de la obra	5	180 personas
Ayudantes	3	Febrero	Quincenal	Duración de la obra	5	180 personas

2.6. RELACION FINANCIERA

INVERSIÓN CONTRATADA:	\$99.501.704,00
INVERSIÓN EJECUTADA:	\$99.412.682,00
SALDO:	\$89.022,00
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO ANTERIOR:	\$79.601.363,00
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO ACTUAL:	\$19.811.319,00
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO ANTERIOR:	80,00%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL:	19,91%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA:	\$99,412,682,00
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	99,91%
PORCENTAJE TOTAL EN SALDO:	0,09%

3. ANEXOS

3.1. REGISTRO FOTOGRAFICO



Las pérdidas de material fueron significativas ya que a pesar de que se protegían con plástico, como se evidencia en la cuarta imagen y en favor al terreno escarpado de la zona, la cantidad de agua era tan grande que alcanzaba a alterar la humedad natural del suelo compactado. Nivel: Base granular.



Retiro de material en vehículo automotor, el cual gran cantidad significativa era de tipo subbase y base granular que se sustituyo por incremento de humedad natural.



Deterioro de tapa en concreto de pozo séptico ubicado en la Calle 25A, Barrio: San Isidro.





Se realiza recolección de aguas lluvias constantes mediante tubería de 6" por la calle 26 proveniente de una vivienda, lo cual se requiere una intervención provisional hasta el sumidero.





Protección de talud con plástico negro en predios no intervenidos sobre la Carrera 2E.





Acorde con la humedad natural del suelo compactado a nivel de base granular y próximo tramo a pavimentarse, se evidencia visualmente como el material no logra una buena compactación, en este caso a favor de la pendiente del terreno escarpado permite un mayor flujo de agua y puede compactarse posteriormente de manera eficiente.



Realización de prueba de hermeticidad en tubería de acueducto instalada en el tramo, requerida por la

supervisión técnica del proyecto. Durante la ejecución, el tramo presentó inconsistencias, lo cual se tuvo que hacer revisión detalladamente para determinar la fuga o desempate en la conexión, el primer día se realizaron 04 intentos que desafortunadamente no resultaron efectivos. Al día siguiente la tubería se dividió en dos partes, ya que las pérdidas de presiones eran menores y su posible inconsistencia se encontraba en la parte superior del tramo. Al momento de realizarse sobre la parte inferior, la instalación era correcta y no presentó ninguna pérdida de presión, sobre la parte superior se continuó con la detección de las inconsistencias y en definitiva se logran ajustar y/o reparar, terminando eficientemente la realización de la prueba sin ninguna pérdida de presión.



✓



Se solicita a Empocaldas realizar corte de agua en la zona, para empalmar la tubería existente con la nueva y la conexión de las acometidas a los medidores.



Como intervención provisional para el manejo de aguas lluvias proveniente de la vivienda en la Calle 26, se realiza un sumidero con rejilla y se controla el flujo de agua constante con tubería de 6" hasta el sumidero.



Se realiza ensayo de suelos a nivel de subbase y base granular, lo cual determinan humedad natural del suelo compactado, densidad seca máxima y grado de compactación.



Se realiza la domiciliaria 9 de acueducto en el tramo para los predios no intervenidos, el cual resultó imposible contactarse con el dueño y se hace presente hasta el 17 de junio de 2022.




Desde el día de la realización de la prueba hidráulica, se reporta daño al final del tramo 3, en la tubería de acueducto con equipo técnico de Empocaldas presente, del cual no se realizó ninguna intervención o actividad por nuestra parte como contratistas para generarla.



Previamente al día de pavimentarse, realiza visita la supervisión y equipo técnico de Empocaldas para atender el daño y tomar decisiones en el asunto, lo cual por parte de la supervisión es que este sea atendido por el contratista, llegando a un acuerdo de intervención ya que la red de suministro es municipal y el contratista no afectó la tubería con alguna actividad del objeto contractual, la decisión tomada dejó sin suministro a las viviendas en la calle 26 con carrera 1A del barrio San Isidro.



Se realiza la imprimación con emulsión asfáltica sin material, la cual preparará la base granular con mejor adherencia cuando se aplique la capa de asfalto o capa de rodadura.

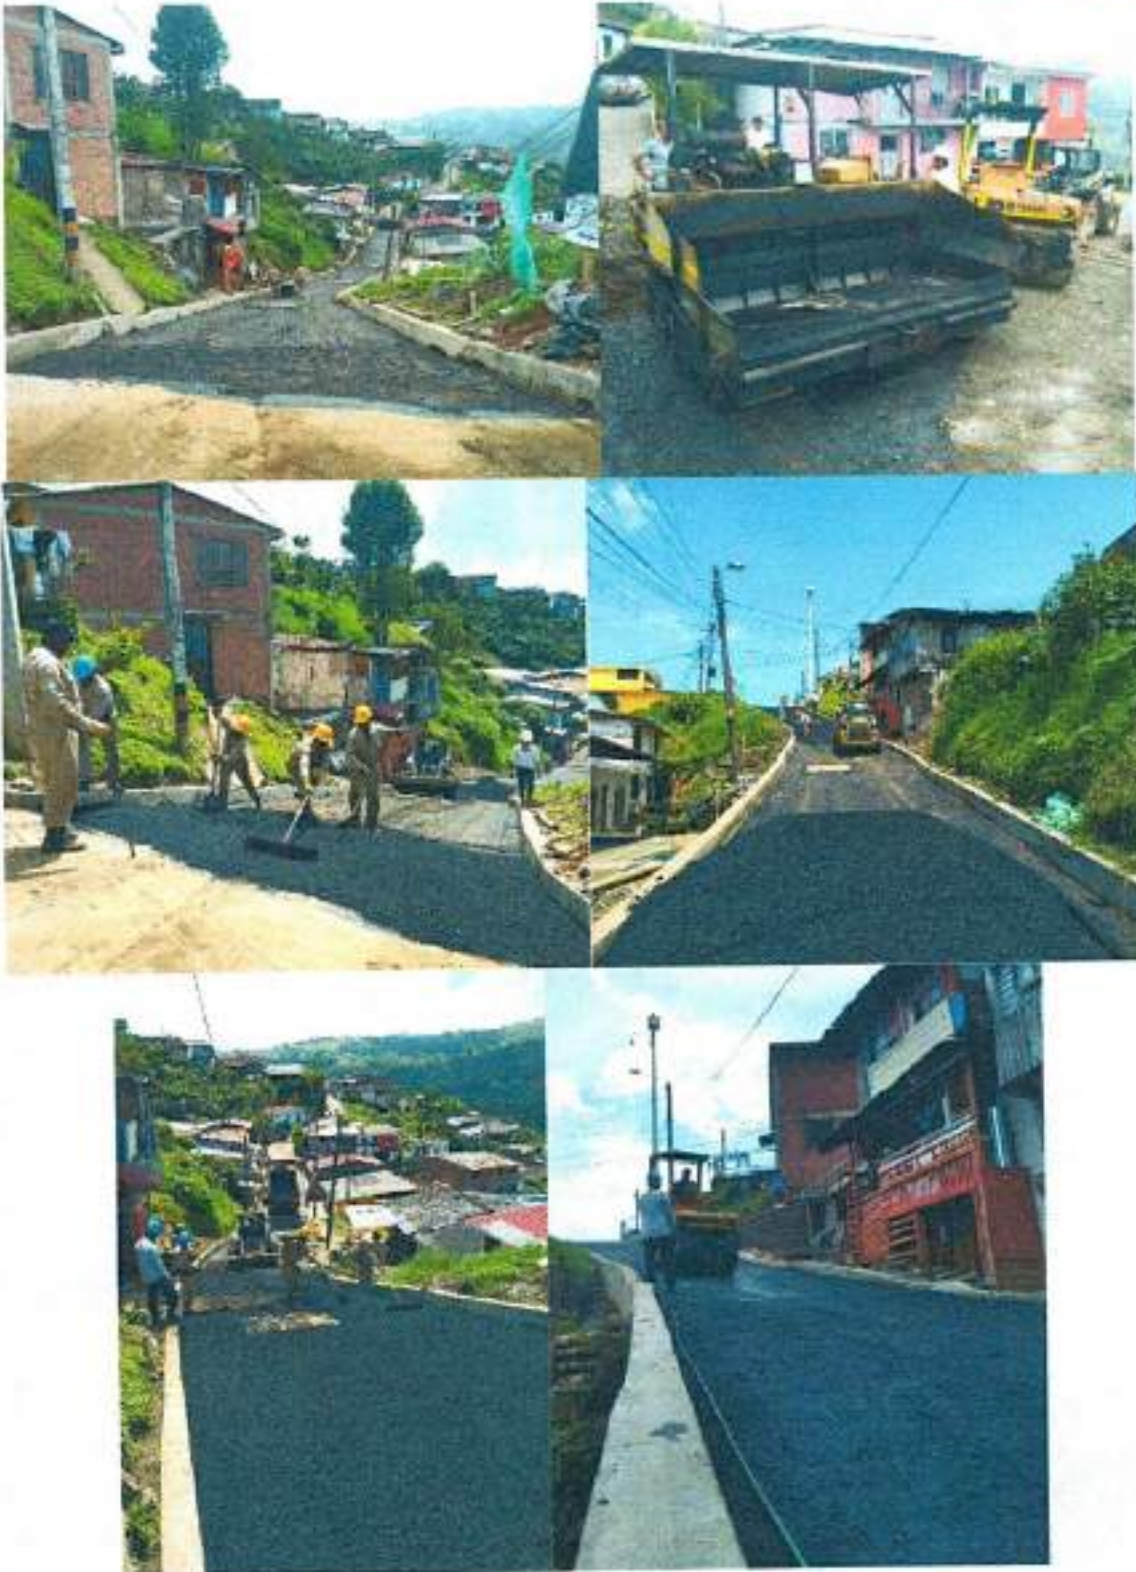



Pavimentación del tramo 3, con mezcla densa en caliente – 19 y espesor de 7 cm de acuerdo con el diseño del pavimento flexible aprobado por la supervisión técnica.



Atención del daño por equipo técnico de Empocaldas el día de la pavimentación del tramo 3.



Durante la pavimentación del tramo, se realizaron cuatro (04) intervenciones al daño reportado en la tubería de acueducto municipal, lo cual en la penúltima afecta el nivel de base granular minutos antes de pavimentar, generando pérdidas de material y tiempo, esto requirió intervenir rápidamente para terminar la pavimentación.



Finalmente en el daño de la tubería municipal se realiza un atraque en concreto y acero.



Instalación de rejilla en sumidero lineal, con calibre de 7/8" y espaciamiento de 3 cm.





Se deja registro de la reparación de andenes y acometidas de acueducto, las cuales se intervinieron en la ejecución del proyecto y permite dejar una mejor estética visual.







Se realiza la intervención de las losas en concreto con sus tapas y aro en hierro fundido respectivamente instaladas, además del acero de refuerzo de acuerdo con las especificaciones técnicas.



Acorde a la presencia de esta humedad superficial en la carpeta asfáltica, con ayuda del equipo técnico de Empocaldas se realiza toma de presiones en las dos viviendas y la detección con geófono desde la superficie.




De manera procedente a la revisión con equipos por parte del equipo técnico de Empocaldas, lo cual determina que no existen pérdidas de presión o alguna posible fuga en el empate de los accesorios sobre las

acometidas. Como sugerencia por parte de la supervisión se realiza intervención como verificación de lo que se está presentando, la humedad superficial que existía provenía del empalme entre la MDC-19 y el muro de contención, de modo tal que para mejorar ese empalme se efectúa un concreto rígido para el recuadro que se demolió.



Se realiza lechada de emulsión asfáltica con arena para lograr un mejor sellado de la MDC-19 aplicada el pasado 22 de junio de 2022. Posterior a ello se realiza retiro del material por acción de la comunidad del sector al presentarse la caída de una persona mayor con la presencia de un menor de edad en sus brazos, lo cual lamentamos, pero irrumpe lo solicitado por las partes y evita el sellado de la mezcla asfáltica.

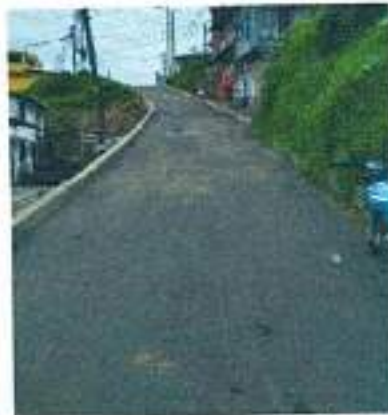

Día del retiro de lechada con arena y emulsión asfáltica por acción de la comunidad, 18 de julio de 2022.

Como entrega a satisfacción se requirió hacer la devolución de dinero respectiva a la instalación de la tapa con aro en hierro fundido del cuarto pozo que se preveía intervenir. Adjunto al informe del supervisor se evidencia el acta de mayores y menores cantidades haciendo relación de ello y de las actividades de obra ejecutadas.



Por ende, de acuerdo con la inestabilidad del terreno desde el sector La Reja hasta la Calle 25, del Barrio: San Isidro, se realizaron Micropilotes más profundos con tal de cumplir con la estabilización requerida por el estudio de suelos contratado para la estructura de pavimento y la red de acueducto y alcantarillado instalada. De acuerdo con las partes se recibe finalmente lo ejecutado y se da la terminación del tramo 3.

De acuerdo con la existencia de quejas, peticiones y reclamos ante la Administración Municipal y la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P. por parte de proveedores, específicamente de Ferreterías, Equipos y Maquinaria, adjunto copias de los pagos efectuados como soporte de paz y salvo ante estos.



RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO
Representante Legal
Red de Ingeniería, Maquinaria y Construcción



Proyecto: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS

Localización: CARRERA 2E ENTRE CALLES 25A A 26, BARRIO: SAN ISIDRO, ANSERMA, CALDAS

Dirigido a: RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Tipo de prueba: Prueba hidráulica de hermeticidad en tubería de acueducto.

Fecha: 10/06/2022 y 11/06/2022

Informe técnico

De acuerdo con lo requerido por el contratante en este caso, se debe realizar la prueba de hermeticidad o estanqueidad en la tubería de acueducto que tiene una longitud de 50 m, con un diámetro de 2", compuesta de PVC tipo presión la cual distribuye a 9 viviendas con un diámetro de tubería de ½", con reducción de tipo Tee.

Este tipo de prueba consiste en la instalación de una bomba de aire a la tubería de acueducto, la cual tendrá un manómetro de presión en psi (kg/cm²) y una inyección de agua, el trabajo en conjunto de aire con agua es distribuirse por toda la red y detectar alguna pérdida de presión, fuga o conexión desempatada, la presión se determinará por la capacidad de la tubería al momento de aplicarse, esta permitirá un tope máximo aplicado preciso dado por la bomba de aire (inhabilita inyectar más aire con agua). La condición de efectividad de la prueba en la tubería de acueducto estará dada por la resultante luego del término de 4 (cuatro) horas, arrojando una pérdida de presión máxima del 10%.

Nota: Cuando la pérdida de presión es mayor al 10%, la red de suministro presenta fuga o conexión desempatada, de modo tal que requiere revisarse cada reducción y conexión a detalle. La intervención debe realizarse y nuevamente empezar la prueba; normalmente en un tramo de tubería cuando la presión genera una pérdida mayor o considerable, la ubicación de la fuga se encuentra en la zona más baja o al final del tramo, y viceversa, es decir, cuando la pérdida es menor, la ubicación de la fuga está en la zona más alta o al inicio del tramo. "Es importante determinar en 2 tramos la tubería de acueducto que va a ser ensayada, según lo mencionado previamente".

Inicio de prueba

Los materiales requeridos para la realización de la prueba son los siguientes:

- 1 Tapón de 1 1/2" de PVC presión

- 1 Tapón de 1 1/2" de PVC presión
- 1 Unión de 1 1/2" de PVC presión
- 1 Buje de 1 1/2" x 1/2" de PVC presión
- Soldadura de PVC
- 1 Segueta
- Limpiador de PVC
- 2 metros de tubería PVC de 1/2" presión
- 4 Adaptador macho de 1/2" PVC
- 1 Manguera
- 1 Caneca plástica de pintura de 5 galones vacía
- 1 Bomba de aire
- 1 Manómetro
- 1 Llave de 1/2" metálica
- 50 cm de tubería de 1/2" metálica

Al tener los anteriores materiales necesarios para generar la prueba hidráulica se procede con la instalación de la bomba de aire y la inyección de agua, la instalación inicial antes de ejercer cualquier tipo de presión queda de este modo.



Ilustración 1. Instalación inicial.

Ilustración 2. Instalación inicial.

Ilustración 3. Instalación inicial.

La presión de aire y agua en el tramo de tubería de acueducto a ensayar fue de 200 kg/cm² inicialmente y al transcurrir una hora y media (1,5) fue de 175 kg/cm².

9/2



Ilustración 4. Presión inicial - 200 kg/cm².

Ilustración 5. Presión (1,5 horas después) - 175 kg/cm².

Inconsistencias en la tubería de acueducto

Al presentarse una pérdida registrada de 25 kg/cm² en este tramo de tubería de 50 m de longitud con 9 acometidas, lo que corresponde a un 12,50% de pérdida de presión y supera el máximo permitido (10%), esto conlleva a concluir la existencia de fuga o conexión desempatada, la cual se encuentra ubicada en la parte superior del tramo detectada por la poca pérdida de presión, se procede a revisar detalladamente y a realizar los ajustes requeridos. Al realizar nuevamente la instalación y proceder con la prueba hidráulica, se presentan las mismas condiciones, suceso que llega a repetir 2 veces más, es decir en total 4 veces se realiza la prueba sobre este tramo y no se detectan el total de fugas o conexiones desempatadas. Por ende, se requiere continuar con la realización de la prueba hidráulica al siguiente día y determinar la inconsistencia presentada en este primer día.

Aunado lo anterior, se divide el tramo que presenta inconsistencias en 2 partes, ya que las pérdidas de presión son menores determinando su ubicación en la parte superior del tramo. Al siguiente día, se realiza la prueba inicialmente en la parte inferior la cual se prevé que no presenta alguna inconsistencia, situación correcta y se logra la efectividad en la prueba hidráulica. Al transcurrir unos minutos del inicio de la prueba en la parte inferior se hace la instalación para la parte superior, la cual sigue presentando inconsistencia, por ende, se revisa todo nuevamente y se detectan las fugas mínimas existentes que lo presentaban, de ese modo se logra la efectividad al fin.

Fin de prueba - Resultados

Parte inferior del tramo dividido. La presión de aire y agua cargada inicialmente en el tramo dividido de la tubería de acueducto es de 180 kg/cm², al transcurrir las cuatro (04) horas mínimas requeridas llega a 172 kg/cm². La pérdida registrada en este tramo de tubería corresponde a un 4,44% de pérdida de presión y no supera el máximo permitido que es el 10%. Lo cual determina

que toda conexión e instalación de tubería de acueducto de diámetro de 2" en esta parte inferior está correctamente instalada y no requiere intervención alguna.



Ilustración 6. Presión inicial - 180 kg/cm².

Ilustración 7. Presión final - 173 kg/cm².

Parte superior del tramo dividido. Acorde con la gran inconsistencia sobre esta parte del tramo dividido, lo cual se hace mención anteriormente, se obtiene eficientemente la realización de la prueba hidráulica. La presión de aire y agua cargada inicialmente en este tramo dividido de la tubería de acueducto es de 200 kg/cm², al transcurrir las cuatro (04) horas mínimas requeridas llega a 195 kg/cm². La pérdida registrada en este tramo de tubería corresponde a un 2,50% de pérdida de presión y no supera el máximo permitido que es el 10%. Lo cual determina que toda conexión e instalación de tubería de acueducto de diámetro de 2" en esta parte superior está correctamente instalada y no requiere intervención alguna.



Ilustración 8. Presión inicial - 200 kg/cm².

Ilustración 9. Presión final - 195 kg/cm².

Recomendaciones

Por parte del equipo técnico encargado de la realización de las pruebas hidráulicas es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Al momento de realizar alguna conexión con soldadura de PVC es recomendable que esta tenga un color distintivo, diferente al color de la tubería, con ello se puede identificar si falta alguna conexión por realizarse.
- Cuando se requiera el uso de cinta de teflón para realizar un apriete entre dos accesorios, es preferible que esta cinta sea de gran calidad y no sea tan endeble.
- La tubería y accesorios para la red de acueducto recomendada para la instalación y esencial cuando se demuestre calidad del trabajo realizado, es primordial que sea tipo presión.



Aprobado:
Ingeniero (a) Residente de Obra

Realizado por:
Dany Alexander Henao C.
Servicio técnico de pruebas hidráulicas
Dos Quebradas, Risaralda





Comprobante de Transacción
Fecha: 03/06/2022 09:34:08

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inactiva

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****+****6322

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ****+****6314
Banco destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 9596366
Nombre titular: RAURICIO BRACCIO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.653.298,00 ✓
Descripción: PAGO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 03/06/2022
Hora de Pago: 09:33:58
Programación: Solo una vez
Documento: 37915728

Comprobante de Transacción generado

Comprobante de Transacción

Fecha: 03/06/2022 09:46:46

**Descripción de la Transacción:**Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Débito**Origen de los fondos:**Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6991**Destino de los fondos:**Tipo de producto: CUENTA DE AHORRO
Número de producto: *****614
Servicio Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 959459
Nombre Titular: MAURICIO GÓZALO
Email Titular:**Detalle de transacción:**Monto: \$ 2.200.480,00
Descripción: PAGO
Referencia: 600000300000000000000000
Fecha de Pago: 03/06/2022
Hora de Pago: 09:46:37
Programación: Salo una vez
Documento: 27926039

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/04/2022 12:19:39



Descripción de la transacción:

Empresa: CONGO RCI0 REDES ARGENTINA
Usuario: SAHORA MELINA A ROMAS GARDONIA
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6122

Destino de los fondos:
Transacción: Pago a terceros
Monto: \$ 1.500.000,00
Descripción: Pago a Prevedora SA

Fecha: 13/04/2022
Hora: 12:19:39

Número de documento: 4555477

Emisor	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Detalle	Destino
BANCO DAVI	CUENTAS AJENAS OTROS BANCOS	*****2863 ANDRES FELIPE ARGENTINA GARDONIA		\$ 1.500.000,00		Banco a Cve. Banco

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/04/2022 12:47:20



Descripción de la Transacción:
Empresa: CONSORCIO REDES ANSRMA
Usuario: SANDRA HELENA ARIAS CARDONA
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****8337

Destino de los fondos:
Transacción: Pago a Proveedor
Monto: \$ 1.475.000,00
Descripción: Pago a Proveedor

Fecha: 13/04/2022
Hora: 12:47:20

Número de documento: 4855888

Banco	Tipo de Débito	Número de Débito	Titular	Valor	Detalle	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS DEBITOS	*****1863	ANDRES FELIPE ARICAPA ORCONE	\$ 1.475.000,00	Envío a Otro Banco	



Comprobante de Transacción
Fecha: 27/05/2022 08:11:25

Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta la Insorta

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1884

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****7426

Banco destino: DAVIVIENDA

Tipo documento titular: CÉDULA DE CAMBIANTE

Número de documento titular: 909960

Nombre titular: GUSTAVO GERALDO ✓

Email titular:

Detalle de transacción:

Monta: \$ 10.517.000,00

Descripción: PAGO

Referencia: 00000000000000000000000000000000

Fecha de Pago: 27/05/2022

Hora de Pago: 08:11:17

Programación: Solo una vez

Documento: 37767126



Comprobante de Transacción
Fecha: 27/05/2022 08:17:04

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **** * 4323

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **** * 426
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo de documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 9538469
Nombre titular: GUSTAVO GIRALDO ✓
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 9.082.499,00
Descripción: PAGO
Referencia: 985000030000000000000000
Fecha de Pago: 27/05/2022
Hora de Pago: 08:17:03
Programación: Solo una vez
Documento: 37167260

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/06/2022 10:57:53



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta de Ingreso

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****222

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****426
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 905009
Nombre Titular: GUSTAVO GIRALDO /
Email Titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 5.000.000,00
Descripción: PAGO
Referencia: 880000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/06/2022
Hora de Pago: 10:57:26
Programación: SALVO VOTO
Documento: 87900235

**Comprobante de Transacción**

Fecha: 22/07/2022 11:24:58

Descripción de la Transacción:Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta de Ingreso**Origen de los fondos:**Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****9322**Destino de los fondos:**Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****9947
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1000552723 ✓
Nombre titular: WILKIN QUINTERO
Sexo titular:**Detalle de transacción:**Monto: \$ 3.837.800,00
Descripción: PAGO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/07/2022
Hora de Pago: 11:24:58
Programación: Solo una vez
Documento: 38028957



Comprobante de Transacción
Fecha: 22/07/2022 11:08:54

Descripción de la transacción:
Transacción: Transacciones Cuenta de Tesorería
Tipo:

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6001

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****8047
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Crédito
Número de documento titular: 106003722
Nombre titular: VIRASA QUINTERO ✓
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 3.045.600,00
Descripción: PAGO
Referencia: 85000300060090286000000
Fecha de Pago: 22/07/2022
Hora de Pago: 11:10:46
Programación: Solo una vez
Documento: 38929078

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/07/2022 16:54:15



Descripción de la Transacción:
Empresa: CONSORCIO REDES ANDINA
Usuario: SANDRA HELENA ARENAS CARDONA
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****322

Destino de los fondos:
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 21.366.055,95
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/07/2022
Hora: 16:54:06

Número de documento: 47328289

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Título	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7428	QUISTARO GORALDO	\$ 21.366.000,00	Pago En Efectivo	
SANCIOLAHUA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3883	ARENAS ARICAPA	\$ 130.250,00	Envío a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/07/2022 17:26:59



Descripción de la Transacción:
Empresa: RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S A S
Usuario: DIEGO ALEXANDER VILASCO VILLARIZAR
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****9991

Destino de los fondos:
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 2.524.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/07/2022
Hora: 17:26:59

Número de documento: 47129228

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Título	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2983 ANDRES ARJICA	/	\$ 2.524.500,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción

Fecha: 22/07/2022 17:27:14



Descripción de la Transacción:

Empresa: 30 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Usuario: RAHEL MORALES GONZALEZ
Origen de los Fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****8544

Destino de los fondos:

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 638.550,00
Descripción: Pags a Proveedores

Fecha: 22/07/2022
Hora: 17:27:05

Número de documento: 47129424

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Detalle	Motivo
SANCOLOMBA	CUENTAS AJEROS OTROS BANCOS	*****2893	ANDRES ARICAFA	\$ 638.550,00	Envío a Otro Banco	

NORMAS COLOMBIANAS CONSORCIO REDES ANSERMA

901.442.348 - 2

Libro Auxiliar con Terceros de (01/01/2021 a 31/07/2022)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	C. COSTO	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
133005	A PROVEEDORES		0,00			16.647.370,00
	FERRY CAMPOS BT S.A.S ZOMAC Id.(901.237.725 - 8)					0,00
09/04/2021	CC	000210410 CANC. ANTICIPO FRAS. MATERIALE:		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
29/04/2021	CC	000210411 CANC. ANTICIPO MATERIALES		0,00	2.202.587,00	47.413,00
26/05/2021	CE	000210507 CANC. ANTICIPO MATERIALES		8.400.000,00	0,00	8.447.413,00
23/07/2021	CC	000210715 CANC. ANTICIPO MATERIALES DE O		5.000.000,00	0,00	13.447.413,00
26/07/2021	CC	000210726 Doc. Anulado. CANC. ABONO MATER		0,00	0,00	13.447.413,00
02/08/2021	CC	000210802 CANC. ANTICIPO ABONO FERRETEF		5.000.000,00	0,00	18.447.413,00
04/08/2021	CC	000210805 CANC. ANTICIPO MATERIALES DE O		5.000.000,00	0,00	23.447.413,00
23/09/2021	CE	000210921 ANTICIPO MATERIALES		729.000,00	0,00	24.176.413,00
02/10/2021	CC	000211001 LEG. ANTICIPO MATERIALES		0,00	729.000,00	23.447.413,00
06/10/2021	CE	000211019 ANTICIPO 50 BULTOS DE CEMENTO		1.179.685,00	0,00	24.627.098,00
19/10/2021	CC	000211002 LEG. ANTICIPO BULTOS DE CEMENT		0,00	1.174.790,00	23.452.308,00
20/10/2021	CE	000211038 ANTICIPO MATERIALES		671.200,00	0,00	24.123.508,00
21/10/2021	CE	000211037 ANTICIPO MATERIALES		1.733.795,00	0,00	25.857.303,00
21/10/2021	CE	000211039 ANTICIPO MATERIALES		7.000.000,00	0,00	32.857.303,00
05/11/2021	CE	000211108 ANTICIPO MATERIALES DE OBRA		1.788.813,00	0,00	34.646.116,00
25/11/2021	CE	000211128 ANTICIPO MATERIALES		7.336.920,00	0,00	41.983.036,00
25/11/2021	CE	000211128 ANTICIPO COMPRA DE PLASTICO		400.000,00	0,00	42.383.036,00
03/12/2021	CE	000211205 ANTICIPO CEMENTO		980.000,00	0,00	43.363.036,00
13/12/2021	CC	000211205 ANTICIPO CEMENTO		1.151.294,00	0,00	44.514.330,00
15/12/2021	CC	000211208 LEG. ANTICIPO CEMENTO		0,00	1.174.790,00	43.339.540,00
15/12/2021	CE	000211207 ANTICIPO CEMENTO		352.600,00	0,00	43.692.340,00
28/12/2021	CC	000211227 ANTICIPO MATERIALES DE OBRA		6.600.000,00	0,00	50.292.340,00
04/01/2022	CC	000220101 LEG. ANTICIPOS MATERIALES VARI		0,00	20.375.718,00	29.916.622,00
28/02/2022	CC	000220213 LEG. ANTICIPOS CEMENTO		0,00	7.834.870,00	22.081.752,00
26/03/2022	CC	000220316 LEG. ANTICIPOS		0,00	5.434.382,00	16.647.370,00
TOTALES FERRY CAMPOS BT S.A.S ZOMAC				55.573.507,00	38.926.137,00	16.647.370,00
TOTALES CUENTA 133005				72.251.763,00	55.604.393,00	16.647.370,00
220501	PROVEEDORES NACIONALES		0,00			10.701.790,35
	FERRY CAMPOS BT S.A.S ZOMAC Id.(901.237.725 - 8)					0,00
12/02/2021	FC	000210211 FRA N. 2041 TELA VERDE		0,00	92.500,00	92.500,00
15/02/2021	CC	000210204 CANC. FRA N. 2041 TELA VERDE		92.500,00	0,00	0,00
15/02/2021	FC	000210210 FRA N. 2061 MATERIALES VARIOS		0,00	193.800,00	193.800,00
17/02/2021	CC	000210209 CANC. FRA N. 2061 MATERIALES		193.800,00	0,00	0,00
22/02/2021	FC	000210212 FRA N. 2139 SOLDADURA Y LIMPIAD		0,00	28.000,00	28.000,00
22/02/2021	FC	000210213 FRA N. 2142 UNION PRESION DE 1/2		0,00	4.000,00	32.000,00
26/02/2021	CC	000210212 CANC. FRA N. 2139 MATERIALES		28.000,00	0,00	4.000,00
26/02/2021	CC	000210212 CANC. FRA N. 2142 MATERIALES		4.000,00	0,00	0,00
29/04/2021	CC	000210411 CANC. FRA N. 71 MATERIALES		2.202.587,00	0,00	-2.202.587,00
29/04/2021	FC	000210404 FRA N. 71 MATERIALES VARIOS DE I		0,00	2.202.587,00	0,00
11/09/2021	FC	000210903 FRA N. 1848 SEMICODO SANITARIO		0,00	18.000,00	18.000,00
13/09/2021	CC	000210904 CANC. FRA N. 3566 SIKADUR 32 Y BI		213.500,00	0,00	-195.500,00
13/09/2021	FC	000210905 FRA N. 3566 SIKADUR 32 Y BROCHA		0,00	213.500,00	18.000,00
15/09/2021	FC	000210907 FRA N. 3592 MATERIALES VARIOS D		0,00	284.600,00	282.600,00
15/09/2021	CC	000210905 CANC. ABONO FRA N. 3592 MATERIA		141.000,00	0,00	141.600,00
22/09/2021	CC	000210920 CANC. FRA N. 1848 SEMICODO SANI		18.000,00	0,00	123.600,00
22/09/2021	CC	000210920 CANC. SALDO FRA N. 3592 MATERIA		123.600,00	0,00	0,00
02/10/2021	CC	000211001 CANC. FRA N. 3773 VARILLA CORRUG		259.000,00	0,00	-259.000,00
02/10/2021	FC	000211003 FRA N. 3773 VARILLA CORRUGADA		0,00	259.000,00	0,00
10/12/2021	FC	000211207 FRA N. 4594 TUBO AGUAS LLUVIAS		0,00	70.000,00	70.000,00

**NORMAS COLOMBIANAS
CONSORCIO REDES ANSERMA**

Libro Auxiliar con Terceros de (01/01/2021 a 31/07/2022)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	C. COSTO	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16/12/2021	FC	X000211208 FRA N. 4660 PINTUTRAFICO, BROCH		0,00	122.600,00	192.600,00
16/12/2021	FC	X000211209 FRA N. 4666 VINILO BLANCO Y GRIS		0,00	75.000,00	267.600,00
17/12/2021	FC	X000211212 FRA N. 4672 CANDADO Y ESTOPAS		0,00	14.400,00	282.000,00
17/12/2021	FC	X000211211 FRA N. 4676 GRANITO Y CINTA DE E		0,00	16.500,00	298.500,00
20/12/2021	CC	X000211225 CANC. FRA N. 4672 CANDADO Y EST		14.400,00	0,00	284.100,00
20/12/2021	CC	X000211225 CANC. FRA N. 4676 GRANITO Y CINT		16.500,00	0,00	267.600,00
20/12/2021	CC	X000211225 CANC. FRA N. 4594 TUBO AGUAS LL		70.000,00	0,00	197.600,00
20/12/2021	CC	X000211225 CANC. FRA N. 4686 VINILO BLER BL/		75.000,00	0,00	122.600,00
20/12/2021	CC	X000211225 CANC. FRA N. 4660 PINTUTRAFICO,		122.600,00	0,00	0,00
03/01/2022	FC	X000220101 FRA N. 207 MATERIALES VARIOS DE		0,00	12.118.118,00	12.118.118,00
04/01/2022	FC	X000220103 FRA N. 208 MATERIALES VARIOS DE		0,00	1.536.823,00	13.654.941,00
04/01/2022	CC	X000220101 CANC. FRAS. MATERIALES VARIOS I		13.654.941,00	0,00	0,00
21/02/2022	FC	X000220203 FRA N. 229 MATERIALES VARIOS DE		0,00	917.200,00	917.200,00
22/02/2022	CE	X000220203 CANC. FRA N. 229 MATERIALES VAR		917.200,00	0,00	0,00
28/02/2022	CC	X000220213 CANC. FRA N. 237 CEMENTO CEME		7.834.870,00	0,00	-7.834.870,00
28/02/2022	FC	X000220206 FRA N. 237 CEMENTO CEMEX		0,00	7.834.870,00	0,00
17/03/2022	CE	X000220302 CANC. FRA N. 242 VARILLA CORRUC		6.564.628,00	0,00	-6.564.628,00
17/03/2022	FC	X000220301 FRA N. 242 VARILLA CORRUGADA		0,00	6.564.628,00	0,00
26/03/2022	CC	X000220316 CANC. FRA N. 255 CEMENTO Y VARI		5.434.382,00	0,00	-5.434.382,00
26/03/2022	FC	X000220302 FRA CENT-255 CEMENTO Y VARILLA		0,00	5.434.382,00	0,00
TOTALES FERRY CAMPOS BT S.A.S ZOMAC				37.980.508,00	37.980.508,00	0,00
TOTALES CUENTA 220501				242.396.939,65	253.098.730,00	10.701.790,35

**NORMAS COLOMBIANAS
CONSORCIO REDES ANSERMA**

901.442.348 - 2

Libro Auxiliar con Terceros de (01/01/2021 a 31/07/2022)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	C. COSTO	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
133005	A PROVEEDORES		0,00			16.647.370,00
	FERRY CAMPOS BT S.A.S ZOMAC Id.(901.237.725 - 8)					0,00
09/04/2021	CC	000210410 CANC. ANTICIPO FRAS. MATERIALE		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
29/04/2021	CC	000210411 CANC. ANTICIPO MATERIALES		0,00	2.202.567,00	47.413,00
26/05/2021	CE	000210507 CANC. ANTICIPO MATERIALES		8.400.000,00	0,00	8.447.413,00
23/07/2021	CC	000210715 CANC. ANTICIPO MATERIALES DE O		5.000.000,00	0,00	13.447.413,00
26/07/2021	CC	000210726 Doc. Anulado. CANC. ABONO MATER		0,00	0,00	13.447.413,00
02/08/2021	CC	000210802 CANC. ANTICIPO ABONO FERRETEF		5.000.000,00	0,00	18.447.413,00
04/08/2021	CC	000210805 CANC. ANTICIPO MATERIALES DE O		5.000.000,00	0,00	23.447.413,00
23/09/2021	CE	000210921 ANTICIPO MATERIALES		729.000,00	0,00	24.176.413,00
02/10/2021	CC	000211001 LEG. ANTICIPO MATERIALES		0,00	729.000,00	23.447.413,00
06/10/2021	CE	000211019 ANTICIPO 50 BULTOS DE CEMENTO		1.179.685,00	0,00	24.627.098,00
19/10/2021	CC	000211002 LEG. ANTICIPO BULTOS DE CEMENT		0,00	1.174.790,00	23.452.308,00
20/10/2021	CE	000211036 ANTICIPO MATERIALES		671.200,00	0,00	24.123.508,00
21/10/2021	CE	000211039 ANTICIPO MATERIALES		7.000.000,00	0,00	31.123.508,00
21/10/2021	CE	000211037 ANTICIPO MATERIALES		1.733.795,00	0,00	32.857.303,00
05/11/2021	CE	000211106 ANTICIPO MATERIALES DE OBRA		1.788.813,00	0,00	34.646.116,00
25/11/2021	CE	000211128 ANTICIPO COMPRA DE PLASTICO		400.000,00	0,00	35.046.116,00
25/11/2021	CE	000211128 ANTICIPO MATERIALES		7.336.920,00	0,00	42.383.036,00
03/12/2021	CE	000211205 ANTICIPO CEMENTO		960.000,00	0,00	43.383.036,00
13/12/2021	CC	000211205 ANTICIPO CEMENTO		1.151.294,00	0,00	44.514.330,00
15/12/2021	CE	000211207 ANTICIPO CEMENTO		352.800,00	0,00	44.867.130,00
15/12/2021	CC	000211208 LEG. ANTICIPO CEMENTO		0,00	1.174.790,00	43.692.340,00
28/12/2021	CC	000211227 ANTICIPO MATERIALES DE OBRA		6.600.000,00	0,00	50.292.340,00
04/01/2022	CC	000220101 LEG. ANTICIPOS MATERIALES VARI		0,00	20.375.718,00	29.916.622,00
28/02/2022	CC	000220213 LEG. ANTICIPOS CEMENTO		0,00	7.834.870,00	22.081.752,00
26/03/2022	CC	000220316 LEG. ANTICIPOS		0,00	5.434.382,00	16.647.370,00
TOTALES FERRY CAMPOS BT S.A.S ZOMAC				55.573.507,00	38.926.137,00	16.647.370,00
TOTALES CUENTA 133005				72.251.763,00	55.604.393,00	16.647.370,00

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



REDIMAC

CONSORCIO REDES ANSERMA

**CONTRATO DE OBRA N°272 DE 2020 CUYO OBJETO ES:
“OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA
MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN
EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS”. DERIVADO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 242 DEL 2020**

**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S**

**CONTRATO DE OBRA N°101 DE 2022 CUYO OBJETO ES:
“OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN
DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES
25 Y 25ª EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS”.
DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 277
DE 2022**

VBo [Signature]

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



INFORME FINAL SISO

PRESENTADO POR:

**YENSY CAMILA GRAJALES GIL
INSPECTOR SISO**

DIRIGIDO A:

**TATIANA BETANCUR CARO
PROMOTORA DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD
EMPOCALDAS S.A E.S.P**

ANSERMA CALDAS 30 DE JULIO DE 2022

CONTENIDO ANEXOS

1. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANEXO 1 ASISTENCIA DIARIA Y CONTROL DE TEMPERATURA

ANEXO 2 ENTREGA DE EPP Y BIOSEGURIDAD

ANEXO 3 BITACORAS VIGENCIA 2021 Y 2022

ANEXO 4 CRONOGRAMAS VIGENCIAS 2021 Y 2022

ANEXO 5 INFORMES SISO VIGENCIA 2021 Y 2022

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRAFICO (TRAMO 1, 2 Y 3)

ANEXO 7 LIQUIDACIONES

ANEXO 8 OTROS

COMPONENTE SISO

Teniendo en cuenta la importancia de las funciones que se cumple en este componente como lo es el vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad; se hace mención de algunas que se llevaron a cabo en este proyecto son:

1	Ingreso de personal
2	Contratacion mano de obra
3	Verificacion de pago de seguridad social integral
4	Capacitacion del personal
5	Entrega e inspeccion de elementos
6	Fomentar el orden y limpeiza de la obra
7	Señalizacion frentes de obra
8	Reporte de accidentes aborales y enfermedades laborales

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas

Construyendo juntos la bienestar



REDIMAC

1. SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Contribuyendo juntos al desarrollo



REDIMAC

ANEXO 1

ASISTENCIA DIARIA Y

CONTROL DE

TEMPERATURA

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 31/08/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,5
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	34,6
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,4
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,7
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,9
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,8
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,2
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,9
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	34,2
12			

ASISTENCIA TARDE 31/08/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,8
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	33,3
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,9
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,7
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,9
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	34,6
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	34,2
12			

OBSERVACIONES	
JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ 1087491396	NO ASISTIO

ASISTENCIA MAÑANA 01/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	33,9
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	34,9
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,3
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,7
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,9
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,6
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	32,3
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,1
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	34,5
12			

ASISTENCIA TARDE 01/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,5
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	34,3
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,6
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,5
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	36,8
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,5
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	34,1
12			

OBSERVACIONES	
JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ 1087491396	NO ASISTIO

ASISTENCIA MAÑANA 02/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,4
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	35,1
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,1
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,7
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,2
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,9
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,7
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,9
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,6
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,9
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7

ASISTENCIA TARDE 02/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,8
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	36,1
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	36
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,2
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,8
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,2
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,7
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,7
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6

ASISTENCIA MAÑANA 03/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,3
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	34,5
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,6
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,3
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,8
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,1
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,1
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,6
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,7
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,6

ASISTENCIA TARDE 03/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,3
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	36,1
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	36
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,2
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,8
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,2
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,7
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,7
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 04/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,5
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	34,9
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,6
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,8
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,2
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,2
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,3
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,1
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,9

ASISTENCIA TARDE 04/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,5
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	36,1
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,2
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,2
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,5
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,5
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,4
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,7
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,7

ASISTENCIA MAÑANA 06/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,1
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	35,7
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,9
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,2
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,6
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	34,8
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,4
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,2
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,8

ASISTENCIA TARDE 06/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,8
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	34,2
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,5
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,2
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,3
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,2
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,7
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	34,8
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,5

ASISTENCIA MAÑANA 07/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,6
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	34,3
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,6
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,8
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,9
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,8
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,2
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,3
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	35,3
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	NO ASISTIO

ASISTENCIA TARDE 07/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,8
2	JUAN MANUEL GONZALES	1101753303	NO ASISTIO
3	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
4	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,6
5	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,2
6	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,7
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	34,9
8	HENRY VILLAMARIA	88246424	
9	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,2
10	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
11	ELLEHN JULIANA MORENO	1099371330	NO ASISTIO
12	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6

ASISTENCIA MAÑANA 08/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,0
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,4
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,2
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,5
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,8
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,3
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,1
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,1

ASISTENCIA TARDE 08/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,5
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,9
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,8
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1

CONSORCIO REDES ANSERMA

ASISTENCIA MAÑANA 09/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,7
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,3
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	36,1
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,7
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	34,8
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,2
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,8

ASISTENCIA TARDE 09/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,1
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,2
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,6
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,4
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,3

ASISTENCIA MAÑANA 10/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	33,9
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,1
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,2
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	33,5
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,1
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,4
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,7

ASISTENCIA TARDE 10/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS	5697080	34,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,2
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,6
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,3
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,5
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35

ASISTENCIA MAÑANA 11/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,4
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,8
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,7
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,4
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA TARDE 11/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,6
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,7
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	36,1
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,5
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,5

ASISTENCIA MAÑANA 13/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	WALTER DANIEL VELASQUEZ	9697803	36,2
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,9
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,2
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,1
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,9
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,1

ASISTENCIA TARDE 13/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	36
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,5
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	PERNISO
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,4
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	34
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,3

CONSORCIO REDES ANSERMA

ASISTENCIA MAÑANA 14/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	WALTER DANIEL VELASQUEZ	9697803	36,4
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,2
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,7
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA TARDE 14/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	34,6
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	34,8
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	34,5
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACIDAD
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,9
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	33,3

ASISTENCIA MAÑANA 15/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,1
3	WALTER DANIEL VELASQUEZ	9697803	36,1
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,8
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	36,1
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,7
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,2

ASISTENCIA TARDE 15/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	36,1
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,3
5	CARLOS ANDRES RIOS	1054926278	35,8
6	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
7	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,1
8	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACIDAD
9	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
10	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,5
11	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,4

ASISTENCIA MAÑANA 16/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,6
3	WALTER DANIEL VELASQUEZ	9697803	36,3
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,4
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,1
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,9
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,8

ASISTENCIA TARDE 16/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,4
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	35,8
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,8
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,6
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACIDAD
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,9
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,2
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	36,1

ASISTENCIA MAÑANA 17/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,5
3	WALTER DANIEL VELASQUEZ	9697803	36,2
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,3
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,4
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,3
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,7

ASISTENCIA TARDE 17/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	36,2
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	34,5
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACIDAD
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,6

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 18/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,2
3	WALTER DANIEL VELASQUEZ	9697803	36,6
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,1
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,2
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA TARDE 18/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	36,3
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,7
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,5
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,7
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,5
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	36,6

ASISTENCIA MAÑANA 20/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,4
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34
3	WALTER DANIEL VELASQUEZ	9697803	36,7
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,4
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,5
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	NO ASISTIO
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,6

ASISTENCIA TARDE 20/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	WALTER DANIEL VASQUEZ	9697803	36,6
4	DILMER ANTONIO RUIZ	6357816	35,8
5	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
6	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,3
7	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,1
8	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
9	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	NO ASISTIO
10	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9

ASISTENCIA MAÑANA 21/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,3

ASISTENCIA TARDE 21/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA MAÑANA 22/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,8

ASISTENCIA TARDE 22/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9

ASISTENCIA MAÑANA 23/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	34,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,2

ASISTENCIA TARDE 23/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

CONSORCIO REDES ANSERMA

ASISTENCIA MAÑANA 24/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA TARDE 24/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA MAÑANA 25/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,9
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,4
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA TARDE 25/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,4
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA MAÑANA 27/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,8

ASISTENCIA TARDE 27/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,9
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	33,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,9

ASISTENCIA MAÑANA 28/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA TARDE 28/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	36,3

ASISTENCIA MAÑANA 29/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA TARDE 29/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,3
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,1
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,4

ASISTENCIA MAÑANA 30/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9

ASISTENCIA TARDE 30/09/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,4
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,5
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,9
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,1
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,2



ASISTENCIA MAÑANA 01/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9

ASISTENCIA TARDE 01/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,5
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA MAÑANA 02/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,4
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,8

ASISTENCIA TARDE 02/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,6
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,1
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,6

ASISTENCIA MAÑANA 04/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	37,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,3

ASISTENCIA TARDE 04/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	37
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	

ASISTENCIA MAÑANA 05/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	37
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6

ASISTENCIA TARDE 05/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,5
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6

ASISTENCIA MAÑANA 06/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,5
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,5

ASISTENCIA TARDE 06/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,6
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,8

ASISTENCIA MAÑANA 07/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,1

ASISTENCIA TARDE 07/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,8

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 08/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9

ASISTENCIA TARDE 08/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,6
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,2

ASISTENCIA MAÑANA 09/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8

ASISTENCIA TARDE 09/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8

ASISTENCIA MAÑANA 11/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7

ASISTENCIA TARDE 11/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,8
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA MAÑANA 12/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,6
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7

ASISTENCIA TARDE 12/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,1
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,6
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,5

ASISTENCIA MAÑANA 13/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,3
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,6

ASISTENCIA TARDE 13/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,1
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 14/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7

ASISTENCIA TARDE 14/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,9
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,6

ASISTENCIA MAÑANA 15/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,6
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36

ASISTENCIA TARDE 15/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,1
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,8
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,8
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8

ASISTENCIA MAÑANA 16/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,4
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,3

ASISTENCIA TARDE 16/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,1
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,6

ASISTENCIA MAÑANA 19/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,6
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA TARDE 19/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	INCAPACITADO
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,8
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,6

ASISTENCIA MAÑANA 20/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,3
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,1

ASISTENCIA TARDE 20/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,3
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 21/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,6
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,7
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7

ASISTENCIA TARDE 21/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,7
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,8
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,9

ASISTENCIA MAÑANA 22/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,6
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,6

ASISTENCIA TARDE 22/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36

ASISTENCIA MAÑANA 23/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,4
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,2

ASISTENCIA TARDE 23/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	36,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA MAÑANA 25/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	FALTA
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	34,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,7
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	33,9

ASISTENCIA TARDE 25/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	34,8
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,8

ASISTENCIA MAÑANA 26/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	

ASISTENCIA TARDE 26/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,5

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 27/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT ING RESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA TARDE 27/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	37
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,4
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9

ASISTENCIA MAÑANA 28/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,4
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36

ASISTENCIA TARDE 28/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	

ASISTENCIA MAÑANA 29/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,3
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,5

ASISTENCIA TARDE 29/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,5
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9

ASISTENCIA MAÑANA 30/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,4
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA TARDE 30/10/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	36
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,9

ASISTENCIA MAÑANA 02/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA TARDE 02/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	

CONSORCIO REDES ANSERMA

ASISTENCIA MAÑANA 03/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,6
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,7
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	CITA MEDICA
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,1
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA TARDE 03/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,6
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	CITA MEDICA
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9

ASISTENCIA MAÑANA 04/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,5

ASISTENCIA TARDE 04/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,4
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,3
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,3

ASISTENCIA MAÑANA 05/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,7
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,9
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,5

ASISTENCIA TARDE 05/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8

ASISTENCIA MAÑANA 06/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,6
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9

ASISTENCIA TARDE 06/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	
7	SILVIA FERNANDA SAENZ		
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	

ASISTENCIA MAÑANA 08/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,9
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7

ASISTENCIA TARDE 08/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ		36,5
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,3

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 09/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,1
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,6
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,1

ASISTENCIA TARDE 09/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,9
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ		
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8

ASISTENCIA MAÑANA 10/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	FALTA (CITA)
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,8

ASISTENCIA TARDE 10/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	FALTA (CITA)
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ		
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,8

ASISTENCIA MAÑANA 11/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36

ASISTENCIA TARDE 11/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35

ASISTENCIA MAÑANA 12/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,6
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,1

ASISTENCIA TARDE 12/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,6
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,5

ASISTENCIA MAÑANA 16/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,4
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,6
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,2

ASISTENCIA TARDE 16/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,3
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,1
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,3

CONSORCIO REDES ANSERMA

ASISTENCIA MAÑANA 17/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,8
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,4

ASISTENCIA TARDE 17/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,6
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8

ASISTENCIA MAÑANA 18/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	FALTA
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,6
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36

ASISTENCIA TARDE 18/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	FALTA
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	

ASISTENCIA MAÑANA 19/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,1
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,5
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,1
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,2
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,3

ASISTENCIA TARDE 19/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	36,3
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,2

ASISTENCIA MAÑANA 20/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	33,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,2
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,2

ASISTENCIA TARDE 20/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,9
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,1
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	36,1
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,6

ASISTENCIA MAÑANA 22/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,4
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	FALTA
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,3

ASISTENCIA TARDE 22/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,4
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,2
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	FALTA
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 23/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	33,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	VACUNA
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,5
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,2

ASISTENCIA TARDE 23/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,3
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,1
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	33,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,6

ASISTENCIA MAÑANA 24/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	FALTA VACUNA
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,3
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8

ASISTENCIA TARDE 24/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	FALTA VACUNA
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,7
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	37
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,1
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9

ASISTENCIA MAÑANA 25/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,8
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	VACUNA

ASISTENCIA TARDE 25/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,6

ASISTENCIA MAÑANA 26/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,3
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,7
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,5
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	35

ASISTENCIA TARDE 26/11/21				
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA	
6:00 a. m.	1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,3
6:00 a. m.	2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
6:00 a. m.	3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
6:00 a. m.	4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,2
6:30 a. m.	5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6:00 a. m.	6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,7
6:00 a. m.	7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34
6:00 a. m.	8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,1
6:00 a. m.	9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34
6:00 a. m.	10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,8
6:00 a. m.	11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	35

ASISTENCIA MAÑANA 29/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,8
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,4
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	36,1

ASISTENCIA TARDE 29/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,8
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,2
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,8
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	36,4
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	36,2

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 30/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,9
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,3
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	PERMISO
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,3
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,8
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	34,4
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	34,7

ASISTENCIA TARDE 30/11/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,6
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,2
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	35
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,8

ASISTENCIA MAÑANA 01/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,8
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,4
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	34,4
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	34,9
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	34

ASISTENCIA TARDE 01/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,4
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,6
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,1
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,4
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	36,2
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	35,1
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,6

ASISTENCIA MAÑANA 02/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	35,1
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,5
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,9
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	PERMISO
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	35,7
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,2

ASISTENCIA TARDE 02/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34,7
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,2
4	HENRY VILLAMARIA	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,4
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,8
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	34,1
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	35,7
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,8

ASISTENCIA MAÑANA 03/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	34,8
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,9
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,4
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	36,3
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	36,1
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,7

ASISTENCIA TARDE 03/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,1
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,2
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,6
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,9
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,7
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	35,2
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	34

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 06/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	34,5
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,4
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	36,1
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	34

ASISTENCIA TARDE 06/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34,9
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	34,9
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	34,7
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	34,5

ASISTENCIA MAÑANA 07/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,3
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,6
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,2
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,8
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	35
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35

ASISTENCIA TARDE 07/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	

ASISTENCIA MAÑANA 09/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	36,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,7
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,5
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	36,1
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	35,9
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	36,4

ASISTENCIA TARDE 09/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,5
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	36,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,7
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,9
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,3
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	35,7
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,1
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,1
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,8
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	35,9
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,9

ASISTENCIA MAÑANA 10/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,7
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,1
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,4
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,5
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,4
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	34,8
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,3
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	35,3
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,6

ASISTENCIA TARDE 10/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	35,4
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,8
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,3
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,4
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	35,5
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	34,3
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35

CONSORCIO REDES ANSERMA



ASISTENCIA MAÑANA 14/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,2
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,8
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,1
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,3
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,7
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	34,9
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	34,3
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,8

ASISTENCIA TARDE 14/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35,3
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,5
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	34,4
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,1
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,7
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,2
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	36,4
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	36
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	36,1

ASISTENCIA MAÑANA 15/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,6
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	35,2
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,5
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,6
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	37,1
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	34,3
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,2
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	34,1
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	34,9
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35

ASISTENCIA TARDE 15/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,0
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	36,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,1
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	34,7
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	35,8
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	35,7

ASISTENCIA MAÑANA 16/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT INGRESO
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	35
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	SALIO
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36,2
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	36,2
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	36,2
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	34
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	SALIO
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	35,3
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	SALIO
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICO	1.002.744.247	SALIO
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	SALIO

ASISTENCIA TARDE 16/12/21			
Nro	NOMBRE	CEDULA	TMPRT SALIDA
1	CARLOS CARDENAS CACERES	5697080	34,9
2	ORLANDO GUZMAN	4430737	34
3	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	36
4	HENRY VILLAMARIN	88246424	
5	JUAN BAUTISTA ZAPATA	9697044	35,7
6	YENSY CAMILA GRAJALES	1002802585	35,9
7	SILVIA FERNANDA SAENZ	1102377281	
8	JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	35,2
9	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6357816	36,1
10	WALTER DANIEL VELASQUEZ	7697803	SALIO
11	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	SALIO
12	JOVANNY MURILLO AVEDAÑO	14191989	SALIO



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

		ASISTENCIA MAÑANA			ASISTENCIA TARDE			
Nro	NOMBRE	CEDEULA	DIA	TMPRT INGRESO	NOMBRE	CEDEULA	DIA	TMPRT SALIDA
1	DELMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	34,5			LUNES	35,5
			MARTES	34,7			MARTES	34,8
			MIÉRCOLES	34			MIÉRCOLES	35
			JUEVES	34,8			JUEVES	35,5
			VIERNES	34,2			VIERNES	36,1
			SÁBADO	35			SÁBADO	36
2	WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ	9.687.888	LUNES	35,1		9.687.888	LUNES	34,9
			MARTES	35,5			MARTES	35
			MIÉRCOLES	34,9			MIÉRCOLES	35,6
			JUEVES	35			JUEVES	35,5
			VIERNES	34,8			VIERNES	36
			SÁBADO	35			SÁBADO	35
3	YENSY CAMILA GRAJALES GIL	1.002.802.585	LUNES	34,9		1.002.802.585	LUNES	36
			MARTES	34,8			MARTES	36,2
			MIÉRCOLES	35			MIÉRCOLES	35
			JUEVES	34,8			JUEVES	34,8
			VIERNES	35,7			VIERNES	35,5
			SÁBADO	35			SÁBADO	36,1
4	SILVIA FERNANDA SAENZ CORZO	1.102.377.281	LUNES	35,7		1.102.377.281	LUNES	35
			MARTES	35			MARTES	36,1
			MIÉRCOLES	36			MIÉRCOLES	35,5
			JUEVES	35			JUEVES	34,8
			VIERNES	34,8			VIERNES	35
			SÁBADO	36,2			SÁBADO	35,5
5	CESAR AUGUSTO RESTREPO ZULLAGA	9.686.580	LUNES	35		9.686.580	LUNES	34,8
			MARTES	35			MARTES	36
			MIÉRCOLES	34,7			MIÉRCOLES	35
			JUEVES	34,8			JUEVES	34,8
			VIERNES	35,2			VIERNES	36
			SÁBADO	35			SÁBADO	35,5

OBSERVACIONES

El oficial de obra CESAR AUGUSTO RESTREPO ZULLAGA, solo trabajo hasta esta semana, se retira con fecha del 19 de febrero de 2022

Febrero 14 al 19 de 2022



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

Nro	NOMBRE	CEDULA	ASISTENCIA MAÑANA	
			DIA	TIEMPO INGRESO
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.806	LUNES	34,9
			MARTES	35,6
			MIÉRCOLES	36
			JUEVES	36,1
			VIERNES	35,9
			SÁBADO	36
			LUNES	35,3
2	WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ	9.697.803	MARTES	36
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	34,9
			VIERNES	35,7
			SÁBADO	36
			LUNES	35,9
			MARTES	36,7
3	JOVANNY MARILLO AVENDAÑO	14.191.989	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	36,3
			VIERNES	34,9
			SÁBADO	36
			LUNES	34,8
			MARTES	35
			MIÉRCOLES	35
4	JUAN DAVID BECERRA ANDRICA	1.002.744.247	JUEVES	35
			VIERNES	34,8
			SÁBADO	35,2



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

Nro	NOMBRE	CEDULA	ASISTENCIA TARDE	
			DIA	TIEMPO SALIDA
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.806	LUNES	35,5
			MARTES	35,8
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35
			SÁBADO	34,9
			LUNES	34,9
2	WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ	9.697.803	MARTES	35,7
			MIÉRCOLES	36
			JUEVES	35,6
			VIERNES	35,6
			SÁBADO	35,3
			LUNES	36
			MARTES	35
3	JOVANNY MARILLO AVENDAÑO	14.191.989	MIÉRCOLES	35,6
			JUEVES	36,7
			VIERNES	35,8
			SÁBADO	35,9
			LUNES	35,7
			MARTES	35,9
			MIÉRCOLES	36
4	JUAN DAVID BECERRA ANDRICA	1.002.744.247	JUEVES	35,9
			VIERNES	35,8
			SÁBADO	34,9

Febrero 21 al 26 de 2022



Nro	NOMBRE	ASISTENCIA MAÑANA		DIA	TMPRT INGRESO
		CEDUJA			
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816		LUNES	36
				MARTES	35
				MIÉRCOLES	35,6
				JUEVES	36,7
				VIERNES	35,8
				SÁBADO	35,9
2	WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ	9.697.803		LUNES	35,5
				MARTES	35,8
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	35,9
				VIERNES	35
				SÁBADO	34,9
3	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989		LUNES	35,7
				MARTES	35,9
				MIÉRCOLES	36
				JUEVES	35,9
				VIERNES	35,8
				SÁBADO	34,9
4	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247		LUNES	35,9
				MARTES	36,7
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	36,3
				VIERNES	34,9
				SÁBADO	36

Nro	NOMBRE	ASISTENCIA TARDE		DIA	TMPRT SALIDA
		CEDUJA			
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816		LUNES	35,3
				MARTES	36
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	34,9
				VIERNES	35,7
				SÁBADO	36
2	WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ	9.697.803		LUNES	34,9
				MARTES	35,7
				MIÉRCOLES	36
				JUEVES	35,6
				VIERNES	35,6
				SÁBADO	35,3
3	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989		LUNES	36
				MARTES	35
				MIÉRCOLES	35,6
				JUEVES	36,7
				VIERNES	35,8
				SÁBADO	35,9
4	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247		LUNES	35,5
				MARTES	35,8
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	35,9
				VIERNES	35
				SÁBADO	34,9

Febrero 28 al 5 de marzo de 2022



**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS**



**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS**

Nro	NOMBRE	ASISTENCIA MAÑANA	CEDULA	DIA		TIPO	INGRESO
				ASISTENCIA	TIPO		
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816		LUNES			35,7
				VIERNES			35,9
				MIÉRCOLES			36
				JUEVES			35,9
				VIERNES			35,8
				SÁBADO			34,9
				LUNES			36
2	WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ	9.697.803		MIÉRCOLES			35,6
				JUEVES			35,6
				VIERNES			35,6
				SÁBADO			34,9
				LUNES			34,9
				MIÉRCOLES			35,7
				VIERNES			36
3	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989		JUEVES			35,6
				VIERNES			35,6
				SÁBADO			35,3
				LUNES			35,5
				MIÉRCOLES			35,8
				JUEVES			35,9
				VIERNES			35,9
4	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247		VIERNES			35
				SÁBADO			34,9



**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS**

Nro	NOMBRE	ASISTENCIA TARDE	CEDULA	DIA		TIPO	SALIDA
				ASISTENCIA	TIPO		
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816		LUNES			34,8
				VIERNES			35
				MIÉRCOLES			35
				JUEVES			35
				VIERNES			34,8
				SÁBADO			35,2
				LUNES			35,9
2	WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ	9.697.803		MIÉRCOLES			35,9
				JUEVES			35,9
				VIERNES			35,9
				SÁBADO			34,9
				LUNES			35,8
				MIÉRCOLES			36
				VIERNES			35,9
3	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989		JUEVES			34,9
				VIERNES			35,7
				SÁBADO			36
				LUNES			34,9
				MIÉRCOLES			35,6
				JUEVES			36
				VIERNES			36,1
4	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247		VIERNES			35,9
				SÁBADO			36

Marzo 7 al 12 de 2022



 RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		ASISTENCIA MAÑANA		ASISTENCIA TARDE		
		Nro	NOMBRE	CECULA	DIA	TIEMP INGRESO
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,5	LUNES	35,5
			MARTES	35,8	MARTES	35,8
			MIÉRCOLES	35,9	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9	JUEVES	35,9
			VIERNES	35	VIERNES	35
			SÁBADO	34,9	SÁBADO	34,9
			LUNES	36	LUNES	36
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	35	MARTES	36,7
			MIÉRCOLES	35,6	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	36,7	JUEVES	36,3
			VIERNES	35,8	VIERNES	34,9
			SÁBADO	35,9	SÁBADO	36
			LUNES	34,9	LUNES	35,1
			MARTES	35,7	MARTES	36
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	MIÉRCOLES	36	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,6	JUEVES	34,9
			VIERNES	35,6	VIERNES	35,7
			SÁBADO	35,3	SÁBADO	36

 RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		ASISTENCIA TARDE		ASISTENCIA MAÑANA		
		Nro	NOMBRE	CECULA	DIA	TIEMP SALIDA
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,5	LUNES	35,5
			MARTES	35,8	MARTES	35,8
			MIÉRCOLES	35,9	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9	JUEVES	35,9
			VIERNES	35	VIERNES	35
			SÁBADO	34,9	SÁBADO	34,9
			LUNES	35,9	LUNES	35,9
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	36,7	MARTES	36,7
			MIÉRCOLES	35,9	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	36,3	JUEVES	36,3
			VIERNES	34,9	VIERNES	34,9
			SÁBADO	36	SÁBADO	36
			LUNES	35,1	LUNES	35,1
			MARTES	36	MARTES	36
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	MIÉRCOLES	35,9	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	34,9	JUEVES	34,9
			VIERNES	35,7	VIERNES	35,7
			SÁBADO	36	SÁBADO	36

Marzo 14 al 19 de 2022.



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

Nro	NOMBRE	CEDULA	ASISTENCIA MAÑANA	
			DIA	TIEMPO INGRESO
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,5
			MAARTES	35,8
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35,9
			SÁBADO	34,9
			LUNES	34,9
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MAARTES	35,7
			MIÉRCOLES	35,7
			JUEVES	35,6
			VIERNES	35,6
			SÁBADO	35,3
			LUNES	35,7
			MAARTES	35,9
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.000.744.247	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35,8
			SÁBADO	34,9



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

Nro	NOMBRE	CEDULA	ASISTENCIA TARDE	
			DIA	TIEMPO SALIDA
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	34,9
			MAARTES	35,6
			MIÉRCOLES	36
			JUEVES	36,1
			VIERNES	35,9
			SÁBADO	36
			LUNES	35,3
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MAARTES	35,9
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	34,9
			VIERNES	35,7
			SÁBADO	36
			LUNES	34,8
			MAARTES	35
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.000.744.247	MIÉRCOLES	35
			JUEVES	35
			VIERNES	34,8
			SÁBADO	35,7

Marzo 21 al 26 de 2022



Nro	NOMBRE	ASISTENCIA MAÑANA		DIA	TMPRT INGRESO
		CEBULA			
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816		LLUNES	35,3
				MARTES	36
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	34,9
				VIERNES	35,7
				SÁBADO	36
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989		LLUNES	35,9
				MARTES	36,7
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	36,3
				VIERNES	34,9
				SÁBADO	36
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247		LLUNES	35,5
				MARTES	35,8
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	35,9
				VIERNES	35
				SÁBADO	34,9

Nro	NOMBRE	ASISTENCIA TARDE		DIA	TMPRT SALIDA
		CEBULA			
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816		LLUNES	34,9
				MARTES	35,7
				MIÉRCOLES	36
				JUEVES	35,6
				VIERNES	35,6
				SÁBADO	35,3
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989		LLUNES	36
				MARTES	35
				MIÉRCOLES	35,6
				JUEVES	36,7
				VIERNES	35,8
				SÁBADO	35,9
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247		LLUNES	35,5
				MARTES	35,8
				MIÉRCOLES	35,9
				JUEVES	35,9
				VIERNES	35
				SÁBADO	34,9

Marzo 28 al 2 de abril de 2022



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

NID	NOMBRE	CEDULA	ASISTENCIA MAÑANA	
			DIA	TIEMPO INGRESO
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	36
			MARTES	35
			MIÉRCOLES	35,6
			JUEVES	36,7
			VIERNES	35,8
			SÁBADO	35,9
			LUNES	35,3
2	JOVANNY MAURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	36
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	34,9
			VIERNES	35,7
			SÁBADO	36
			LUNES	35,5
			MARTES	35,8
3	JUAN DAVID BECERRA ANDRICA	1.002.744.247	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35
			SÁBADO	34,9



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

NID	NOMBRE	CEDULA	ASISTENCIA TARDE	
			DIA	TIEMPO SALIDA
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	34,9
			MARTES	35,7
			MIÉRCOLES	36
			JUEVES	35,6
			VIERNES	35,6
			SÁBADO	35,3
			LUNES	35,9
2	JOVANNY MAURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	36,7
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	36,3
			VIERNES	34,9
			SÁBADO	36
			LUNES	35,5
			MARTES	35,8
3	JUAN DAVID BECERRA ANDRICA	1.002.744.247	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35
			SÁBADO	34,9

Abril 4 al 9 de 2022



Nro	ASISTENCIA MAÑANA		DIA	TMPPT INGRESO
	NOMBRE	CEDEULA		
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,5
			MARTES	35,8
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35
			SÁBADO	34,9
			LUNES	36
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	35
			MIÉRCOLES	35,6
			JUEVES	36,7
			VIERNES	35,8
			SÁBADO	35,9
			LUNES	34,9
			MARTES	35,7
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	MIÉRCOLES	36
			JUEVES	35,6
			VIERNES	35,6
			SÁBADO	35,3

Nro	ASISTENCIA TARDE		DIA	TMPPT SALIDA
	NOMBRE	CEDEULA		
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,5
			MARTES	35,8
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35
			SÁBADO	34,9
			LUNES	35,9
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	36,7
			MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	36,3
			VIERNES	34,9
			SÁBADO	36
			LUNES	35,3
			MARTES	36
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	MIÉRCOLES	35,9
			JUEVES	34,9
			VIERNES	35,7
			SÁBADO	36

Abril 11 al 16 de 2022



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

Nro	NOMBRE	CERTEJA	ASISTENCIA MAÑANA	
			DIA	TIEMPO INGRESO
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,5
			MARTES	35,8
			MIERCOLES	35,9
			JUEVES	35,9
			VIERNES	35
			SABADO	34,9
			LUNES	34,9
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	35,7
			MIERCOLES	36
			JUEVES	35,6
			VIERNES	35,6
			SABADO	35,3
			LUNES	35,8
			MARTES	36
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	MARTES	INCAPACITADO
			MIERCOLES	INCAPACITADO
			JUEVES	INCAPACITADO
			VIERNES	SAUO
			SABADO	SAUO
			MARTES	35,9
			MARTES	36

OBSERVACIONES

El trabajador JUAN DAVID BECERRA ANDICA, ayudante de obra, estuvo incapacitado los días 20 y 21 de abril por enfermedad general. El 22 del mismo mes nos comunica que renuncia.



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

Nro	NOMBRE	CERTEJA	ASISTENCIA TARDE	
			DIA	TIEMPO SALIDA
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,9
			MARTES	36,7
			MIERCOLES	35,9
			JUEVES	35,3
			VIERNES	34,9
			SABADO	36
			LUNES	35,3
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	MARTES	36
			MIERCOLES	35,9
			JUEVES	34,9
			VIERNES	35,7
			SABADO	36
			LUNES	35,3
			MARTES	35,9
3	JUAN DAVID BECERRA ANDICA	1.002.744.247	MARTES	INCAPACITADO
			MIERCOLES	INCAPACITADO
			JUEVES	INCAPACITADO
			VIERNES	SAUO
			SABADO	SAUO
			MARTES	35,9
			MARTES	36

Abril 18 al 23 de 2022



Nro	NOMBRE	ASISTENCIA MAÑANA		DIA	TIMPRT INGRESO
		CEDEULA			
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,5	
			MARTES	35,8	
			MIÉRCOLES	35,9	
			JUEVES	35,9	
			VIERNES	35	
			SÁBADO	34,9	
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	LUNES	35,3	
			MARTES	36	
			MIÉRCOLES	35,9	
			JUEVES	34,9	
			VIERNES	35,7	
			SÁBADO	36	

Nro	NOMBRE	ASISTENCIA TARDE		DIA	TIMPRT SALIDA
		CEDEULA			
1	DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.816	LUNES	35,3	
			MARTES	36	
			MIÉRCOLES	35,9	
			JUEVES	34,9	
			VIERNES	35,7	
			SÁBADO	36	
2	JOVANNY MURILLO AVENDAÑO	14.191.989	LUNES	35,5	
			MARTES	35,8	
			MIÉRCOLES	35,9	
			JUEVES	35,9	
			VIERNES	35	
			SÁBADO	34,9	

Abril 25 al 30 de 2022

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



REDIMAC

ANEXO 2

ENTREGA DE EPP Y BIOSEGURIDAD

CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE	Yelson Magaña Hernandez	CEDULA No.	102744326	CARGO	Ayudante de obra
OSER:	DESCRIPCIÓN: BARRIO SAN HIDRO, ANHEIMA CALLOS				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Posibles causas de repetición: Mala calidad, desgaste, rotura lisa

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIIBLES CAUSAS DE REPETICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco Arcosillo		1	6-10-21	Yelson Hernandez
2	Tapabocas		2	8-10-21	Yelson Hernandez
3	Guaantes Vaqueta		1	8-10-21	Yelson Hernandez
4	Guaantes Vaqueta		1	3-11-21	Yelson Hernandez
5	Gafas transparentes		1	3-11-21	Yelson Hernandez
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	YENIS CAMILA GARCERAN GIL	CEDULA No.	100102025
CARGO	JEFE DE O-SALUD OCUPACIONAL	FIRMA	Oxandys G.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el Trabajo que contribuyan a su bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (autorizados para su uso) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUBSISTIVO DEL TRABAJO: Art. 88 y Art. 89 numeral 1; LEY 9 DE 1976: Art. 80; DECRETO 2800 Art. 3; DECRETO 1366 DE 1991: Art. 21; LEY 1466 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y estado de los EPP. El presente compromiso quedará acreditado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Yelson Hernandez

CEDULA No:

1.027.441.326

CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 NOMBRE: Juan David Becerra Archa CÉDULA No. 1.001.744.247 CARGO Apudante de obra
 OBR.: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ELICTRIFICADO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO DIRECCIÓN: SEMIÓforo SAN ISIDRO, ANSERMA CALDERA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Posibles causas de reposición: Mala calidad, desgaste, roturas, referir las

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad.		1	26-11-21	Juan David b.A.
2	Guantes vaqueta.			26-11-21	Juan David b.A.
3	Topabrisas			26-11-21	Juan David b.A.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DETOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: _____ CÉDULA No. _____
 CARGO: SEMI-SALUD OCCUPACIONAL FIRMA: Carulla Co.

COMPROBANDO

Se comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUBSISTIVO DEL TRABAJO; Art. 95 y Art. 96 n.º numeral 1; LEY 9 DE 1978; Art. 89; DECRETO 1840 Art. 3; DECRETO 1840 DE 1981; Art. 21LEY 1688 DE 2012; Art. 37. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

Se presente competente aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROBANDO: Juan David b.A. CÉDULA No. 1.001.744.247



CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



DETOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE	Josanny Muello Ayebarsu	CEDULA No.	14.191.989	CARGO	Ayudante de C.A.A.
OBRA:	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE AGUAS, ALIMENTACIÓN Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ARRILLO VIAL SAN HENRO				
DIRECCIÓN: BARRIO SAN HENRO, ASERENA CALZAS					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Posibles causas de reposición: Mala calidad, desgaste, rotura liso

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIIBLES CAUSAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad		1	1-12-21	Josanny Muello
2	Guaotas Vaqueta		1	1-12-21	Josanny Muello
3	Tapabocas		1	1-12-21	Josanny Muello
4	Botas de Seguridad		1	6-12-21	Josanny Muello
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	YENY CAMILA ORAJALES GU	CEDULA No.	196186235
CARGO	ENC. SALUD OCUPACIONAL	FIRMA	Yenny G.

COMPROBEMO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a un bienestar físico, psicológico y social. Declaro que la recepción expresada en este documento es correcta y adecuada de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUBSTATIVO DEL TRABAJO: Art. 96 y Art. 97 numeral 1; LEY 9 DE 1971: Art. 66; DECRETO 2400 Art. 3; DECRETO 1809 DE 1994; Art. 23; LEY 1563 DE 2010; Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de sus deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROBEMO:

Josanny Muello

CEDULA No: 14.191.989



CONSORCIO
REDES AERIAS

CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE	Walter Daniel Velozquez	CEDULA No.	9.697.803	CARGO	Ayudante de obra
OSHA	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACREVUCTO, ELABORADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL ALM HEDRO	DIRECCIÓN:	BARRO SAN HEDRO, AMERBIE CALLES		

FASE 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Possibles causas de exposición: Hacia ciudad, de agosto, retiro lino

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE EXPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDA
1	Casco de Seguridad		1	26-11-2021	Walter Daniel Velozquez
2	Guaantes Vaqueta		1	26-11-2021	Walter Daniel Velozquez
3	Tapabocas		1	26-11-2021	Walter Daniel Velozquez
4	Gafas de Seguridad		1	30-11-2021	Walter Daniel Velozquez
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	YENNY CAMILA ORAJALES GIL	CEDULA No.	EDW202885
CARGO	SUS SALUD OCUPACIONAL	FIRMA	Yenny Gil

COMPROMISO

No comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenidos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Usaré los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy comprometido con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUBTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 86 y Art. 88 numeral 7; LEY 0 DE 1978; Art. 86; DECRETO 2400 Art. 3; DECRETO 1598 DE 1994; Art. 81; LEY 1968 DE 2018; Art. 37. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y obligaciones con el trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEY EL COMPROMISO:

Walter Daniel Velozquez

CEDULA No. 9.697.803



CONSEJO
NACIONAL DE
SEGURIDAD

CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE	Dilmer Antonio Luz 6.	CECULA N°.	6-357-816	CARGO	Ayudante de aseo.
OSHA:	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALICANTAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ENTORNO VIAL SAN ISIDRO FASE I	DIRECCIÓN:	BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Eválúese causas de reposición: Mala calidad, desgaste, rotura, etc.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad		1	0-10-21	Dilmer Antonio Luz
2	Gafas transparentes		1	0-10-21	Dilmer Antonio Luz
3	Tapabocas		1	3-11-21	Dilmer Antonio Luz
4	Guantes vaqueta.		1	3-11-21	Dilmer Antonio Luz
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	YENNY CARMELA ORAJALES GIL	CECULA No.	
CARGO	SUS NILO-SALUD OCCUPACIONAL	FIRMA	CONTRALUZ CO.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que corresponden a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normativa: CÓDIGO SUBSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 66 numeral 1; LEY 9 DE 1978; Art. 84; DECRETO 1806 DE 1994; Art. 3; DECRETO 1206 DE 1994; Art. 23; LEY 1462 DE 2012; Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y DEL COMPROMISARIO:

FIRMA	Dilmer Antonio Luz	CECULA No.	6-357-816
-------	--------------------	------------	-----------

CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE	Juan Camilo Castañeda	CEDULA No.	1.054.925.408	CARGO	Ayudante de Construcción
OBRA:	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALICANTILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ENTILLO VIEL SEN ISORO FASE 1	DIRECCIÓN:	BARRIO SAN HIDRO, ENSEÑAS CAJAS		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Posibles causas de reposición: Mala calidad, desgaste, rotura lisa

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	FORMAS CAJAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Topadoras		2	28-09-21	Juan Camilo C.
2	Guantes de trabajo		1	20-10-21	Juan Camilo C.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	YENNY CAMILA ORJALAS OIL	CEDULA No.	100020286
CARGO	AUX SING-SALUD OPERACIONAL	FIRMA	Camila O.

COMPROMISO

Yo, comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUCUMATIVO DEL TRABAJO; Art. 65 y Art. 68 numeral 1; Ley 9 de 1978; Art. 16; DECRETO 1385 DE 1994; Art. 22, Ley 1502 DE 2012; Art. 27 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Juan Camilo C. CEDULA No: 1.054.925.408



CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			
NOMBRE	CREDULA No.	CARGO	MAGISTRO de obra.
OBRA:	DIRECCIÓN:	BARRIO SAN ISIDRO, ARRENERIA CALDES	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (APP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE REPETICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guanites Maqueta		1	20-10-21	<i>Trujillo</i>
2	Topobocas		3	20-10-21	<i>Trujillo</i>
3	Guanites	Desgaste.	1	25-11-21	<i>Trujillo</i>
4	Gafas de seguridad		1	25-11-21	<i>Trujillo</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	
NOMBRE	CEDULA No.
GABRIEL	10089288
CARGO	TIENDA
	CAJUBO Co.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normativa: CODIGO SUBSTATIVO DEL TRABAJO, Art. 90 y Art. 91 numeral 7; Ley 9 de marzo 17; Ley 8 de marzo 17; Ley 9 de marzo 17; Decreto 4400 Art. 3; Decreto 1090 DE 1994; Art. 22 LETY 1992 DE 2012; Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: *Trujillo*

CEDULA No.	5 697 080
------------	-----------



CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

<p align="center">DAVOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</p>	
NOMBRE	<p>Dalmes Antonio Ruiz Gonsa</p>
CEDELA No.	<p>6.357.816</p>
CARGO	<p>Ayudante de obra</p>
OBRA:	<p>RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S</p>
DIRECCIÓN:	<p>BARRIO SAN BUENO AVENIDA CALDAS</p>

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Posibles causas de reposición: Mala calidad, desgaste, rotura, etc.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad		1	15-02-22	D. Alvarez P. Ruiz
2	Gauchos		1	15-02-22	D. Alvarez P. Ruiz
3	Tapabocas		2	15-02-22	D. Alvarez P. Ruiz
4	Chaleco Reflector		1	01-03-22	D. Alvarez P. Ruiz
5	Gafas Tiempo de Seguridad		1	17-03-22	D. Alvarez P. Ruiz
6					
7					
8					
9					
10					

DAVOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	<p>YENNY GARCIA ORJALES OEL</p>
CEDELA No.	<p>1000000000</p>
CARGO	<p>AUX SIGO-SALUD OCUPACIONAL</p>
FIRMA	<p>Comitelo G.</p>

COMPROMISO

Yo, comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

(Cuando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) están suministrados por el empleador, el trabajador debe cumplir con las siguientes obligaciones: CODIGO SUPLENTE DEL TRABAJO; Art. 86 y Art. 88 numeral 1; LEY 8 DE 1995; Art. 68; DECRETO 2600 Art. 3; DECRETO 1096 DE 1994; Art. 32 LET 1862 DE 2012; Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	<p>D. Alvarez P. Ruiz</p>
CEDELA No:	<p>6.357.816</p>



CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE: Juan David Becerra Ardán CÉDULA No. 10027442147 CARGO Ayudante de obra

ORLA: RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S DIRECCIÓN: BARRIO SAN HEDRO ANERMA CALLES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Posibles causas de reposición: Mala calidad, desgaste, refusa llen

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad		1	25-02-22	Juan David B.A
2	Chalero reflectivo		1	1-08-22	Juan David B.A
3	Gautes		1	25-02-22	Juan David B.A
4	Tapabocas		2	25-02-22	Juan David B.A
5	Gafas de Seguridad		1	07-03-22	Juan David B.A
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: YENY GEMELA CRUJELES DEL CÉDULA No. 1002000549

CARGO: AUX HEDRO-SALUD OCUPACIONAL FIRMA: Carulla Co

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo tops de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definido en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO ORGANIZATIVO DEL TRABAJO; Art. 66 y Art. 68 numeral 7; LEY 6 DE 1979; Art. 28; DECRETO 2400 Art. 3; DECRETO 1568 DE 1994; Art. 23; LEY 1562 DE 2012; Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará anotado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Juan David CÉDULA No. 10027442147



CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
NOMBRE <i>Jovanny Merino Alvarado</i>	CEDULA No. <i>14.191.989</i>
OBRA <i>RED DE INGENIEROS, MECANICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.</i>	CARGO <i>Ayudante de obra</i>
DIRECCIÓN: <i>BARRIO SAN ISIDRO ANTERENA CALDAS</i>	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

Posibles causas de reposición: Mala calidad, desgaste, rotura, etc.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad		1	25-02-22	Jovanny Merino
2	Chaleco Reflector		1	1-03-22	Jovanny Merino
3	Gaúfres		1	25-02-22	Jovanny Merino
4	Tapabocas		2	25-02-22	Jovanny Merino
5	Gafas de Seguridad		1	19-03-22	Jovanny Merino
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE <i>YENNY CAMILA ORJALES OJE</i>	CEDULA No. <i>1968002835</i>
CARGO <i>RUX ISO-SALUD OCUPACIONAL</i>	FIRMA <i>Yenny Oje</i>

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuya a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.

Quando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador adscrito en la ley a través de la empresa acordada: CODIGO SUBSECTOR DEL TRABAJO: Art. 86 y Art. 88 numeral 1; Ley 1712 de 2014; Art. 86; DECRETO 1080 DE 1994; Art. 22 del Decreto 1012 de 2015; Art. 87. Soy responsable del uso y estado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y deberes como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: <i>Jovanny Merino</i>		CEDULA No. <i>14.191.989</i>
---	--	---------------------------------



CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			
NOMBRE	Walter Daniel Velásquez	CEDULA No.	9.694.803
CARGO		CARGO	Ayudante de obra
EMPRESA	MED DE INGENIERIA, MECANICA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	PREVENCIÓN:	TRABJO SIN MEDIO AMBIENTE CAIDAS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS
 Posibles causas de reposición: Mala calidad, desgaste, rotura lisa

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EPP	POSIBLES CAUSAS DE REPOSICIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad		1	21-02-22	Walter Daniel Velásquez
2	Chaleco Reflectivo		1	01-03-22	Walter Daniel Velásquez
3	Guantas		1	22-02-22	Walter Daniel Velásquez
4	Tapabocas		2	22-02-22	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	TENSY CÁMILA GUAJALES GEL	CEDULA No.	1000000000
CARGO	AUX BISO-ABRIDO OCUPACIONAL	FIRMA	Caundero

COMPROMISO
 Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido capacitación sobre el uso adecuado de los mismos.
 Cuando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador regulados en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUBSTATIVO DE TRABAJO; Art. 05 y Art. 06 numeral 1; LEY 9 DE 1978; Art. 05; DECRETO 2400 Art. 3; DECRETO 1088 DE 1994; Art. 22; LEY 1992 DE 2015; Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.			
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Walter Daniel Velásquez	CEDULA No.	9.694.803

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Contribuyendo Juntos al Bienestar



REDIMAC

ANEXO 3

BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Compañías que cuidan tu bienestar



REDIMAC

BITACORAS VIGENCIA 2021


**OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO
 FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.**
Elaborado por:

Yensy Camila Grajales Gil

Cargo:

Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: Día soleado, nublado en horas de la tarde. Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 2, ayudante 7, vigilante.
	Se realiza aseo y desinfección de la obra, bodega y oficina de trabajo
	Se realiza recorrido a la obra (tramo 1 y tramo 2) verificando que los colaboradores estén usando correctamente los elementos de protección personal, se evidencia que faltan algunos epp como: tapa oídos y guantes de caucho. Se hace la solicitud de estos elementos al área encargada de suministrarlos.
	Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.
MARTES 7 DE SEPTIEMBRE	Reporte de clima: Templado en horas de la mañana y soleado en horas de la tarde. Personal de obra: Residente de obra (hasta las 9:00 am) Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra (hasta las 9:00 am) oficiales 2, ayudantes 7, vigilante.
	se realiza recorrido a la obra dejando registro fotográfico de las actividades evidenciadas.
	Se hace la devolución de material alquilado en INGEEQUIPOS. (Formaletas, alineador de 4m, taco metálico corto, portafijador, prensa, fijador, R-fijador.
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE	Reporte clima: Lluvia Moderada en la mañana, nublado en horas de la tarde Personal de obra: Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro reemplazo, 1 oficial, 6 ayudantes, Vigilante.
	Se recibió suministro de base, 4 volquetadas y 1 de suministro de arena
	Se realiza Charla, recordatorio sobre protocolo de bioseguridad enfocándonos en el lavado constante de manos y uso obligatorio del tapabocas
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE	Reporte clima: día soleado (mañana y tarde) Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro reemplazo, 1 oficial, 6 ayudantes, Vigilante.
	Se realiza visita del Ingeniero interventor de la obra Johan Sabogal y la trabajadora social Tatiana Betancur por medio de Empocaldas y Natalia Sanchez Gestora Social del contrato, se hace recorrido por la obra verificando sus avances y realizando sus debidas observaciones.
	Se lleva a cabo el comité de obra y presentación de la nueva Ingeniera residente. Con acompañamiento Virtual del Ingeniero jefe Edgar Darío
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE	Reporte clima: día soleado (mañana y tarde) Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro reemplazo, 1 oficial, 6 ayudantes, Vigilante
	En el recorrido de obra, se observa una domiciliaria la cual está mal ubicada y se tiene que anular.
	Se instala la tubería con una nueva ubicación
	Los trabajadores se encuentran reafirmando la base, se hace recorrido y se deja evidencia fotográfica las cuales se presentarán en el informe quincenal.
SABADO 11 DE SEPTIEMBRE	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
	Iniciación de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am
	Terminación de la domiciliaria.
	Jornada de Aseo y adecuación del material, del área de trabajo y de la oficina
	Se realiza registro de salida a las 12:00 pm del personal con toma de asistencia, temperatura,

**BITACORA SEMANAL**

CONSORCIO REDES ANSERMA

**OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO
FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.**

Elaborado por:



Yensy Camila Grajales Gil

Cargo:

Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: Día soleado. Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 5, (1 INCAPACITADO) vigilante.
	Se realiza organización de una Az con lista de chequeo por cada laborador la cual contiene afiliaciones, entrega de epp, examen medico de ingreso, contrato de trabajo, copia de cedula
	Se realiza recorrido a la obra (tramo 1 y tramo 2) verificando que los colaboradores esten usando correctamente los elementos de proteccion personal.
	Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: Día soleado. Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 5, (1 INCAPACITADO) vigilante.
	se realiza aseo y adecuacion de la bodega y oficina de trabajo
	revisando las liquidaciones del personal que ha salido se evidencia que faltan por pagar liquidaciones del personal retirado durante el mes de septiembre
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: templado en horas de la mañana y soleado en horas de la tarde Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 5, (1 INCAPACITADO) vigilante.
	se recibe suministro de base, una volqueta
	Recorrido de obra en tramo 1 y 2, analizando y detectando posibles factores de riesgo dentro de la obra.
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE	Reporte clima: día soleado (mañana y tarde) Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro reemplazo, 1 oficial, 5 ayudantes, (1 INCAPACITADO) Vigilante.
	Se realiza las actas de vecindad en el tramo 1 esto con el fin de garantizar el estado en el que se encuentra las viviendas en estos momentos.
	Jornada de Aseo y adecuación del material, del area de trabajo y de la oficina
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE	Reporte clima: día soleado (mañana y tarde) Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro reemplazo, 1 oficial, 5 ayudantes, (1 INCAPACITADO) Vigilante.
	Se realiza comité de obra con el acompañamiento de interventoria y gestion social empocaldas, Ingeniero y arquitecto por medio de la alcaldía municipal y por medio del consorcio: Ingeniero contratista, Aux Siso, Operario de maquinaria, Inge residente.
	Recorrido de obra en tramo 1 y 2 dejando registro fotografico de avances
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE	Iniciacion de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am
	Reporte clima: día soleado (mañana y tarde) Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro reemplazo, 1 oficial, 6 ayudantes, Vigilante.
	fundicion de la Viga de cimentacion, se hace acompañamiento siso e Ingeniera residente y se deja registro fotografico
	Se realiza registro de salida a las 10:30 am ya que se les debe una hora y media de trabajo extra. Se toma temperatura aleatoria

	desinfeccion y correcto lavado de manos.	
BITACORA SEMANAL		
OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.		
Elaborado por:	Yensy Camila Grajales Gil	Cargo: Inspector Siso
ANOTACIONES		
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: Día soleado. obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 6, vigilante.	Personal de
	Recorrido de obra	
	Se susperiten 4 trabajadores hasta nueva orde. Daniel Velasquez, Dilmer Antonio Ruiz Garcia, Jeison Alejandro Hernandez, Carlos Andres Rios Trejos.	Walter
	Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.	
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: Día nublado, se reporta lluvia de 9:00 am a 9:45 am Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.	
	Se realizan los formatos de entregas de elementos de protección personal, se anexan a la lista de chequeo.	
	Se hacen firmar los contratos de trabajo de las personal que faltaban	
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.	
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: Día nublado, se reporta lluvia de 6:00 am a 9:00 am y de 11:30 am a 1:00 pm Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.	
	Recorrido de obra dejando registro fotografico de los avances y del correcto uso de los epps	
	se realiza inspección de la señalización en la obra	
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.	
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: Día nublado en horas de la mañana, se reporta lluvia de 9:50 am a 10:30 am, clima templado en la tarde. Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.	
	Aseo, desinfección y adecuacion de la bodega y oficina de trabajo.	
	Recorrido de obra	
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.	
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE	Reporte de Clima: templado en la mañana, soleado en la tarde de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.	Personal de
	Supervisión de los factores de riesgo existentes en obra, está con el fin de slavaguardar la vida e integridad de los Colaboradores.	
	Se realiza la impresión del tramo 1, dejando listo para asfaltar mañana sabado, 25 de septiembre.	
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.	
SABADO 25 DE SEPTIEMBRE	Iniciacion de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am	
	Se realiza pavimentación de la vía, se hace acompañamiento por parte del ingeniero sabogal en horas de la mañana.	
	Pavimentación de la vía, se hace acompañamiento de la ingeniera residente y aux siso durante esta realización.	
	Se realiza registro de salida a las 5:00 pm, se laboran horas extras con el fin de terminar la pavimentación de la vía. Se toma temperatura aleatoria	
OBSERVACIONES		
Por motivos desconocidos, se retardan las maquinarias que llegaban el día jueves 23 de septiembre a realizar la pavimentación. Llegan el día viernes en horas de la tarde.		

**BITACORA SEMANAL**

CONSORCIO REDES ANSERMA

**OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.**

Elaborado por:

Yensy Camila Grajales Gil

Cargo:

Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 04 DE OCTUBRE	Reporte de Clima: Día soleado. Personal de obra: Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 3, vigilante.
	La auxiliar siso no asiste por incapacidad.
	Los trabajadores realizan actividades de excavación, demolición de la loza, compactación de la subbase y están realización las entradas de las casas que se habían dañado.
	Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.
MARTES 05 DE OCTUBRE	Reporte de Clima: Templado en horas de la mañana y soleado en horas de la tarde. Personal de obra: Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 3, vigilante.
	se solicita cita medica por medio de la ARL al trabajador JUAN BAUTISTA ZAPATA OSORIO por temas relacionados con el accidente el pasado 11 de septiembre de 2021
	los trabajadores se encuentran realizando compactación de la subrazante con vibro
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
MIERCOLES 06 DE OCTUBRE	Reporte de Clima: Soleado, se reporta lluvia de 4:30 pm a 5:30 pm Personal de obra: Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 3, vigilante.
	El trabajador JUAN BAUTISTA ZAPATA OSORIO se ausenta a las 9:00 am para asistir a cita medica en el hospital san vicente de paul, donde lo remiten con ortopedista. Sigue manifestando que debido a la piedra que no fue extraída por el medico que lo atendio el dia 11 de septiembre de 2021 el cual hizo énfasis en que esta situación no le generaría difultades, el trabajador sostiene pérdida de la sencibilidad en la zona sdel antebrazo afectado al igual que en 2 dedos de la mano.
	Recorrido de obra Tramo 2
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
JUEVES 07 DE OCTUBRE	Reporte de Clima: Día nublado en horas de la mañana, se reporta lluvia de 9:50 am a 10:30 am, clima templado en la tarde. Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.
	Se reintegra uno de los trabajadores (DILMER ANTONIO RUIZ) suspendido el 20 de septiembre del 2021, se afilia a la seguridad social.
	Se realizan las actas de vecindad del tramo 2 en compañía de la doctora Tatiana Betancur, Gestora Social de empocaldas.
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
VIERNES 08 DE OCTUBRE	Reporte de Clima: templado en la mañana, soleado en la tarde Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.
	armado de formaleta para muro, registro fotografico
	comité de obra en compañía del interventor de empocaldas, Inge residente, gestora social, aux siso
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
SABADO 09 DE OCTUBRE	Iniciacion de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am
	Baseo de muro en el tramo 2
	recorrido de obra tramo 2 dejando registro fotografico
	Se realiza registro de salida a las 5:00 pm, se laboran horas extras con el fin de terminar la pavimentación de la vía. Se toma temperatura aleatoria

OBSERVACIONES

El trabajador Juan Bautista manifiesta dolor continuo en el antebrazo del accidente y asiste a urgencias el día Domingo 10 de octubre de 2020, donde le dicen que si el dolor persiste debe asistir de nuevo.


OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.

Elaborado por: Yensy Camila Grajales Gil Cargo: Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 11 DE OCTUBRE	Reporte de Clima: Día soleado.
	Personal de obra: Residente de obra, aux siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.
	Armado de formaleta para bordillo, recorrido de obra y registro fotografico
	El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio menciona que debido al dolor que presento en horas de la noche el pasado domingo 10 de octubre de 2021, asistió a urgencias del hospital San Vicente de Paul en donde dice ser atendido nuevamente por no sentir sensación en la zona de antebrazo pero al momento de solicitarle la epícrisis de la atención no hace entrega de ningún documento oficial o original de los que remite la ips del hospital dee anserma. La auxiliar Siso se dirige la Hospital con el trabajador y no lo atienden por urgencias ya que la ARL debe autorizar primero. Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.
MARTES 12 DE OCTUBRE	Reporte de Clima: Templado, lluvia de 1:30 pm a 2:20 pm
	Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.
	El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio manifiesta dolor pero no va al hospital por las esperas y porque por urgencias no lo quieren atender. Dice esperar el tramite de la autorizacion por ortopedia por medio de la ARL el cual se va a realizar en la ciudad de manizales. Se envían un domiciliario con los documentos de la remisión a la oficina de sura en manizales y al llegar le dicen que no estan atendiendo presencial si no virtual y le entregan los numeros telefonicos donde se debe hacer la gestión. Se extiende la jornada laboral con el fin de terminar el baseo de los metros lineales que se habian formaleteado. Se termina a las 6:45 pm Se realiza registro de salida del personal (6:45 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
	Reporte de Clima: Soleado
MIERCOLES 13 DE OCTUBRE	Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.
	Se reparten volantes en las casas del tramo 2, avisando que sera suspendido el servicio de acueducto a partir de las 8:30 am ya que van a profundizar el tuvo principal del agua. La comunidad el día martes 12 de octubre en horas de la noche, dañaron aproximadamente 10 mts lineales del bordillo que se habia baseado ese mismo día, pasandose por encima de él, estando la mezcla fresca. Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
	Reporte de Clima: templado, llovizna de 3:00 pm a 3:40 pm
JUEVES 14 DE OCTUBRE	Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 3, vigilante.
	Se intenta llamar a la ARL sura telefonos: 8756222-3185813637. con el fin de hacer autorizar la cita de ortopedia del trabajador Juan Bautista Zapata Osorio, pero no contestan. Recorrido de obra dejando registro fotografico del segundo baseo de berdillo del tramo 2 Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
	Reporte de Clima: templado en la mañana, soleado en la tarde
VIERNES 15 DE OCTUBRE	Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.
	El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio asiste al hospital San Vicente de Paul y le dieron incapacidad por 7 dias. Hace entrega de epícrisis e incapacidad. Recorrido de obra dejando registro fotografico del segundo baseo de berdillo del tramo 2 Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
	Reporte de Clima: templado en la mañana, soleado en la tarde
SABADO 16 DE OCTUBRE	Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 2, vigilante.
	Inicio de labores 7:00 am, Se hace el registro de Ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am Capacitación sobre SG-SST Recorrido de obra tramo 2 Se realiza registro de salida a las 12:00 pm
	Reporte de Clima: templado en la mañana, soleado en la tarde



BITACORA SEMANAL

CONSORCIO REDES ANSERMA



OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO
FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.

Elaborado por: Yensy Camila Grajales Gil Cargo: Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021	SIN ACTIVIDADES (LUNES FESTIVO)
MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante. Recorrido de obra: los trabajadores se encuentran retirando formaleta y realizando el replanteo para los bordillos
	El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio lleva la incapacidad a la oficina de la nueva eps en anserma caldas donde le dicen que esos papeles se deben llevar a Manizales o realizar la gestion por internet.
	Se realiza registro de salida del personal (6:45 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante. El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio ingresa a trabajar hoy miercoles 20 de octubre despues de la incapacidad por 7 dias
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021	recorrido de obra: los trabajadores se encuentran formaleutando para bordillos y realizaron zanja para filtro
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
	Reporte de Clima: templado, lluvia de 12:30 pm a 2:00 pm Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante. El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio manifiesta dolor en el antebrazo pero no asiste al hospital.
JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021	La Aux siso se cominuca con la arl y autoriza la cita con ortopedia del trabajador Juan Bautista Zapata Osorio, en 5 dias habiles se estarán comunicando con el trabajador para dar la direccion de la clinica y la fecha de la cita.
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 4, vigilante.
VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021	Se realiza el comité de obra
	Adelanto de bitacora semanal
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2021	Inicio de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am
	Aseo, adecuacion y desinfección de la bodega y oficina de trabajo
	Recorrido de obra: los travbajadores se encuentran baseando bordillo y el anden de una casa en tramo 1 que se había dañado durante la realización de la obra.
	Salida de los trabajadores a las 12:00 pm registro de salida, toma de temperatura y lavado de manos

OBSERVACIONES

El día viernes el trabajador Juan Camilo Castaño, ayudante de construcción, se ausenta a las 7:00 am para asistir a la vacuna del COVID-19 primera dosis. Ingres a trabajar a las 9:00 am



BITACORA SEMANAL

CONSORCIO REDES ANSERMA



OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.

Elaborado por:

Yensy Camila Grajales Gil

Cargo:

Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 01 DE NOVIEMBRE

SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)

MARTES 02 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Soleado

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.

Se realiza recorrido de obra tomando registro fotografico para informe de supervisión

Se verifico el uso de los elementos de protección personal en los trabajadores.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Soleado

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 3, vigilante.

El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio falta a laborar ya que tiene cita de ortopedia a las 9:20 en Manizales.

El trabajador regresa a las 3:30 pm, presentando epicrisis y radiografia. Manifiesta tener cita nuevamente el miercoles 10 de noviembre para revisión de la riografia.

Se realiza comité tecnico de obra en compañía de empocaldas (supervisor y trabajador social).

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

JUEVES 04 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: templado, lluvia de 8:00 am a 8:40 am y de 3:10 pm a 5:00 pm

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.

Se realiza aseo, adecuación y desinfección de la bodega y oficina de trabajo.

Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran formaleteando y baseando gavión, se comenzo la excavación para filtro.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.

VIERNES 05 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Soleado

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 4, vigilante.

El trabajador Henry Eduan Villamarin (Operario Maquinaria) se ausenta a las 9:30 am para ir al hospital ya que se encuentra enfermo. Manifiesta que los dejarón todo el día en urgencias y presenta epicrisis.

Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran realizando excavación para conectar el filtro al pozo.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

SABADO 06 DE NOVIEMBRE

Iniciacion de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am

Recorrido de obra verificando el uso de los elementos de protección personal.

Entrega de bitacora semanal de actividades.

Salida de los trabajadores a las 12:00 pm registro de salida, toma de temperatura y lavado de manos



BITACORA SEMANAL

CONSORCIO REDES ANSERMA



OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.

Elaborado por:

Yensy Camila Grajales Gil

Cargo:

Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 08 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Soleado en la mañana, nublado en la tarde, lluvia de 3:45 pm a 4:45 pm
Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.

Los trabajadores Juan Bautista Zapata y Juan Camilo Castañeda asisten tarde a laborar, pasadas las 7:00 am. En varias ocasiones se les ha llamado la atención por lo mismo, se deja constancia de que la proxima vez que asistan tarde a laborar se hará memorando.

Se realiza recorrido de obra revisando el uso correcto de los epp

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

MARTES 09 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Nublado, lluvia de 3:00 pm a 4:00 pm
Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.

Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran continuando con las actividades de instalación de filtro frances.

Se realiza actualización de bitacora diaria en obra.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Nublado, lluvia de 2:00 pm a 3:30 pm
Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 3, vigilante.

El trabajador Juan Bautista Zapata falta el día miercoles 10 de noviembre para asistir a cita medica (revisión de radiografías) en Manizales donde lo remiten con otro medico para que autorice la retirada de la esquiría de su antebrazo. Se esta realizando la respectiva solicitud por parte de la Aux. Siso.

Se realiza recorrido de obra con acompañamiento por 1 hora

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: soleado
Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.

El trabajador Juan Bautista Zapata ingresa a trabajar y presenta epicrisis medica de la atención del día anterior.

Se realizan actas de vecindad faltantes del tramo 2 en compañía de la Promotora de Desarrollo ala Comunidad Tatiana Betancur de Empocaldas.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 4, vigilante.

Se realiza el comité técnico de obra en compañía de personal de Empocaldas, administración municipal y personal administrativo del consorcio Redes Anserma.

La Aux siso ha intentado comunicarse con la clinica para pedir cita de remisión del trabajador Juan Bautista pero no contestan las llamadas.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.

SABADO 13 DE NOVIEMBRE

NO SE LABORÓ


OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.
Elaborado por: Yensy Camila Grajales Gil **Cargo:** Inspector Siso

ANOTACIONES
LUNES 15 NOVIEMBRE NO SE LABORO

(FESTIVO)

MARTES 16 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Día soleado. Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, 1 oficiales, 5 ayudantes, (1 INCAPACITADO) vigilante.

Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran baseando bordillos

El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio manifiesta dolor en el antebrazo afectado por el accidente del 11 de septiembre, se le dice que asista al hospital y no quiere.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: templado, lluvia de 7:00 am a 11:00 am

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, 1 oficial, 4 ayudantes, vigilante.

La aux. siso se comunica con la clinica fisietra Dr. Luis Ignacio Correa con el fin de solicitar cita de remisión para la revisión de radiografías del trabajador Juan Bautista Zapata; donde responden que este mes no tienen citas disponibles, que después del 26 de noviembre agendan las citas para el mes de diciembre.

Recorrido de obra dejando registro fotografico

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

Reporte clima: día nublado, lluvia de 7:00 am a 12:00 pm

Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro de obra, 4 ayudantes, Vigilante,

El trabajador Orlando de Jesus Guzman no asiste a laborar y tampoco presenta justificación alguna a su falta por lo cual se le hará memorando y se le descontará el día de su proxima quincena.

Se realiza aseo, desinfección y adecuación de la oficina y bodega de trabajo, dandole cumplimiento al protocolo de bioseguridad.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

Reporte clima: día soleado

Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro de obra, 1 oficial, 4 ayudantes, vigilante

se realizo comité técnico de obra en compañía de personal administrativo del consorcio redes aserma y por parte de empocaldas, promotora de desarrollo e ingeniero supervisor.

Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran realizando excavaciones para sumideros

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

SABADO 20 DE NOVIEMBRE

Iniciacion de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am

Recorrido de obra

Se actualizó la bitacora diaria que se lleva en obra con las actividades y los pormenores que surgieron durante la semana

Se realiza registro de salida a las 12:00 pm con toma de temperatura y desinfección personal con alcohol por trabajador.

OBSERVACIONES

1. El trabajador Orlando de Jesus Guzman, el día martes 16 de noviembre por tercera vez no asiste a registrarse después de terminar su labor como está acostumbrado a realizarse todos los días con el fin de certificar que los trabajadores salen en buenas condiciones físicas y para darle cumplimiento al protocolo de bioseguridad en cuanto a la toma de temperatura. Por lo cual se le realiza memorando ya que en ocasiones anteriores se le había llamado la atención verbalmente por el mismo suceso y esté hizo caso omiso.

2. El trabajador Juan Bautista Zapata Osorio el día Viernes 19 de noviembre a las 7:00 am se desplaza a la ciudad de pereira en la turbo, con permiso del contratista a traer un acero ya cotizado en la ferreteria GYJ.

Regresa a 1:30 pm

**BITACORA SEMANAL**

CONSORCIO REDES ANSERMA

**OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.**

Elaborado por: Yeny Camila Grajales Gil Cargo: Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 22 DE NOVIEMBRE	<p>Reporte de Clima: Lluvia de 2:00 pm a 4:00 pm Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 3, vigilante.</p> <p>El trabajador Jelson Alejandro Hernandez no asiste a laborar en todo el día, tampoco justifica su falta, por lo cual se le hará memorando y se le descontará el día de su próxima quincena.</p> <p>Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran fundiendo cunetas en concreto.</p> <p>Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.</p>
MARTES 23 DE NOVIEMBRE	<p>Reporte de Clima: Lluvia todo el día Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 4, vigilante.</p> <p>Recorrido de obra, se continúa con actividades de figurado de acero y concreto para cunetas. Se realizan ensayos de % de compactación para el material de base</p> <p>El trabajador Juan Camilo Castañeda solicita permiso desde las 7:00 am para asistir a cita de segunda dosis de vacuna contra covid-19. Regresa a las 9:30 am</p> <p>Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.</p>
MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE	<p>Reporte de Clima: Lluvia de 7:30 am a 11:00 am y de 2:30 pm a 4:15 pm Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 3, vigilante.</p> <p>El trabajador Juan Camilo Castañeda se comunica con Iña Aux siso y manifiesta tener dolor de cabeza y fiebre debido a la segunda dosis de la vacuna contra covid 19 aplicada el día anterior, por lo cual no asistirá a laborar.</p> <p>Recorrido de obra, Los trabajadores se encuentran realizando actividades de cunetas y estendido de material subbase y base.</p> <p>Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.</p>
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE	<p>Reporte clima: Lluvia de 2:00 pm a 5:00 pm Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro de obra, 1 oficial, 4 ayudantes, Vigilante.</p> <p>El trabajador Dimer Antonio Ruiz solicitó permiso para asistir a la segunda dosis de la vacuna contra covid-19. Se ausenta a las 7:00 am y regresa a las 9:00 am</p> <p>Se realizan afiliaciones a ARL de las 2 personas que ingresan a trabajar Mañana viernes 26 de noviembre</p> <p>Se realiza registro de salida del personal (4:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.</p> <p>Se salio una hora antes por motivos del clima, con el compromiso de entra una hora antes al día siguiente, es decir, iniciar a las 6:00 am el día viernes 26 de noviembre.</p>
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE	<p>Reporte clima: Lluvia de 1:00 pm a 2:00 pm Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro de obra, 1 oficial, 6 ayudantes, Vigilante.</p> <p>Se ingresa a las 6:00 am a laborar, se realiza capacitación de seguridad y salud en el trabajo (políticas del consorcio)</p> <p>Ingresan 2 ayudantes de obra más para agilizar las actividades faltantes requeridas para la entrega de tramo 2 el 18 de diciembre.</p> <p>Se realizan las respectivas afiliaciones.</p> <p>Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.</p>
SABADO 27 DE NOVIEMBRE	<p>Iniciación de labores 7:00 am. Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am</p> <p>Al realizar recorrido de obra observamos que un Vehículo Ingres a la obra teniendo en cuenta que se hizo el cierre de la vía y se puso la señalización indicando que no había paso. Se deja registro fotografico</p> <p>Elaboración de Bitacora semanal de actividades.</p> <p>Se realiza salida a las 4:00 pm, se laboran horas extras con el fin de terminar actividades pendientes</p>

OBSERVACIONES

El día martes 23 de Noviembre la Ingeniera residente Icontacta a 2 personas Interesadas en laborar como ayudantes de obra y las cuales eran recomendadas por la seccional de empocaldas Anserma.

Estas personas llegaron a la oficina del Consorcio Redes Anserma donde se les hace entrevista y se envían a examen medico de ingreso. Se afilian a la seguridad social con el fin de que empezaran a laborar el día siguiente Miércoles 24. Este día las 2 personas no asisten a laborar, se llaman y no contestan el telefono bloqueando las llamadas.

La aux siso se encarga de cancelar las afiliaciones ya que no hubo vínculo laboral.



BITACORA SEMANAL

CONSORCIO REDES ANSERMA



OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.

Elaborado por:

Yensy Camila Grajales Gil

Cargo:

Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 29 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Día soleado.

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, 2 operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 7, vigilante.

Se entregan elementos de protección personal a los trabajadores nuevos (guantes, tapabocas, casco)

Se realizaron las afiliaciones a salud del personal que ingreso nuevo

Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.

MARTES 30 DE NOVIEMBRE

Reporte de Clima: Día soleado.

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, 2 operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 7, vigilante.

El trabajador Jeison Alejandro Hernandez solicita permiso para asistir a cita para vacuna contra covid-19, no llega a registrarse en la mañana y regresa a retomar labores a las 3:00 pm

Realización de informe quincenal Siso

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE

Reporte de Clima: Día soleado.

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, 2 operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 7, vigilante.

Recorrido de obra

Se realizaron las afiliaciones pendientes del personal nuevo (pensión)

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

JUEVES 02 DE DICIEMBRE

Reporte de Clima: Día soleado.

Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, 2 operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 7, vigilante.

Realización de los contratos de trabajo del personal nuevo.

Se organizarán las listas de chequeo (hojas de vida) de los trabajadores nuevos, las cuales contienen copia de cédula, contrato de trabajo, certificados de afiliaciones a seguridad social, examen medico de ingreso, formato de entrega de elementos de protección personal.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

VIERNES 03 DE DICIEMBRE

Reporte clima: día soleado (mañana y tarde)

Personal de obra: Residente de Obra, Aux Siso, Operador Maquinaria, Maestro reemplazo, 1 oficial, 5 ayudantes, Vigilante.

Recorrido de obra, los trabajadores junto con empocaldas se encuentran instalando el hidrante

Actualización de bitacora con las actividades diarias en obra, y pormenores.

Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.

SABADO 04 DE DICIEMBRE

Iniciación de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am

Elaboración y entrega de bitacora semanal de actividades

Recorrido de obra

Se realiza registro de salida a las 12:00 pm ya que se les debe una hora y media de trabajo extra. Se toma temperatura aleatoria



BITACORA SEMANAL

CONSORCIO REDES ANSERMA



OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO
FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.

Elaborado por:

Yensy Camila Grajales Gil

Cargo:

Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 06 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: lluvia de 7:00 am a 11:00 am
	Personal de obra: Residente de obra, Aux siso, 2 Operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 7, vigilante.
	Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran baseando cunetas y demoliendo loza del PQR del tramo 3
	Elaboración de cronograma semanal de actividades
	Se realiza el registro de salida del personal (5:00 pm) tomando asistencia y temperatura aleatoria con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad.
MARTES 07 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado
	Personal de obra: Residente de obra, Aux siso, 2 Operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 7, vigilante.
	Vigilancia de la imprimación del tramo 2, registro fotografico para informe quincenal
	Se actualizo la bitacora diaria en obra
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
MIERCOLES 08 DE DICIEMBRE	NO SE LABORO (FESTIVO)
JUEVES 09 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado
	Personal de obra: Residente de obra, Aux siso, 2 Operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 7, vigilante.
	Se realizó aseo, desinfección y adecuación de la oficina y bodega de trabajo.
	Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran excavando para instalación de hidrante
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
VIERNES 10 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado
	Personal de obra: Residente de obra, Aux siso, 2 Operarios de maquinaria, Maestro de obra, oficiales 1, ayudante 7, vigilante.
	Recorrido de obra, vigilancia de la pavimentación del tramo 2
	Acompañamiento en la pavimentación del tramo 2, se deja registro fotografico
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfeccion y correcto lavado de manos.
SABADO 11 DE DICIEMBRE	Iniciacion de labores 7:00 am, Se hace el registro de ingreso con toma de temperatura a las 6:50 am
	Recorrido de obra, los trabajadores se cuentan fundiendo las cunetas faltantes
	Acompañamiento en retoques de la pavimentación, verificando el buen uso de los elementos de protección personal.
	Se realiza registro de salida a las 6:00 pm, se laboran horas extras con el fin de terminar la pavimentación de la vía tramo 2. Se toma temperatura aleatoria


**OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL-SAN ISIDRO
FASE 1. MUNICIPIO ANSERMA CALDAS.**

Elaborado por: Yensy Camila Grajales Gil Cargo: Inspector Siso

ANOTACIONES

LUNES 13 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria 2, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 7, vigilante.
	Realización de cronograma semanal de actividades
	Recorrido de obra, los trabajadores se encuentran arreglando andenes
	Se realiza registro de salida del personal (6:45 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
MARTES 14 DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria 2, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 7.
	Se realizó aseo, Desinfección y adecuación de bodega y oficina de trabajo.
	El vigilante Pablo Emilio Giraldo solo trabajo hasta la madrugada de hoy 14 de diciembre, se le realizó carta de desistimiento a examen de egreso y paz y salvo.
	Se realiza registro de salida del personal (6:45 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria 2, Maestro de obra, oficiales 1, ayudantes 7.
	Recorrido de obra, los trabajadores se encuentra fundiendo la loza del PQR tramo 2.
	Los trabajadores (Jelson Alejandro Hernandez, Orlando de Jesus Guzman, Juan David Becerra, Jovanny Murillo y Walter Daniel Velasquez) solo trabajaron hasta hoy 15 de diciembre por motivos de terminación de la obra, se les hizo firmar las liquidaciones, carta de desistimiento a examen de egreso y paz y salvo con terminación del contrato.
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
JUEVES 16 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Operador de maquinaria, Maestro de obra, ayudantes 3.
	se hizo el retiro de la seguridad social de los trabajadores que hasta ahora han salido de la obra.
	El trabajador Edison Daza Riaño, operario de maquinaria solo trabaja hasta hoy 16 de diciembre. Se le hace el retiro de la seguridad social, se hace firmar liquidación, nomina y paz y salvo
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.
VIERNES 17 DE DICIEMBRE	Reporte de Clima: Soleado Personal de obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, ayudantes 3.
	Recorrido de obra, los trabajadores ya terminaron de hacer los andenes, se encuentran pintando muros y haciendo aseo de la obra.
	Hasta hoy 17 de diciembre se labora ya que se da por terminado el tramo 2, se retirán con fecha de hoy de la seguridad social y se hace firmar nomina, liquidaciones, paz y salvo, carta de desistimiento a examen de egreso.
	El único trabajador que se realizará el examen de egreso es el trabajador Juan Bautista Zapata Osorio por afectaciones del accidente del 11 de septiembre de 2021.
	Se realiza registro de salida del personal (5:00 pm) con toma de asistencia, temperatura, desinfección y correcto lavado de manos.

OBSERVACIONES

En cuanto al trabajador Juan Bautista Zapata, la ARL le seguirá respondiendo por las citas y demás correspondientes al antebrazo afectado por el accidente del 11 de septiembre, en estos momentos se encuentra a la espera de una llamada de la ARL para autorización de cita con Fisiatra.

En el informe final anexare las fotos de la terminación de la obra (tramo 2) y los demás documentos firmados como los son las liquidaciones, paz y salvo y terminación del contrato, nomina, carta de desistimiento a examen de egreso y examen de egreso de la persona que fue requerida.

Se dejo inventariado todos los materiales y herramientas que quedaron en la bodega.

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar



REDIMAC

BITACORAS VIGENCIA 2022

**BITACORA SISO**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS**DATOS OBRA**

NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022		
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Arserma
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil		
NOMBRE DEL CARGO	Asesor SISO		
CONTACTO	3104430645	DOMICILIO	Cra 1e #23-28 barrio Ouzoro, Arserma Caldas
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		

INFORME ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA
Reporte del clima	Lunes	14/03/2022	7:00 a. m.
Elaboración de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-eficiencias-contratos laborales	Lunes	14/03/2022	10:00 a. m.
Cooperación entre contratista, entidades y trabajadores	Lunes	14/03/2022	3:00 p. m.
Reporte del clima	Miércoles	15/03/2022	7:00 a. m.
Verificación de equipos	Miércoles	15/03/2022	10:00 a. m.
Reporte del clima	Miércoles	16/03/2022	7:00 a. m.
Señalización de obra	Miércoles	16/03/2022	8:00 a. m.
Elaboración de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-	Miércoles	16/03/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Jueves	17/03/2022	7:00 a. m.
Acompañamiento a actividades de obra	Jueves	17/03/2022	2:00 p. m.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Jueves	17/03/2022	10:00 a. m.
Reporte del clima	Viernes	18/03/2022	7:00 a. m.
Entrega de elementos de protección	Viernes	18/03/2022	2:00 p. m.
Participación en comités o reuniones	Viernes	18/03/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Sábado	19/03/2022	7:00 a. m.
Verificación del personal -ingreso-	Todos los días		
Recorrido de obra	Todos los días		
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Todos los días		
Registro salida de personal	Todos los días		

OBSERVACION
Soleado
Realización de Cronograma semanal de actividades
Afiliación de empresa a Confa
Lluvioso
Se verifican los equipos de seguridad como casaca, botiquín y extintor.
Lluvioso
Verificación de señalización y listado de la faltante
Solicitud de señalización faltante
Nublado
Se realiza acompañamiento en actividades de excavación para plintos
Limpieza desinfección y adecuación de bodega y oficina de trabajo.
Lluvioso
Entrega de Gafas de seguridad oscuras
Comité virtual con inventorial, director y residente de obra
Soleado
Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Se realizan recorridos de obra periodicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotografico
Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
Registro de salida del personal con toma de temperatura

SEMANA DEL 14 AL 19 DE MARZO

ANOTACIONES

**BITACORA SISO**

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



DATOS OBRA				
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022			
LOCALIZACION	San Isidro			
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS			
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022			
FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022			
NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil			
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO			
CONTACTO	3104430645			
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO			
DOCUMENTO	1,002.802.585			
MUNICIPIO	Anserma			
	Cra 1e #23-28 barrio Ocutza, Anserma Caldas			
INFORME ACTIVIDADES				
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	OBSERVACION
FESTIVO	LUNES	21/03/2022		SIN LABORES
Reporte de clima	Martes	22/03/2022	7:00 a. m.	Nublado
Acompañamiento a actividades de obra	Martes	22/03/2022	3:00 p. m.	Baño de pilotes para muro
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-	Martes	22/03/2022	10:00 a. m.	Elaboración de cronograma semanal de actividades
cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	22/03/2022	7:00 a. m.	Afiliación a ARL del personal nuevo para 3d Ingeniería y
	Martes	22/03/2022	8:00 a. m.	Cobertura de epp para el personal nuevo
Reporte de clima	Miércoles	23/03/2022	7:00 a. m.	Soleado
Reporte de clima	Jueves	24/03/2022	7:00 a. m.	Soleado
Entrega de elementos de protección	Jueves	24/03/2022	7:00 a. m.	Se entregaron epp (Gafas, Protección auditiva, guantes)
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Jueves	24/03/2022	7:00 a. m.	Desinfección personal por trabajador con alcohol
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Jueves	24/03/2022	8:00 a. m.	Aseo, desinfección y adecuación de la bodega y oficina de
Reporte de clima	Viernes	25/03/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Señalización de obra	Viernes	25/03/2022	3:00 p. m.	Se verifico que la señalización este en los puntos adecuados
Acompañamiento a actividades de obra	Viernes	25/03/2022		Excavación para segundo muro
Reporte de clima	Sábado	26/03/2022	7:00 a. m.	Nublado
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-	Sábado	26/03/2022	8:00 a. m.	Elaboración de Bitacora semanal de actividades
cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales				
Verificación del personal -ingreso-	Todos los días		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los días		9:00 am - 11:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realiza recorrido de obra verificando el buen uso de los epp, detectando posibles riesgos dentro de la obra, dejando registro fotografico
Registro salida de personal	Todos los días		5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura
ANOTACIONES				
El día viernes 25/03/2022 se laboró horas extras en la cra 3 entre calles 12 y 13 ya que la retro excavadora reventó el tubo principal del agua. Debido a esto se terminaron de realizar las labores a las 7:30 pm				
SEMANA DEL 21 AL 26 DE MARZO				

**BITACORA SISO**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS

NUMERO DE CONTRATO		DATOS OBRA		101 de 2022	
LOCALIZACION	MUNICIPIO	MUNICIPIO		Anserma Caldas	
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS				
FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022			
NOMBRE	DOCUMENTO	1.002.802.585			
NOMBRE DEL CARGO	MUNICIPIO	Anserma			
CONTACTO	Cra 1e #23-28 barrio Ocauca, Anserma Caldas				
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO				
INFORME ACTIVIDADES					
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	OBSERVACION	
Reporte de clima	Lunes	28/03/2022	7:00 a. m.	Soleado	
Elaboración de informes-bitacoras-ronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	28/03/2022	10:00 a. m.	Elaboración de cronograma semanal de actividades	
Elaboración de informes-bitacoras-ronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	28/03/2022	1:00 p. m.	Afiliación a ARL del personal que se va a contratar	
Participación en reunión	Lunes	28/03/2022	7:30 p. m.	Acompañamiento junto con la trabajadora social en reunión con la comunidad con el fin de aclarar dudas	
Reporte de clima	Martes	29/03/2022	7:00 a. m.	Lluvioso	
Entrega de elementos de protección	Martes	29/03/2022	7:00 a. m.	Se realiza entrega de EPP (guantes, gafas, casco) a las 2 personas que ingresaron nuevos.	
Señalización de obra	Martes	29/03/2022	2:00 p. m.	Se pone la señalización de cierre de vía en la cra 4 con calle 12 por arreglos de acueducto	
Acompañamiento a actividades de obra	Martes	29/03/2022	3:00 p. m.	Se realiza acompañamiento en arreglo de acueducto	
Reporte de clima	Miércoles	30/03/2022	7:00 a. m.	Lluvioso	
Reporte de incidente o accidente laboral	Miércoles	30/03/2022	9:00 a. m.	El día de hoy se presentó un accidente de trabajo en la Cra 3ra entre calles 12 y 13, un tramo de losa de concreto se desprendió cayéndole en la espalda y piernas a uno de los trabajadores, se realiza el reporte ante las ARL y se lleva al trabajador a urgencias, le hicieron radiografías y no tuvo ninguna fractura. Le dieron 5 días de incapacidad.	
Elaboración de informes-bitacoras-ronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	30/03/2022	10:00 a. m.	Solicitud de elementos de protección personal faltantes	
Elaboración de informes-bitacoras-ronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	30/03/2022	2:00 p. m.	Adelanto de informe quincenal	
Reporte de clima	Jueves	31/03/2022	7:00 a. m.	Nublado	

Reporte de incidente o accidente laboral	Jueves	31/03/2022	8:00 a. m.	Se realiza reporte de accidente en la obra de anillo vital, el trabajador Diemer Ruiz, bajando la mezcladora de concreto del mixteador, sufre golpe en el hombro derecho y en la espalda al golpearse contra el techo de la cabina del mixteador, le dan 4 días de incapacidad.
Elaboracion de informes- bitacorás-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	31/03/2022	10:00 a. m.	Adelanto de contratos de trabajo
Elaboracion de informes- bitacorás-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	31/03/2022	2:00 p. m.	Afiliacion a ASL de 2 personas que ingresan mañana 01/04/2022
Acompañamiento a actividades de obra	Jueves	31/03/2022	3:00 p. m.	Acompañamiento en actividades de obra en la cra 3ra hasta las 5:00 pm
Reporte de clima	Viernes	1/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Entrega de elementos de proteccion	Viernes	1/04/2022	7:00 a. m.	Entrega de epp (casco, guantes, gafas) a personal nuevo
Elaboracion de informes- bitacorás-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Viernes	1/04/2022	8:00 a. m.	Contratos de trabajo
Acompañamiento a actividades de obra	Viernes	1/04/2022	2:00 p. m.	Acompañamiento en actividades de obra, amarré de hierro para muro en anillo vital
Solicitud de permiso (SSO)	Viernes	1/04/2022	4:00 p. m.	Permiso para asistir a audiencia presencial con la secretaria de tránsito de Anserma Caldas
Reporte de clima	Sábado	2/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Elaboracion de informes- bitacorás-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Sábado	2/04/2022	8:00 a. m.	Elaboracion de Bitacorá semanal de actividades
Verificacion del personal -Ingreso-	Todos los días			Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los días			Se realiza recorrido de obra verificando el buen uso de los epp, detectando posibles riesgos dentro de la obra, dejando registro fotografico
Registro salida de personal	Todos los días			Registro de salida del personal con toma de temperatura

ANOTACIONES

El día lunes y miércoles se laboraron horas extras ya que se dañó la tubería del acueducto en la Cra 3ra entre calles 12 y 13 y el arreglo lo terminaron a las 8:00 pm
SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL

**BITACORA SISO**

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

**DATOS OBRA**

NUMERO DE CONTRATO		101 de 2022	
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Anserma Caldas
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil	DOCUMENTO	1.002.802.585
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO	MUNICIPIO	Anserma
CONTACTO	3104430645	DOMICILIO	Cra 1e #23-28 barrio Orataco, Anserma Caldas
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		

INFORME ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	OBSERVACION
Reporte de clima	Lunes	4/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Elaboracion de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	4/04/2022	10:00 a. m.	Elaboración de cronograma semanal de actividades
Elaboracion de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	4/04/2022	1:00 p. m.	Afiliaciones de Eps del personal que faltaba
Elaboracion de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	4/04/2022	3:00 p. m.	Afiliaciones de caja de compensación familiar
Reporte de clima	Martes	5/04/2022	7:00 a. m.	Nublado
Elaboracion de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	5/04/2022	9:00 a. m.	Elaboración de contratos de trabajo de 3D ingeniería y construcciones sas
Acompañamiento en actividades de obra	Martes	5/04/2022	3:00 p. m.	Se realizo acompañamiento en obra y se hicieron firmar los contratos de trabajo
Reporte de clima	Miércoles	6/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Miércoles	6/04/2022	9:00 a. m.	Seguimiento al oficio radicado en la chec para la estabilización de poste en tramo 3
Acompañamiento en actividades de obra	Miércoles	6/04/2022	10:00 a. m.	Se realizo acompañamiento en las actividades de obra de tramo 3
verificación de solabazón	Miércoles	6/04/2022	2:00 p. m.	Se verifico que señalización hay que cuales faltan para solicitarias
Reporte de clima	Jueves	7/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Pomemores	Jueves	7/04/2022	8:00 a. m.	Se reporta robo de tablas utilizadas como puente en las excavaciones de las cajas de inspección

Elaboracion de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	7/04/2022	2:00 p. m.	Solicitud de elementos de protección personal
Acompañamiento a actividades de obra	Jueves	7/04/2022	3:00 p. m.	Acompañamiento en actividades verificando el buen uso de los elementos de protección personal
Reporte de clima	Viernes	8/04/2022	7:00 a. m.	Llaviso
Control fotografico de soporte de actividades	Viernes	8/04/2022	8:00 a. m.	Se deja registro fotografico de los avances de obra
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Viernes	8/04/2022	2:00 p. m.	Aseo y adecuacion de materiales y herramientas
Reporte de clima	Sábado	9/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Elaboracion de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Sábado	9/04/2022	8:00 a. m.	Elaboracion de Bitacora semanal de actividades
Verificacion del personal -ingreso-	Todos los dias		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los dias		9:00 am - 11:00 am - 2:00 pm - 4:00 am.	Se realiza recorrido de obra verificando el buen uso de los epp, detectando posibles riesgos dentro de la obra, dejando registro fotografico
Registro salida de personal	Todos los dias		5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura

SEMANA DEL 04 AL 09 DE ABRIL.

**BITACORA SISO**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS**DATOS OBRA**

NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022		
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Anserma Caldas
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022

NOMBRE	Yensy Camilla Grajales Gil		
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO		
CONTACTO	3104430645	DOMICILIO	Cra 1e #23-28 barrio Oruzca, Anserma Caldas
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		

INFORME ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA
Reporte de clima	Lunes	11/04/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	11/04/2022	10:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	11/04/2022	1:00 p. m.
Reporte de clima	Martes	12/04/2022	7:00 a. m.
Cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Martes	12/04/2022	9:00 a. m.
Acompañamiento en actividades de obra	Martes	12/04/2022	3:00 p. m.
Reporte de clima	Miércoles	13/04/2022	7:00 a. m.
Señalización y cerramientos de obra	Miércoles	13/04/2022	9:00 a. m.
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Miércoles	13/04/2022	10:00 a. m.
Verificación del personal -ingreso-	Todos los días		
Recorrido de obra	Todos los días		
Registro salida de personal	Todos los días		

OBSERVACION	Nublado
	Elaboración de cronograma semanal de actividades
	Afiliación del personal que faltaba a caja de compensación familiar
	Soleado
	Desinfección personal y formato de sintomatología
	Acompañamiento en obra hasta las 5:00 pm
	Soleado
	Se realizó reposición del cerramiento de obra ya que se encontraba dañado y roto por las personas de la comunidad, se deja registro fotografico
	Se realiza aseo, desinfección y adecuación de la bodega y de los materiales y herramientas de obra.
	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
	Se realiza recorrido de obra verificando el buen uso de los epp, detectando posibles riesgos dentro de la obra, dejando registro fotografico
	Registro de salida del personal con toma de temperatura

AMOTACIONES

Los días jueves, viernes y sábado no se laborarán (Semana Santa)

SEMANA DEL 11 AL 16 DE ABRIL



BITACORA SISO

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



DATOS OBRA				
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022			
LOCALIZACION	MUNICIPIO Anserma			
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS			
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022			
FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022			
NOMBRE	Yensy Camilla Grajales Gil			
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO			
CONTACTO	3104430645			
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO			
DOCUMENTO	1,002.802.585			
MUNICIPIO	Anserma			
Cra 1e #23-28 barrio Ocuza, Anserma Caldas				
INFORME ACTIVIDADES				
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	OBSERVACION
Reporte del clima	Lunes	18/04/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	18/04/2022	10:00 a. m.	Realización de Cronograma semanal de actividades
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	18/04/2022	3:00 p. m.	Realización de pas y salvos y cartas de desistimiento a examen de egreso del personal que se ha retirado.
Reporte del clima	Martes	19/04/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Verificación de equipos	Martes	19/04/2022	10:00 a. m.	Se verifican que los equipos de seguridad como camilla, botiquín y extintor, se encuentren en buen estado.
Reporte del clima	Miércoles	20/04/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Señalización de obra	Miércoles	20/04/2022	8:00 a. m.	Verificación de señalización cerramientos de obra
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	20/04/2022	2:00 p. m.	Solicitud de elementos de protección personal (Guantes)
Reporte del clima	Jueves	21/04/2022	7:00 a. m.	Nublado
Acompañamiento a actividades de obra	Jueves	21/04/2022	2:00 p. m.	Se realiza acompañamiento en actividades de excavación para pilotes del 3 muro
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Jueves	21/04/2022	10:00 a. m.	Limpieza desinfección y adecuación de bodega y oficina de trabajo.
Reporte de accidentes e incidentes	Jueves		2:00 p. m.	Se realiza reporte de accidente ante la Afl de un trabajador que se golpeo la rodilla derecha con una pica, fue atendido en el hospital San Vicente de Paul de Anserma Caldas y le dieron 2 dias de incapacidad.
Reporte del clima	Viernes	22/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores	Viernes	22/04/2022	2:00 p. m.	Se envían las incapacidades a la Afl Sura
Acompañamiento a actividades de obra	Viernes	22/04/2022	2:00 p. m.	Se realiza acompañamiento en actividades de baseo de muro.

Reporte del día	Sábado	23/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Verificación del personal -Ingreso-	Todos los días		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los días		9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realizan recorridos de obra periódicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotográfico
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Todos los días		7:00 am - 5:00 pm	Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
Registro salida de personal	Todos los días		5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura

AMOTACIONES

El día 22 de abril de 2022 se retira el trabajador JUAN DAVID BECERRA ANDICA, Afiliado por la empresa REDIMAC, Se comunica al contador para que realice su respectiva liquidación.

SEMANA DEL 18 AL 23 DE ABRIL

FECHA	ACTIVIDADES	TIEMPO	ESTADO DEL CIELO	OTROS COMENTARIOS
18/04/2022	Trabajo de mantenimiento en el área de...	8:00 am - 12:00 pm	Soleado	
19/04/2022	Trabajo de mantenimiento en el área de...	8:00 am - 12:00 pm	Soleado	
20/04/2022	Trabajo de mantenimiento en el área de...	8:00 am - 12:00 pm	Soleado	
21/04/2022	Trabajo de mantenimiento en el área de...	8:00 am - 12:00 pm	Soleado	
22/04/2022	Trabajo de mantenimiento en el área de...	8:00 am - 12:00 pm	Soleado	
23/04/2022	Trabajo de mantenimiento en el área de...	8:00 am - 12:00 pm	Soleado	



BITACORA SISO

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



DATOS OBRA

NUMERO DE CONTRATO		101 de 2022	
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Anserma
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camilla Grajales Gil		
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO	DOCUMENTO	1.002.B02.585
CONTACTO	3104430645	MUNICIPIO	Anserma
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		

INFORME ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	OBSERVACION
Reporte del clima	Lunes	25/04/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	25/04/2022	10:00 a. m.	Realización de Cronograma semanal de actividades
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	25/04/2022	3:00 p. m.	Elaboración de informe sobre robo de señalización y cerramientos
Reporte del clima	Martes	26/04/2022	7:00 a. m.	Nublado
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	26/04/2022	10:00 a. m.	Retiro de la seguridad social de 2 trabajadores, realización de paz y salvos.
Reporte del clima	Miércoles	27/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Acompañamiento a actividades de obra	Miércoles	27/04/2022	8:00 a. m.	Acompañamiento en demolición para conexión de tubería
Cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores	Miércoles	27/04/2022	2:00 p. m.	Desplazamiento hacia el Cairo para negociación del concreto para la obra de la Cra 3ra
Reporte del clima	Jueves	28/04/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Inspección de elementos de protección personal	Jueves	28/04/2022	2:00 p. m.	Se realiza inspección de los epp verificando cuales se encuentran en buen estado y cuales necesitan reposición.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Jueves	28/04/2022	10:00 a. m.	Limpieza desinfección y adecuación de bodega y oficina de trabajo.
Cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores	Jueves	28/04/2022	2:00 p. m.	Se solicita pago de liquidación de los trabajadores que han sido retirados de la obra ya que hay un retraso en las mismas.
Reporte del clima	Viernes	29/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores	Viernes	29/04/2022	2:00 p. m.	Radicación de incapacidades mayores a 3 días en la ARL sufra.

Cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores	Viernes	29/04/2022	2:00 p. m.	Desplazamiento a la secretaría de tránsito de Aserrma con el fin de llevar oficio solicitando permiso para entrada de los carros Mixer los cuales traen el concreto para fundición de losa en la Cra 3ra
Reporte del clima	Sábado	30/04/2022	7:00 a. m.	Soleado
Elaboración de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Sábado	30/04/2022	10:00 a. m.	Elaboración de bitacora semanal de actividades
Verificación del personal -Ingreso-	Todos los días		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los días		9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realizan recorridos de obra periodicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotografico
Vigilancia del area de limpieza y desinfección de los trabajadores	Todos los días		7:00 am - 5:00 pm	Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
Registro salida de personal	Todos los días		5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura
ANOTACIONES				
SEMANA DEL 25 AL 30 DE ABRIL				

Fecha	Actividad	Inicio	Fin	Observaciones
29/04/2022	Cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores	2:00 p. m.		Desplazamiento a la secretaría de tránsito de Aserrma con el fin de llevar oficio solicitando permiso para entrada de los carros Mixer los cuales traen el concreto para fundición de losa en la Cra 3ra
30/04/2022	Reporte del clima	7:00 a. m.		Soleado
30/04/2022	Elaboración de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	10:00 a. m.		Elaboración de bitacora semanal de actividades
30/04/2022	Verificación del personal -Ingreso-	7:00 a. m.		Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
30/04/2022	Recorrido de obra	9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm		Se realizan recorridos de obra periodicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotografico
30/04/2022	Vigilancia del area de limpieza y desinfección de los trabajadores	7:00 am - 5:00 pm		Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
30/04/2022	Registro salida de personal	5:00 p. m.		Registro de salida del personal con toma de temperatura



BITACORA SISO

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



DATOS OBRA	
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022
LOCALIZACION	MUNICIPIO
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022
FECHA DE FINALIZACION	04 de abril de 2022

NOMBRE	Yensy Camila Grijales Gil	DOCUMENTO	1.002.802.585
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO	MUNICIPIO	Anserma
CONTACTO	3104430645	Cra 1e #23-28 barrio Orozco, Anserma Caldas	
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		

INFORME ACTIVIDADES				
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	OBSERVACION
Reporte del clima	Lunes	2/05/2022	7:00 a. m.	Soledad
Acompañamiento a actividades de obra	Lunes	2/05/2022	10:00 a. m.	Se realizó acompañamiento todo el día en el baseo de la espina de pescado en la cra 3. Verificando el cumplimiento con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Reporte del clima	Martes	3/05/2022	7:00 a. m.	Soledad
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Martes	3/05/2022	10:00 a. m.	Adecuación de la bodega y oficina de trabajo.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	3/05/2022	2:00 p. m.	Elaboración de cronograma semanal de actividades
Reporte del clima	Miércoles	4/05/2022	7:00 a. m.	Soledad
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Miércoles	4/05/2022	2:00 p. m.	Informe N°2 siso, Cerramientos de obra.
Reporte del clima	Jueves	5/05/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Comité de obra	Jueves	5/05/2022	9:00 a. m.	Acompañamiento en el comité técnico de obra que se realizó en la bodega de san isidro por parte de la supervisión del contrato y la alcaldía municipal.
Recorridos de obras	Jueves	5/05/2022	11:30 a. m.	Se hizo el recorrido de obra en compañía de los participantes en el comité técnico.
Acompañamiento a actividades de obra	Jueves	5/05/2022	2:00 p. m.	Se realizó acompañamiento en actividades de obra en la cra 3, ensayos de mejora de placa.
Reporte del clima	Viernes	6/05/2022	7:00 a. m.	Lluvioso

Reporte de incidente o accidente laboral	Viernes	6/05/2022	3:00 p. m.	Se reporta un incidente de trabajo en obra de anillo vital. La retro excavadora reventó el tubo del gas ocasionando que este se esparciera por la obra. Se tomaron las debidas precauciones para evitar un accidente y se llamo a la empresa Efigas para que solicitaran el daño.
Reporte del clima	Sabado	7/05/2022	7:00 a. m.	Lluvioso
Elaboracion de informes- bitacor-a-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Sabado	7/05/2022	10:00 a. m.	Elaboración de Bitacora semanal de actividades
Verificación del personal - Ingreso-	Todos los dias		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los dias		9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realizan recorridos de obra periódicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotográfico
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Todos los dias		7:00 am - 5:00 pm	Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
registro salida de personal	Todos los dias		5:00 p. m.	registro de salida del personal con toma de temperatura
ANOTACIONES				
SEMANA DEL 2 AL 7 DE MAYO				




BITACORA SISO

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



DATOS OBRA	
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022
LOCALIZACION	San Isidro
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022
FECHA DE FINALIZACION	04 de abril de 2022
MUNICIPIO	Anserma
NOMBRE	Yensy Camila Grijales Gil
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO
CONTACTO	3104430645
DOMICILIO	Cra 1e #23-28 barrio Ocutza, Anserma Caldas
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO
DOCUMENTO	1.002.802.585
MUNICIPIO	Anserma

INFORME ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	OBSERVACION		
Reporte del clima	Lunes	9/05/2022	7:00 a. m.	Lluvioso		
Desplazamientos	Lunes	9/05/2022	11:00 a. m.	Desplazamiento de la Aux siso a Mantiales a realizar entrega de Formaleta metálica.		
Reporte del clima	Martes	10/05/2022	7:00 a. m.	Soleado		
Acompañamiento a actividades de obra	Martes	10/05/2022	10:00 a. m.	Acompañamiento en actividades de excavación para reposición de tierra.		
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	10/05/2022	2:00 p. m.	Elaboración de cronograma semanal de actividades		
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	10/05/2022	3:00 p. m.	Se realizó envío de Informe Siso N°2 al supervisor de zona de empocaldas.		
Reporte del clima	Miércoles	11/05/2022	7:00 a. m.	Lluvioso		
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	11/05/2022	2:00 p. m.	Organizar informe final de la Cra 3.		
Reporte del clima	Jueves	12/05/2022	7:00 a. m.	Lluvioso		
Acompañamiento a actividades de obra	Jueves	12/05/2022	9:00 a. m.	Acompañamiento en mejoras de placa en la cra 3.		
Inspección de equipos y herramientas.	Jueves	12/05/2022	11:30 a. m.	Se realizó inspección a la pulidora que se utilizó para los cortes de dilatación en la Cra3		
Cooperación entre contratista, entidades y trabajadores	Jueves	12/05/2022	2:00 p. m.	Se realizó comité técnico de obra en la Cra3 por parte del supervisor de zona de empocaldas.		
Reporte del clima	Viernes	13/05/2022	7:00 a. m.	Lluvioso		

**BITACORA SISO**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS

DATOS OBRA			
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022		
LOCALIZACION	San Isidro		
CONTRATISTA	MUNICIPIO Anserma		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022		
FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022		
NOMBRE	Yenny Camila Grajales Gil		
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO		
CONTACTO	3104430645		
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		
DOCUMENTO	1.002.802.583		
MUNICIPIO	Anserma		
DOMICILIO	Cra 1e #23-28 barrio Guaca, Anserma Caldas		
INFORME ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA
Reporte del clima	Lunes	16/05/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-c	Lunes	16/05/2022	10:00 a. m.
Elaboración de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-c	Lunes	16/05/2022	2:00 p. m.
Entrega de elementos de protección personal	Lunes	16/05/2022	4:00 p. m.
Reporte del clima	Martes	17/05/2022	7:00 a. m.
Acompañamiento a actividades de obra	Martes	17/05/2022	10:00 a. m.
Elaboración de Informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	17/05/2022	2:00 p. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	17/05/2022	9:00 p. m.
Reporte del clima	Miércoles	18/05/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	18/05/2022	10:00 a. m.
Retiros	Miércoles	18/05/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Jueves	19/05/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	19/05/2022	2:00 p. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	19/05/2022	4:00 p. m.
Reporte del clima	Viernes	20/05/2022	7:00 a. m.

Orden y limpieza de obra	Viernes	20/05/2022	10:00 a. m.	Se hizo Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo.
Elaboración de informes- bitácoras- cronogramas- solicitud de materiales- cotizaciones- afiliaciones- contratos laborales	Viernes	20/05/2022	3:00 p. m.	Se realizaron Afiliaciones a caja de compensación familiar (COAF) del personal nuevo
Reporte del clima	Sábado	21/05/2022	7:00 a. m.	Nublado
Elaboración de informes- bitácoras- cronogramas- solicitud de materiales- cotizaciones- afiliaciones- contratos laborales.	Sábado	21/05/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de bitácora semanal de actividades
Verificación del personal -ingreso-	Todos los días		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los días		9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realizan recorridos de obra periódicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotográfico
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Todos los días		7:00 am - 5:00 pm	Desinfección con alcohol de ropas y zapatos, lavado de manos
Registro salida de personal	Todos los días		5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura
ANOTACIONES				
SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO				



BITACORA SISO

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



DATOS OBRA

NUMERO DE CONTRATO		101 de 2022	
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Anserma
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil		
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO		
CONTACTO	3104430645		
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		
NOMBRE	1.002.802.585		
MUNICIPIO	Anserma		
DOCUMENTO	Cra 1e #23-28 barrio Ocauca, Anserma Caldas		

INFORME ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA
Reporte del clima	Lunes	23/05/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	23/05/2022	2:00 p. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	23/05/2022	4:00 p. m.
Reporte del clima	Martes	24/05/2022	7:00 a. m.
Liquidaciones	Martes	24/05/2022	2:00 p. m.
Acompañamiento en actividades de obra	Martes	24/05/2022	3:00 p. m.
Reporte del clima	Miércoles	25/05/2022	7:00 a. m.
cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores.	Miércoles	25/05/2022	10:00 a. m.
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Miércoles	25/05/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Jueves	26/05/2022	7:00 a. m.
cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores.	Jueves	26/05/2022	10:00 a. m.
Recorrido de obra	Jueves	26/05/2022	11:00 a. m.
Reporte del clima	Viernes	27/05/2022	7:00 a. m.
Control fotografico de soporte de actividades	Viernes	27/05/2022	10:00 a. m.

Verificación de equipos	Elaboración de acta	Viernes	27/05/2022	3:00 p. m.	Se verifica que los equipos y herramientas en obra se encuentren en buen estado para así evitar cualquier tipo de accidente o incidente.
Reporte de actividades	Elaboración de acta	Sábado	28/05/2022	7:00 a. m.	Finalizado
Elaboración de bitácora	Bitácora - cronogramas - solicitud de material	Sábado	28/05/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de bitácora semanal de actividades
Verificación del personal - ingreso	Verificación del personal	Todos los días			Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Recorrido de obra	Todos los días			Se realizan recorridos de obra periódicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotográfico
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Vigilancia del área de limpieza	Todos los días			Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
Registro salida de personal	Registro salida de personal	Todos los días			Registro de salida del personal con toma de temperatura

ANOTACIONES

Los trabajadores LIS HERMAN COLODRADO y GERARDO ANTONIO MONTES, trabajaron hasta el día sábado 28 de mayo. Se les hace firmar los paz y salvo y liquidaciones.

SEMANA DEL 23 AL 28 DE MAYO

FECHA	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	TIPO	COMENTARIOS
23/05/2022	Verificación de equipos	08:00	10:00	Diario	
23/05/2022	Reporte de actividades	08:00	10:00	Diario	
23/05/2022	Elaboración de bitácora	10:00	12:00	Diario	
23/05/2022	Verificación del personal	08:00	09:00	Diario	
23/05/2022	Recorrido de obra	08:00	12:00	Diario	
23/05/2022	Vigilancia del área de limpieza	08:00	12:00	Diario	
23/05/2022	Registro salida de personal	12:00	13:00	Diario	

**BITACORA SISO**

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

**DATOS OBRA**

NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022		
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Ancorima
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil	DOCUMENTO	1.002.802.585
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO	MUNICIPIO	Ancorima
CONTACTO	3104830645	DOMICILIO	Cra 1E # 23-28 Barrio Ozuca, Ancorima, Cúcuta
JEFE INMEDIATO	RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO		

INFORME ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA
FESTIVO	Lunes	30/05/2022	7:00 a. m.
Reporte del clima	Martes	31/05/2022	7:00 a. m.
Acompañamiento a actividades de obra	Martes	31/05/2022	10:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	31/05/2022	3:00 p. m.
Reporte del clima	Miércoles	1/06/2022	7:00 a. m.
Retiros	Miércoles	1/06/2022	10:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	1/06/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Jueves	2/06/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	2/06/2022	2:00 p. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	2/06/2022	4:00 p. m.
Reporte del clima	Viernes	3/06/2022	7:00 a. m.
Orden y limpieza de obra	Viernes	3/06/2022	10:00 a. m.
Cooperación entre contratistas, entidades y trabajadores.	Viernes	3/06/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Sábado	4/06/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material- cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Sábado	4/06/2022	10:00 a. m.
Verificación del personal- ingreso-	Todos los días		7:00 a. m.
Reporte de obra	Todos los días		19:00 pm - 2:00 pm - 4:00 pm.
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Todos los días		7:00 am - 5:00 pm
Registro salida de personal	Todos los días		5:00 p. m.

ANOTACIONES

SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO

**BITACORA SISO**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS

DATOS OBRA	
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022
LOCALIZACION	San Isidro Anserma
CONTRATISTA	Red de ingeniería, Maquinaria y Construcciones SAS
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022
FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022

NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil	DOCUMENTO	1.002.902.585
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO	MUNICIPIO	Anserma
CONTACTO	3104430645	Cra 1e #23-28 barrio Ocauca, Anserma Caldas	
JEFE INMEDIATO	Rafael Edgar Delgado Moreno		

INFORME ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA			
Reporte del clima	Lunes	6/06/2022	7:00 a. m.	Soledad		
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	6/06/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de cronograma semanal de actividades		
Acompañamiento en actividades de obra	Lunes	6/06/2022	2:00 p. m.	Se hizo acompañamiento en obra por dos horas, los trabajadores se encontraban realizando consolidación de pavimento a nivel de base granular.		
Reporte del clima	Martes	7/06/2022	7:00 a. m.	Lluvia		
Acompañamiento en actividades de obra	Martes	7/06/2022	10:00 a. m.	Se realizaron arreglos en los andenes de las viviendas que se habían dañado al inicio de la obra		
Cooperación entre contratista, entidades, trabajadores.	Martes	7/06/2022	3:00 p. m.	Se firmo prorroga N° 2 al convenio 242 por parte del alcalde municipal John Alejandro Londoño.		
Reporte del clima	Miércoles	8/06/2022	7:00 a. m.	Soledad		
Acompañamiento en actividades de obra	Miércoles	8/06/2022	10:00 a. m.	Se realizó acompañamiento en las actividades de prueba de hermeticidad.		
Inventarios	Miércoles	8/06/2022	2:00 p. m.	Se realizó inventario de los materiales, herramientas y		
Reporte del clima	Jueves	9/06/2022	7:00 a. m.	Nublado		
Orden y limpieza en obra	Jueves	9/06/2022	2:00 p. m.	Se realizó Aseo, desinfección adecuación de bodega y oficina de trabajo.		
Cooperación entre contratista, entidades, trabajadores.	Jueves	9/06/2022	4:00 p. m.	Visita por parte del sub contratista del asfalto para pavimento.		
Reporte del clima	Viernes	10/06/2022	7:00 a. m.	Soledad		
Reporte del clima	Sábado	11/06/2022	7:00 a. m.	Lluvia		
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Sábado	11/06/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de Bitacora semanal de actividades		

Verificación del personal -Ingreso-	Todos los días	7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los días	9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realizan recorridos de obra periódicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotográfico
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Todos los días	7:00 am - 5:00 pm	Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
Registro salida de personal	Todos los días	5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura

ANOTACIONES

El día viernes 10 de junio la Aux. SISO solicitó permiso por asuntos familiares.

SEMANA DEL 5 AL 11 DE JUNIO

FECHA	ACTIVIDADES	TIEMPO	RESPONSABLE	OTROS COMENTARIOS
05/06/2022	Revisión de planos y especificaciones de obra	08:00 - 12:00	Ing. [Nombre]	
06/06/2022	Revisión de planos y especificaciones de obra	08:00 - 12:00	Ing. [Nombre]	
07/06/2022	Revisión de planos y especificaciones de obra	08:00 - 12:00	Ing. [Nombre]	
08/06/2022	Revisión de planos y especificaciones de obra	08:00 - 12:00	Ing. [Nombre]	
09/06/2022	Revisión de planos y especificaciones de obra	08:00 - 12:00	Ing. [Nombre]	
10/06/2022	Revisión de planos y especificaciones de obra	08:00 - 12:00	Ing. [Nombre]	
11/06/2022	Revisión de planos y especificaciones de obra	08:00 - 12:00	Ing. [Nombre]	

**BITACORA SISO**RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS

DATOS OBRA	
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022
LOCALIZACION	San Isidro
CONTRATISTA	Red de Ingenieria, Maquinaria y Construcciones SAS
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022
FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022
MUNICIPIO	Anserma

NOMBRE	Yeny Camila Grajales Gil	DOCUMENTO	1.007.802.585
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO	MUNICIPIO	Anserma
CONTACTO	3104430645	Cra 1e #23-28 barrio Ocauca, Anserma Caldas	
JEFE INMEDIATO	Rafael Edgar Delgado Moreno		

INFORME ACTIVIDADES					
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA		
Reporte del clima	Lunes	13/06/2022	7:00 a. m.	Lluvioso	
Elaboración de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de materializaciones-afiliaciones-contratos laborales	Lunes	13/06/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de cronograma semanal de actividades	
Orden y limpieza en obra	Lunes	13/06/2022	2:00 p. m.	Se realiza limpieza en obra (Tramo3).	
Reporte del clima	Martes	14/06/2022	7:00 a. m.	Lluvioso	
Acompañamiento en actividades de obra	Martes	14/06/2022	10:00 a. m.	Acompañamiento en actividades de compactación de base	
Elaboración de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de materializaciones-afiliaciones-contratos laborales	Martes	14/06/2022	3:00 p. m.	Adelanto de informe SISO quincenal.	
Reporte del clima	Miércoles	15/06/2022	7:00 a. m.	Soleado	
Elaboración de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de materializaciones-afiliaciones-contratos laborales	Miércoles	15/06/2022	10:00 a. m.	Elaboración de informe SISO quincenal.	
Inventarios	Miércoles	15/06/2022	2:00 p. m.	Se realizó inventario de los elementos de protección sobrantes y se verificó en el estado en que se encontraban para botar o reutilizar.	
Reporte del clima	Jueves	16/06/2022	7:00 a. m.	Lluvioso	
Orden y limpieza en obra	Jueves	16/06/2022	2:00 p. m.	Se realizó Aseo, desinfección adecuación de bodega y oficina de trabajo.	
Acompañamiento en actividades de obra	Jueves	16/06/2022	3:00 p. m.	Se hizo acompañamiento en actividades de toma de muestras de densidad de suelo, se dejó registro fotografico.	
Elaboración de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de materializaciones-afiliaciones-contratos laborales	Jueves	16/06/2022	4:00 p. m.	Anexo de registro fotografico para terminación y envío de informe SISO quincenal.	
Reporte del clima	Viernes	18/06/2022	7:00 a. m.	Lluvioso	
Acompañamiento en actividades de obra	Viernes	18/06/2022	2:00 p. m.	Excavación para búsqueda de fallo en el inicio de tramo 3	
Reporte del clima	Sábado	19/06/2022	7:00 a. m.	Soleado	
Elaboración de informes-bitacoras-cronogramas-solicitud de materializaciones-afiliaciones-contratos laborales	Sábado	19/06/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de Bitacora semanal de actividades	



empocaldas

BITACORA SISO



DATOS OBRA	
NÚMERO DE CONTRATO	101 de 2022
LOCALIZACIÓN	San Isidro
CONTRATISTA	Red de Ingeniería, Maquinaria y Construcciones SAS
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	04 de Abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO
CONTACTO	3104430645
DOMICILIO	Rafael Edgar Delgado Moreno
DOCUMENTO	1,002.802.585
MUNICIPIO	Anserma
MUNICIPIO	Anserma
DOCUMENTO	Cra 1e #23-28 barrio Ocuza, Anserma Caldas

INFORME ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA
NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Lunes	20/06/2022	7:00 a. m.
Reporte del clima	Martes	21/06/2022	7:00 a. m.
Acompañamiento en actividades de obra	Martes	21/06/2022	2:00 p. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Martes	21/06/2022	4:00 p. m.
Reporte del clima	Miércoles	22/06/2022	7:00 a. m.
Acompañamiento en actividades de obra	Miércoles	22/06/2022	Todo el día
Reporte del clima	Jueves	23/06/2022	7:00 a. m.
Orden y limpieza en obra	Jueves	23/06/2022	2:00 p. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Jueves	23/06/2022	3:00 p. m.
Reporte del clima	Viernes	24/06/2022	7:00 a. m.

Desplazamientos	Viernes	24/06/2022	Todo el día	La Aux siso se desplaza a la oficina principal de Empocaldas en Manizales con el fin de recibir inducción sobre presentación de informe final y cierre SISO.
Reporte del clima	Sábado	25/06/2022	7:00 a. m.	Llaviso
Elaboración de informes- bitacorras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Sábado	25/06/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de Bitacora semanal de actividades
Verificación del personal -ingreso-	Todos los días		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los días		9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realizan recorridos de obra periódicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotográfico
Vigilancia del área de limpieza y desinfección de los trabajadores	Todos los días		7:00 am - 5:00 pm	Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
Registro salida de personal	Todos los días		5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura

ANOTACIONES

SEMANA DEL 20 AL 25 DE JUNIO.



BITACORA SISO



DATOS OBRA

NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022		
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Anserma
CONTRATISTA	Red de ingeniería, Maquinaria y Construcciones SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camilla Grajales Gil		
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO		
CONTACTO	3104430645	DOMICILIO	Cra 1e #23-28 barrio Ocuzca, Anserma Caldas
JEFE INMEDIATO	Rafael Edgar Delgado Moreno		

INFORME ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA
NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Lunes	27/06/2022	7:00 a. m.
Reporte del clima	Martes	28/06/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Martes	28/06/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Miércoles	29/06/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Miércoles	29/06/2022	10:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Miércoles	29/06/2022	2:00 p. m.
Reporte del clima	Jueves	30/06/2022	7:00 a. m.
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Jueves	30/06/2022	2:00 p. m.
Acompañamiento en actividades de obra	Jueves	30/06/2022	3:00 p. m.
Reporte del clima	Viernes	1/07/2022	7:00 a. m.



empocaldas
Compañía de Ingeniería y Construcción

BITACORA SISO



REDIMAC

DATOS OBRA			
NUMERO DE CONTRATO	101 de 2022		
LOCALIZACION	San Isidro	MUNICIPIO	Anserma
CONTRATISTA	Red de ingeniería, Maquinaria y Construcciones SAS		
FECHA DE INICIO	04 de febrero de 2022	FECHA DE FINALIZACION	04 de Abril de 2022
NOMBRE	Yensy Camila Grajales Gil		
NOMBRE DEL CARGO	Auxiliar SISO		
CONTACTO	3104430645	DOMICILIO	Cra 1e #23-28 barrio Ocuza, Anserma Caldas
JEFE INMEDIATO	Rafael Edgar Delgado Moreno		

INFORME ACTIVIDADES				
ACTIVIDAD	DIA	FECHA	HORA	
NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Lunes	4/07/2022	7:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)
Reporte del clima	Martes	5/07/2022	7:00 a. m.	Soleado
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Martes	5/07/2022	2:00 p. m.	Se elaboró el cronograma semanal de actividades
Reporte del clima	Miércoles	6/07/2022	7:00 a. m.	Soleado
Elaboración de informes- bitacoras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Miércoles	6/07/2022	10:00 a. m.	Terminación de Informe final
Comité técnico de obra	Miércoles	6/07/2022	2:00 p. m.	Se realizó un comité y recorrido de obra en compañía del contratista del proyecto, y supervisión social por parte de EMPOCALDAS.

Reporte del clima	Jueves	7/07/2022	7:00 a. m.	Soleado
Acompañamiento en actividades de obra	Jueves	7/07/2022	2:00 p. m.	Se realiza acompañamiento en toma de medidas para presupuesto de loza de pavimentación en la calle 25.
Reporte del clima	Viernes	8/07/2022	7:00 a. m.	Soleado
Comité técnico de obra	Viernes	8/07/2022	2:00 p. m.	El día de hoy en horas de la mañana se reúne el ingeniero residente de obra por parte del contratista, ingeniero supervisor por parte de empocaldas y representante de planeación de la Alcaldía municipal con el fin de dar solución a las observaciones en cuanto al pavimento.
Reporte del clima	Sábado	9/07/2022	7:00 a. m.	Soleado
Elaboracion de informes- bitacorras-cronogramas-solicitud de material-cotizaciones-afiliaciones-contratos laborales.	Sábado	9/07/2022	10:00 a. m.	Elaboración y envío de Bitacora semanal de actividades
Verificacion del personal -Ingreso-	Todos los dias		7:00 a. m.	Registro de ingreso del personal con toma de temperatura
Recorrido de obra	Todos los dias		9:00 am - 2:00 pm - 4:00 pm	Se realizan recorridos de obra periodicos verificando el uso de los epp y dejando registro fotográfico
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Todos los dias		7:00 am - 5:00 pm	Desinfección con alcohol de ropa y zapatos, lavado de manos
Registro salida de personal	Todos los dias		5:00 p. m.	Registro de salida del personal con toma de temperatura
ANOTACIONES				
SEMANA DEL 4 AL 9 DE JULIO DE 2022				

CONSORCIO REDES ANSERIMA



empocaldas
Construyendo juntos el bienestar



REDIMAC

ANEXO 4

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar



REDIMAC

CRONOGRAMAS VIGENCIA 2021

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

AGOSTO- SEPTIEMBRE

HORA	LUNES 30 AGO	MARTES 31 AGO	MIERCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03	SABADO 04
M A Ñ A N A	7:00 a. m.	Registro de Asistencia y toma de temperatura	Registro de Asistencia y toma de temperatura	Registro de Asistencia y toma de temperatura	Registro de Asistencia y toma de temperatura	Registro de Asistencia y toma de temperatura
	8:00 a. m.	Revisión personal afiliado a seguridad social	Capacitación sobre correcto uso del tapabocas	Afiliaciones pendientes del personal	Afiliaciones pendientes del personal	Afiliaciones pendientes del personal
	9:40 a. m.	Recorrido Obra (tramo 1 y tramo 2)		Observación de falencias en obra		Recorrido Obra (tramo 1 y tramo 2)
	11:00 a. m.		Entrega de epp (guantes) a Personal	Recorrido Obra (tramo 1 y tramo 2)	Charla, recordatorio sobre lavado de manos	Continuación Afiliaciones pendientes
	Tarde		Continuación Afiliaciones pendientes	Continuación Afiliaciones pendientes	Aseo y desinfección de oficina de trabajo	
T A R D E	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura



**CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE DEL 6 AL 11 DE 2021**

		HORA	LUNES 6	MARTES 7	MIERCOLES 8	JUEVES 9	VIERNES 10	SABADO 11
M A Ñ A N A	6:50 a. m.	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
	7:00 a. m.	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Uso correcto del tapabocas	Charla sobre correcto lavado de manos	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Entrega de epp (tapacidos, guantes)	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)
	9:00 a. m.	Afiliaciones pendientes a Salud (EPS)	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)				Capacitacion sobre protocolo de bioseguridad	Realizacion de bitacora
T A R D E	1:00 p. m.	Aseo y desinfeccion de Oficina y bodega de trabajo	Realizacion formatos del protocolo	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)		Realizacion y entrega de bitacora
	3:00 p. m.	Afiliaciones pendientes a Caja de compensacion familiar	Verificacion de la seguridad social		Aseo y desinfeccion de Oficina y bodega de trabajo			Adecuacion de material
	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DE 13 AL 18

HORA	LUNES 13	MARTES 14	MIÉRCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17	SABADO 18
M A Ñ A N A	6:50 a. m.	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
	7:00 a. m.	Organización de Az	Revisar contratos de trabajo	Entrega de elementos de protección personal	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Realizar Listas de chequeo del personal
	9:00 a. m.	Radicar Incapacidad en la EPS del trabajador accidentado	Revisar liquidaciones de personal retirado	Capacitación de correcto uso de los elementos de protección entregados	Rotulación de AZ	Completar información y documentos de las lista de chequeo
T A R D E	1:00 p. m.	Aseo y desinfección de Oficina y bodega de trabajo	Revisar y completar botiquín de primeros auxilios	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Registro fotografico de los avances de obra	Recibir induccion de como reportar un accidente de trabajo a la ARL
	3:00 p. m.	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Aseo y adecuacion de oficina de trabajo	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)	Recorrido por obra (tramo 1 y 2)
	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura
						Identificar deficiencias de los equipos de trabajo



CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DEL 20 AL 25

HORA	LUNES 20	MARTES 21	MIÉRCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24	SABADO 25
M A Ñ A N A	6:50 a. m.	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
	7:00 a. m.	Selección del recorte de personal temporal	Comité para canal	Inspección de la señalización	Acompañamiento y vigilancia en pavimentación de la vía	Recorrido por obra (tramo 1 y2)
	9:00 a. m.	Elaboración de Carta para Supención temporal de personal	Cotización de EPP faltantes	Socializar procedimientos de reporte de accidente de trabajo	Acompañamiento y vigilancia en pavimentación de la vía	Realización y entrega de bitácora
T A R D E	1:00 p. m.	Aseo y desinfección de Oficina y bodega de trabajo	Realizar inspección del extintor	Recorrido por obra (tramo 1 y2)	Registro fotografico de los avances de obra	Acompañamiento y vigilancia en pavimentación de la vía
	3:00 p. m.	Recorrido por obra (tramo 1 y2)	Recorrido por obra (tramo 1 y2)	Aseo y adecuación de oficina de trabajo	Acompañamiento y vigilancia en pavimentación de la vía	Recorrido por obra (tramo 1 y2)
	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

OCTUBRE DEL 04 AL 09

		HORA	LUNES 04	MARTES 05	MIERCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08	SABADO 09
M A Ñ A N A	6:50 a. m.	Sin actividad (incapacidad)	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
	7:00 a. m.	Sin actividad (incapacidad)	Afiliación personal reingresado	Contrato de trabajo del reingreso	Aseo y desinfección de oficina, bodega.	Registro fotográfico de avances de obra	Capacitación sobre accidentes e incidentes	
	9:00 a. m.	Sin actividad (incapacidad)	Recorrido de obra	Registro fotográfico para informe	Recorrido de obra	Comité de obra	Recorrido de obra	
T A R D E	1:00 p. m.	Sin actividad (incapacidad)	Lista de chequeo del reingreso	Lavado de manos, protocolo de Bioseguridad	Realizar Actas de vecindad tramo 2	Realizar Bitacora semanal de actividades.	Desinfección de ropa y zapatos	
	3:00 p. m.	Sin actividad (incapacidad)	Realizar Acta de comité	Recorrido de obra (tramo 2)	Realizar Actas de vecindad tramo 2	Desinfección de herramienta con alcohol	SIN ACTIVIDAD	
	5:00 p. m.	Sin actividad (incapacidad)	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	SIN ACTIVIDAD	



CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaidas

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

OCTUBRE DEL 11 AL 16

HORA	LUNES 11	MARTES 12	MIÉRCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15	SABADO 16
M A Ñ A N A	6:50 a. m.	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
	7:00 a. m.	Afilaciones pendientes del reingreso	Enviar oficio a confa para reintegrar a caja de compensación familiar.	Solicitar elementos de protección personal faltantes	Realizar informe quincenal	Recorrido de obra (tramo 2)
	9:00 a. m.	Supervisar retiro de formaleta de muro en tramo 2	Registro fotografico del replanteo para bordillo	Capacitar sobre los elementos de protección personal requeridos	Adelanto de los anexos del informe	Verificación del pago de la seguridad social.
T A R D E	1:00 p. m.	Gestión para cita de Ortopedia del trabajador accidentado	Realizar acta de comité del viernes 8 de octubre de 2021	Recorrido de obra (tramo 2)	Enviar informe quincenal	Registro de salida y toma de temperatura.
	3:00 p. m.	Recorrido de obra	Recorrido de obra (tramo 2)	Desinfección con alcohol de material de trabajo	Realizar bitacora semanal	SIN ACTIVIDAD
	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

OCTUBRE DEL 18 AL 23 DE 2021

		LUNES 18	MARTES 19	MIERCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	SABADO 23
M A Ñ A N A	HORA						
	6:50 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
	7:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Recorrido de obra	Lista de chequeo del personal reintegrado	Capacitación SG-SST	Firmar formato de entrega de EPP	Recorrido de obra
	9:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Gestion para cita de ortopedia del trabajador Juan Bautista	Hacer firmar nomina quincenal del 1 al 15 de octubre	Cotizar EPP faltantes	Recorrido de obra	Revisar señalización de la obra
	1:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Enviar incapacidad de Juan Bautista a la nueva Eps	Recorrido de obra	Entrega de EPP (Guantes, tapabocas)	Aseo y desinfeccion de oficina y bodega	Realizar y enviar bitacora semanal
	3:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Actualizar Bitacora	Realizar inventario de Epp	Recorrido de obra	Desinfección personal de los trabajadores	SIN ACTIVIDAD
T A R D E	5:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	SIN ACTIVIDAD



CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Compañía Líquida S. Universidad

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOVIEMBRE DEL 01 AL 06 DE 2022

		HORA	LUNES 01	MARTES 02	MIÉRCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SABADO 06
M A Ñ A N A		6:50 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
		7:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Recorrido de obra	Solicitar Epp faltantes	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina	Realizar bitacora semanal	Recorrido de obra
		9:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Realizar cronograma semanal de actividades	Revisión y actualización de bitacora	Fumigación de la herramienta	Recorrido de obra	Verificación y control del uso de los elementos de protección personal
T A R D E		1:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Verificación y control del uso de los elementos de protección personal	Comité técnico de obra	Inspecciones de elementos de protección personal	Verificación estado del extintor	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección
		3:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	SIN ACTIVIDAD	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Vigilancia a la salud de los trabajadores	SIN ACTIVIDAD
		5:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	SIN ACTIVIDAD



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOVIEMBRE DEL 01 AL 06

		HORA	LUNES 01	MARTES 02	MIÉRCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SABADO 06
M A Ñ A N A		6:50 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
		7:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Recorrido de obra	Solicitar Epp faltantes	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina	Realizar bitacora semanal	Recorrido de obra
		9:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Realizar cronograma semanal de actividades	Revisión y actualización de bitacora	Fumigación de la herramienta	Recorrido de obra	Verificación y control del uso de los elementos de protección personal
		1:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Verificación y control del uso de los elementos de protección personal	Comité técnico de obra	Inspecciones de elementos de protección personal	Verificación estado del extintor	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección
		3:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	SIN ACTIVIDAD	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Vigilancia a la salud de los trabajadores	SIN ACTIVIDAD
		5:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	Registro de salida, toma de temperatura y desinfección personal	SIN ACTIVIDAD
T A R D E								



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOVIEMBRE DEL 15 AL 20

HORA	LUNES 15	MARTES 16	MIERCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19	SABADO 20
M		Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
A		Terminar y enviar informe quincenal	Terminar y enviar acta de comité técnico	Aseo, desinfección y adecuación de bodega y oficina de trabajo	Entregar dotación de guantes y tapabocas	Actualizar bitacora diaria en obra
Ñ	(FESTIVO)					
A		Realizar cronograma semanal de actividades	Verificar pago de nómina quincenal	Recorrido de obra	Comité técnico de obra	Recorrido de obra
N		Recorrido de obra	Solicitar copia de exámenes médicos de ingreso a la ips	Organizar Az	Recorrido de obra	Desinfección personal de los trabajadores
A		Realizar acta de comité técnico del viernes 12 de noviembre	Recorrido de obra	Verificar señalización en obra	Realizar Bitacora semanal de actividades	SIN ACTIVIDAD
N	(FESTIVO)	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	SIN ACTIVIDAD
A						
R						
D						
E						



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOVIEMBRE DEL 22 AL 27.

HORA	LUNES 22	MARTES 23	MIERCOLES 24	JUEVES 25	VIERNES 26	SABADO 27
6:50 a. m.	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
7:00 a. m.	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Cotizar los epp que hacen falta	Aseo y desinfección de oficina y bodega.	Desinfección personal por trabajador	Verificación del uso correcto de los epp
9:00 a. m.	Actualizar bitacora diaria en obra con los por menores que surgieron durante la jornada	Realizar Acta de comité técnico del 19 de noviembre	Recorrido de obra	Comité técnico de obra	Recorrido de obra	Adelantar informe quincenal
1:00 p. m.	Realizar cronograma semanal de actividades	Inspección de botiquin	Formatos de entrega de epp	Recorrido de obra	Entregar epp (Guantes, vaqueta)	Recorrido de obra
3:00 p. m.	Realizar memorando por falta injustificada a trabajador	Revisar que elementos de protección personal hacen falta	Recorrido de obra	Desinfección de materiales y herramienta de trabajo	Realizar Bitacora semanal de actividades	SIN ACTIVIDAD
5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	SIN ACTIVIDAD

T A R D E

M A Ñ A



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE

		DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE					
		LUNES 29	MARTES 30	MIÉRCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03	SABADO 04
M A Ñ A N A	6:50 a. m.	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura
	7:00 a. m.	Realizar afiliaciones faltantes al personal nuevo	Recorrido de obra, toma de registro fotografico para informe quincenal	Actualizar bitacora diario en obra	Aseo, adecuacion y desinfección de bodega y oficina de trabajo.	Inspección de epp	Realizar bitacora semanal de actividades
	9:00 a. m.	Recorrido de obra	Realizar formato de entrega de epp al personal nuevo	Recorrido de obra	Realizar lista de chequeo de los trabajadores que ingresaron nuevos	Comité técnico de obra	Recorrido de obra
	1:00 p. m.	Ir a confa a solicitar formatos para afiliación a ccf	Cotizar epp faltantes	Revisar la señalización en obra	Recorrido de obra	Vigilar el cumplimiento con los epp dentro de la obra	Realizar acta de comité
	3:00 p. m.	Realizar y enviar cronograma semanal de actividades	Realizar informe quincenal	Actualizar hojas de vida de los trabajadores con anexos	Getlonar cita para Juan Bautista	Recorrido de obra	SIN ACTIVIDAD
	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.
T A R D E							



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

DICIEMBRE DEL 06 AL 11

		DICIEMBRE DEL 06 AL 11						
M A N A N A	HORA	LUNES 06	MARTES 07	MIERCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	SABADO 11	
	6:50 a. m.	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	NO SE LABORA (FESTIVO)	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	Registro de asistencia y toma de temperatura	
	7:00 a. m.	Recorrido de obra	Acompañamiento durante la imprimación del tramo 2		Vigilar el uso de los epp durante la pavimentación de la vía	Acompañamiento en pavimentación de la vía (tramo 2)	Realización de bitacora semanal de actividades	
	9:00 a. m.	Recoger formatos en conía para afiliación del personal nuevo	Acompañamiento durante la imprimación del tramo 2	Registro fotográfico de la pavimentación	Acompañamiento en pavimentación de la vía (tramo 2)	Aseo, desinfección y adecuación de oficina de trabajo.		
	1:00 p. m.	Realizar cronograma semanal de actividades	Registro fotográfico de la Imprimación	NO SE LABORA (FESTIVO)	Registro fotográfico de la bitacora diaria en obra	Registro fotográfico	Recorrido de obra	
	3:00 p. m.	Pedir dotación de tapabocas (cumplimiento con el protocolo de bioseguridad)	Desinfección de materiales y herramientas		Actualizar bitacora diaria en obra	Verificación de peligros existentes en obra	SIN ACTIVIDAD	
	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.		Registro de salida y toma de temperatura.	Registro de salida y toma de temperatura.	SIN ACTIVIDAD	
	T A R D E							

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Compañía Especializada en el Mantenimiento



REDIMAC

CRONOGRAMAS VIGENCIA 2022



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS

**CRONOGRAMA SEMANAL DE
ACTIVIDADES**



mar-22

SEMANA DEL 14 AL 19

HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M 7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
A 9:00 a. m.	Continuar con el proceso de afiliación de la empresa 3D en la seguridad social	Solicitar dotación para el personal (Botas con puntera, Guantes)	Registro fotografico del uso de chalecos y EPP	Solicitar señalización faltante para las 2 obras	Capacitación sobre el buen uso de los elementos de protección personal	Realizar bitacora semanal de actividades
A 11:00 a. m.	Realizar recorrido de obra con acompañamiento de 1 hora	Realizar informe Siso quincenal	Realizar afiliación a confa del personal de 3D ingeniería y construcciones	Recorrido de obra con acompañamiento de 1 hora	Recorrido de obra con acompañamiento de 1 hora	Recorrido de obra con acompañamiento de 1 hora
T 1:00 p. m.	Realizar plan de manejo de protocolo de Bioseguridad	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo	Hacer firmar pago de nomina quincenal	Recorrido de obra, registro fotografico	Aseo, desinfección y adecuación de bodega	Sin actividad
A 3:00 p. m.	Recorrido de obra	Inspección de botiquin	Realizar paz y salvo y desistimiento a examen de las 2 personas retiradas	Adelantar Bitacora semanal de actividades	Recorrido de obra, registro fotografico	Sin actividad
D 5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura
N O C H E						

OBSERVACIONES



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



mar-22

SEMANA DEL 21 AL 26

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
7:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
9:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Enviar a examen medico de ingreso al nuevo personal que se va a contratar	Capacitar al personal nuevo sobre politicas de la empresa, horarios de trabajo etc...	Realizar contratos de trabajo al personal nuevo	Realizar contratos de trabajo	Recorrido de obra
11:00 a. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Afiliar a ARL al nuevo personal	Entrega de epp al personal nuevo contratado	Aseo desinfección y adecuación de bodega	Recorrido de obra dejando registro fotografico de las actividades	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
1:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Realizar cronograma semanal de actividades	Recorrido de obra	Afiliar a Eps, caja de compensacion familiar al personal nuevo	Verificar desinfección personal de cada trabajador	Sin actividad
3:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Recorrido de obra	Acompañamiento en baseo de pilotes	Recorrido de obra	Entrega de epp (protección auditiva)	Sin actividad
5:00 p. m.	SIN ACTIVIDAD (FESTIVO)	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad

M
A
N
A
N
A

T
A
R
D
E

N
O
C
H
E



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



mar-Abr 2022

SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL

HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
9:00 a. m.	Realizar Afiliación a Arl del personal que se va a contratar	Realizar inducción al personal nuevo	Recorrido de obra	Limpieza, Adecuación y desinfección de la bodega y oficina de trabajo	Realizar afiliaciones de confa al personal nuevo	Recorrido de obra
11:00 a. m.	Enviar este personal que se va a contratar a examen médico de ingreso	Entrega de epp (casco, Guantes, Tapabocas, Gafas, Chaleco)	Realizar informe quincenal	Recorrido de obra (anillo vial)	Acompañamiento en actividades en (Cra 3ra)	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
1:00 p. m.	Recorrido de obra	Realizar cronograma semanal de actividades	Llevar solicitud a la Chec para traslado de posta en anillo vial	Recorrido de obra (Cra 3ra)	Realizar contratos a los trabajadores que faltan	Sin actividad
3:00 p. m.	Solicitar epp para el personal nuevo	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Desinfección personal por trabajador con alcohol	Recorrido de obra (anillo vial)	Sin actividad
5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad

M A Ñ A N A

T A R D E

N O C H E

OBSERVACIONES



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



abr-22

SEMANA DEL 04 AL 09 DE ABRIL

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A N A	7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	Realizar contratos de trabajo	Realizar y enviar cronograma semanal de actividades	Subir Incapacidades a la ARL	Limpieza, desinfección y adecuación de bodega y oficina de trabajo	Recorrido de obra
	11:00 a. m.		Realizar informe sobre el accidente de trabajo	Enviar a examen medico de ingreso al personal que falta	Realizar afiliaciones a conta	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
T A R D E	1:00 p. m.	Recorrido de obra	Recorrido de obra Cra 3ra	Descargar certificados de pensión	Recorrido de obra	Recorrido de obra
	3:00 p. m.	Realizar afiliaciones a EPS del personal ingresado la semana pasada	Recorrido de obra anillo vial	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de obra, retiro de material	Asistir en comité tecnico de obra
	5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Formar las listas de chequeo en las AZ
N O C H E						Registro de Salida con toma de temperatura

OBSERVACIONES



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



abr-22						
SEMANA DEL 11 AL 16 DE ABRIL						
HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	NO SE LABORA (FESTIVO)	NO SE LABORA (FESTIVO)	Registro de entrada y toma de temperatura
9:00 a. m.	Acompañamiento en actividades de obra, Baseo de muro en tramo 3	Adelantar informe quincenal	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo	NO SE LABORA (FESTIVO)	NO SE LABORA (FESTIVO)	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
11:00 a. m.	Realizar cronograma semanal de actividades	Recorrido de obra	Recorrido de obra	NO SE LABORA (FESTIVO)	NO SE LABORA (FESTIVO)	Recorrido de obra
1:00 p. m.	Actualizar formatos de protocolo de Bioseguridad	Afiliaciones a caja de compensación familiar	Acompañamiento en actividades en la Cra 3	NO SE LABORA (FESTIVO)	NO SE LABORA (FESTIVO)	Sin actividad
3:00 p. m.	Recorrido de obra	Dejar las afiliaciones que faltan listas	Desinfección personal por trabajador	NO SE LABORA (FESTIVO)	NO SE LABORA (FESTIVO)	Sin actividad
5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	NO SE LABORA (FESTIVO)	NO SE LABORA (FESTIVO)	Sin actividad

M A Ñ A N A

T A R D E

N O C H E

OBSERVACIONES



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCION

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



abr-22

SEMANA DEL 18 AL 23 DE ABRIL

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
9:00 a. m.	Realizar informe sobre cerramiento y señalización de obra	Recorrido de obra	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y materiales de trabajo.	Revisar afiliaciones	Recorrido de obra	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
11:00 a. m.	Realizar cronograma semanal de actividades	Afilaciones a caja de compensación familiar	Recorrido de obra anillo vial	Realizar reposición de cerramiento con lona verde en anillo vial	Capacitación	Recorrido de obra
1:00 p. m.	Realizar y enviar informe sisto quincenal	Acompañamiento en actividades de obra	Recorrido de obra Cra 3	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Sin actividad
3:00 p. m.	Recorrido de obra	Llevar informe de cerramiento y señalización de obra a planeación municipal	Firmar planilla de nómina	Realizar carta de desistimiento y paz y salvo de trabajador retirado el 31 de marzo	Realizar listas de chequeo	Sin actividad
5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	NO SE LABORA (FESTIVO)	Sin actividad

M A Ñ A N A

T A R D E

N O C H E

OBSERVACIONES



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



abr-22

SEMANA DEL 25 AL 30 DE ABRIL

	HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A	7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	Radicar las Incapacidades en la ARL	Realizar paz y salvo de los trabajadores retirados	Acompañamiento en fundición de ultimo muro	Hacer firmar liquidaciones del personal retirado	Realizar informe quincenal siso	Realizar y enviar Bitacor semanal de actividades
	11:00 a. m.	Realizar Cronograma semanal de actividades	Realizar informe sobre robos de plastico en la cra 3ra	Recorrido de obra	Organizar las Az con toda la documentación por trabajador	Recorrido de obra	Recorrido de obra
T A R D E	1:00 p. m.	Recorrido de obra	Realizar informe sobre el personal retirado por falta de actividades	Actualizar formatos siso de 3D Ingeniería y construcciones	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina	Plan de desinfección personal por trabajador	Sin actividad
	3:00 p. m.	Revisar cerramientos	Recorrido de obra	Imprimir todos los formatos	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de obra	Sin actividad
	5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	NO SE LABORA (FESTIVO)	NO SE LABORA (FESTIVO)
N O C H E							

1. Elaborar el cronograma de actividades de la obra.
 2. Realizar el seguimiento de las actividades programadas.
 3. Mantener actualizado el cronograma de actividades.
 4. Reportar al cliente el avance de las actividades.
 5. Mantener informado al cliente sobre el avance de las actividades.
 6. Mantener informado al cliente sobre el avance de las actividades.
 7. Mantener informado al cliente sobre el avance de las actividades.
 8. Mantener informado al cliente sobre el avance de las actividades.
 9. Mantener informado al cliente sobre el avance de las actividades.
 10. Mantener informado al cliente sobre el avance de las actividades.



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE
ACTIVIDADES



may-22

SEMANA DEL 02 AL 07

HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
9:00 a. m.	Realizar acompañamiento en baseo de placa en la cra 3	Realizar cronograma semanal de actividades	Verificar planilla de pago de seguridad social del operario de la retroexcavadora contratada.	Comité tecnico de obra	Actualización de informe final de la Cra 3	Realizar bitacora semanal de actividades
11:00 a. m.	Realizar acompañamiento en baseo de placa en la cra 3	Verificar cerramiento de obra (Anillo vial)	Recorrido de obra	Recorrido de obra en acompañamiento de la supervisión y el municipio.	Recorrido de obra con acompañamiento de 1 hora	Recorrido de obra con acompañamiento de 1 hora
2:00 p. m.	Acompañamiento en baseo de concreto en la cra 3	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo	Solicitar dotación para operario de maquinaria	Recorrido de obra en la Cra3	Informe siso N°2 cra 3	Sin actividad
3:00 p. m.	Recibir retro excavadora	Inspección de botiquin	Acompañamiento en actividades de excavación	Acompañamiento en actividades de la Cra3	Acompañamiento en realización de cuneta en cra3	Sin actividad
5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Sin actividad

OBSERVACIONES

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIONES SAS

**CRONOGRAMA SEMANAL DE
ACTIVIDADES**



may-22

SEMANA DEL 09 AL 14

		HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A R A N A	7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	Recorrido de obra	Entregar informe siso N°2 de la Cra3	Verificar planillas de pago de la seguridad social de todo el personal	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Adelantar informe quincenal	Realizar bitacora sen de actividades
	11:00 a. m.	Hacer firmar formatos de liquidación	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de obra en la Cra 3. (Garantías).	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo.	Recorrido de obra	Acompañamiento en baseo de bordillos	Recorrido de obra
	1:00 p. m.	desplazamiento hacia Manizales para entrega de formaleta	Realizar Cronograma semanal de actividades	Solicitar epp para reposición	Participar en comité	Organizar AZ con documentación del personal	Recorrido de obra	Sin actividad
	3:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Sin actividad
N O C H E	5:00 p. m.	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Registro de salida y toma de temperatura	Sin actividad



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCION

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



empocaldas

may-22

SEMANA DEL 16 AL 21 DE MAYO

	HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A	7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	Realizar cronograma semanal de actividades	Delimitar areas intervenidas con cinta de peligro.	Realizar afiliaciones de EPS del personal que se cambio de 3D ingenieria y construcciones	Entregar elementos de protección personal (Guantes).	Recorrido de obra	Recorrido de obra
	11:00 a. m.	Afiliar al personal que se va a pasar de 3d a redinmac	Acompañamiento en obra	Contratos de trabajo	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo.	Inspección de epp	Realizar y enviar Bitácora semanal de actividades
T A R D E	1:00 p. m.	Recorrido de obra	Solicitar epp para el personal nuevo	Formatos de entrega de epp	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de obra	Sin actividad
	3:00 p. m.	Acompañamiento en actividades de obra	Recorrido final de obra	Recorrido de obra	Desinfección personal por trabajador con alcohol	Informe Siso de la Cra 3	Sin actividad
	5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad
N O C H E							



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES


may-22

SEMANA DEL 23 AL 28 DE MAYO

		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A	7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	Imprimir exámenes de ingreso para anexar a informe	Realizar paz y salvo de los trabajadores retirados	Limpieza y desinfección de herramienta	Participar en comité de obra	Adelantar informe SISO quincenal	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
	11:00 a. m.	Realizar paz y salvo y carta de desistimiento a examen de egreso de las personal retiradas	Actualizar bitacora diaria	Aseo general de obra.	Hacer firmar liquidaciones del personal retirado	Recorrido de obra	Recorrido de obra
	1:00 p. m.	Realizar cronograma semanal de actividades	Acompañamiento en biseo de bordillo	Recorrido de obra	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina	Acompañamiento en actividades de obra	Sin actividad
	3:00 p. m.	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Afilaciones a caja de compensación familiar	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de obra	Sin actividad
	5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura
T A R D E							
N O C H E							



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y CONSTRUCCION



empocaldas
EMPRESA DE SERVICIOS
COMERCIALES S.A.S.

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

may y jun - 2022

SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO

	HORA	LUNES	MAERTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A R T I N A	7:00 a. m.	FESTIVO (NO SE LABORAR)	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	FESTIVO (NO SE LABORAR)	paz y salvo y examen de egreso del personal retirado	Realizar informe quincenal	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo.	Recorrido de obra	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
	11:00 a. m.	FESTIVO (NO SE LABORAR)	Realizar cronograma semanal de actividades	Ir a la IPS Anti salud a reclamar los exámenes de ingreso que faltan	Completar informe final siso de la cra 3	Estar presente en la prueba de hemeritividad que se le realizará al acueducto	Recorrido de obra
T A R D E	1:00 p. m.	FESTIVO (NO SE LABORAR)	Reclamar tubería en planta para desague.	Recorrido de obra	Acompañamiento en buseo de últimos bordillos	Verificar epp	Sin actividad
	3:00 p. m.	FESTIVO (NO SE LABORAR)	Acompañamiento en actividades de obra	Organizar Az con documentación nueva	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de obra.	Sin actividad
	5:00 p. m.	FESTIVO (NO SE LABORAR)	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad
N O C H E							



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



Jun-22

SEMANA DEL 06 AL 11

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A N A	7:00 a. m. Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m. Elaborar Cronograma semanal de actividades	Acompañamiento en actividades de obra (2 horas)	Recorrido de obra	Aseo, desinfección y adecuación de oficina y bodega.	Recorrido de obra	Realizar y enviar Bitácora semanal de actividades
	11:00 a. m. Recorrido de obra	Cerramiento de áreas intervenidas con cinta precaución.	Desinfección de herramientas .	Recorrido de obra	Adelanto de informe siso quincenal	Recorrido de obra
T A R D E	1:00 p. m. Recorrido de obra	Hacer firmar prorroga en Alcaldía Municipal.	Toma de registro fotografico de avances de obra para informe.	Acompañamiento en actividades de obra	Inspección de extintor	Sin actividad
	3:00 p. m. Hacer inventario de herramientas y pateriales que se encuentran en la bodega.	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Inspección de botiquin	Acompañamiento en actividades de obra.	Sin actividad
N O C H E	5:00 p. m. Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad



CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



Jun-22

SEMANA DEL 13 AL 18

	HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A N A N A	7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	Elaborar Cronograma semanal de actividades	Despachar tubería sobrante a Empocaldas	Realizar Informe quincenal	Aseo, desinfección y adecuación de oficina y bodega.	Recorrido de obra	Realizar y enviar Bitácora semanal de actividades
	11:00 a. m.	Verificar epp	Recorrido de obra	Realizar Informe quincenal	Acompañamiento en compartación de base	Limpieza de obra	Recorrido de obra
T A R D E	1:00 p. m.	Recorrido de obra	Cotizar epp que hacen falta (Guañtes)	Recorrido de obra	Enviar informe SISO quincenal	Actualizar bitácora diaria	Sin actividad
	3:00 p. m.	Realizar inventario de tubería	Acompañamiento en corte de tapas de pozos	Toma de registro fotográfico para Informe	Recorrido de obra	Recorrido de obra	Sin actividad
	5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad
N O C H E							



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



jun-22

SEMANA DEL 20 AL 25

HORA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A N A	7:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de pavimentación.	Aseo, adecuación y desinfección de bodega y oficina de trabajo.	Recorrido de obra	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
	11:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Elaborar Cronograma semanal de actividades	Acompañamiento en actividades de pavimentación.	Recorrido de obra	Realizar informe final para cierre SISO.	Recorrido de obra
	1:00 p. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Recorrido de obra	Acompañamiento en actividades de pavimentación.	Firmas de planilla de pago de nómina	Realizar informe final para cierre SISO.	Sin actividad
	3:00 p. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Acompañamiento en actividades de Imprimación del tramo.	Acompañamiento en actividades de pavimentación.	Toma de registro fotografico de terminado de pavimentación	Realizar informe final para cierre SISO.	Sin actividad
	5:00 p. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura
N O C H E							



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



Jul-22

SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO

	HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A N A	7:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	9:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Elaborar de cronograma semanal de actividades	Informe final (cierre siso)	Informe final (cierre siso)	Informe final (cierre siso)	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
	11:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Inventario de herramienta, materiales y equipos que se van llevar de la bodega.	Recorrido por obra	Rotulación de Az con documentación de todo el transcurso de ejecución de obra.	Informe final (cierre siso)	Recorrido de obra
T A R D E	3:00 p. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Aseo, desinfección y adecuación de bodega y oficina de trabajo.	organizar Documentos administrativos	Realizar Informe quincenal SISO	Realizar paz y Salvo de los trabajadores que se van a retirar por terminación de contrato.	Sin actividad
	5:00 p. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad
N O C H E							



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



Jul-22

SEMANA DEL 04 AL 09 DE JULIO

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
7:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
9:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Recorrido de obra	Realizar inspección de epp	Actualizar bitacora diaria	Recorrido de obra	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades
11:00 a. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Realizar cronograma semanal de actividades.	Recorrido de obra con el subcontratista del pavimento.	Aseo y desinfección de bodega.	Rotulación de Az	Recorrido de obra
3:00 p. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Firmas de planillas de nomina	Recorrido de obra en compañía del director de obra y supervisión Empocaldas.	Recorrido de obra	Organizar formatos de entrega de epp.	Sin actividad
5:00 p. m.	NO SE LABORÓ (FESTIVO)	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad

M
A
Ñ
A
N
A

T
A
R
D
E

N
O
C
H
E



RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES



empocaldas
Compañía de Ingeniería y Tecnología

Jul-22

SEMANA DEL 11 AL 16 DE JULIO

	HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
M A Ñ A N A	7:00 a. m.	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura	Registro de entrada y toma de temperatura
	11:00 a. m.	Realizar cronograma semanal de actividades	Hacer acompañamiento en actividades de corte de pavimento para arreglo de humedad presentada por posible fuga en el acueducto instalado.	Organizar nueva oficina de trabajo.	Realizar Informe SISO quincenal	Recorrido de obra	Realizar y enviar Bitacora semanal de actividades.
	3:00 p. m.	Recorrido de obra	Realizar Aseo y desinfección para entrega de bodega y oficina a la Junta de Acción Comunal.	Recorrido de obra	Recorrido de obra.	Terminar y enviar Informe SISO quincenal	Sin actividad
T A R D E	5:00 p. m.	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Registro de Salida con toma de temperatura	Sin actividad
N O C H E							

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos la bienestar



REDIMAC

ANEXO 5

INFORMES SISO

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Comunidades Unidas de Manizales



REDIMAC

INFORMES VIGENCIA 2021

**INFORMA BIOSEGURIDAD****CONSORCIO REDES ANSERMA**

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION

26/08/2021

PERIODO

DESDE

14/07/2021

HASTA

15/08/2021

N° DE INFORME

1

NOMBRE DEL CARGO

auxiliar de seguridad y salud en el trabajo

ENCARGADO DE INFORME

yeira estefania arroyave bohorquez

OBJETIVO

Garantizar la realizacion de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevencion y seguridad

RELACION DE PERSONAL EN OBRA**CANTIDAD**

Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Ayudantes de obra	7

ACTIVIDADES DESARROLLADAS**OBSERVACIONES**

Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	los dias al ingresar con toma de temperatura desinfeccion de
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	za de la obra se recogen escombros se organiza bodega se
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	acion en comité, recorrido de obra, se verifico la limpieza d
Recorrido de obra	uentran trabajando verificando que se encuentren con los
Entrega de elementos de bioseguridad a trabajadores	s realiza entrega cada 15 dias o cuando el epp esta en mal e
Elaboracion cronograma semanal	se realiza 2 capacitaciones semanal mente
Manejo de bitacora	apartir de 30 de agosto se implemetara bitacora

CAPACITACIONES**FECHA****N° ASISTENTES**

uso correcto del tapabocas, lavado de manos y el distancia miento de 2 metros

10

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

1 se han presentado fuertes lluvias en este mes de agosto lo cual nos hace retrasar y cambiar las actividades que se estan ejecutando en obra 2 se han venido presentando desde que se inicio la obra el hurto de señalizacion, la lona verde con la cual se realizo el encerramiento, plastico y tablos los cuales adaptamos en la entradas para las casa 3 se ha retrasado el retiramiento de escombros y tierra que se saca de la obra ya que se han venido presentado problemas con la maquinaria por daños

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARELLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 01

HASTA 15

N° DE INFORME

1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



desinfeccion con alcohol



toma de temperatura



entrega de epp



guantes



19/08/2021 08:11
Anserma

Reposición Alcantarillado y Acueducto

entrega de tapabocas



19/08/2021 08:11
Anserma

Reposición Alcantarillado y Acueducto

tapabocas



lavado de manos



lavado de manos



lavado de manos



lavado de manos



señalización





señalización



señalización



señalización



señalización

registro de toma de temperatura



registro de capacitacion

registro de capacitacion



registro de capacitacion



capacitacion



capacitacion

**INFORMA BIOSEGURIDAD****CONSORCIO REDES ANSERIMA**

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS"

PERIODO DESDE 03/08/2021 HASTA 15/08/2021 **N° DE INFORME** 1**RELACION DE PERSONAL**

	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1	WALTER DANIEL	9697803	1/07/2021		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFA	
2	YEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	16/07/2021		ASMET SALUD	SURA	PORVENIR	CONFA	
3	JUAN MANUEL GONZALES DUARTE	1101753303	12/06/2021		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFENALCO	
4	HECTOR FABIO SANCHEZ AGUDELO	18522277	16/06/2021	15/08/2021	ASMET SALUD	SURA	PORVENIR	CONFA	25/08/2021
5	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ROJAS	4430737	14/07/2021		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFA	
6	CARLOS ANDRES RIDOS	1054926278	13/07/2021		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFA	
7	YEIRA ESTEFANIA ARROYAVE	1054926452	1/02/2021		ASMET SALUD	SURA	PORVENIR	COFA	
8	HENRY VILLA MARIN BAUTIZTA	88246424	16/02/2021		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFA	
9	JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	13/07/201		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFA	
10	CESAR ANTONIO GALEANO	1054920052	13/07/2021	23/08/2021	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFA	25/08/2021
8	JHAIR ALEXIS VALERO	1098714358	17/04/2021	19/08/2021	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFENALCO	
9	ELLEHEN JULIANA DE LOS ANGELES MORENO	1099371330	23/08/2021		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFENALCO	
10	CARLOS MANUEL CARDENAS	5697080	13/08/2021		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	CONFENALCO	



INFORMA BIOSEGURIDAD



CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 01/08/2021 HASTA 15/08/2021

N° DE INFORME 1

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 YEIRA ESTEFANIA ARROYAVE	1054926452	22	1/02/2021	X		X	
2 HENRY VILLAMARIN BAUTIZTA	88246424	44	16/02/2021	X		X	
3 HELLEN JULIANA DE LOS ANGELES	1099371330	27	23/08/2021	X		X	
4 DILMER ANTONIO RUIZ	6357916	43	26/08/2021	X		X	
5 JUAN BAUTIZTA ZAPATA	6697044	37	23/08/2021	X		X	
6 JUAN MANUEL GONZALES DUARTE	1101753303	43	12/06/2021				X
7 ORLANDO DE JESUS GUZMAN ROJAS	4430737	53	14/07/2021				
8 CARLOS ANDRES RIOS ROJAS	1054926278	22	13/07/2021				
9 JUAN CAMILO CASTAÑEDA	1054925408	24	13/07/2021				
10 YEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	1087491396	22	16/07/2021				

NOTA DEL 6 AL 10 NO HAN CONSEGUIDO

CITA PARA LA VACUNACION DEL COVID

**INFORME BIOSEGURIDAD**

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA NOVEDAD EN EL ANILLO VIAL SAN BIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION 9/09/2021**PERIODO**

DESDE 1/09/2021

HASTA 15/09/2021

N° DE INFORME

2

NOMBRE DEL CARGO

INSPECTOR SISO

ENCARGADO DE INFORME

YENSY CAMILA GRAJALES GIL

OBJETIVO

Garantizar la realizacion de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevencion y seguridad

RELACION DE PERSONAL EN OBRA**CANTIDAD**

Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Ayudantes de obra	8

ACTIVIDADES DESARROLLADAS**OBSERVACIONES**

Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de bioseguridad a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES**FECHA****N° ASISTENTES**

Uso correcto del tapabocas durante la realización de las labores	8/09/2021	9
Protocolo de bioseguridad en general	10/09/2021	10

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

En este mes el clima se ha prestado para avances en la obra ya que han sido pocos los dias de lluvia, exactamente (3). En respuesta a lo solicitado en el comité realizado el día 09 de septiembre de 2021, se quiere manifestar que el CONSORCIO REDES ANSERMA desde el 25 de agosto de 2021 esta solicitando disponibilidad con la empresa GEODCO en el municipio de neira caldas, y con la empresa el cairo en el municipio de Pereira Risaralda, el espacio para la PAVIMENTACION DEL TRAMO 1, pero esta fecha no ha sido posible determinarse con exactitud debido a que los equipos se encuentran ocupados.

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 03/09/2021 HASTA 15/09/2021

N° DE INFORME

2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Uso de Epp (casco, guantes)



Lavado de Manos



Lavado de Manos



Avanse de Obra



Aseo y adecuación de la obra



Limpieza de la obra



INFORMA BIOSEGURIDAD

CONSORCIO REDES ANSERMA



CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FACE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 01/09/2021 HASTA 15/09/2021

N° DE INFORME

2

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	16/07/2021		Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confia	
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	14/07/2021		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confia	
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	24/08/2021		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confia	
4 Carlos Andres Rios	1.054.926.278	13/07/2021		Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confia	
5 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	13/07/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confia	
6 Walter Daniel Velasquez	9.697.803	24/05/2021		Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confia	
7 Juan Manuel Gonzalez	1.101.753.303	14/07/2021	6/09/2021	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Comfenalco	En preceso
8 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	27/08/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confia	
9 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	14/02/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confia	
10 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	13/02/2021		Santas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
11 Ellenh Juliana Moreno	1.099.371.330	23/08/2021	6/09/2021	Coosalud	Sura	Colpensiones	Comfenalco	En preceso
12 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	31/08/2021		Medinas	Sura	Porvenir	Confia	
13 Silvia Fernanda	1.102.377.281	9/09/2021		Santas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	

**INFORMA BIOSEGURIDAD**

CONTRATO 272 - 2020

OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL AMILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 01/09/2021 HASTA 15/09/2021

N° DE INFORME

2

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	16/07/2021		X		
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	53	14/07/2021	X		X	
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	24/08/2021	X		X	X
4 Carlos Andres Rios	1.054.926.278	22	13/07/2021		X		
5 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	13/07/2021		X		
6 Walter Daniel Velasquez	9.697.803		24/05/2021		X		
7 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	43	27/08/2021	X		X	X
8 Henry Villamarín Bautista	88.246.424	44	14/02//2021	X		X	X
9 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	13/02/2021	X		X	X
10 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	20	31/08/2021		X		
11 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	9/09/2021	X		X	X

OBSERVACIONES

NOMBRE	MOTIVO DE NO VACUNACION
1 Jeison Alejandro Hernandez	No ha salido la solicitud de la cita
2 Carlos Andres Rios	No ha salido la solicitud de la cita
3 Juan Camilo Castañeda	No ha salido la solicitud de la cita
4 Walter Daniel Velasquez	No lo han llamado
5 Yensy Camila Grajales	Por Covid reciente, en 15 dias cita para vacuna

**INFORME BIOSEGURIDAD**

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION	28/09/2021
PERIODO	DESDE 15/09/2021
	HASTA 30/09/2021

N° DE INFORME 3

NOMBRE DEL CARGO	INSPECTOR SISO
ENCARGADO DE INFORME	YENSY CAMILA GRAJALES GIL

OBJETIVO

Garantizar la realizacion de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevencion y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Ayudantes de obra	4

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de bioseguridad a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES	FECHA	N° ASISTENTES
Señalización	22/09/2021	6

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

En estos quince (15) días las lluvias han aumentado, se registra días nublados y lluvias en 6 días. El día 15 se retira a un trabajador (Carlos Andres Rios Trejos) y el día 20 se suspenden y se liquidan 3 trabajadores (Walter Daniel Velasquez, Dilmer Antonio Ruiz, Jeison Alejandro Hernandez) hasta nueva orden.

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/09/2021 HASTA 30/09/2021

N° DE INFORME

3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Orden de aseo y desinfección



Uso de epp (cumplimiento del protocolo de bioseguridad)



Lavado de manos



Lavado de manos



Orden y aseo de la bodega



Toma de temperatura



Zona de desinfección



Señalización



Uso adecuado de los epp durante la pavimentación



Uso adecuado de los epp durante la pavimentación



Cierre de la vía



Cierre de la vía

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/09/2021 HASTA 30/09/2021

N° DE INFORME

3

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	16/07/2021	20/09/2021	Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	5/10/2021
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	14/07/2021		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	24/08/2021		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
4 Carlos Andres Rios	1.054.926.278	13/07/2021	15/09/2021	Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	30/09/2021
5 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	13/07/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
6 Walter Daniel Velasquez	9.697.803	24/05/2021	20/09/2021	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	5/10/2021
8 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	27/08/2021	20/09/2021	Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	5/10/2021
9 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	14/02/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
10 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	13/02/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
12 Yensy Camilla Grajales	1.002.802.585	31/08/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
13 Silvia Fernanda	1.102.377.281	9/09/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	



INFORMA BIOSEGURIDAD



CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/09/2021 HASTA 30/09/2021

N° DE INFORME

3

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	53	14/07/2021	X		X	
2 Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	24/08/2021	X		X	
3 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	13/07/2021		X		
4 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	44	14/02//2021	X		X	
5 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	13/02/2021	X		X	
6 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	20	31/08/2021		X		
7 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	9/09/2021	X		X	

OBSERVACIONES

NOMBRE	MOTIVO DE NO VACUNACION
3 Juan Camilo Castañeda	No ha salido la solicitud de la cita
5 Yensy Camila Grajales	No ha salido la solicitud de la cita

**INFORME BIOSEGURIDAD****CONSORCIO REDES ANSERMA**

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION 14/10/2021**PERIODO**

DESDE 1/10/2021

HASTA 15/10/2021

N° DE INFORME

4

NOMBRE DEL CARGO

INSPECTOR SISO

ENCARGADO DE INFORME

YENSY CAMILA GRAJALES GIL

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA**CANTIDAD**

Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	2
Ayudantes de obra	5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS**OBSERVACIONES**

Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de bioseguridad a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hara reposición del mismo
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES**FECHA****N° ASISTENTES**

Uso de epps

13/10/2021

7

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

Se han registrado 5 dias de lluvia desde el 1 hasta el 15 de octubre. Se hizo el reingreso de dos trabajadores (DILMER ANTONIO RUIZ, JEISON HERNANDEZ).

El día martes 12 de octubre se fundieron bordillos, el día martes 13 de octubre al ingresar a la obra evidenciamos que la comunidad no respeto las señales y las citas y se pasaron por encima del concreto fresco, dañando aproximadamente 10 mts lineales.

Los días jueves de cada semana se realiza aseo y desinfección de la oficina y bodega de trabajo.

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 01/10/2021 HASTA 15/10/2021

N° DE INFORME

4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Baseo de bordillo, horas extras



Lavado de manos



Lavado de manos



Respeto por parte de los motociclistas



Supervisión uso Epp



Arreglo de andenes dañados



Recorridos de obra



Toma de temperatura



Cerramientos de la vía



Señalización



Avances de obra



Avances de obra



empocaldes

INFORMA BIOSEGURIDAD

CONSORCIO REDES ANSERMA



CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN SIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 1/10/2021 HASTA 15/10/2021

N° DE INFORME

4

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	5/10/2021		Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	14/07/2021		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	24/08/2021		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
4 Carlos Andres Rios	1.054.926.278	13/07/2021	15/09/2021	Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	30/09/2021
5 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	13/07/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
6 Walter Daniel Velasquez	9.697.803	24/05/2021	20/09/2021	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	5/10/2021
8 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	7/10/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
9 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	14/02/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
10 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	13/02/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
12 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	31/08/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
13 Silvia Fernanda	1.102.377.281	9/09/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	



INFORMA BIOSEGURIDAD



CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO DESDE 1/10/2021 HASTA 15/10/2021

N° DE INFORME 4

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	53	14/07/2021	X		X	
2 Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	24/08/2021	X		X	X
3 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	13/07/2021		X		
4 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	44	14/02//2021	X		X	X
5 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	13/02/2021	X		X	X
6 Yensy Camilla Grajales	1.002.802.585	20	31/08/2021		X		
7 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	5/10/2021		X		
8 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816		7/10/2021	X			
9 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	9/09/2021	X		X	X

OBSERVACIONES

NOMBRE	MOTIVO DE NO VACUNACION
1 Juan Camilo Castañeda	No ha salido la solicitud de la cita
2 Jeison Alejandro Hernandez	No ha salido la solicitud de la cita
3 Yensy Camilla Grajales	No ha salido la solicitud de la cita

CONTRATO 272 – 2020

*OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN RUIRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS*

FECHA ELABORACION 30/10/2021

PERIODO

 DESDE 15/10/2021
 HASTA 30/10/2021

N° DE INFORME

5

NOMBRE DEL CARGO

INSPECTOR SISO

ENCARGADO DE INFORME

YENSY CAMILA GRAJALES GIL

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA
CANTIDAD

Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	2
Ayudantes de obra	5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES

Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de bioseguridad a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES
FECHA
N° ASISTENTES

0

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

Se registran 4 días de lluvia a partir del 15 de octubre, hasta el 30 de octubre de 2021
 Los trabajadores durante esta quincena se encuentran baseando bordillo, realizando actividades de excavaciones para filtro frances, regando subbase y compactando.
 Se realizaron 2 comites tecnicos el 22 de octubre y el 28 de octubre donde se trataron temas de la adición y el accidente de trabajo presentado el 11 de septiembre de 2021.

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/10/2021 HASTA 30/10/2021

N° DE INFORME

5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Desinfección de los buguis



Desinfección de herramienta



Desinfección personal



Ordenamiento de la herramienta



Lavado de manos



Lavado de manos



Lavado de manos



Uso correcto de los elementos de protección personal



Aseo y limpieza



Aseo de la bodega



Avances de obra



Avances de obra (filtro)



INFORMA BIOSEGURIDAD



CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDORO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/10/2021

HASTA 30/10/2021

N° DE INFORME

5

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	5/10/2021		Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	14/07/2021		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	24/08/2021		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
5 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	13/07/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
8 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	7/10/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
9 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	14/02/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
10 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	13/02/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
12 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	31/08/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
13 Silvia Fernanda	1.102.377.281	9/09/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
14 Pablo emilio Giraldo	1.054.922.598	27/04/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	

CONTRATO 272 - 2020

OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 15/10/2021 HASTA 30/10/2021

N° DE INFORME

5

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	53	14/07/2021	X		X	X
2 Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	24/08/2021	X		X	X
3 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	13/07/2021	X		X	
4 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	44	14/02//2021	X		X	X
5 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	13/02/2021	X		X	X
6 Yensy Camilla Grajales	1.002.802.585	20	31/08/2021	X		X	
7 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	5/10/2021	X		X	
8 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816		7/10/2021	X		X	X
9 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	9/09/2021	X		X	X

OBSERVACIONES

NOMBRE	MOTIVO DE NO VACUNACION
1 Juan Camilo Castañeda	Proxima dosis el 23 de noviembre de 2021
2 Jeison Alejandro Hernandez	Falta segunda dosis
3 Yensy Camilla Grajales	Proxima dosis el 27 de enero de 2022

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION	16/11/2021	N° DE INFORME	6
PERIODO	DESDE 30/10/2021		
	HASTA 16/11/2021		
NOMBRE DEL CARGO	INSPECTOR SISO		
ENCARGADO DE INFORME	YENSY CAMILA GRAJALES GIL		

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	2
Asistentes de obra	5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afiliaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentren al día con la afiliación a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el Consorcio Redes Anserma.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de vía en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES	FECHA	N° ASISTENTES
1 (horarios de trabajo)	9/11/2021	

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

En esta quincena (30/10/2021 - 15/11/2021) se han registrado lluvias en 4 días los cuales han retrasado un poco las actividades de los trabajadores ya que las volquetas no lograban entrar al tramo 2 y tuvieron que realizar tras ciegos de los excombros. El botadero tambien estuvo cerrado unos dias por las fuertes lluvias.

Se realizarón 2 comités técnicos de obra el día 03/11/2021 y 12/11/2021.

A la fecha los trabajadores se encuentran realizando filtro franse y armado de formaleta para baseo de bordillos.

Se realiza limpieza desinfección y adecuación de bodega los días jueves de cada semana.

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MORTALIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 30/10/2021 HASTA 15/11/2021

N° DE INFORME

6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Lavado de manos



Lavado de manos



Uso correcto de epp



Lavado de manos



Señalización



Limpieza de la obra



Avance de obra (filtro franses)



Avance de obra (compactación subbase)



Adecuación de bodega



Toma de temperatura



Avance de obra (baseo bordillos)



Avance de obra (Formaleta para bordillos)



INFORMA BIOSEGURIDAD



CONTRATO 272 - 2020

OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 30/10/2021

HASTA 15/11/2021

N° DE

6

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Jelson Alejandro Hernandez	1.087.491.396	5/10/2021		Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	14/07/2021		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	24/08/2021		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
4 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	13/07/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
5 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	7/10/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
6 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	14/02//2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
7 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	13/02/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
8 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	31/08/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
9 Silvia Fernanda	1.102.377.281	9/09/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
10 Pablo emilio Giraldo	1.054.922.598	27/04/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	

**INFORMA BIOSEGURIDAD****CONSORCIO REDES ANSERMA**

CONTRATO 272 - 2020

"ORBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO DESDE 30/10/2021 HASTA 15/11/2021

N° DE INFORME

6

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	53	14/07/2021	X		X	X
2 Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	24/08/2021	X		X	X
3 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	13/07/2021	X		X	
4 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	44	14/02//2021	X		X	X
5 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	13/02/2021	X		X	X
6 Yensy Camilla Grajales	1.002.802.585	20	31/08/2021	X		X	
7 Jelson Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	5/10/2021	X		X	
8 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816		7/10/2021	X		X	X
9 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	9/09/2021	X		X	X

OBSERVACIONES

NOMBRE	MOTIVO DE NO VACUNACION
1 Juan Camilo Castañeda	Proxima dosis el 23 de noviembre de 2021
2 Jelson Alejandro Hernandez	Falta segunda dosis
3 Yensy Camilla Grajales	Proxima dosis el 27 de enero de 2022

**INFORME BIOSEGURIDAD**

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN SIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION 30/11/2021**PERIODO**

DESDE 15/11/2021

HASTA 30/11/2021

N° DE INFORME

7

NOMBRE DEL CARGO INSPECTOR SISO**ENCARGADO DE INFORME** YENSY CAMILA GRAJALES GIL**OBJETIVO**

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA**CANTIDAD**

Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	2
Ayudantes de obra	8

ACTIVIDADES DESARROLLADAS**OBSERVACIONES**

Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el sitio el lavamanos con jabon y toallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Emposcaldas, Alcaldía municipal y personal operativo y administrativo del CONSORCIO REDES ANSERMA, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de app firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afiliaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentren al dia con la afiliación a la seguridad social (ARL,SALUD,PENSIÓN,CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el CONSORCIO REDES ANSERMA.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de vía en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la Promotora de Desarrollo de EMPOCALDAS S.A E.S.P
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a EMPOCALDAS.

CAPACITACIONES**FECHA****N° ASISTENTES**

Horarios de trabajo para las personas nuevas, politicas de la empresa, componentes sg-sst 26/11/2021 12

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

En esta quincena (del 15 al 30 de noviembre) se registraron lluvias durante 7 días aproximadamente lo cual retraso las actividades de los trabajadores y por ende la pavimentación no se podra realizar la primer semana de diciembre, quedo programada para la segunda semana.

Se realiza orden de limpieza y desinfeccion en la obra y oficina los dias jueves de cada semana.

Ingresaron 3 personas nuevas, 2 ayudantes y 1 operario de maquinaria amarilla el día 26 de noviembre de 2021, se realizaron las respectivas afiliaciones.

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/11/2021 HASTA 30/11/2021

N° DE INFORME

7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Lavado de manos



Uso de epp



Uso de epp



Uso de epp



Adecuación de bodega



Limpieza de obra



Avances de obra



Señalización



Avances de obra



Limpieza y avance de obra



INFORME BIOSEGURIDAD

CONSORCIO REDES ANSERMA



CONTRATO 272 - 2020

OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO	DESDE 15/11/2021	HASTA 30/11/2021	N° DE INFORME	7
----------------	------------------	------------------	----------------------	---

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	5/10/2021		Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	14/07/2021		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	24/08/2021		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
4 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	13/07/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
5 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	7/10/2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
6 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	14/02//2021		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
7 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	13/02/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenaico	
8 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	31/08/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
9 Silvia Fernanda	1.102.377.281	9/09/2021		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenaico	
10 Pablo emilio Giraldo	1.054.922.598	27/04/2021		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
11 Walter Daniela Velasquez	9.697.803	26/11/2021		Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	
12 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	26/11/2021		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	
13 Edison Daza Riaño	1.065.235.783	25/11/2021		En tramite	Sura	En tramite	En tramite	



INFORME BIOSEGURIDAD



CONTRATO 272 - 2020

OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 15/11/2021 HASTA 30/11/2021

N° DE INFORME

7

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	53	14/07/2021	X		X	X
2 Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	24/08/2021	X		X	X
3 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	13/07/2021	X		X	X
4 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	44	14/02//2021	X		X	X
5 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	13/02/2021	X		X	X
6 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	20	31/08/2021	X		X	
7 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	5/10/2021	X		X	X
8 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816		7/10/2021	X		X	X
9 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	9/09/2021	X		X	X

OBSERVACIONES

NOMBRE	MOTIVO DE NO VACUNACION
1 Yensy Camila Grajales	Proxima dosis el 27 de enero de 2022

**INFORME BIOSEGURIDAD**

CONTRATO 273 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN IGORO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION	17/12/2021
PERIODO	DESDE 30/11/2021
	HASTA 17/12/2021

N° DE INFORME 8

NOMBRE DEL CARGO	INSPECTOR SISO
ENCARGADO DE INFORME	YENSY CAMILA GRAJALES GIL

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	2
Ayudantes de obra	11

ACTIVIDADES DESARROLLADAS**OBSERVACIONES**

Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio al lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afilaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentran al dia con la afiliación a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el Consorcio Redes Anserma.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de via en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES**FECHA****N° ASISTENTES**

0

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

En estos 17 días las lluvias disminuyeron, se registran 3 días de lluvia

Se realiza orden de limpieza y desinfeccion en la obra y oficina los dias jueves de cada semana.

Ingresaron 2 trabajadores nuevos con el fin de hacer rendir las actividades y poder terminar el tramo 2 antes del 18 de diciembre de 2021, se realizarón las respectivas afiliaciones.

El día 15 de diciembre de 2021 se retiran 7 trabajadores por motivos de terminación de pavimentación y andenes, se les hace firmar con huella los documentos como carta de desistimiento a examen de egreso, Paz y salvo y terminación de contrato, liquidaciones y nomina las cuales se anexaran escaneadas a este informe.

CONTRATO 272 - 2020
"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN SIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CAJIDAS"

PERIODO

DESDE 30/11/2021 HASTA 17/12/2021

N° DE INFORME

8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Pavimentación de la vía



Pavimentación de la vía



Pavimentación de la vía



Realización de andenes



Realización de andenes



Cierre de vía



Orden y limpieza



Uso correcto de EPP



INFORME BIOSEGURIDAD

CONSORCIO REDES ANSERMA



CONTRATO 272 - 2020

OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 30/11/2021 HASTA 17/12/2021

N° DE INFORME

8

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Jelson Alejandro Hernandez	1.087.491.396	5/10/2021	15/12/2021	Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	29/12/2021
2 Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	14/07/2021	15/12/2021	Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	29/12/2021
3 Juan Bautista Zapata	9.697.044	24/08/2021	17/12/2021	Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	29/12/2021
4 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	13/07/2021	17/12/2021	Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	29/12/2021
5 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	7/10/2021	17/12/2021	Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	29/12/2021
6 Henry Villamarin Bautista	88.246.424	14/02/2021	17/12/2021	Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	29/12/2021
7 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	13/02/2021	17/12/2021	Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenaalco	29/12/2021
8 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	31/08/2021	17/12/2021	Medimas	Sura	Porvenir	Confa	29/12/2021
9 Silvia Fernanda	1.102.377.281	9/09/2021	17/12/2021	Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenaalco	29/12/2021
10 Pablo emilio Giraldo	1.054.922.598	27/04/2021	13/12/2021	Medimas	Sura	Porvenir	Confa	29/12/2021
11 Walter Daniela Velasquez	9.697.803	26/11/2021	15/12/2021	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	29/12/2021
12 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	26/11/2021	15/12/2021	Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	29/12/2021
13 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	1/12/2021	15/12/2021	Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	29/12/2021
14 Edison Daza Riaño	1.065.235.783	25/11/2021	15/12/2021	En tramite	Sura	En tramite	En tramite	29/12/2021

PERIODO

DESDE 30/11/2021 HASTA 17/12/2021

N° DE INFORME

8

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

	NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
					SI	NO		
1	Orlando de Jesus Guzman	4.430.737	53	14/07/2021	X		X	X
2	Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	24/08/2021	X		X	X
3	Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	13/07/2021	X		X	X
4	Henry Villamarin Bautista	88.246.424	44	14/02//2021	X		X	X
5	Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	13/02/2021	X		X	X
6	Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	20	31/08/2021	X		X	
7	Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	5/10/2021	X		X	X
8	Dimer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816	43	7/10/2021	X		X	X
9	Silvia Corzo	1.102.377.281	26	9/09/2021	X		X	X
10	Pablo emilio Giraldo	1.054.922.598	36	27/04/2021	X		X	X
11	Walter Daniela Velasquez	9.697.803	34	26/11/2021	X		X	X
12	Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	18	26/11/2021		X		
13	Jovanny Murillo Avedaño	14.191.989	38	1/12/2021	X		X	X
14	Edison Daza Riaño	1.065.235.783	39	25/11/2021	X		X	X

OBSERVACIONES
NOMBRE
MOTIVO DE NO VACUNACION

1	Juan David Becerra Andica	En espera de cita para vacunación
2	Yensy Camila Grajales	Proxima dosis el 27 de enero de 2022

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar



REDIMAC

INFORMES VIGENCIA 2022

CONTRATO 271 - 2020

 "OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION	28/02/2022
PERIODO	DESDE 15/02/2022
	HASTA 28/02/2022

N° DE INFORME	1
----------------------	---

NOMBRE DEL CARGO	INSPECTOR SISO
ENCARGADO DE INFORME	YENSY CAMILA GRAJALES GIL

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Ayudantes de obra	6

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afiliaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentren al dia con la afiliación a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el Consorcio Redes Anserma.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de vía en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES	FECHA	N° ASISTENTES

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

Se realizaron las afiliaciones a todo el personal ingresado las cuales se anexaran en el envio de este informe.
Se ha presetando fuertes lluvias lo cual ha retardado un poco las actividades.
Se hizo el cerramiento de la obra con lona verde y señalización demarcando el sendero peatonal y evitando un incidente o accidente con la comunidad que transita por este tramo.

CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD
EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/02/2022

HASTA 28/02/2022

N° DE INFORME

1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Cerramientos con lona verde



Señalización



Estado de obra por fuertes lluvias



Estado de obra por fuertes lluvias



Instalación de valla



Avance de obra (Domiciliarias)



Uso de Epp



Entibación



INFORME BIOSEGURIDAD

CONSORCIO REDES ANSERMA



CONTRATO 272 - 2020

"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 15/11/2021

HASTA 30/11/2021

N° DE INFORME

1

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Juan Bautista Zapata	9.697.044	21/02/2022		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
2 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	21/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
3 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	15/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
4 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	16/02/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
5 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	8/02/2022		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
6 Silvia Fernanda	1.102.377.281	11/01/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
7 Walter Daniela Velasquez	9.697.803	21/02/2022		Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	
8 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	25/02/2022		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
9 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	4/03/2022		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	

OBSERVACIONES

El personal operativo anteriormente mencionado esta afiliado por la empresa REDIMAC (Red de ingeniería, maquinaria y construcciones S.A.S El personal Administrativo (siso y ing residente) están afiliados por CONSORCIO REDES ANSERMA.



INFORME BIOSEGURIDAD



CONTRATO 272 - 2020

OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 15/02/2022 HASTA 28/02/2022

N° DE INFORME

1

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Juan Bautista Zapata	9.697.044	37	21/02/2022	X		X	X
2 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	21/02/2022	X		X	X
3 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	61	16/02/2022	X		X	X
4 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	21	8/02/2022	X		X	X
5 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816	36	15/02/2022	X		X	X
6 Walter Daniel Velasquez	9.697.803	38	21/02/2022	X		X	X
7 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	18	4/03/2022	X		X	
8 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	43	25/02/2022	X		X	X
9 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	11/01/2022	X		X	X

CONTRATO 101 de 2022

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 21 ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION 15/03/2022

PERIODO

DESDE

1/03/2022

HASTA

16/03/2022

N° DE INFORME

2

NOMBRE DEL CARGO

INSPECTOR SISO

ENCARGADO DE INFORME

YENSY CAMILA ORAJALES OIL

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA
CANTIDAD

Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Ayudantes de obra	4

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES

Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un dia a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afiliaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentren al dia con la afiliación a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSION, CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el Consorcio Redes Anserma.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de vía en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES
FECHA
N° ASISTENTES

Puntos para la señalización

15/03/2022

5

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

En estos 15 días las lluvias han disminuido por lo cual se ha avanzado más en las actividades de obra. Se ha trabajado con la señalización que se tiene por el momento, ya se realizó la solicitud de pedido de la señalización que hace falta. Una vez a la semana se realiza el aseo, adecuación y desinfección de la bodega y oficina de trabajo. El día 09 de marzo de 2022 se retiraron 2 trabajadores, descritos en la relación del personal (Anexo 1)

PERIODO

DESDE 01/03/2022 HASTA 30/03/2022

N° DE INFORME

2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Uso de epp



Uso de chalecos



Señalización



Protocolo de bioseguridad



Adecuación de bodega



Camilla y Botiquín



Actividades de obra



Cerramiento de obra



INFORME BIOSEGURIDAD

RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
REDIMAC

CONTRATO 101 de 2022

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDORO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 01/03/2022 HASTA 16/03/2023

N° DE INFORME

2

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Juan Bautista Zapata	9.697.044	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
2 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	21/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
3 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	15/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
4 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	16/02/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
5 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	8/02/2022		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
6 Silvia Fernanda	1.102.377.281	11/01/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
7 Walter Daniela Velasquez	9.697.803	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	
8 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	25/02/2022		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
9 Albano Caceres Rojas	91.157.048	10/03/2022		Asmet Salud	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
10 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	4/03/2022		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	

OBSERVACIONES

El personal operativo anteriormente mencionado esta afiliado por la empresa REDIMAC (Red de ingenieria, maquinaria y construcciones S.A.S
El personal Administrativo (siso y ing residente) están afiliados por CONSORCIO REDES ANSERMA.



INFORME BIOSEGURIDAD

CONTRATO 101 de 2022

RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRETERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS

PERIODO DESDE 01/03/2022 HASTA 16/03/2022

N° DE INFORME 2

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	24	21/02/2022	X		X	X
2 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	61	16/02/2022	X		X	X
3 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	21	8/02/2022	X		X	X
4 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816	36	15/02/2022	X		X	X
5 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	18	4/03/2022	X		X	
6 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	43	25/02/2022	X		X	X
7 Albano Caceres Rojas	91.157.048	46	10/03/2022	X		X	X
8 Silvia Corzo	1.102.377.281	26	11/01/2022	X		X	X

**INFORME BIOSEGURIDAD****RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS**

CONTRATO 301- 2022

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION	13/04/2022	N° DE INFORME	3
PERIODO	DESDE 1/04/2022		
	HASTA 15/04/2022		
NOMBRE DEL CARGO	INSPECTOR SISO		
ENCARGADO DE INFORME	YENSY CAMILA GRAJALES GIL		

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Ayudantes de obra	5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afiliaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentren al dia con la afiliación a la seguridad social (ARI, SALUD, PENSIÓN, CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el Consorcio Redes Anserma.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de vía en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES**FECHA****N° ASISTENTES****OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES**

Se realizaron los contratos de trabajo de todo el personal, se anexaron a las listas de chequeo que se manejan por cada trabajador las cuales contienen exámenes medicos de ingreso, certificados de afiliación a la seguridad social, copia de cedula, formato de entrega de elementos de protección personal.

Se ha presetando fuertes lluvias lo cual ha retardado un poco las actividades.

Se hizo el cerramiento de la obra con lona verde y señalización demarcando el sendero peatonal y evitando un incidente o accidente con la comunidad que transita por este tramo.

PERIODO

DESDE 01/04/2022 HASTA 15/04/2022

N° DE INFORME

3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Cerramientos con lona verde



Señalización



Cerramiento con cinta delimitadora



Reposición de cerramiento con Lona verde



Zona de desinfección



Desinfección de herramienta



Lavado de manos



Limpieza y adecuación de bodega



empocaldas

ALUMBRADO Y
SANEAMIENTO

INFORME BIOSEGURIDAD

RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



CONTRATO 101-2022

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 01/04/20212

HASTA 15/04/2022

N° DE INFORME

3

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Juan Bautista Zapata	9.697.044	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
2 Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	21/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
3 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	15/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
4 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	16/02/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
5 Yersy Camila Grajales	1.002.802.585	8/02/2022		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
6 Silvia Fernanda	1.102.377.281	11/01/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
7 Walter Daniela Velasquez	9.697.803	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	
8 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	25/02/2022		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
9 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	4/02/2022		Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	



INFORME BIOSEGURIDAD

RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



CONTRATO 101 - 2022

HORAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACION DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDORO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS*

PERIODO

DESDE 01/04/2022 HASTA 15/04/2022

N° DE INFORME

3

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

	NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
					SI	NO		
1	Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	16/02/2022	X		X	X
2	Yensy Camilla Grajales	1.002.802.585	20	8/02/2022	X		X	
3	Jelson Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	23/03/202	X		X	X
4	Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816	55	15/02/2022	X		X	X
5	Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	18	4/03/2022	X		X	X
6	Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	37	25/02/2022	X		X	X
7	Silvia Fernanda Corzo	1.102.377.281	26	11/01/2022	X		X	X



INFORME BIOSEGURIDAD

RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



CONTRATO 101- 2022

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN SIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

FECHA ELABORACION	12/05/2022	N° DE INFORME	4 Y 5
PERIODO	DESDE 16/04/2022		
	HASTA 15/05/2022		

NOMBRE DEL CARGO	INSPECTOR SISO
ENCARGADO DE INFORME	YENSY CAMILA GRAJALES GIL

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Inspector SISO	1
Operario maquinaria	1
Maestro de obra	2
Ayudantes de obra	6

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y toallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldia municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afiliaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentren al día con la afiliación a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el Consorcio Redes Anserma.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de vía en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES	FECHA	N° ASISTENTES

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

Se han presentado fuertes lluvias las cuales han generado daños en la obra y hace que se retrasen las actividades.
 El día 05 de mayo se realizo de nuevo el cerramiento de obra, utilizando aproximadamente 60 mts de lona verde, se dejo registro fotografico.
 Los días jueves de cada semana se realiza mantenimiento de la obra, limpieza y desinfección de materiales y bodega.
 En este mes se realizaron dos retiros de personal, uno el 21 de abril de 2022, Se retiro de la seguridad social, y se liquido el día martes 10 de mayo de 2022. El otro el día sabado 14 de mayo y esta pendiente por liquidar.
 Anexo 3. Formato de liquidación firmado.

CONTRATO 100- 2022

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACION DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN PEDRO CARRERA DE ENTRE CALLES 23 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 16/04/2022 HASTA 15/05/2022

N° DE INFORME

4 Y 5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Cerramiento de obra



Cerramiento de obra



Fundida del 2 muro de contención



Fundida del 2 muro de contención



Estado de la obra



Excavación para caja de inspección



Cerramiento de obra



Excavación para reposición de tierra




Compactación de la base de reposición



Toma de temperatura



INFORME BIOSEGURIDAD



CONTRATO 101-2022

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

PERIODO

DESDE 16/04/2022

HASTA 15/05/2022

N° DE INFORME

4 Y 5

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Juan Bautista Zapata	9.697.044	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	9/04/2022
2 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	15/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
3 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	16/02/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
4 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	8/02/2022		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
5 Luis Miguel Gómez Benítez	1.005.297.031	10/05/2022		Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
6 Silvia Fernanda Saenz	1.102.377.281	11/01/2022	11/05/2022	Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	Pendiente
7 Walter Daniela Velasquez	9.697.803	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	9/04/2022
8 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	25/02/2022		Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	
9 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	4/02/2022	21/04/2022	Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	10/05/2022
10 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	23/03/2022		Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	
11 Luis Fernando Hoyos Hernandez	75.037.027	23/03/2022	14/05/2022	Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	Pendiente
12 Gerardo Antonio Montes Roman	1.054.919.825	30/03/2022		Salud Total	Sura	Proteccion	Confa	
13 Luis Hernan Colorado Lopez	1.054.917.261	1/04/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	

OBSERVACIONES

Los ultimos 4 trabajadores relacionados en la lista (numerales 10, 11, 12 y 13) se encuentran afiliados por 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, pero serán liquidados y posteriormente afiliados a REDIMAC en la semana del 16 al 20 de mayo.



INFORME BIOSEGURIDAD

CONTRATO 101 - 2022

RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS

PERIODO

DESDE 16/04/2022 HASTA 15/05/2022

Nº DE INFORME

4 Y 5

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	16/02/2022	X		X	X
2 Yensy Camilla Grajales	1.002.802.585	20	8/02/2022	X		X	
3 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	23/03/2022	X		X	X
4 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816	55	15/02/2022	X		X	X
5 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	18	4/03/2022	X		X	X
6 Jovanny Murrillo Avendaño	14.191.989	37	25/02/2022	X		X	X
7 Silvia Fernanda Corzo	1.102.377.281	26	11/01/2022	X		X	X
8 Luis fernando Hoyos Hernandez	75.037.027	56	23/03/2022	X		X	X
9 Gerardo Antonio Montes Roman	1.054.919.825	33	30/03/2022	X		X	X
10 Luis Herman Colorado Lopez	1.054.917.261	27	1/04/2022	X		X	X
11 Luis Miguel Gómez Benitez	1.005.297.031	23	10/05/2022	X		X	X

**INFORME BIOSEGURIDAD****RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS**

CONTRATO 303 - 2022

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

FECHA ELABORACION	31/05/2022	N° DE INFORME	7 y 8
PERIODO	DESDE 31/05/2022		
	HASTA 30/06/2022		
NOMBRE DEL CARGO	INSPECTOR SISO		
ENCARGADO DE INFORME	YENSY CAMILA GRAJALES GIL		

OBJETIVO

Garantizar la realización de las actividades SISO enmarcadas en los principios de prevención y seguridad laboral

RELACION DE PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Residente de obra	1
Inspector SISO	1
Operario maquinaria	1
Maestro de obra	1
Ayudantes de obra	2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Vigilancia del area de limpieza y desinfeccion de los trabajadores	Contamos con una zona de desinfección en la entrada de la bodega y oficina en la cual se dispone suficiente alcohol para la desinfeccion de ropa, zapatos, entre otros. Tambien se encuentra en el citio el lavamanos con jabon y tohallas desechables para el constante lavado de manos de todo el personal.
Mantenimiento de la obra en buen estado, orden y limpieza	Disponemos un día a la semana para la limpieza y aseo de la obra, oficina, bodega. Al igual que la adecuacion del material y equipos de trabajo
Cooperacion entre contratista, entidades y trabajadores	Apoyo por parte de Empocaldas, Alcaldía municipal y personal operativo y administrativo del consorcio, realizando comites tecnicos semanales en la obra
Recorrido de obra	Se realiza el recorrido de obra 3 veces al dia revisando que el personal use adecuadamente los EPP, detectando factores de riesgo, dejando registro fotografico
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores	Los trabajadores cuentan con casco de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, tapabocas. Se deja registro de entrega de epp firmado, y cuando este desgastado o en mal estado se hará reposición del mismo
Afiliaciones a seguridad social de todo el personal del consorcio	Se verifica que todos los trabajadores se encuentren al día con la afiliación a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CCF) Así mismo se realizan estas afiliaciones a personas que ingrese a laboral con el Consorcio Redes Anserma.
Verificar señalización en obra y acomodarla en los lugares correspondientes.	Se instalan adecuadamente las señalizaciones y cierres de vía en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes.
Elaboracion cronograma semanal	Se envia Cronograma semanal de actividades a realizar los dias lunes a la gestora social de empocaldas
Manejo de bitacora	Se realiza bitacora semanal informando los pormenores que se presentan diariamente en obra, se envia a empocaldas.

CAPACITACIONES**FECHA****N° ASISTENTES****OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES**

En esta quincena se han presentado 8 días de lluvia, lo cual ha retrasado las actividades de pavimentación ya que la base en la parte del plan del tramo esta humeda y el vibro compactador ha presentado fallas.
Se tiene programado el asfalto para los días martes y miércoles 21 y 22 de junio.

CONTRATO 301- 2022

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 23 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANGERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 31/05/2022 HASTA 30/05/2022

N° DE INFORME

7 y 8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Pruebas de Hermeticidad



Pruebas de Hermeticidad



Compactación de base



Compactación de base



Pruebas de densidad de suelo



Pruebas de



Recorte de capas de pozos



Instalación de base



INFORME BIOSEGURIDAD



CONTRATO 101-2022

"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 31/05/20212

HASTA 30/06/2022

N° DE INFORME

7

RELACION DE PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	APORTE A LA SALUD	ARL	COTIZACION DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION	FECHA LIQUIDACION
1 Juan Bautista Zapata	9.697.044	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	9/04/2022
2 Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	15/02/2022		Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	
3 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	16/02/2022		Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	
4 Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	8/02/2022		Medimas	Sura	Porvenir	Confa	
5 Silvia Fernanda	1.102.377.281	11/01/2022	13/05/2022	Sanitas	Sura	Colpensiones	Comfenalco	Pendiente
6 Walter Daniela Velasquez	9.697.803	21/02/2022	9/03/2022	Nueva Eps	Sura	Colpensiones	Confa	9/04/2022
7 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	25/02/2022	3/06/2022	Nueva Eps	Sura	Proteccion	Confa	Pendiente
8 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	4/02/2022	21/04/2022	Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	10/05/2022
9 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	23/03/2022	13/06/2022	Asmet Salud	Sura	Proteccion	Confa	Pendiente
10 Luis fernando Hoyos Hernandez	75.037.027	23/03/2022	14/05/2022	Asmet Salud	Sura	Porvenir	Confa	6/06/2022
11 Gerardo Antonio Montes Roman	1.054.919.825	30/03/2022	29/05/2022	Salud Total	Sura	Proteccion	Confa	6/06/2022
12 Luis Hernan Colorado Lopez	1.054.917.261	1/04/2022	29/05/2022	Nueva Eps	Sura	Porvenir	Confa	Pendiente

OBSERVACIONES

Faltan por firmar liquidación JOVANNY MURILO AVENDAÑO y JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ



INFORME BIOSEGURIDAD

CONTRATO 101 - 2022

RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



"OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRETA 38 ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

PERIODO

DESDE 31/05/2022 HASTA 30/06/2022

Nº DE INFORME

7 y 8

RELACION DE PERSONAL VACUNADO

NOMBRE	DOCUMENTO	EDAD	FECHA INGRESO	VACUNACION COVID 19		PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS
				SI	NO		
1 Carlos Manuel Cardenas	5.697.080	60	16/02/2022	X		X	X
2 Yensy Camilla Grajales	1.002.802.585	20	8/02/2022	X		X	X
3 Jeison Alejandro Hernandez	1.087.491.396	25	23/03/2022	X		X	X
4 Dilmer Antonio Ruiz Garcia	6.357.816	55	15/02/2022	X		X	X
5 Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	18	4/03/2022	X		X	X
6 Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	37	25/02/2022	X		X	X
7 Silvia Fernanda Corzo	1.102.377.281	26	11/01/2022	X		X	X
8 Luis Fernando Hoyos Hernandez	75.037.027	56	23/03/2022	X		X	X
9 Gerardo Antonio Montes Roman	1.054.919.825	33	30/03/2022	X		X	X
10 Luis Hernan Colorado Lopez	1.054.917.261	27	1/04/2022	X		X	X
11							

INFORME SISO N°1

CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA

FECHA DE PRESENTACION : 19/04/2022

RESONSABLE : YENSY CAMILA GRAJALES GIL (INSPECTOR SISO)

CONTRATO : 101 DE 2022

OBJETO : "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CRA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25# EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

REPRESENTANTE LEGAL : RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS SOBRE AISLAMIENTOS DE ZONAS DE TRABAJO.

Desde el inicio de la obra que se está ejecutando actualmente en el sector de San Isidro, los esfuerzos desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo –SST- (del contratista) han buscado cumplir con todas las medidas necesarias para la seguridad de la obra con lo relacionado al aislamiento de zona de trabajo y la debida señalización de los espacios, con el fin de permitir una mejor movilidad y seguridad de los usuarios teniendo en cuenta que dichos trabajos han podido generar algunas condiciones tales como: estrechamiento de calzada, desvíos provisorios, excavaciones y/o cunetas, desniveles, material en la zona, maquinaria y obreros trabajando en la vía.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha dispuesto en la zona lona verde, cinta de precaución y señalización metálica (obra en la vía a 110 metros, prohibido el paso vehicular, paso peatonal y desvío).

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO EN OBRA.



REDIMAC


RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



24 DE FEBRERO DE 2022



3 DE MARZO DE 2022

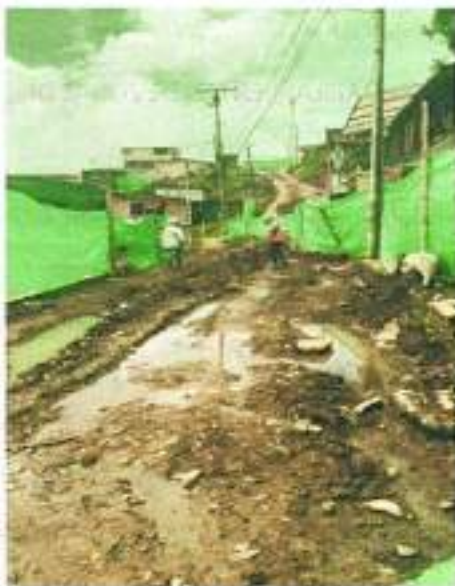

11 DE MARZO DE 2022



11 DE MARZO DE 2022



REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



19 DE MARZO DE 2022



19 DE MARZO DE 2022



13 DE ABRIL DE 2022



13 DE ABRIL DE 2022



REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DAÑOS OCASIONADOS A LA SEÑALIZACIÓN DISPUESTA EN OBRA.



29 DE MARZO DE 2022



13 DE ABRIL DE 2022



13 DE ABRIL DE ABRIL



13 DE ABRIL DE 2022



Se debe tener en cuenta que se han presentado en varias oportunidades daños en las señalizaciones dispuestas en la obra, lo anterior, se menciona debido a que es reiterada la actuación de la comunidad la cual se ha encargado de desobedecer la señalización dispuesta rompiendo la lona verde para cerco de obra y cortando la cinta delimitadora; haciendo caso omiso a la advertencia de prohibido el paso vehicular ya que de igual manera transitan motos por la obra.

En tres oportunidades se ha cambiado el cerramiento debido a los daños ocasionados por la comunidad del sector a continuación, se mencionan las fechas en las cuales se han realizado dichas reparaciones:

- 24 de febrero de 2022: Instalación de 130 mts de lona verde
- 19 de marzo de 2022: Reposición de 100 mts de lona verde
- 13 de abril de 2022: Reposición de 130 mts de lona verde
- Está pendiente la reposición de 130 mts de lona verde los cuales fueron dañados por comunidad entre las fechas del 14 y el 17 de abril.

Lo referido anteriormente puede generar situaciones de riesgo que no están bajo estricta responsabilidad del contratista debido a que la comunidad realiza los daños en horas de la noche o



REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

JAN 10 2022

los fines de semana cuando no hay presencia de personal en la obra, se resalta que continuamente en el sector realiza recorrido el técnico SISO responsable de vigilar las medidas mencionadas tomando los correctivos requeridos.

Lo anterior se informa para su conocimiento.

Atentamente,

Yensy Camila Grajales Gil

Inspector SISO

CONTRATO 101 DE 20222

INFORME SISO N°2

ACTIVIDADES EN OBRA

FECHA DE PRESENTACION : 10/05/2022

RESPONSABLE : YENSY CAMILA GRAJALES GIL (INSPECTOR SISO)

CONTRATO : 101 DE 2022

OBJETO : "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CRA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25ª EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

REPRESENTANTE LEGAL : RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO

ASUNTO: INFORME SISO DE ACTIVIDADES DE OBRA

A continuación se relaciona el registro fotográfico como evidencia de las actividades llevadas a cabo en obra y la descripción de las labores realizadas.

1. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRA



Fotografía Nro. 1 - excavación domiciliaria



Fotografía Nro. 2 - deterioro del cerramiento



Fotografía Nro. 3. - deterioro del cerramiento



Fotografía Nro. 4. - excavación para muro



Fotografía Nro. 5. - Cerramiento de obra



Fotografía Nro. 6. - Cerramiento de obra



Fotografía Nro. 7. - Baseo de muro #1



Fotografía Nro. 8. - Baseo de muro #2



Fotografía Nro. 9. -Baseo de muro #2



REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS



Fotografía Nro. 10. -Baseo de muro #2



Fotografía Nro. 11. - Baseo de muro #2



Fotografía Nro. 12. - instalación último tramo de tubería



Fotografía Nro. 13. - Concreto reparación pavimento



Fotografía Nro. 14. - Finalización muro



Fotografía Nro. 15. - figurado de acero



Fotografía No. 16. - Baseo de muro



Fotografía Nro. 17. - figurado de acero



Fotografía Nro. 18. - Estado de obra



Fotografía Nro. 19. - Estado de obra





REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CERRAMIENTO (05/05/2022)



Se realiza la cuarta reposición de lona verde correspondiente a 60 metros, con el fin de aislar la zona de trabajo y dar cumplimiento con el cerramiento de obra. Los anteriores cerramientos se realizaron el 24 de febrero, 19 de marzo y el 13 de abril de la presente vigencia.

A pesar de que se vienen acatando las recomendaciones realizadas frente al debido cerramiento de obra; las situaciones de riesgo que se puedan presentar con la comunidad del sector por transitar en zona de influencia de obra haciendo caso omiso a las advertencias dispuestas, no están bajo estricta responsabilidad del contratista, debido a que es reiterada la acción de la comunidad de dañar o retirar el material dispuesto para el aislamiento de la obra.



REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

3. RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

N°	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	ESTADO	NOVEDADES
1	Silvia Fernanda Sáenz	1.102.377.281	Ing. Residente	Activo	
2	Yensy Camila Grajales	1.002.802.585	SISO	Activo	
3	Carlos Manuel Cárdenas	5.697.080	Maestro de obra	Activo	
4	Juan Bautista Zapata	9.697.044	Ayudante de obra	Retirado	Liquidado
5	Juan Camilo Castañeda	1.054.925.408	Ayudante de obra	Retirado	Liquidado
6	Dilmer Antonio Ruiz	6.357.816	Ayudante de obra	Activo	
7	Walter Daniela Velásquez	9.697.803	Ayudante de obra	Retirado	Liquidado
8	Jovanny Murillo Avendaño	14.191.989	Ayudante de obra	Activo	
9	Juan David Becerra Andica	1.002.744.247	Ayudante de obra	Retirado	Liquidado
10	Jeison Alejandro Hernández	1.087.491.396	Ayudante de obra	Activo	
11	Luis Fernando Hoyos H	75.037.027	Ayudante de obra	Activo	
12	Luis Hernán Colorado López	1.054.917.261	Ayudante de obra	Activo	
13	Gerardo Antonio Montes R	1.054.919.825	Ayudante de obra	Activo	

4. RESUMEN DEL REPORTE DEL CLIMA

MES	DIAS SOLEADOS	DIAS NUBLADOS	DIAS LLUVIOSOS
FEBRERO	3	7	2
MARZO	6	8	12
ABRIL	13	4	6
TOTAL	22	19	20



REPORTE DE CLIMA CONTRATO 101 DE 2022

AÑO	Mes	Día	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J				
			1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	28		
2022	ENERO																											
	FEBRERO																											
	MARZO																											
	ABRIL																											
	MAYO																											
	JUNIO																											
	JULIO																											
	AGOSTO																											
	SEPTIEMBRE																											
	OCTUBRE																											
	NOVIEMBRE																											
	DICIEMBRE																											
AÑO	Mes	Día	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J				
			1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	28		
2022	ENERO																											
	FEBRERO																											
	MARZO																											
	ABRIL																											
	MAYO																											
	JUNIO																											
	JULIO																											
	AGOSTO																											
	SEPTIEMBRE																											
	OCTUBRE																											
	NOVIEMBRE																											
	DICIEMBRE																											
AÑO	Mes	Día	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S						
			1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30
2022	ENERO																											
	FEBRERO																											
	MARZO																											
	ABRIL																											
	MAYO																											
	JUNIO																											
	JULIO																											
	AGOSTO																											
	SEPTIEMBRE																											
	OCTUBRE																											
	NOVIEMBRE																											
	DICIEMBRE																											

SOLEADO
 NUBLADO
 LLUVIOSO
 SIN ACTIVIDAD



REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

5. REGÍSTRO FOTOGRAFICO DE SOCAVACION DE TERRENO





REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Teniendo en cuenta recorrido de obra realizado el jueves 5 de mayo en horas de la mañana, por parte de Empocaldas el Supervisor de Zona, la Promotora de Desarrollo y la Administradora de la Seccional, por parte de la Alcaldía Municipal un representante de la Secretaría de Planeación y por parte del contratista la Ingeniera Residente, la Técnico SISO y la profesional encargada de la gestión social en obra; quienes verificaron en campo, socavación realizada al borde del tercer muro actividad llevada a cabo por parte del propietario de la vivienda sin solicitar permiso, lo anterior, generó preocupación debido a que esto podría desestabilizar el muro ya construido. Por lo tanto, las partes deciden consensuar que por parte del contratista se debe oficiar a la Inspección de Policía del municipio para que ésta visite el sitio y verifique si el espacio socavado hace parte de la vivienda o corresponde a espacio público para tomar las medidas correspondientes.



REDIMAC

RED DE INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

6. ACTIVIDADES DE OBRA

ACTIVIDAD	ESPECIFICACIONES	
Construcción de muros	Muro N°1	14,30 mts
	Muro N°2	9,30 mts
	Muro N°3	8,30 mts
Instalación de acometidas de acueducto	20 Unds	
Realización de formaletas para bordillos y nivelación		
Excavación para reposición de material	Profundidad de 50 cms	
	En 20 mts la profundidad de la excavación variara a 80 o 90 cms	
Maquinaria en campo	Retroexcavadora	
	Volquetas	
	Mini cargador	
	Vibrocompactador	

Lo anterior se informa para su conocimiento.

Atentamente,

Yensy Camila Grajales Gil

Inspector SISO

CONTRATO 101 DE 2022



26 de Julio de 2022, Anserma, Caldas

Señores:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Carrera 23 Nro. 75-82
Manizales

Referencia: *CONTRATO No. 101 DE 2022*, Objeto: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

Asunto: Retiro de lechada con emulsión asfáltica y arena, sello de MDC-19.

Cordial saludo,

El motivo de la presente es con el fin de informar y reportar el retiro de la lechada con emulsión asfáltica y arena realizado en la Carrera 2E entre calles 25 a 25A, los cuales correspondían a la actividad de obtener un mejor sello en el acabado final de la Mezcla Densa en Caliente No.19 cumpliendo con el objeto en referencia y según lo requerido por las partes como entrega del proyecto, el retiro del material lo realiza la comunidad del sector al presentarse la caída de una persona mayor (característica: tercera edad) con la presencia de un menor de edad en sus brazos, lo cual lamentamos la situación presentada, pero irrumpe lo solicitado por las partes y evita la obtención del sellado de la mezcla asfáltica.

La lechada de emulsión asfáltica con arena fue realizada el 18 de julio de 2022, el retiro del material por acción de la comunidad fue efectuado el 22 de julio de 2022.

Acorde con lo anterior, se anexa evidencia de lo sucedido respectivamente con el material aplicado y retirado en la zona.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VICERRECTOR POR LA ZONA DE MANIZALES
RECIBIDO POR: Gabel Cordero
FECHA: 28-07-22
HORA: 03:56 pm
FIRMA: (Firma)



REDIMAC



Ilustración 1. Aplicación de emulsión asfáltica, 18-07-22.



Ilustración 2. Aplicación de emulsión asfáltica, 18-07-22.

Ilustración 3. Aplicación de emulsión asfáltica, 18-07-22.



Ilustración 4. Aplicación de arena, 18-07-22.

Ilustración 5. Aplicación de arena, 18-07-22.



REDIMAC

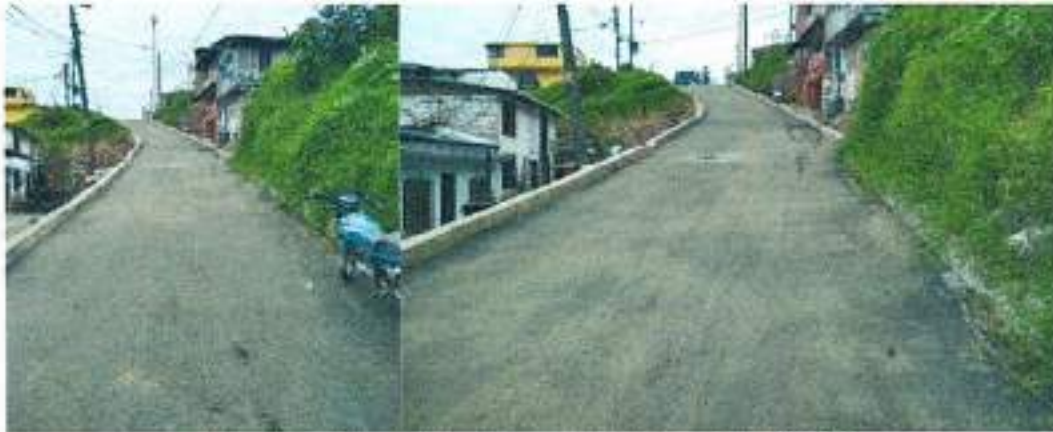


Ilustración 6. Retiro de lechada por acción de la comunidad, 22-07-22.

Ilustración 7. Retiro de lechada por acción de la comunidad, 22-07-22.



Ilustración 8. Día posterior al retiro de lechada, 23-07-22.

Ilustración 9. Día posterior al retiro de lechada, 23-07-22.

Atentamente,

RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO
R.L. REDIMAC S.A.S.

CONSORCIO REDES ANSERMA



13 de mayo de 2022, Anserma, Caldas

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ALCALDÍA ANSERMA CALDAS
NIT. 890.801.139-1

Señores
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE ANSERMA
MÓNICA MARÍA RENDÓN VÉLEZ

Fecha: 13-05-22 Hora: 10:22

RADICADO # 03757

DEPENDENCIA: Inspeccion

REFERENCIA: CONTRATO No. 272 DE 2020 – OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL - SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

ASUNTO: SOLICITUD DE VISITA E INSPECCIÓN

CORDIAL SALUDO,

La presente requiere la visita al lugar de obra comprendido en el anillo vial del barrio San Isidro, Anserma, Caldas por parte de la inspección de policía municipal por los motivos presentados por la comunidad, en el cual realizaron una excavación posterior al trabajo efectuado del muro de contención, actividad contractual del objeto referente en la presente, a razón de ello puede existir una inestabilidad del terreno y colapso del muro de contención en las zonas puntualmente afectadas, por ende se necesita un visita de inspección con la finalidad de verificar que los predios sean de cada habitante y puedan realizar estas excavaciones, o tomar las medidas pertinentes para efectuar nuevamente el relleno. Anexo se evidencia lo sucedido.



Calle 99 a # 35-21

o-mail: 3dingeneriayconstruccion@outlook.com / Tel: 322 7665759 MANIZALES / CALDAS



Ilustración 1. Condiciones iniciales del trinchero.
Ilustración 2. Condiciones iniciales del trinchero.



Ilustración 3. Condiciones iniciales del trinchero.



Calle 99 a # 36-21

e-mail: 3dingenieriaayconstrucciones@gmail.com / Tel: 322 7605759 MANIZALES / CALDAS



Ilustración 4. Condiciones actuales intervenidas por la comunidad.



Ilustración 5. Condiciones actuales intervenidas por la comunidad.

Aunado a lo anterior, se solicita la respectiva visita que convalide la situación presente.

Atentamente,

Sandra Milena Arenas C.

SANDRA MILENA ARENAS C.
CONSORCIO REDES ANSERMA



Calle 99 a # 36-21

e- mail: 3dingenieriayconstrucciones@gmail.com / Tel: 322 7605759 MANIZALES / CALDAS

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Construyendo juntos la Metrópolis



REDIMAC

ANEXO 6

REGISTRO FOTOGRAFICO (TRAMO 1, 2 Y 3)

REGISTRO FOTOGRAFICO TRAMO 1








REGISTRO FOTOGRAFICO TRAMO 2





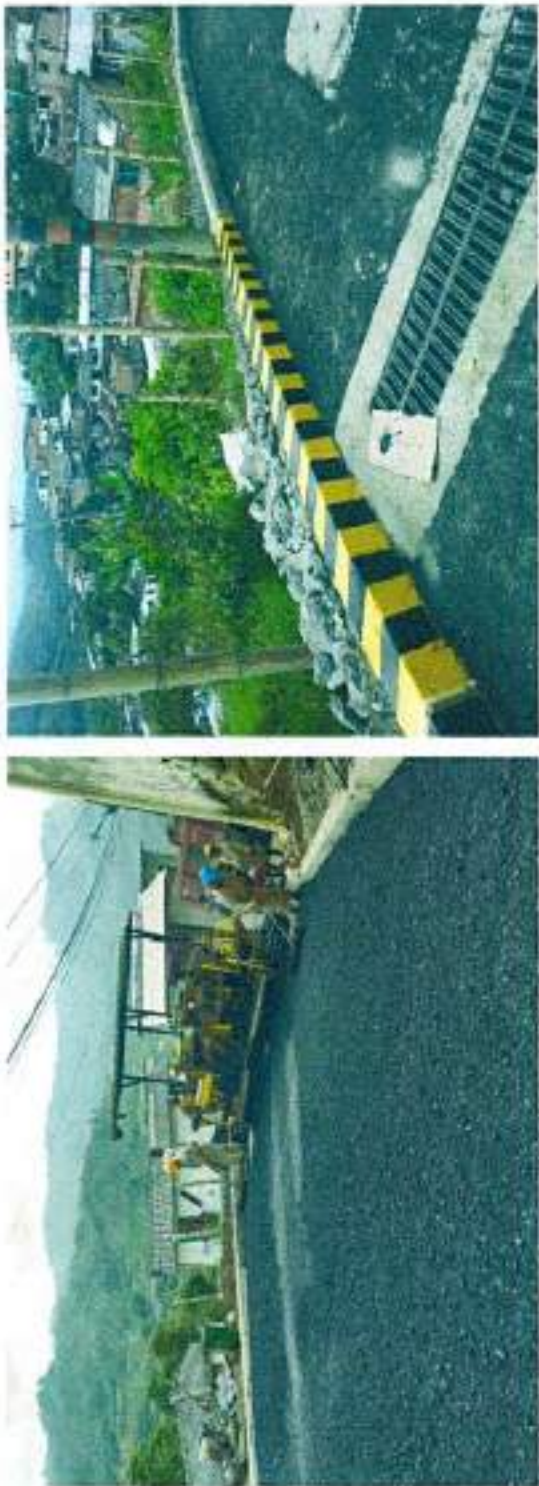



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO TRAMO 3





RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS





REDIMAC

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS





RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS



CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
construyendo juntos tu bienestar



REDIMAC

ANEXO 7

LIQUIDACIONES DEL PERSONAL

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
GERARDO ANTONIO MONTES ROMAN	AYUDANTE DE ORA	1.000.000	117.172
CC 1.054.919.825			
FECHA DE INGRESO:	19/05/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	28/05/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	19/05/2022	28/05/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	10
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	31.033
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	103
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	19/05/2022	28/05/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	10
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	31.033
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	19/05/2022	28/05/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	10
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	13.889
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas:			
TOTAL A PAGAR:			76.057

SON: SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MVCTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el **CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2** queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Gerardo Antonio Montes Roman

Diligencia: **DIEGO VELASCO**

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
CARLOS ANDRES RIOS TREJOS	AYUDANTE DE OBRA	908.526	106.454
CC 1.054.926.278			
FECHA DE INGRESO:	13/07/2021	FECHA DE LIQUIDACION:	15/09/2021
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	13/07/2021	15/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	63
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	177.622
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	3.730
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	13/07/2021	15/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	63
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	177.622
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA VACACIONES:	13/07/2021	15/09/2021	
Ultimo salario fijo:	908.526	Dias trabajados:	63
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	79.496
Salario promedio para vacaciones:	908.526		
Vacaciones disfrutadas:			
TOTAL A PAGAR:			438.469

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y solvo por todo concepto.

Recibi conforme: Carlos Rios

Diligencia: DIEGO VELASCO



REDIMAC SAS
 NIT. 900.945.440-8
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
JUAN DAVID BECERRA ANDICA	AYUDANTE DE OBRA	1.000.000	117.172
CC 1.002.744.247			
FECHA DE INGRESO:	23/02/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	21/04/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	23/02/2022	21/04/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	59
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Cesantias:	183.092
Total remuneraciones:		Intereses Cesantias:	3.601
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	23/02/2022	21/04/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	59
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Prima de servicios:	183.092
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	23/02/2022	21/04/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	59
total subsidio de alimentacion			
Promedio extras y recargos:			
BONIFICACION	0	Vacaciones:	81.944
promedio otras remuneraciones:			
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas:			
TOTAL A PAGAR:			451.729

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideración a que la obtención de los datos contables de elaboración y revisión de la presente liquidación, su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador acepta expresamente que el término transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de pago de esta liquidación ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, está justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidación declaro que la empresa REDIMAC SAS queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Juan David Becerra Andica

Diligencio: DIEGO VELASCO

REDIMAC SAS
 NIT. 900.945.440-8
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE: JOVANNY MURILLO AVENDAÑO CC 14.191.989	CARGO: AYUDANTE DE OBRA	SALARIO BASICO: 1.000.000	AUX. DE TRANSPORTE: 117.172
FECHA DE INGRESO: 25/02/2022		FECHA DE LIQUIDACION: 03/06/2022	
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	25/02/2022	03/06/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	99
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Cesantias:	307.222
Total remuneraciones:		Intereses Cesantias:	10.138
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	25/02/2022	08/06/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	99
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Prima de servicios:	307.222
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	25/02/2022	03/06/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	99
total subsidio de alimentacion			
Promedio extras y recargos:			
BONIFICACION	0		
promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	137.500
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas:	0		
TOTAL A PAGAR:			762.083

SON; SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que la empresa REDIMAC SAS queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Jovany Murillo Avendaño Tu. 797.989

Diligencia: DIEGO VELASCO



CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
CARLOS MANUEL CARDENAS CACERES CC 5.697.080	MAESTRO DE OBRA	1.200.000	117.172
FECHA DE INGRESO:	19/05/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	28/06/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	19/05/2022	28/06/2022	
Total basico:	1.200.000	Total dias trabajados:	40
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.317.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	146.352
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	1.951
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.317.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	19/05/2022	28/06/2022	
Total basico:	1.200.000	Total dias trabajados:	40
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.317.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	146.352
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.317.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	19/05/2022	28/06/2022	
Ultimo salario fijo:	1.200.000	Dias trabajados:	40
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	66.667
Salario promedio para vacaciones:	1.200.000		
Deflacion:			
Vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			361.323

SON: TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL, TRECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salva por todo concepto.

Recibi conforme: Diego Velasco

Diligencia: DIEGO VELASCO


CONSORCIO REDES ANSERMA
 NIT. 901.442.348-2
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE: ORLANDO DE JESUS GUSMAN BOMEZ CC 4.430.737	CARGO: AYUDANTE DE OBRA	SALARIO BASICO: 908.526	AUX. DE TRANSPORTE: 106.454
FECHA DE INGRESO: 14/07/2021		FECHA DE LIQUIDACION: 15/12/2021	
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	14/07/2021	15/12/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	152
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	428.547
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	21.713
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	14/07/2021	15/12/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	152
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	428.547
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA VACACIONES:	14/07/2021	15/12/2021	
Ultimo salario fijo:	908.526	Dias trabajados:	152
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	191.800
Salario promedio para vacaciones:	908.526		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			1.070.607

SON: UN MILLON SETENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: 

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE: JUAN DAVID BECERRA ANDICA CC 1002.744.247	CARGO: AYUDANTE DE OBRA	SALARIO BASICO: 908.526	AUX. DE TRANSPORTE: 106.454
FECHA DE INGRESO:	26/11/2021	FECHA DE LIQUIDACION:	15/12/2021
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	26/11/2021	15/12/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	20
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	56.388
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	376
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	26/11/2021	15/12/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	20
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	56.388
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA VACACIONES:	26/11/2021	15/12/2021	
Ultimo salario fijo:	908.526	Dias trabajados:	20
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	25.237
Salario promedio para vacaciones:	908.526		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			138.388

SON: CIENTO TREINTA Y COHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Juan David Becerra Andica

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
 NIT. 901.442.348-2
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
PABLO EMILIO GIRALDO MONSALVE	CELADOR	908.526	106.454
CC 1.054.922.598			
FECHA DE INGRESO:	27/04/2021	FECHA DE LIQUIDACION:	13/12/2021
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	27/04/2021	13/12/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	229
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	645.640
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	49.284
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	01/07/2021	13/12/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	163
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	459.560
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA VACACIONES:	27/04/2021	13/12/2021	
Ultimo salario fijo:	908.526	Dias trabajados:	229
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	288.962
Salario promedio para vacaciones:	908.526		
Defecion:			
Vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			1.443.446

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Pablo Emilio Giraldo

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
WALTER DANIEL VELAZQUEZ PELAEZ	AYUDANTE DE OBRA	908.526	106.454
CC 9.697.803			
FECHA DE INGRESO:	24/05/2021	FECHA DE LIQUIDACION:	20/09/2021
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	24/05/2021	20/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	117
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	329.869
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	12.865
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	24/05/2021	20/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	117
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	329.869
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA VACACIONES:	24/05/2021	20/09/2021	
Ultimo salario fijo:	908.526	Dias trabajados:	117
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	147.635
Salario promedio para vacaciones:	908.526		
vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			820.237

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Walter Daniel Velazquez Pelaez

Diligencia: **DIEGO VELASCO**



REDIMAC SAS
 NIT. 900.945.440-8
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE: WALTER DANIEL PELAEZ VASQUEZ CC 9.697.803	CARGO: AYUDANTE DE OBRA	SALARIO BASICO: 1.000.000	AUX. DE TRANSPORTE: 117.172
FECHA DE INGRESO: 22/02/2022		FECHA DE LIQUIDACION: 09/03/2022	
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	22/02/2022	09/03/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	18
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Cesantias:	55.859
Total remuneraciones:		Intereses Cesantias:	335
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	22/02/2022	09/03/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	18
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Prima de servicios:	55.859
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	22/02/2022	09/03/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	18
total subsidio de alimentacion			
Promedio extras y recargos:	0		
BONIFICACION		Vacaciones:	25.000
promedio otras remuneraciones:			
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas:			
			157.052

TOTAL A PAGAR:

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideración a que la obtención de los datos contables de elaboración y revisión de la presente liquidación, su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador acepta expresamente que el término transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de pago de esta liquidación ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidación declaro que la empresa REDIMAC SAS queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibí conforme: Walter Daniel Velásquez

Diligencio: DIEGO VELASCO

REDIMAC SAS
 NIT. 900.945.440-8
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE: WALTER DANIEL PELAEZ VASQUEZ CC 9.697.803	CARGO: AYUDANTE DE OBRA	SALARIO BASICO: 1.000.000	AUX. DE TRANSPORTE: 117.172
FECHA DE INGRESO:	14/02/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	17/02/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	14/02/2022	17/02/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	4
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Cesantias:	12.418
Total remuneraciones:		intereses Cesantias:	17
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	14/02/2022	17/02/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	4
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Prima de servicios:	12.418
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	14/02/2022	17/02/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	4
total subsidio de alimentacion			
Promedio extras y recargos:			
BONIFICACION	0	Vacaciones:	5.556
promedio otras remuneraciones:			
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas			
			30.388
TOTAL A PAGAR:			

SON: TREINTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que al termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que la empresa REDIMAC SAS queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Walter Daniel Velásquez

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
YENSY CAMILA BRAJALES GIL	AUX. SISO	1.000.000	117.172
CC 1.002.802.585			
FECHA DE INGRESO:	08/02/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	28/06/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	08/02/2022	28/06/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	141
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	437.559
Total extras dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	20.565
Total remuneraciones:	1.117.172		
Total salarios devengados:			
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	08/02/2022	28/06/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	141
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	437.559
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:	1.117.172		
Total salarios devengados:			
PERIODO PARA VACACIONES:	08/02/2022	28/06/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	141
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:		Vacaciones:	195.833
Promedio otras remuneraciones:			
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Vacaciones:			
Vacaciones disfrutadas:			
			1.091.517
TOTAL A PASAR:			

SON: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 quedo a paz y salva por todo concepto.

Recibi conforme: Camila @ - 1002802585

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
NET. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
YENSY CAMILA GRAJALES GIL	AUX. SISO	1.000.000	117.172
CC 1.002.802.585			
FECHA DE INGRESO:	08/02/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	12/07/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	08/02/2022	12/07/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	155
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	481.005
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	24.852
Total remuneraciones:	1.117.172		
Total salarios devengados:			
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	08/02/2022	12/07/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	155
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Primo de servicios:	481.005
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:	1.117.172		
Total salarios devengados:			
PERIODO PARA VACACIONES:	08/02/2022	12/07/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	155
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	215.278
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Vacaciones disfrutadas:			
TOTAL A PAGAR:			1.202.139

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS IVCTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declara que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Camila G. - 1002802585

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	908.526	106.454
CC 1087.491.396			
FECHA DE INGRESO:	17/07/2021	FECHA DE LIQUIDACION:	20/09/2021
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	17/07/2021	20/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	64
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	180.441
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	3.849
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	17/07/2021	20/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	64
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	180.441
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA VACACIONES:	17/07/2021	20/09/2021	
Ultimo salario fijo:	908.526	Dias trabajados:	64
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	80.758
Salario promedio para vacaciones:	908.526		
vacaciones:			
vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			445.489

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Jeison Hernandez

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.000.000	117.172
CC 1.087.491.396			
FECHA DE INGRESO:	19/05/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	12/06/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	19/05/2022	12/06/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	24
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	74.478
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	596
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	19/05/2022	12/06/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	24
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	74.478
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	19/05/2022	12/06/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	24
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	33.333
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Vacaciones:			
Vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			1.82.885

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esto justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Jeison Hernandez

Diligencia: DIEGO VELASCO

REDIMAC SAS
 NIT. 900.945.440-8
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE: DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA CC 6.357.816	CARGO: AYUDANTE DE OBRA	SALARIO BASICO: 1.000.000	AUX. DE TRANSPORTE: 117.172
FECHA DE INGRESO: 14/02/2022		FECHA DE LIQUIDACION: 14/07/2022	
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	14/02/2022	14/07/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	151
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Cesantias:	468.592
Total remuneraciones:		Intereses Cesantias:	21.586
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	14/02/2022	14/07/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	151
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
total subsidio de alimentacion		Prima de servicios:	468.592
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	14/02/2022	14/07/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	151
total subsidio de alimentacion			
Promedio extras y recargos:			
BONIFICACION	0	Vacaciones:	209.722
promedio otras remuneraciones:			
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Dotacion:			
Vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			1.170.491

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que la empresa REDIMAC SAS queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Diego Velasco

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	908.526	106.454
CC 6.357.816			
FECHA DE INGRESO:	27/08/2021	FECHA DE LIQUIDACION:	20/09/2021
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	27/08/2021	20/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	24
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	67.665
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	541
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	27/08/2021	20/09/2021	
Total basico:	908.526	Total dias trabajados:	24
Total subsidio de transporte:	106.454	Salario promedio:	1.014.980
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	67.665
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.014.980		
PERIODO PARA VACACIONES:	27/08/2021	20/09/2021	
Ultimo salario fijo:	908.526	Dias trabajados:	24
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:			
Promedio otras remuneraciones:		Vacaciones:	30.284
Salario promedio para vacaciones:	908.526		
vacaciones disfrutadas			
			166.156

TOTAL A PAGAR:

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declare que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Diego A. Velasco

Diligencia: DIEGO VELASCO



CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT. 901.442.348-2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACION PERSONAL

NOMBRE:	CARGO:	SALARIO BASICO:	AUX. DE TRANSPORTE:
LUIS HERNAN COLORADO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.000.000	117.172
CC 1.054.917.261			
FECHA DE INGRESO:	19/05/2022	FECHA DE LIQUIDACION:	29/05/2022
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA:	0		
PERIODO PARA CESANTIAS:	19/05/2022	29/05/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	11
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Cesantias:	34.136
Total Extras Dominicales y/o festivos:		Intereses Cesantias:	129
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA PRIMA DE SERVICIOS:	19/05/2022	29/05/2022	
Total basico:	1.000.000	Total dias trabajados:	11
Total subsidio de transporte:	117.172	Salario promedio:	1.117.172
Total Auxilio Alimentacion:	0	Prima de servicios:	34.136
Total extras dominicales y/o festivos:			
Total remuneraciones:			
Total salarios devengados:	1.117.172		
PERIODO PARA VACACIONES:	19/05/2022	29/05/2022	
Ultimo salario fijo:	1.000.000	Dias trabajados:	11
Total Auxilio Alimentacion:	0		
Promedio extras y recargos:			
Promedio dominical y/o festivos:		Vacaciones:	15.278
Promedio otras remuneraciones:			
Salario promedio para vacaciones:	1.000.000		
Datacion:			
vacaciones disfrutadas			
TOTAL A PAGAR:			83.675

SON: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Constancia: Se hace constar expresamente lo siguiente: En consideracion a que la obtencion de los datos contables de elaboracion y revision de la presente liquidacion, su aprobacion y el giro de cheques, ha exigido varios dias, por lo cual ha sido fisicamente imposible pagar en el instante de la terminacion del contrato, el trabajador acepta expresamente que el termino transcurrido entre la terminacion del contrato y la fecha de pago de esta liquidacion ha sido necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia, esta justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Con la presente liquidacion declaro que el CONSORCIO REDES ANSERMA NIT: 901.442.348-2 queda a paz y salvo por todo concepto.

Recibi conforme: Luis Colorado

Diligencia: DIEGO VELASCO

CONSORCIO REDES ANSERMA



empocaldas
Comunidades Juntas y Bienestar



REDIMAC

ANEXO 8

OTRAS



AMI-SALUD IPS SAS

CARRERA 4 # 6 - 36 Teléfono: 3503442907

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Identificación: **CC 6357816**

Nombre: **DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA**

Edad: **56 Años**

Entidad: **CONSORCIO REDES ANSERMA - CONSORCIO REDES ANSERMA**

Fecha: **11/02/2022 15:32:00**

EMPRESA: **CONSORCIO REDES ANSERMA**

CARGO: **AYUDANTE DE OBRA**

EXAMEN OCUPACIONAL PARA: **CONDUCTOR __ TRABAJO ALTURAS __ MAN DE ALIMENTOS __ OTRO X**

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

EXAMEN DE INGRESO X EXAMEN PERIODICO __ EXAMEN DE EGRESO __

CONCEPTO

Evaluación médica sin alteración evidente X

Con énfasis osteomuscular __

Evaluación médica presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral __

Presenta patología general manejada con recomendaciones médicas, que no interfieren en su trabajo __

Presenta patología general que requiere estudio y seguimiento médico por EPS __

Presenta enfermedad laboral calificada que requiere seguimiento por ARL __

APTO **SI X NO __**

APTO CON RECOMENDACIONES **SI __ NO __**

APLAZADO **SI __ NO __**

RECOMENDACIONES GENERALES

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN

Mantener adecuada higiene postural X

Realizar pausas saludables X

Adoptar estilos de vida saludables X

Asistir a citas o control médico establecido __

Usos de elementos de protección personal X

Otra. ¿Cuál? _____

Pro vig epidem para la prevención de DME __

Pro vig epidem para preven de riesgo psicosocial __

Programa de estilos de vida y entorno saludables __

Prog vig epi preve hipoacusia por ruido ocupacional __

Otra. ¿Cuál? _____

RECOMENDACIONES O RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Describir: _____

Remitir eps __ Continuar manejo con eps __ Seguimiento control SST __

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

NOMBRE _____

CEDULA _____

DR. WILLIAM VASQUEZ JARAMILLO CC 75092709
Especialista en Salud Ocupacional y
Otorrinolaringología TP 16128 y licencia 142



AMI-SALUD IPS SAS

CARRERA 4 # 6 - 36 Teléfono: 3503442907

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Identificación: CC 1002802585

Nombre: YENSY CAMILA GRAJALES GIL

Edad: 21 Años

Entidad: CONSORCIO REDES ANSERMA - CONSORCIO REDES ANSERMA

Fecha: 08/02/2022 16:17:00

EMPRESA: CONSORCIO REDES ANSERMA

CARGO: INSPECTOR SISA

EXAMEN OCUPACIONAL PARA: CONDUCTOR __ TRABAJO ALTURAS __ MAN DE ALIMENTOS __ OTRO __X__

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

EXAMEN DE INGRESO __X__ EXAMEN PERIODICO __ EXAMEN DE EGRESO __

CONCEPTO

Evaluación médica sin alteración evidente __X__

Con énfasis osteomuscular __

Evaluación médica presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral __

Presenta patología general manejada con recomendaciones médicas, que no interfieren en su trabajo __

Presenta patología general que requiere estudio y seguimiento médico por EPS __

Presenta enfermedad laboral calificada que requiere seguimiento por ARL __

APTO

SI __X__ NO __

APTO CON RECOMENDACIONES

SI __ NO __

APLAZADO

SI __ NO __

RECOMENDACIONES GENERALES

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN

Mantener adecuada higiene postural __X__

Pro vig epidem para la prevención de DME __

Realizar pausas saludables __X__

Pro vig epidem para preven de riesgo psicosocial __

Adoptar estilos de vida saludables __X__

Programa de estilos de vida y entorno saludables __

Asistir a citas o control médico establecido __

Prog vig epi preve hipoacusia por ruido ocupacional __

Usos de elementos de protección personal __X__

Otra. ¿Cuál? _____ Otra. ¿Cuál? _____

RECOMENDACIONES O RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Describir: _____

Remitir eps __ Continuar manejo con eps __ Seguimiento control SST __

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

NOMBRE _____

CEDULA _____

DR. WILLIAM VASQUEZ JARAMILLO CC 75092709
Especialista en Salud Ocupacional y
Otorrinolaringología TP 16129 y licencia 142



AMI-SALUD IPS SAS

CARRERA 4 # 6 - 36 Teléfono: 3503442907

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Identificación: CC 9697803

Nombre: WALTER DANIEL VELASQUEZ PELAEZ

Edad: 38 Años

Entidad: CONSORCIO REDES ANSERMA - CONSORCIO REDES ANSERMA

Fecha: 11/02/2022 15:22:00

EMPRESA: CONSORCIO REDES ANSERMA

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

EXAMEN OCUPACIONAL PARA: CONDUCTOR __ TRABAJO ALTURAS __ MAN DE ALIMENTOS __ OTRO X

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

EXAMEN DE INGRESO X EXAMEN PERIODICO __ EXAMEN DE EGRESO __

CONCEPTO

Evaluación médica sin alteración evidente X

Con énfasis osteomuscular __

Evaluación médica presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral __

Presenta patología general manejada con recomendaciones médicas, que no interfieren en su trabajo __

Presenta patología general que requiere estudio y seguimiento médico por EPS __

Presenta enfermedad laboral calificada que requiere seguimiento por ARL __

APTO

SI X NO __

APTO CON RECOMENDACIONES

SI __ NO __

APLAZADO

SI __ NO __

RECOMENDACIONES GENERALES

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN

Mantener adecuada higiene postural X

Pro vig epidem para la prevención de DME __

Realizar pausas saludables X

Pro vig epidem para preven de riesgo psicosocial __

Adoptar estilos de vida saludables X

Programa de estilos de vida y entorno saludables __

Asistir a citas o control médico establecido __

Prog vig epi preve hipoacusia por ruido ocupacional _

Usos de elementos de protección personal X

Otra. ¿Cuál? _____

Otra. ¿Cuál? _____

RECOMENDACIONES O RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Describir: _____

Remitir eps __ Continuar manejo con eps __ Seguimiento control SST __

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

NOMBRE _____

CEDULA _____

DR. WILLIAM VASQUEZ JARAMILLO CC 75082709
Especialista en Salud Ocupacional y
Otorrinolaringología TP 18129 y licencia 142



AMI-SALUD IPS SAS

CARRERA 4 # 6 - 36 Teléfono: 3503442907

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Identificación: **CC 75037027**

Nombre: **LUIS FERNANDO HOYOS HERNANDEZ**

Edad: **56 Años**

Entidad: **CONSORCIO REDES ANSERMA - CONSORCIO REDES ANSERMA**

Fecha: **24/03/2022 11:19:00**

EMPRESA: **CONSORCIO REDES ANSERMA**

CARGO: **AYUDANTE DE OBRA**

EXAMEN OCUPACIONAL PARA: **CONDUCTOR__ TRABAJO ALTURAS__ MAN DE ALIMENTOS__ OTRO __X__**

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

EXAMEN DE INGRESO **__X__** EXAMEN PERIODICO **__** EXAMEN DE EGRESO **__**

CONCEPTO

Evaluación médica sin alteración evidente **__X__**

Con énfasis osteomuscular **__**

Evaluación médica presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral **__**

Presenta patología general manejada con recomendaciones médicas, que no interfieren en su trabajo **__**

Presenta patología general que requiere estudio y seguimiento médico por EPS **__**

Presenta enfermedad laboral calificada que requiere seguimiento por ARL **__**

APTO **SI __X__ NO __**

APTO CON RECOMENDACIONES **SI __ NO __**

APLAZADO **SI __ NO __**

RECOMENDACIONES GENERALES

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN

Mantener adecuada higiene postural **__X__**

Realizar pausas saludables **__X__**

Adoptar estilos de vida saludables **__X__**

Asistir a citas o control médico establecido **__**

Usos de elementos de protección personal **__X__**

Otra. ¿Cuál? **__**

Pro vig epidem para la prevención de DME **__**

Pro vig epidem para preven de riesgo psicosocial **__**

Programa de estilos de vida y entorno saludables **__**

Prog vig epi preve hipoacusia por ruido ocupacional **__**

Otra. ¿Cuál? **__**

RECOMENDACIONES O RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Describir: **_____**

Remitir eps **__** Continuar manejo con eps **__** Seguimiento control SST **__**

FIRMA DEL TRABAJADOR **_____**

NOMBRE **_____**

CEDULA **_____**

DR. WILLIAM VASQUEZ JARAMILLO CC 75092709
Especialista en Salud Ocupacional y
Otorrinolaringología TP 16129 y licencia 142



AMI-SALUD IPS SAS

CARRERA 4 # 6 - 36 Teléfono: 3503442907

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Identificación: CC 1002744247

Nombre: JUAN DAVID BECERRA ANDICA

Edad: 18 Años

Entidad: CONSORCIO REDES ANSERMA - CONSORCIO REDES ANSERMA

Fecha: 06/04/2022 10:39:00

EMPRESA: CONSORCIO REDES ANSERMA

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

EXAMEN OCUPACIONAL PARA: CONDUCTOR __ TRABAJO ALTURAS __ MAN DE ALIMENTOS __ OTRO __X__

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

EXAMEN DE INGRESO __X__ EXAMEN PERIODICO __ EXAMEN DE EGRESO __

CONCEPTO

Evaluación médica sin alteración evidente __X__

Con énfasis osteomuscular __

Evaluación médica presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral __

Presenta patología general manejada con recomendaciones médicas, que no interfieren en su trabajo __

Presenta patología general que requiere estudio y seguimiento médico por EPS __

Presenta enfermedad laboral calificada que requiere seguimiento por ARL __

APTO

SI __X__ NO __

APTO CON RECOMENDACIONES

SI __ NO __

APLAZADO

SI __ NO __

RECOMENDACIONES GENERALES

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN

Mantener adecuada higiene postural __X__

Realizar pausas saludables __X__

Adoptar estilos de vida saludables __X__

Asistir a citas o control médico establecido __

Usos de elementos de protección personal __X__

Otra. ¿Cuál? _____

Pro vig epidem para la prevención de DME __

Pro vig epidem para preven de riesgo psicosocial __

Programa de estilos de vida y entorno saludables __

Prog vig epi preve hipoacusia por ruido ocupacional __

Otra. ¿Cuál? _____

RECOMENDACIONES O RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Describir: _____

Remitir eps __ Continuar manejo con eps __ Seguimiento control SST __

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

NOMBRE _____

CEDULA _____

DR. WILLIAM VASQUEZ JARAMILLO CC 75092708
Especialista en Salud Ocupacional y
Otomicrofisiología TP 16129 y licencia 142



CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Identificación: CC 1054925408

Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA TANGARIFE

Edad: 24 Años

Entidad: CONSORCIO REDES ANSERMA - CONSORCIO REDES ANSERMA

Fecha: 11/02/2022 15:25:00

EMPRESA: CONSORCIO REDES ANSERMA

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

EXAMEN OCUPACIONAL PARA: CONDUCTOR __ TRABAJO ALTURAS __ MAN DE ALIMENTOS __ OTRO __X__

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

EXAMEN DE INGRESO __X__ EXAMEN PERIODICO __ EXAMEN DE EGRESO __

CONCEPTO

Evaluación médica sin alteración evidente __X__

Con énfasis osteomuscular __

Evaluación médica presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral __

Presenta patología general manejada con recomendaciones médicas, que no interfieren en su trabajo __

Presenta patología general que requiere estudio y seguimiento médico por EPS __

Presenta enfermedad laboral calificada que requiere seguimiento por ARL __

APTO SI __X__ NO __

APTO CON RECOMENDACIONES SI __ NO __

APLAZADO SI __ NO __

RECOMENDACIONES GENERALES

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN

Mantener adecuada higiene postural __X__

Realizar pausas saludables __X__

Adoptar estilos de vida saludables __X__

Asistir a citas o control médico establecido __

Usos de elementos de protección personal __X__

Otra. ¿Cuál? _____

Pro vig epidem para la prevención de DME __

Pro vig epidem para preven de riesgo psicosocial __

Programa de estilos de vida y entorno saludables __

Prog vig epi preve hipoacusia por ruido ocupacional __

Otra. ¿Cuál? _____

RECOMENDACIONES O RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Describir: _____

Remitir eps __ Continuar manejo con eps __ Seguimiento control SST __

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

NOMBRE _____

CEDULA _____

DR. WILLIAM VASQUEZ JARAMILLO CC 75082709
Especialista en Salud Ocupacional y
Otorrinolaringología TP 16129 y licencia 142

Anserma caldas, 21 de junio de 2022

Señor

JOHANNY MURILLO AVERULOSO

Cargo

Arbitro de obra

REDIMAC (RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS)

Asunto: PAZ Y SALVO Y EXAMEN DE EGRESO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Con el presente y para dar cumplimiento al artículo 348 de C.S.T. Me permito informarle que LA REDIMAC (RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS) NIT. 900.945.440-8 que tiene por objeto "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

Ha Finalizado su contrato de trabajo en las actividades de la obra para la cual fue contratado por una duración de 3 meses y medio

Por lo anterior si usted cree que en el desarrollo de las actividades de obra sufrió algún tipo de accidente o Enfermedad Profesional favor comunicarse con la Empresa dentro de los cinco días hábiles siguientes con el fin de coordinar el sitio y hora para realizar el examen medico de Egreso por parte del Medico Especialista en Salud Ocupacional.

Para tal fin se puede comunicar de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm al Teléfono **3104430645**

Se hace constar expresamente lo siguiente: que con el pago de la suma del dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que a quedado terminado, pues ha sido su común animo transar definitivamente como en efecto se transa todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa del mencionado contrato, por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones proveniente de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados en la presente liquidación.

Así mismo se deja constancia que el trabajador no sufrió ningún tipo de accidente laboral ni desarrollo una enfermedad profesional y certifico con su firma que se encuentra en óptimas condiciones Físicas y Síquicas, y sus aportes a seguridad social se hicieron oportunamente mientras duro la vinculación laboral.

El trabajador laboró 3 meses y medio desempeñando el cargo de Ayudante de obra ejecutando las funciones de Actividades Normas, Solicitados por el maestro u oficial de la obra. la causa de terminación del contrato fue por terminación de obra, Por contrato de obra o labor.

Por lo tanto y dando cumplimiento a los términos en lo dispuesto por la ley 1636 de 2013 articulo 10 y en concordancia con el decreto 2652 de 2013. Se expide la presente certificación de la relación laboral

Dado en Anserma caldas a los 21 días del mes de junio de 2022

Cordialmente



Rafael Edgar Delgado Moreno
Representante Legal

RECIBÍ: Jovany Muzillo Arredondo
C.C. No. 74 791 989



Anserma caldas, 23 de junio de 2022

Señor

Jerson Alejandro Hernandez

Cargo

Ayudante de obra.

REDIMAC (RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS)

Asunto: PAZ Y SALVO Y EXAMEN DE EGRESO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Con el presente y para dar cumplimiento al artículo 348 de C.S.T. Me permito informarle que LA REDIMAC (RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS) NIT. 900.945.440-8 que tiene por objeto "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

Ha Finalizado su contrato de trabajo en las actividades de la obra para la cual fue contratado por una duración de 1 mes aprox

Por lo anterior si usted cree que en el desarrollo de las actividades de obra sufrió algún tipo de accidente o Enfermedad Profesional favor comunicarse con la Empresa dentro de los cinco días hábiles siguientes con el fin de coordinar el sitio y hora para realizar el examen medico de Egreso por parte del Medico Especialista en Salud Ocupacional.

Para tal fin se puede comunicar de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm al Teléfono **3104430645**

Se hace constar expresamente lo siguiente: que con el pago de la suma del dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que a quedado terminado, pues ha sido su común animo transar definitivamente como en efecto se transa todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa del mencionado contrato, por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones proveniente de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados en la presente liquidación.

Así mismo se deja constancia que el trabajador no sufrió ningún tipo de accidente laboral ni desarrollo una enfermedad profesional y certifico con su firma que se encuentra en óptimas condiciones Físicas y Síquicas, y sus aportes a seguridad social se hicieron oportunamente mientras duro la vinculación laboral.

El trabajador laboró 1 mes Aprox desempeñando el cargo de Ayudante de obra ejecutando las funciones de Actividades Varas
Orientadas por el maestro u oficial de obra.
_____ la causa de terminación del contrato fue por terminación de obra, Por contrato de obra o labor.

Por lo tanto y dando cumplimiento a los términos en lo dispuesto por la ley 1636 de 2013 articulo 10 y en concordancia con el decreto 2652 de 2013. Se expide la presente certificación de la relación laboral

Dado en Anserma caldas a los 23 días del mes de junio de 2022

Cordialmente



Rafael Edgar Delgado Moreno
Representante Legal

RECIBÍ: *1087947396
C.C. No. Yeison Her Hernandez

Huella.



Miércoles 13 de Abril de 2022

21

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Aux SISO, maestro de obra
3 ayudantes, operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se retira formaleta de bordillo y viga de cimentación y se instala en cuerpo de muro de contención. Se funde en este mismo día. Se continúa con el acopio de material y consolidación de pavimento, se hacen los gustes requeridos por la Superación en la tubería de acueducto.

Jurjur

Lunes 18 de Abril del 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra, Aux SISO, maestro de obra, 3 Ayudantes, Operad

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se retira formaleta del cuerpo de muro de contención, se continúa el acopio del material y consolidación del pavimento y se terminan los gustes requeridos por la Superación en la tubería de acueducto.

Jurjur

Martes 19 de Abril de 2022.

Contrato 101 de 2022.

Reporte de clima: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra, Aux siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se realiza arreglos en andenes intervenidos y se continua el acopio de material y consolidación de pavimento.

Jurjur

Miércoles 20 de Abril de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Aux siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se realiza retiro de material en volquetas, se continua el acopio de material para consolidación de pavimento y se inicia instalación de formoleta para bordillo, se fonde este mismo día.

Jurjur

Jueves 21 de Abril de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Aux siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador, Benita, Apisonador tipo Canguro.

Actividades: Se realiza retiro de material en volqueta, se continua el acopio de material para consolidación de pavimento, en el cual para la pendiente del tramo desde la calle 25 se realiza un trabajo alternado entre Equipo Benita y apisonador compactador tipo Canguro, se retira formoleta de bordillo.

Observación: Como recomendación de la Supervisión y equipo técnico de 23
Empacadoras, se menciona al contratista realizar una cama o base inferior de
la tubería de acueducto en arena.

Jufuz

Viernes 22 de Abril de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Lluvioso.

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, Operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador, Benitun, Apisonador tipo Canguro.

Actividades: Se realiza retiro de material en volqueta, se continúa el acropio de
material para consolidación de pavimento, del mismo modo, alternado entre equipo Benitun
y apisonador compactador tipo Canguro, se inicia instalación de formaleta para bordillo
y se funde este mismo día.

Observación: Por condiciones climáticas del día, se suspende la actividad de retiro de material
en volqueta, ya que el vehículo no puede acceder al sitio de obra.

Jufuz

Sábado 23 de Abril de 2022

Contrato 101 de 2022.

Reporte de clima: Lluvioso.

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, Operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se comienza a realizar los llenos en la tubería de acueducto y
se dejan sin intervención los puntos específicos de empalme a la Red Municipal.

Observación: al presentarse las condiciones climáticas, se suspende la actividad de Consolidación de pavimento, ya que existen pérdidas de material y evita mantener las especificaciones técnicas mínimas requeridas en su instalación y compactación.

Juarez

Lunes 25 de Abril de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Lluvioso.

Personal en obra: Residente de obra, Aux SISO, maestro de obra, 3 Ayudantes, Operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se continúa con los llenos en la tubería de acueducto y se inicia la instalación de formaleta para bordillo y se funda este mismo día.

Juarez

Martes 26 de Abril de 2022.

Contrato 101 de 2022.

Reporte de clima: Lluvioso.

Personal en obra: Residente de obra, Aux SISO, maestro de obra, 3 Ayudantes, Operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se continúa con los llenos en la tubería de acueducto, se retira la formaleta para bordillo.

Observación: la jornada invernal durante varios días ha impedido efectuar eficientemente la consolidación del pavimento y ocasionalmente ha generado pérdidas y afectaciones en la humedad natural de la subbase y base granular instaladas, no se funda bordillo este día.

Juarez

Miércoles 27 de Abril de 2022.

25

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, operador.

Equipo: Herramienta menor, mimicargador, Banta, Apisonador tipo carguro.

Actividades: Se realizó retiro de escombros en volqueta, Se inicia nuevamente la actividad de Consolidación de pavimento y se funde bordillo.

Juarez

Jueves 28 de Abril de 2022.

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: Soleado.

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Aux siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, operador.

Equipo: Herramienta menor, Mimicargador.

Actividades: Se retira formaleta y se instala sobre el muro deteriorado, este previamente se demuele superficialmente para obtener un agarre del concreto, de ese modo se procede a fundir el bordillo, se continúa el acopio de material para consolidación de pavimento, el retiro de escombros y se terminan los llenos en la tubería de arroyo.

Juarez

Viernes 29 de Abril de 2022.

Contrato 101 de 2022

Reporte de clima: lluvioso.

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Aux siso, maestro de obra, 3 Ayudantes, operador.

Equipo: Herramienta menor, minicargador.

Actividades: Se retira formaleta de bordillo, Se continúa con el acopio de material y Consolidación de pavimento, y el retiro de escombros hasta que las condiciones climáticas del día lo permitan.

Observaciones: Mediante acuerdo entre las partes, Supervisión y Contratista, Se decide suspender el contrato de obra 101 de 2022 por 41 días calendario.

Los retrasos generados en las actividades de obra ejecutadas a la fecha, han sido directamente afectados por las jornadas invernales en el mes de marzo y abril.

J. J. J.

Miércoles 08 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, 2 operarios

Equipo Herramienta menor, Minicargador, Buzina, Apisonador tipo conguero.

Actividades: Se instala formaleta para bordillo, se realiza cambio de material consolidado como pavimento por pérdida y se hace consolidación de pavimento mediante equipos.

Observación: Al cumplirse los 41 días calendario de suspensión se da reinicio del contrato 101 de 2022 entre las partes, Supervisión y Contratista.

M. J. J.

Jueves. 09 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, 2 operarios.

Equipo: Herramienta menor, Minicargador, Benita, Apisonador tipo conuro. 27

Actividades: Se funde bordillo, se continua con el cambio de material consolidado como pavimento por pérdida y se hace consolidación de pavimento mediante equipos.

Observación: Se realiza dato sobre la calle 26 con la Miniretroexcavadora en la tubería de acueducto, por ende, se solicita cierre e intervención en conjunto con el equipo técnico de Empacaladas, la tubería pertenece a la red de suministro municipal.



Viernes 10 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residencia de obra, Aca Siso, Maestro de obra, Ayudante, 2 Operadores.

Equipo: Herramienta menor, Minicargador, Miniretroexcavadora, Benita, Apisonador tipo conuro.

Actividades: Se refino la formulata de bordillo y se reinstala para el siguiente, se continua el cambio de material consolidado como pavimento por pérdida y se da inicio al acopio de material y realización de prueba de hermeticidad, se efectúa la consolidación de pavimento mediante equipos.

Observación: La prueba de hermeticidad fue requerida por la supervisión del proyecto en la tubería de acueducto, como prevención en la existencia de fugas o bajas de presión. El tramo 3 intervenido por Redimac, presentó pérdidas de presión ubicadas en la parte superior del tramo o identificarse pérdidas poco considerables, motivo por el cual se decide

Cortar el tramo en dos partes y realizar la prueba en cada 28

uno, de ese modo, el tramo 2 cortado no presentó ningún inconveniente.

Se reporta daño al final del tramo 3 en tubería de acueducto con el grupo técnico de Empacaldas presente, del cual no se realizó ninguna intervención o actividad por parte del contratista para guiarla.



Sábado 11 de Junio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, 2 operarios.

Equipos: Herramienta menor, Mininetroexcavadora, Minicargador, Bactin.

Actividades: Se continúa el acopio de material y realización de pruebas de hermeticidad en el tramo 1 cortado, se efectúa la consolidación de pavimento mediante equipos.

Observación: El tramo 3 intervenido por Redimac, presentó pérdidas de presión ubicadas en la parte superior del tramo, motivo por el cual se decide cortar el tramo en dos partes y realizar la prueba en cada uno, de ese modo, el tramo 1 cortado presentó varias pérdidas de presión por desarmes en la tubería y sus accesorios, las cuales eran mínimas, resolviendo los problemas presentes hasta que la tubería no presentara ningún inconveniente en la realización de la prueba.



Lunes 13 de Junio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Unusual

Personal en obra: Residente de obra, An Siso, Maestro de obra, Ayudante, 2 Operarios

Equipos Herramienta menor, Minicargadora, Minicargador, Barbas, Apisonador tipo coneyuro.

Actividades: Se continua con el acopio de material y consolidación de pavimento mediante equipos. Se hacen los empalmes de tubería de acueducto nuevo con lo existente, al igual se realizan las conexiones a los medidores.

Observación: Se solicita a Empealderas realizar corte de agua en la zona, para empalmar la tubería existente con la nueva y la conexión de la tubería a los medidores



Fecha: 14 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Unusual

Personal en obra: Residente de obra, An Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operador

Equipos Herramienta menor, Minicargador, Barbas, Apisonador tipo coneyuro.

Actividades: Se funda bordillo y se protege, se continua con el acopio de material y consolidación de pavimento mediante equipos.

Observación: Al presentarse las condiciones climáticas, se suspenden las actividades en merito de escombros y consolidación del pavimento.

Observación 2: Se identifica un borjante de agua constante en una casa sobre la Calle 26 y se interviene provisionalmente con una tubería 6", atravesando la calzada y llevando las aguas al sumidero transversal existente



Miércoles 15 de Junio de 2022

30

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operador.

Equipos: Herramienta menor, Minicargador, Baitin, Apisonador tipo conguo.

Actividades: Se realiza retiro de escombros en volqueta y llenos en la zona de los lotes no intervenidos para generar una mejor visual, se continuo con el acopio de material para consolidación de pavimento mediante equipos. Acorde con el boquete de agua constante, se realiza sumidero provisional en concreto anexa a la tubería de 6" instalada.

Observación: De acuerdo con la visita realizada en el último comité, se decide realizar una intervención en Calle 26 de manera provisional.



Jueves 16 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operadores

Equipos: Herramienta menor, Minicargador, Baitin, Apisonador tipo conguo.

Actividades: Se realiza retiro de escombros en volqueta, se continua con el acopio de material para consolidación de pavimento mediante equipos y los llenos en la zona de los lotes no intervenidos.



Viernes 17 de Junio de 2012

31

Contratos 101 de 2012

Reporte del clima: Lluvioso.

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operador.

Equipos: Herramienta menor, Minicargador, Benitón.

Actividades: Se realiza retiro de escombros en volqueta, se continúa con el acopio de material para consolidación de pavimento mediante equipos y

se inicia la excavación e instalación de acantrada para el dueño de los lotes no intervenidos, al cual resultó imposible contactarlo y hasta la fecha se hace presente, por ende, solo se instala la acantrada de acueducto.

Observación: Conforme a la situación presente durante varios días y sin ninguna intervención hasta el momento, se realizó oficio a Empacalados del dueño al final del tramo 3 en tuberío de acueducto para su intervención pronta.



Sábado 18 de Junio de 2012

Contratos 101 de 2012

Reporte del clima: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operador.

Equipos: Herramienta menor, Minicargador, Benitón.

Actividades: Se continúa con el retiro de escombros, en volqueta, el acopio de material para consolidación de pavimento mediante equipos y la instalación de acantrada de acueducto para el dueño de los lotes no intervenidos, se terminan los llenos en la zona de los lotes no intervenidos como un mejor aspecto visual.



Mañanas 21 de Junio de 2022

32

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operador.

Equipo: Heliomixto menor, Minicargador, Barita, Apisonador tipo cargador.

Actividades: Se define la pendiente al final del tramo 3 con una caída de 1,5% se terminó el acopio de material para consolidación de pavimento mediante equipos y se realizó un cambio y recopio llegando al. Fumero lineal, se empezó a realizar intervención del daño, este se detecta totalmente y se presenta un daño en la tubería de acueducto, se efectúa la imprimación de la base granular.

Observación 1: Al presentarse las condiciones climáticas, se realiza cambio de material consolidado como pavimento. Se hace visita por parte de la Supervisión y equipo técnico de Empacalbas para clauder el daño y tomar decisiones en el asunto, lo cual por parte de la supervisión es que este sea atendido por el Contratista, se llega a un acuerdo de intervención ya que lo real de suministro es municipal y el contratista no efectuó la tubería con alguna actividad del objeto contractual.

Observación 2: Se le notifica al supervisor que al siguiente día se pavimentará y por ello se solicitaba intervención pronto del daño.



Miércoles 22 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux siso, Maestro de obra, Ayudante, 2 Operadores.

Equipo: Herreramiento menor, Mixcargador, Batafín, Apisonador tipo conguero, 33

Pavimentadora (Finisher), Vibracompactador con rodillo.

Actividades: Se instala la mezcla asfáltica con espesor de 7cm, acorde con el diseño del pavimento flexible aprobado por la supervisión del proyecto, el sustrato frenal sufrió un daño por el paso de la volqueta cargada con material.

Observación 1: Se realiza visita por parte de la administración municipal para revisar acabado de mezcla asfáltica MOC-19, emite algunos ajustes sobre el perfil, acabado y manejo de pendiente.

Observación 2: El daño que se intervinó durante el día anterior dejó sin suministro a las viviendas en la Calle 26 con Carrera 1A del barrio San Isidro, en el presente día se hizo 4 intervenciones, la cual es la última afectó el nivel de base granular minutos antes de pavimentar, generando pérdidas de material y tiempo, esto requirió intervenirse rápidamente para terminar la pavimentación y realizar un atraque de la tubería con concreto y acero.

Jueves 23 de Junio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Ayo Jiro, Maestro de obra, Ayudante, Operador.

Equipo Herreramiento menor, Mixcargador.

Actividades: Se realiza retiro de escombros en volqueta, se inicia la reparación de andenes en concreto y asfalto, ya que los rampas en concreto hacia el pavimento nuevo no pueden realizarse, se hace jornada de aseo y terminando la tarde se habilita el paso vehicular en el tramo 3.

M. J. Rojas

Viernes 24 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Urrutso

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operador.

Equipos: Herramienta menor, Mixcargadora

Actividades: Se realiza retiro de escombros en vidrieta, se continua la reparacion de andenes en concreto, la jornada de ateo y se hizo la demolicion al 50% de las losas en concreto de las tapas de los pozos sépticos (en totalidad 3).

M. J. Rojas

Sábado 25 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Urrutso

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante, Operador

Equipos: Herramienta Menor.

Actividades: Se continua la reparacion de andenes en concreto y la demolicion al 50% de las losas en concreto de las tapas de los pozos sépticos

M. J. Rojas

Lunes 27 de Junio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Urrutso

Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipos Humano menor.

Actividades: Se continúan la reparación de andenes en concreto, se termina la demolición al 50% de las losas en concreto de las tapas de los pozos sépticos, se figura el acero de refuerzo, y se funden dos (02) de las (03) tras lasas, adicionalmente se instalan las tapas en hierro fundido de diámetro de 60 cm.

Observación: De acuerdo con el concreto fundido en las losas de las tapas de los pozos sépticos se hace cierre de paso vehicular por 6 días hasta el sábado 02 de Julio de 2022.



Horas 28 de junio de 2022

Carta: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante

Equipos Humano menor.

Actividades: Se continúa la reparación de andenes en concreto, el figurado del acero de refuerzo y se funde la última losa del pozo séptico, adicionalmente se instala la tapa en hierro fundido de diámetro de 60 cm.

Observación: De acuerdo con el concreto fundido en las losas de las tapas de los pozos sépticos se cumple con el cierre de paso vehicular hasta el sábado 02 de Julio de 2022.

Observación 2: Se realiza visita por parte de la administración municipal al sitio de obra para revisar el acabado final de la pavimentación y obras relacionadas al objeto del proyecto, en su posición de interés, realiza algunos ajustes que deben ser atendidos por parte del

Contratista para entregar a satisfacción el proyecto.

36



Miércoles 29 de Junio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo Herramienta menor.

Actividades: Se continuo la reparación de andenes en concreto y se inicia arreglo de rejillo para sumidero lineal.



Juvis 30 de Junio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo Herramienta menor.

Actividades: Se continuo la reparación de andenes en concreto y el arreglo de rejillo para sumidero lineal, se inician las reparaciones en concreto sobre las acanafadas de conducto faltantes.



Viernes 01 de Julio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo Herramienta menor

Actividades: Se continúan las reparaciones en concreto sobre las

acomodadas de acueducto faltantes y el arreglo de rejilla
para sumidero lineal.

37



Sábado 02 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo Herramienta menor.

Actividades: Se continúan las reparaciones en concreto sobre las acomodadas de acueducto faltantes.

Observación: Se realiza abertura vehicular luego del medio día.



Lunes, 04 de Julio de 2022.

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo Herramienta menor.

Actividades: Se inicia nuevamente la reparación de cunetas en concreto y colocación de sumidero transversal en dirección al sector La

Roja, Barrio: San Isidro.



Martes 05 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continuo la reparacion de andenes en concreto y colmatacion de sumidero transversal en direccion al sector La Feja, Barrio: San Isidro. 38



Mercedes 06 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipos Herramienta menor.

Actividades: Se continuo la reparacion de andenes en concreto y colmatacion de sumidero transversal en direccion al sector La Feja, Barrio: San Isidro.

Observación 1: se realiza visita de obra entre las partes, supervisada y contratista, como revisión de los ajustes realizados, acabado final y solicitar la continuidad de estos para proceder con el resto final de acuerdo con la entrega a Satisfacción.

Observación 2: se analizó la intencionalidad solicitada en el empalme del tramo 2 con tramo 3, ... busco de la mejor alternativa de solución y el posible recurso presupuestal requerido para ejecutarse.



Junos 07 de Julio de 2022.

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipos Herramienta menor.

Actividades. Se continuo la reparacion de ordenes en concreto. 39
y colmatacion de sumidero transversal en direccion al sector La
Laja, Barrio San Esteban.



Vienes 08 de Julio de 2022

Contratos 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Au fijo, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo Herramienta menor.

Actividades. Se continua la reparacion de ordenes en concreto y colmata-
cion de sumidero transversal en direccion al sector La Laja, Barrio San

Isidro, se inicio reparacion de la rejilla para sumidero lineal.

Observacion 1: Se realiza visita de supervision y administracion municipal

Con equipo tecnico de Empaceladas, lo cual determina la toma de
muestras en dos viviendas y la deteccion con geofono en la
superficie de la carpeta asfaltica por la presencia de humedad
superficial.

Observacion 2: Se analiza las propuestas del contratista de la
intervencion solicitada del empalme del tramo 2 y tramo 3,
para determinar el material de pavimentacion y area, por lo tanto
se le pide al contratista modificar el area y proponer otra
alternativa de material como pavimentacion.



Lunes 11 de Julio de 2022

Contratos 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Ayo Siso, Maestro de obra, Ayudante 40

Equipo: Herramientas menores.

Actividades Se continua la reparación de andenes en concreto, la colocación de sumidero transversal en dirección al Sector Los Rijos, Barrio San Isidro y la reparación de la rejilla para sumidero lineal.



Martes 12 de Julio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Ayo Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo: Herramientas menores.

Actividades Se continua la reparación de andenes en concreto, la colocación de sumidero transversal en dirección al sector Los Rijos, Barrio San Isidro y la reparación de la rejilla para sumidero lineal.

Observación: Por parte de la supervisión se emite el concepto de la humedad superficial en la carpeta esfáltica, lo cual determina que no existen pérdidas de presión o alguna fuga en el empote de los accesorios en las acanetadas, pero recomienda destapar, y revisar la humedad que se concentra en esta zona.



Miércoles 13 de Julio de 2022

Contrato 101 de 2022

Reporte del clima: Lluvioso

Personal de obra: Residente de obra, Ayo Siso, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo: Herramientas menores.

Actividades: Se realiza elaboración de $0,50 \times 0,50$ m. de la carpeta.

asfáltica en la zona donde se presenta la humedad superficial, como verificación de lo que está presentando, de esta manera también se realiza la excavación del material compactado hasta llegar a la profundidad de la tubería principal de acueducto.

41



Jueves 14 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa la excavación del material compactado hasta llegar a la profundidad de la tubería principal de acueducto, se agranda la demolición de la carpeta asfáltica hasta el empalme con muro de contención.

Observación: Al realizarse la revisión de la tubería y material compactado en la zona específica, no se evidencia alguna fuga o desempalme de tubería con accesorios y el material no presentaba humedad, la humedad superficial que existía provenía del empalme en la MOC-19 y el muro de contención, por ende, se realiza la demolición de la carpeta asfáltica hasta el muro de contención.



Viernes 15 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante

Equipo: Herramienta menor.

Actividades. Se realiza excavación de material compactado, se comienza **42**

a realizar acopio y compactación de material mediante capas entre cemento, suelo de subbase y base granular hasta llegar al nivel requerido para dejar un concreto rígido de 15 cm. de espesor como reemplazo de la MOC-19.

Observación: Como mejoramiento de humedad y empalme de carpeta asfáltica con muro de contención, se realizó un concreto rígido para el recuadro que se eliminó de MOC-19, adicionalmente una intersección por capas entre cemento y material de subbase y base granular al momento de rellenarse.



Lunes 18 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del abono Sobrado

Personal en obra: Residente de obra, Ar 510, Maestro de obra, Ayudante.

Equipo Herramienta menor.

Actividades: se realiza lechada de emulsión asfáltica con arena para lograr un mejor sellado de la MOC-19 aplicado el pasado 22 de Junio de 2022, se funde el concreto rígido para empalme con muro de contención.

Observación: Se cumple con la requerida por las partes, supervisión y administración municipal referente a las anomalías del proyecto para entrega a satisfacción.



Martes 19 de Julio de 2022.

Contrato: 101 de 2022.

Reporte del clima: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante

Equipos: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza limpieza y aseo al sitio de obra.



Jueves 21 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Aux Siso, Maestro de obra, Ayudante

Equipos: Herramienta menor.

Actividades: Se efectuó un arreglo pendiente, con respecto al mango de aguas lluvias, en el orden de una vivienda, la intervención se realizó mediante un sifón conectado a la caja de inspección.

Observación: Se define entre las partes, la realización de la intervención requerida en el empalme del tramo 2 y tramo 3, lo cual se impone como definitiva no efectuarse y recibir a satisfacción el proyecto realizado, de modo que se pueda proceder con el recibo final.



Martes 26 de Julio de 2022

Contrato: 101 de 2022

Reporte del clima: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra

Observación: Se realizó visita entre las partes, supervisión, administración municipal y contratista, al sitio de obra, se corroboraron las situaciones presentadas por el contratista en el empalme del tramo 2 y tramo 3, los cuales son verídicos, pero se le condiciona realizar la devolución

de dinero de las actividades que no ejecuto.

44



Miércoles 27 de Julio de 2022.

Contrato 101 de 2022.

Reporte del clima: Lluvioso.

Personal en obra: Director de obra, feriante de obra.

Observación: se realiza entrega a satisfacción del contrato 101 de 2022.



RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S (ANSERMA)
 NIT. 900.945.440-8
 NOMINA DEL 01-30 JUNIO DE 2022

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA			MONEDA			DEVENGADO				DEDUCIDO			TOTAL A PAGAR	FIRMA		
			D	M	A	IR	IR	IRL	SUELDO BASICO	DIAS	SUELDO	INCAPACIDAD	AUX TRANSP	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%			PENSION 4%	TOTAL DEDUCIDO
1	SILVER ANTONIO BLAZ GARCIA	6.357.816	14	2	22				1.000.000	30	1.000.000	0	117.172	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.172	<i>Dilger Aniza</i>
2	JOVANNY MARILLO AVEHONADO	14.191.989	3	6	22	X			1.000.000	3	100.000	0	11.717	111.717	4.000	4.000	8.000	103.717	<i>Jovanny Mer 110</i>
TOTALES																			
									2.000.000	33	1.100.000	0	128.889	1.228.889	44.000	44.000	88.000	1.140.889	

TOTAL DEVENGADO	1.228.889
TOTAL DEDUCIDO	88.000
NETO PAGADO	1.140.889

ELABORADO: DIEGO VELASCO

REVISADO: _____

APROBADO: _____

OBSERVACIONES

DR

RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S (ANSERMA)
 NIT. 900.945.440-8
 NOMINA DEL 01-30 JULIO DE 2022

No	NOMBRE	CEDULA	FECHA			NOVEDADES			SUeldo BASICO	DIAS	DEVENGADO			DEDUCIDO			TOTAL A PAGAR	FIRMA
			D	M	A	I	R	IEG			IRL	SUELDO	INCAPACIDAD	ALUX TRANSP	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%		
1	DILVER ANTONIO RUIZ GARCIA	6.357.876	14	2	22				14	1.000.000	0	54.680	521.347	18.667	18.667	37.333	484.014	<i>[Firma]</i>
	AYUDANTE DE OBRA					X				1.000.000	0	54.680	521.347	18.667	18.667	37.333	484.014	
TOTALES																		

ax

TOTAL DEVENGADO	521.347
TOTAL DEDUCIDO	37.333
NETO PAGADO	484.014

ELABORADO: DIEGO VELASCO
 REVISADO: _____
 APROBADO: _____

OBSERVACIONES



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	3	Fecha del informe	27/07/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	101 DE 2022
Objeto:	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS
Nombre Contratista:	RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
Fecha del contrato:	28/01/2022
Plazo de ejecución:	60 DÍAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$99.501.704,00
Valor ejecutado:	\$99.412.682,00
Saldo:	\$89.022,00
Fecha de iniciación:	04/04/2022
Fecha de suspensión 1:	29/04/2022
Fecha de reiniciación 1:	08/06/2021
Fecha de terminación inicial:	04/04/2022
Nueva fecha de terminación:	29/07/2022
Prórroga (en tiempo):	75 DÍAS CALENDARIO
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del período anterior	80,00%
Avance físico del período actual	19,91%
Avance físico Acumulado	99,91%
Saldo porcentual	0,09%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

Actividades de estructura de alcantarillado

- Instalación de rejilla para sumidero lineal.
- Instalación de tapas en hierro fundido con D=0,60m.
- Reparaciones requeridas en la rejilla del sumidero lineal.

Actividades de llenos

- Instalación de cama y atraque en arena para red de acueducto.

- Lleno con material de obra en tubería de acueducto.
- Lleno con material de cantera préstamo.

Actividades de excavación

- Excavación de obra bajo especificaciones técnicas.
- Excavación para red principal y domiciliarias de acueducto.
- Excavación para las demás actividades requeridas que no se tenían previstas en las instalaciones de tubería de alcantarillado y acueducto, pero están reflejados en las viviendas.
- Retiro de todo de material.

Actividades de estructura de acueducto

- Instalación de tubería PVC 2".
- Instalación de tubería para acometidas, adicionalmente se adiciona otra domiciliaria para los lotes no intervenidos, requerido por el dueño hasta mediados de Junio que se hace presenta, luego de haberse comunicado desde el inicio del proyecto.
- Conexión de acometidas hasta medidor.
- Instalación de Tee de reducción de 2" a 1/2" para las domiciliarias.
- Realización de prueba de hermeticidad sobre la tubería de acueducto instalada, duración: 2 días.
- Empalmes de tubería instalada a red de suministro, sobre la calle 25 y 25A.
- Llenos de material de cantera de préstamos para la red de suministro, adicionalmente con protección y cama en arena.

Actividades de demoliciones

- Demolición de estructuras en concreto hidráulico de andenes y demás que no se relacionaron en las instalaciones de tubería de alcantarillado y acueducto, pero están reflejados en las viviendas.
- Demolición de estructuras en concreto hidráulico para muro de contención.
- Demolición de sumidero lineal antiguo.

Actividades de llenos

- Instalación de material subbase granular para mejoramiento de terreno, de acuerdo con el estudio de suelos realizado en la zona.
- Rellenos del tercer tramo de acuerdo con la dimensión del pavimento flexible para subbase y base granular.

Actividades de instalación de subbase y base granular

- Instalación de material subbase granular para mejoramiento de terreno, longitud: 39 m.

- Rellenos del tercer tramo entre abscisas K0+000 a K0+051 de acuerdo con la dimensión del pavimento flexible, 0,27 m para subbase y 0,20 m para base granular.

Actividades de acero

- Figuración de acero para sumidero lineal y losas de los pozos sépticos intervenidos.

Actividades de instalación de plástico negro

- Suministro de plástico negro para cubrir base granular compactada y predios no intervenidos.

Actividades de concreto

- Bordillo en concreto de 21 MPa, altura: 50 cm.
- Concreto de 21 MPa para sumidero lineal y losas de los pozos sépticos intervenidos al 50%.
- Reposición de concreto de 21 MPa en andenes, domiciliarias y entradas a vivienda.

Actividades de concreto asfáltico MDC-19

- Instalación de concreto asfáltico MDC-19 en el tramo 3 con espesor de 7cm.

Actividades de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

- Aplicación de imprimación con emulsión asfáltica sin material.

Acompañamiento social, seguridad y salud en el trabajo

- Para la correcta ejecución del proyecto se solicitó el cumplimiento total de los protocolos de bioseguridad con personal de seguridad y salud en el trabajo.
- Durante las actividades ejecutadas estuvo presente la profesional social de la obra.
- Durante la ejecución del proyecto se realizó el acompañamiento de la profesional SISO y la auxiliar SISO.

Elementos de protección para personal en obra

- Para la correcta ejecución del proyecto se solicitó el cumplimiento total de los protocolos de bioseguridad con personal de seguridad y salud en el trabajo.

1.3. Avance en tiempo

Píazo de ejecución:	135
Tiempo total transcurrido:	133
Avance Porcentual:	99,91%
Saldo porcentual	0,09%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Las pérdidas de material fueron representativas a pesar de que se protegían con plástico, y en favor al terreno escarpado de la zona, la cantidad de agua era tan grande que alcanzaba a alterar la humedad natural del suelo compactado. Nivel: Base granular.



Retiro de todo tipo de material en vehículo automotor, gran cantidad significativa era de tipo subbase y base granular que se sustituyó por incremento de humedad natural.



Deterioro de tapa en concreto de pozo séptico ubicado en la Calle 25A, Barrio: San Isidro, el cual se reemplazará por el contratista por tapa con aro en hierro fundido.





El contratista realiza la recolección de aguas lluvias constantes mediante tubería de 6", suministrada por Empocaldas, en la calle 26 proveniente de una vivienda, requiriendo una intervención provisional hasta el sumidero.



Protección de talud con plástico negro en predios no intervenidos sobre la Carrera 2E y de igual modo la protección de la subbase y base granular instalada como pavimento.





Acorde con la humedad natural del suelo compactado a nivel de base granular y próximo tramo a pavimentarse, se evidencia como el material no logra una compactación buena, en este caso a favor de la pendiente del terreno escarpado permite un mayor flujo de agua y por consiguiente, puede compactarse de manera eficiente al paso de un tiempo.



Para verificar la instalación correcta en la tubería de acueducto se solicita al contratista la realización de prueba de hermeticidad. Bajo supervisión del equipo técnico de Empocaldas durante la ejecución, el tramo de tubería presentó varias inconsistencias, durante el primer día se realizaron 04 intentos que siempre arrojaron pérdida de presión. Al día siguiente se divide en dos partes el

tramo y se logra la efectividad primero en la parte inferior, y luego de algunos ajustes sobre la parte superior, obteniéndose como resultante una eficiente instalación de tubería.



De ese modo procede con su solicitud ante Empocaldas para realizar corte de agua en la zona y empalmar la tubería existente con la nueva, además de la conexión de las acometidas a los medidores.



Como intervención provisional para el manejo de aguas lluvias, el contratista realiza un sumidero con rejilla y se controla el flujo de agua constante con tubería de 6" dada por Empocaldas para conectar hasta el sumidero.



Se realiza ensayo de suelos a nivel de subbase y base granular, lo cual determinan humedad natural del suelo compactado, densidad seca máxima y grado de compactación, de acuerdo con las especificaciones técnicas.



A solicitud del dueño se realiza la domiciliaria 9 de acueducto en el tramo para los predios no intervenidos, el cual resultó imposible contactarse y se hace presente hasta el 17 de junio de 2022.



Por parte del contratista se reporta daño al final del tramo 3 en la tubería de acueducto, estando equipo técnico de Empocaldas presente. El daño fue reportado el día de la realización de la prueba hidráulica.



Previamente al día de pavimentarse, se realiza visita al lugar de obra con equipo técnico de Empocaldas para atender el daño y tomar decisiones en el asunto, lo cual se le pide al contratista que sea atendido por él, razón por el cual se negó, entonces se llegó a un acuerdo de intervención ya que la red de suministro es municipal y el contratista no afectó la tubería. La decisión tomada dejó sin suministro a las viviendas en la calle 26 con carrera 1A del barrio San Isidro.



Se realiza la imprimación con emulsión asfáltica sin material, la cual preparará la base granular con mejor adherencia cuando se aplique la capa de asfalto o capa de rodadura.





Pavimentación del tramo 3, con mezcla densa en caliente – 19 y espesor de 7 cm de acuerdo con el diseño del pavimento flexible.



Atención del daño reportado por el contratista por equipo técnico de Empocaldas , intervención: día de la pavimentación del tramo 3.



Durante la pavimentación del tramo 3, el equipo técnico de Empocaldas realizó cuatro (04) intervenciones al daño reportado, y en la penúltima afecta el nivel de base granular minutos antes de pavimentar, esto presento pérdidas de material y tiempo, la intervención debía terminarse para culminar la pavimentación.



Finalmente al daño de la tubería municipal se le realiza un atraque en concreto y acero por parte del equipo técnico de Empocaldas, subsanando el daño existente.



Se realiza la instalación de rejilla en sumidero lineal, con calibre de 7/8" y espaciado de 3 cm.





Se deja el registro fotográfico de la reparación de andenes y acometidas de acueducto, las cuales se intervinieron en la ejecución del proyecto.





Se realiza la intervención de las losas en concreto con sus tapas y aro en hierro fundido respectivamente instaladas, además del acero de refuerzo de acuerdo con las especificaciones técnicas.



Acorde a la presencia de esta humedad superficial en la carpeta asfáltica, con ayuda del equipo técnico de Empocaldas se realiza la toma de presiones en las dos viviendas y la detección con geófono desde la superficie. Lo cual determina que no existen pérdidas de presión o alguna posible fuga en el empate de los accesorios sobre las acometidas. Por ende, se le sugiere al contratista intervenir la zona puntual como verificación de lo que se está ocasionando.



La humedad superficial que existía provenía del empalme entre la MDC-19 y el muro de contención, de modo tal que para mejorar ese empalme el contratista lo reemplaza por un concreto rígido para el recuadro que se demolió.



En solicitud para la obtención de un mejor sellado de la MDC-19 el contratista realiza una lechada de emulsión asfáltica, aplicada el pasado 18 de julio de 2022. Posterior a ello se realiza retiro del material por acción de la comunidad del sector al presentarse la caída de una persona mayor con la presencia de un menor de edad en sus brazos, lo cual lamentamos esta situación, pero evita el sellado de la mezcla asfáltica.



Se anexa la evidencia del día que sucede el retiro del material por acción de la comunidad, el cual se efectuó el 18 de julio de 2022. Como recibo final de la obra se requirió hacer la devolución de dinero respectiva a la instalación de la tapa con aro en hierro fundido del cuarto pozo que se preveía intervenir. Adjunto al informe del supervisor se evidencia el acta de mayores y menores cantidades haciendo relación de ello y de las actividades de obra ejecutadas en definitiva.



De acuerdo con las partes se recibe lo ejecutado y se da la terminación del tramo 3 con el contrato 101 de 2022, de Red de Ingeniería, Maquinaria y Construcción como contratista.

1.4. Problemáticas con la obra:

El cerramiento provisional de la obra fue imposible controlarse por parte del contratista, la comunidad no permitió, accedió sin permiso e irrumpe constantemente por los andenes, ya sea de manera peatonal o en motocicleta.

Se reportaron tres (03) daños en la tubería de acueducto existente, mediante las actividades realizadas por el contratista durante la ejecución del proyecto se responsabilizó de dos (02), ya que el último daño reportado no se realizó por alguna actividad o labor. El último daño fue intervenido por el personal técnico de Empocaldas el día de la pavimentación del tramo 3 y este mismo presentó gran problemática en su reparación, pero se logró culminar de manera adecuada sin retrasar el tiempo de ejecución del contratista.

Posterior a la pavimentación se le solicita al contratista la realización de algunos arreglos y detalles que permiten obtener una mejor visual del objeto contractual que se cumple y se realiza entrega.

Respecto a la instalación de una tapa con aro en hierro fundido, actividad la cual que no se ejecutó, se puede aclarar que el contratista a solicitud de la interventoría no ejecutó la actividad, puesto que implicaba un detrimento al patrimonio teniendo en cuenta que el pozo ubicado en la cota k0+280 en la esquina denominada la reja, donde se unen las redes de 20 pulgadas que vienen del tramo 1-2 y se unen con la red de 12 pulgadas del tramo 3, requieren una intervención posterior, ya que el diámetro de la tubería es insuficiente y la tubería debe ser repuesta próximamente, por lo cual, esta cámara de inspección no fue demolida y adicionalmente la losa y el aro tapa no fueron instalados; los recursos que estaban destinados para ello se usaron en la construcción de un sumidero en la esquina de la carrera 2E con calle 25A teniendo en cuenta que las aguas lluvias de esta área aferente debían ser encauzadas directamente al sumidero transversal de la reja para evitar el

deterioro de la capa asfáltica objeto de la recuperación de la malla vial. Dado lo anterior el cierre de los recursos del proyecto fue hasta una inversión porcentual del 99,91%.



1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$99.501.704,00
Inversión ejecutada en el período anterior:	\$79.601.363,00
Inversión ejecutada en el período actual:	\$19.811.319,00
Porcentaje ejecutado en el período anterior:	80,00%
Porcentaje ejecutado en el período actual:	19,91%
Inversión total ejecutada:	\$99.412.682,00
Saldo	\$89.022,00
Porcentaje total ejecutado:	99,91%
Porcentaje total en saldo:	0,09%

Adicionalmente el contratista de obra, realizó un acta de mayores y menores cantidades donde se evidencia lo ejecutado y el saldo de devolución, con fecha del 26 de julio de 2022 como balance presupuestal de acuerdo con los imprevistos durante la ejecución de las actividades de obra, de modo que éstas mayores o menores cantidades no afectarán el valor contractual, y se refleje el dinero en saldo referente a lo mencionado anteriormente, de modo tal que se justificará y soportará cada una de las actividades modificadas. Las memorias y soportes que se muestran de manera explícita a lo que se hace mención se encuentra inmerso en el informe presentado por el contratista.

Adjunto acta de mayores y menores cantidades firmado por las partes.

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.: 101 DE 2022	ACTA No.: ACTA DE MAYORES Y MENORES 1	Fecha de corte: 29 DE JULIO DE 2022
OBJETO CONTRATO: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACION DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 28A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS	FECHA INICIACION: 04 DE FEBRERO DE 2022	Fecha de vencimiento: 29 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA:	PROPRIO: PRORROGA 1 (30) DIAS CALENDARIO Y PRORROGA 2 (45) DIAS CALENDARIO	Valor Adicion
DESCRIPCION	% DE OBRAS	FECHA: 26/07/2022
ITEM	VR. UNITARIO	VALOR FINAL
UNID	VR. TOTAL	VR. PARCIAL
CANTIDAD	MAYOR CANTIDAD	MEJOR CANTIDAD
CONTRIBUCIONAL	CONTRIBUCIONAL	CONTRIBUCIONAL

OBJET: OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALcantarillado EN EL SECTOR DEL ANILLO VIAL DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBRAS	MAYOR CANTIDAD	MEJOR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR FINAL
1	PRELIMINARES									
1.1	Instalación y medición (trapeados, revoque, eliers) se cancela una vez se haga entrega del plano Nacional con revisiones topograficas donde esten ausar todas las dimensiones de acuerdo y de conformidad	m ²	51,00	\$ 6.796,11	\$ 327.302,00	0,32%	0	\$	51,00	\$ 31.107,00
1.2	Convenio con Ica verse el supuesto de gancha cada 2 metros.	m ²	51,00	\$ 14.762,92	\$ 752.009,00	0,74%	0	\$	51,00	\$ 752.909,00
1.3	Segur. profesional y responsabilidad	m ²	3,00	\$ 168.533,34	\$ 505.600,00	0,17%	0	\$	3,00	\$ 505.600,00
1.4	Insurción de vida institucional Ica	m ²	3,00	\$ 853.151,37	\$ 2.559.454,11	0,88%	0	\$	3,00	\$ 2.559.454,11
2	ACTIVIDADES									
2.1	Despliegue de estructura de en concreto hidráulico incluye anillos, bocanillos, granelos y cisternas	m ³	36,20	\$ 90.342,31	\$ 3.272.401,78	0,51%	0,20	\$ 18.167,16	36,20	\$ 3.290.568,94
3	DESCARGOS									
3.1	En 1/20 de concreto de 4 a 2m	m ³	36,30	\$ 24.792,33	\$ 899.941,67	3,00%	24,18	\$ 597.862,00	36,30	\$ 899.941,67
3.2	En 1/20 de concreto de 3,1 a 2m	m ³	27,00	\$ 29.543,26	\$ 797.668,17	0,80%	0	\$	27,00	\$ 797.668,17
3.3	En 1/20 de concreto de 0 a 2 m	m ³	3,00	\$ 31.482,96	\$ 94.448,00	0,03%	0	\$	3,00	\$ 94.448,00
3.4	En 1/20 de concreto de 0 a 2 m	m ³	26,00	\$ 26.637,29	\$ 692.771,64	0,54%	0	\$	26,00	\$ 692.771,64
3.5	En 1/20 de concreto de 0 a 2 m	m ³	55,31	\$ 37.634,60	\$ 2.083.344,00	2,09%	39,20	\$ 1.691.149,00	55,31	\$ 2.083.344,00
4	ESTRUCTURAS ALcantarillado									
4.1	Perforación a tubería PVC con grava de 12" incluye insurción desde la planta al 50% de instalación	m ⁴	31,00	\$ 25.788,56	\$ 799.347,36	1,87%	17,20	\$ 438.142,00	31,00	\$ 799.347,36
5	TIENDAS									
5.1	Arera para bota y arroyar	m ²	4,59	\$ 130.856,15	\$ 600.812,03	0,60%	1,56	\$ 204.131,00	4,59	\$ 600.812,03
5.2	Arera con tapa con material de obra	m ²	22,05	\$ 24.028,52	\$ 530.417,00	1,75%	3,07	\$ 73.680,00	22,05	\$ 530.417,00
5.3	Arera con material de obra	m ²	11,05	\$ 27.302,26	\$ 301.557,00	1,16%	0	\$	11,05	\$ 301.557,00
6	TUBERIAS									
6.1	Arera para bota y arroyar	m ²	3,00	\$ 3.421.581,25	\$ 1.026.554,38	7,48%	0,09	\$	3,00	\$ 1.026.554,38
6.2	Arera para bota y arroyar	m ²	3,00	\$ 6.821.345,18	\$ 20.464.035,74	4,86%	0,58	\$ 2.415.070,00	3,00	\$ 20.464.035,74

1/3 De 1000 (continúa)

980

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.: 101 DE 2022		ACTA No.: ACTA DE MAYORES Y MENORES 1		Fecha de corte: 20 DE JULIO DE 2022	
OBJETO CONTRATO: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACION DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA, CALDAS		FECHA INICIACION: 04 DE FEBRERO DE 2022		Valor Adición	
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:		FECHA: 26/07/2022	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	VR UNITARIO	VIL TOTAL	% DE OBRA
8.3	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica para la prestación del contrato por COVID-19 (Servicio de conexión, instalación, transporte, armado y box que incluye la certificación), item cancelado como factura al contratista de obra	cl	\$ 776.000,00	\$ -	0,00%
8.4	Suministro de productos para la atención al contagio por COVID-19 (hidroal, gel a base de alcohol, alcohol, toallas, jabón líquido) Solo aplicar para eludimiento, útiles y resaca de obra que se encuentren en la obra y acorde al volumen 350 toneladas y botarras	(4*trabajo) adic	\$ 4.577,00	\$ 1.855.324,00	3,26%

OBRA2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DEL ANILLO VIAL DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS					
			MAYOR CANTIDAD	MEJOR CANTIDAD	VALOR FINAL
3	EGRAVACION				
3.1	En material común de 8 a 2m	m ³	\$ 28.434,71	\$ 1.415,00	\$ 23.489,00
3.2	Pipera de material ordinaria en vitelco asfáltico	m ³	\$ 35.635,09	\$ 280.022,00	\$ 426.810,20
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
4.2	Instalación de tubería PVC de 2". Incluye transporte a sitio y labor de instalación	m	\$ 4.160,78	\$ 593.443,00	\$ 388.796,20
5	UBRADO				
5.2	Ubrado con material de obra	m ²	\$ 24.887,17	\$ 71.380,00	\$ 242.210,00
5.3	Ubrado con material ordinario de pavimento	m ²	\$ 37.332,35	\$ 210.324,00	\$ 324.443,00

OBRA3: OBRAS DE RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS					
2	RECONSTRUCCIONES				
2.1	Demolición de estructura en concreto hidráulico incluye bases, patas, zapatas, patentes y labrado	m ³	\$ 13.111,70	\$ 485.145,00	\$ 47,14
3	EGRAVACION				
3.1	En material común de 0 a 2m	m ³	\$ 34.100,13	\$ 2.530.557,00	\$ 93,60
3.2	En material común de 0 a 2m	m ³	\$ 31.688,81	\$ 1.318.254,00	\$ 38,76
3.3	En material ordinaria en vitelco asfáltico, incluye transporte a sitio y labor de instalación de tubería de 2"	m ³	\$ 38.200,28	\$ 8.646.181,00	\$ 154,55
4	ALLENOS				
4.1	Suministro transporte e instalación de tubos para tuberías de 150mm. Incluye ensayos de laboratorio para ensayo de 0,15m	m ³	\$ 68,85	\$ 31.659.871,00	\$ 1,87
4.2	Suministro transporte e instalación de Bases primarias tipo 100mm. Incluye ensayos de laboratorio para ensayo de 0,15m	m ³	\$ 183.003,74	\$ 9.533.151,00	\$ 2,78
5	CONCRETOS				
5.4	Suministro transporte e instalación de concreto estructural tipo C30. Incluye ensayos de laboratorio	m ³	\$ 1.113.095,12	\$ 20.960.944,00	\$ 6,17

Date

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:		ACTA DE MAYORES Y MENORES 1		Fecha de corte						
OBJETO CONTRATO:		FECHA INICIACIÓN:		Fecha Vencimiento						
CONTRATISTA:		PRORROGA:		Valor Adición						
		CONTRATISTA:		FECHA: 26/07/2022						
		CONTRATISTA:		VALOR FINAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBRA	MAYOR CANTIDAD	MEJOR CANTIDAD	CANTIDAD	VR. PARCIAL
5.5	Servicio transporte e instalación de riesgo de impermeabilización de obra C31-3	m2	295,00	\$ 4.010,88	\$ 1.203.007,00	1,03%	\$ 800.300,00	\$ 73,05	\$ 213.049,00	\$ 891.749,00
5.6	Zona en concreto reforzado 1.60 x 1.60 x 0.2 m (bacheo) sacos de refuerzo (lejos de agua)	M3	3,00	\$ 778.599,42	\$ 2.335.798,26	0,78%	\$ 203.493,00	\$ 1,24	\$ 1.843.003,00	\$
5.7	Barrido de Concreto de 20kg de arena/metro cúbico 25 cm ancho 15 (m cubierto 21 Mts - No incluye mano de obra)	m3	94,28	\$ 117.676,81	\$ 11.066.938,00	11,12%	\$ 1.352.709,00	\$ 0	\$ 105,50	\$ 37.403.650,00
5.8	M3 de concreto de 25 cm de espesor concreto 2000 psi	m3	0,00	\$ 315.448,36	\$ 0,00	2,00%	\$ 3.234.665,00	\$ 0	\$ 31,80	\$ 4.528.533,00
5.9	Concreto de 1.000 psi para vigas de cimentación	m3	0,00	\$ 178.341,07	\$ 0,00	1,03%	\$ 1.233.577,00	\$ 0	\$ 27,56	\$ 2.797.405,00
5.10	Servicio de instalación de plomería (agua)	M2	333,00	\$ 7.352,04	\$ 2.448.329,32	1,27%	\$ 1.270.862,00	\$ 0	\$ 355,33	\$ 2.028.734,00
5.11	Concreto 2000 psi Mano de obra (lejos de obra)	m3	2,72	\$ 3.681.875,44	\$ 10.013.561,44	2,96%	\$ 3.287.363,00	\$ 0	\$ 6,23	\$ 6.740.084,00
COSTO TOTAL				\$ 99.501.704,00		100%	\$ 22.461.821,00	\$ 22.550.343,00	\$	\$ 99.412.682,00

COSTO DIRECTO	\$ 73.732.270,18	22,68%	\$ 16.643.957,76	\$ 36.709.929,42	\$ 73.666.307,52
ADMINISTRACIÓN	\$ 10.645.036,77		\$ 4.680.308,17	\$ 4.678.778,84	\$ 20.626.566,13
IMPREVISTOS	\$ 737.372,74		\$ 166.439,58	\$ 167.099,24	\$ 756.653,08
UTILIDADES	\$ 3.686.613,71		\$ 832.197,89	\$ 835.499,22	\$ 3.683.315,38
SUMA ANTES DE IVA	\$ 88.801.347,40		\$ 22.962.903,41	\$ 22.391.258,72	\$ 98.712.852,09
IVA SOBRE UTILIDADES	\$ 700.456,60		\$ 138.137,60	\$ 138.744,28	\$ 699.429,92
TOTAL	\$ 99.501.704,00		\$ 22.461.021,01	\$ 22.550.043,00	\$ 99.412.682,00

SALDO \$ 60.022,00

[Firma]
RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO
EL RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN
CONTRATISTA

[Firma]
JOHANN MANUEL SANCHEZ RAMIREZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Es importante aclarar que algunas actividades con mayor cantidad se relacionan con la inestabilidad del terreno desde el sector La Reja hasta la Calle 25, del Barrio: San Isidro, del cual se realizaron Micropilotes más profundos con tal de cumplir con la estabilización requerida por el estudio de suelos contratado para la estructura de pavimento y la red de acueducto y alcantarillado instalada.

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR ASEGURADO
Cumplimiento	Aseguradora solidaria de Colombia	730-47-994000 014990	04/02/2022	29/10/2022	\$29.850.511,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind. estabilidad y calidad de la obra	Aseguradora solidaria de Colombia	730-47-994000 014990	04/02/2022	29/07/2025	\$19.900.340,80
Estabilidad y calidad de la obra	Aseguradora solidaria de Colombia	730-47-994000 014990	28/07/2022	28/07/2027	\$19.900.340,80
Responsabilidad civil	Aseguradora solidaria de Colombia	730-74- 994000003066	04/02/2021	29/10/2022	\$29.850.511,00

3. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

ANEXO 1

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS EPP
09/02/2022	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
05/04/2022	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
20/06/2021	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
CONVENCIONES: A: adecuada D: deficiente N/U: No usan N/A: no aplica								

5. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

5.1. EMPLEOS GENERADOS

PERSONAL CONTRATISTA DE CONTRUCCIÓN		LOCAL	EXTERNA	SUBTOTAL
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	INDÍGENAS	0	0	0
	NEGRITUDES	0	0	0
	MADRES CABEZA DE FAMILIA	0	0	0
	PERSONAL CON LIMITACIONES FÍSICAS	0	0	0
MANO DE OBRA CALIFICADA	INDÍGENAS	0	0	0
	NEGRITUDES	0	0	0
	MADRES CABEZA DE FAMILIA	0	0	0
	PERSONAL CON LIMITACIONES FÍSICAS	0	0	0
TOTALES				0

6. ACTA Y MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ANEXO 2

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno	X	
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación	X	
Bitácora de la obra	X	



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Actualización de póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación	X	
Paz y salvo de trabajo	X	
Paz y salvo de contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo de la obra	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique que suscriptor el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	
Memorias de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Nombre supervisor



Firma del Supervisor

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 01

CONTRATO	101 DE 2022
CONTRATISTA	RED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
OBJETO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
MUNICIPIO	ANSERMA – CALDAS

En la ciudad de Manizales, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2022, se reunieron **JOHANN MANUEL SABOGAL R.** Ingeniero de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO**, Representante legal de RED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Contratista, con el fin de convenir la suspensión 01 del contrato 101 de 2022, que tiene por objeto: "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El contratista de obra, solicita la suspensión del contrato, dado a que como cumplimiento de los compromisos establecidos con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. entidad contratante y Alcaldía del Municipio de Anserma entidad cofinanciante del proyecto a través del Convenio interadministrativo 277 de 2021, se presentaron altas lluvias provenientes de las jornadas invernales durante este período impidiendo el avance en obra en las actividades de excavación de material común, instalación de la tubería de acueducto y consolidación del pavimento, razón por lo cual mediante solicitud de Supervisión, Contratista y Municipio se suspenda las actividades de obra.
- Adicionalmente, la tubería de 2" escaseo, por lo cual, debió solicitarse que se cambiará por tubería de 1 1/2" que si tenía EMPOCALDAS S.A. E.S.P. generando un retraso en la entrega que afectó el cronograma de las actividades de obra.
- También el material de cantera ha tenido dificultades en su entrega por las lluvias presentadas constantemente impidiendo el cargue y transporte al lugar de obra, ya que el material pierde su condición requerida para instalación por el aumento de humedad natural, de ese modo existe negación de los transportadores ya que en su entrega se rechaza.

Por lo anterior las partes han decidido realizar la suspensión 01 de las obras del contrato 101 de 2022, por cuarenta y un (41) días calendario a partir de la fecha hasta tanto la solicitud de la administración municipal sea cumplida y se logre continuar la ejecución de actividades.



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

JOHANN MANUEL SABOGAL R.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ingeniero Zona

RAFAEL DELGADO MORENO
RED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
Representante Legal
Contratista

ACTA DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO: 101 DE 2022
CONTRATISTA: RED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
OBJETO: "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"
FECHA DE REINICIO 08 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACION 14 de junio de 2022

En el Municipio de Anserma - Caldas el ocho (08) de junio de 2022 se reunieron por una parte, el Ingeniero **JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ** Ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P Y **EDGAR RAFAEL DELGADO MORENO**, Representante legal de RED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, contratista, con el fin de convenir el reinicio del contrato 101 de 2022 que tiene por objeto: "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS". Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el día 29 de abril de 2022 se firmó acta de suspensión del contrato 101 de 2022 ya que para cumplir el objeto contractual del mismo se planteó una solicitud de adición en tiempo al contrato y en ese momento se encontraba en trámite.
- El 29 de abril se realizó esta modificación al contrato con una prórroga de 45 días, por lo cual se procede a dar reinicio el 08 de junio de 2022.

En virtud de lo anterior las partes han decidido reiniciar la obra del contrato 101/2022, teniendo en cuenta que ya se han solucionado y superado las causales que justificaban la suspensión del contrato.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron.



JOHANN MANUEL SABOGAL R.
Ingeniero zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



RAFAEL DELGADO MORENO
RL RED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
Contratista

GOTRANSVIAL S.A.S.
Nít. 900376530-0
Calle 423 # 19a - 47 Alcazaras
Manizales (Caldas)



ENSAYO DE HUMEDAD INVE - 122 - 13

OBRA:	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
LOCALIZACIÓN:	CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A, ANSERMA (CALDAS)
DIRIGIDO A:	RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN
FECHA:	9/06/2022

Densidad	Localización	W Cáp.	W Cáp. + MH	W Cáp. + MS	HUMEDAD
1		81.21	551.5	531.2	4.5
2		79.36	489.1	467.7	5.5

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO
MP. 01111-10567 CPITY

PR

GEOTRANSVIAL S.A.S.
 Nit. 900376530-0
 Calle # 23 # 19d - 47 B. Alcorzares
 Manizales (Caldas)



DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV - E 161 - 13

PROYECTO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ANDRÉS CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 26A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
FECHA:	8/06/2022
DIRIGIDO:	RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN:	SUBBASE GRANULAR
LOCALIZACIÓN:	CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 26A, ANSERMA (CALDAS)

DENSIDAD PROCTOR (gr/cm3) 2.210

PUNTO	K CONO (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO INICIAL (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO FINAL (gr)	W ARENA EN EL HUECO (gr)	DENSIDAD D ARENA (gr/cm3)	VOLUMEN HUECO (cm3)	PESO SUELO HUMEDO (gr)	HUMEDAD D (%)	PESO SUELO SECO (gr)	DENSIDAD SUELO HUMEDO (gr/cm3)	DENSIDAD SUELO SECO (gr/cm3)	COMPACTACIÓN (%)	ABSCISA	COSTADO
1	1566	6315	2416	2333	1,40	1701	3892	5,5	3599	2,29	2,17	94,83	CRA 2E-025-05	
2	1566	6287	2329	2362	1,40	1674	3888	6,0	3477	2,32	2,19	94,38	CRA 2E-025-45	

OK

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO
 ASP. 01111-10987 CRTVC

GOTRANSVIAL S.A.S.
Nít. 900376530-0
Calle 4a3 # 19a - 47 Alosazares
Manizales (Caldas)



ENSAYO DE HUMEDAD INVE - 122 - 13

OBRA:	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACION DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
LOCALIZACIÓN:	CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A, ANSERMA (CALDAS)
DIRIGIDO A :	RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN
FECHA :	9/06/2022

Densidad	Localización	W Cáp.	W Cáp. + NH	W Cáp. + MS	HUMEDAD
1		77.05	571.5	553.4	3.8
2		72.28	567.5	547.5	4.2

7/8

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO
MP. 01111-10567 CPITV

GEOTRANSVIAL S.A.S.
 Nit. 900376530-0
 Calle #13 # 19d - 47 B. Alvarado
 Manizales (Caldas)



DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV - E 161 - 13

PROYECTO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO CARRERA 25 ENTRE CALLES 25 Y 26A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
FECHA:	9/06/2022
DIRIGIDO:	RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR
LOCALIZACIÓN:	CARRERA 25 ENTRE CALLES 25 Y 26A, ANSERMA (CALDAS)

DENSIDAD PROCTOR (gr/cm³) 2.520

PUNTO	K COMO (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO INICIAL (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO FINAL (gr)	W ARENA EN EL HUECO (gr)	DENSIDAD D ARENA (gr/cm ³)	VOLUMEN HUECO (cm ³)	PESO SUELO HUMEDO (gr)	HUMEDAD D (%)	PESO SUELO SECO (gr)	DENSIDAD		COMPACTACIÓN (%)	ABSCISA	COSTADO
										SUELO HUMEDO (gr/cm ³)	SUELO SECO (gr/cm ³)			
1	1566	6153	2260	2357	1.40	1508	3823	4.1	3484	2.54	2.44	96.11	CRA 2E#25-05	
2	1555	6081	2178	2315	1.40	1555	3828	6.4	3269	2.45	2.31	94.03	CRA 2E#25-45	

MR

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO
 MP. 01111-10567 CPITVC

EL CAIRO

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
MÉTODO MARSHALL

RE CQ 03

Version: 1

Fecha: 21 de mayo de 2022
Procedente: Subcontrato

MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 2020


Objeto: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
Código: 0202-000000-000000-000000-000000

Gravidad específica: 1.016 g/cm³
Densidad aparente agregado: 2.683 g/cm³

Tamiz	Diámetro (mm)	Retenido (g)	Retenido (%)	Porcentaje Pasado		Retenido (g)	Retenido (%)	Retenido (g)	Retenido (%)	Retenido (g)	Retenido (%)	Retenido (g)	Retenido (%)
				g	%								
1	75	0	0	100	100	395.7	3.379	395.7	1.04	395.7	1.04	395.7	1.04
2	150	0	0	100	100	509.7	2.367	509.7	1.59	509.7	1.59	509.7	1.59
3	300	5.8	0.58	99.42	99.42	507.8	2.355	507.8	1.58	507.8	1.58	507.8	1.58
						508.5	2.364	508.5	1.58	508.5	1.58	508.5	1.58

Tamiz	Diámetro (mm)	Retenido (g)	Retenido (%)	Porcentaje Pasado		Retenido (g)	Retenido (%)	Retenido (g)	Retenido (%)	Retenido (g)	Retenido (%)	Retenido (g)	Retenido (%)
				g	%								
1	75	0	0	100	100	395.7	3.379	395.7	1.04	395.7	1.04	395.7	1.04
2	150	0	0	100	100	509.7	2.367	509.7	1.59	509.7	1.59	509.7	1.59
3	300	5.8	0.58	99.42	99.42	507.8	2.355	507.8	1.58	507.8	1.58	507.8	1.58
						508.5	2.364	508.5	1.58	508.5	1.58	508.5	1.58

CURVA GRANULOMETRICA

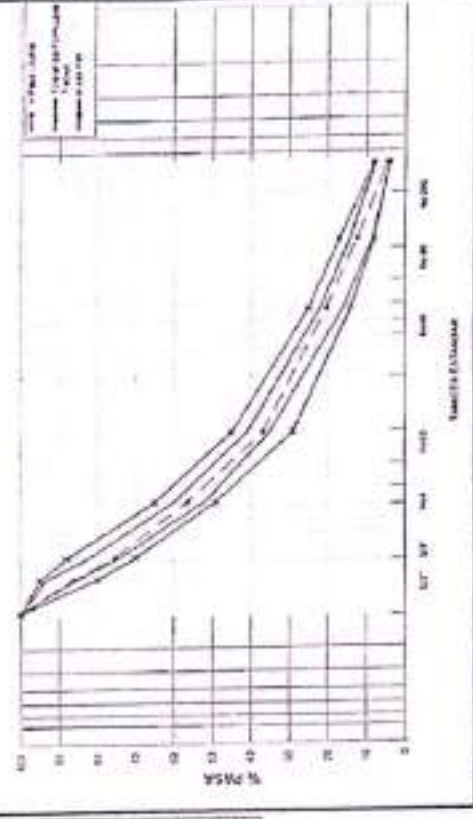

[Handwritten Signature]
 J. J. J. J.
 Responsable Laboratorio
 2022-05-21

PARAMETROS BREVES ART. 450-13	
Relación Estándar/Real (g/100g)	3.7
Descripción	N11 N12 N11
Características	1000 1000 1000
Características	2.0 x 3.0 2.0 x 3.5
Características	15
Características	75-8 75-8 85-10
Características	2.0 x 4.0 2.0 x 5.0 3.0 x 4.0
Características	3.0 x 5.0 3.0 x 5.0 4.0 x 5.0
Características	4.5 x 7.5 4.5 x 7.5 4.5 x 7.5



[Handwritten Signature]
 Responsable Laboratorio

EL CAIRO	DISEÑO DE METODO MARSHALL MDC-19 (60/70) INV.2013	ES PM 00
Generador:	Producción de mezcla asfáltica	Versión 2
Fecha de elaboración:	17 de febrero de 2022	Página 1 de 4

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MÉTODO MARSHALL ✓

**MEZCLA TIPO MDC-19 (NT-3)
TIPO DE ASFALTO 60/70
(INVÍAS 2013)**

**La Virginia, Risaralda
Febrero 17 – 2022**

<p>Elaboro: </p> <p>Nombre: Giovanni Mottoa Nieto</p> <p>Cargo: Laboratorista</p>	<p>Elaboro:  <small>L. LOS VES 611</small> <small>Jefe de planta</small></p> <p>Nombre: Ing. Camilo Cuellar Cepeda</p> <p>Cargo: Jefe de planta</p>
---	---

EL CAIRO	DISEÑO DE METODO MARSHALL MDC-19 (60/70) INV.2013	ES PM 00
Generador:	Producción de mezcla asfáltica	Versión 2
Fecha de elaboración:	17 de febrero de 2022	Página 2 de 4



CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS

Para realizar el diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19, se utilizaron materiales provenientes del Río Risaralda, procesados en la planta de Agregados El Cairo S.A.S. localizada en la intersección de la quebrada el Cairo y el Río Risaralda; clasificado de la siguiente manera:

- GRUESOS: TRITURADO TAMAÑO MAXIMO 3/4"
TRITURADO TAMAÑO MAXIMO 1/2"
- INTERMEDIOS ARENA PROVENIENTE DE TRITURACIÓN
- LLENANTE ARENA LIMOSA N.P. DE PLAYA (Río Risaralda)

A los materiales se les realizaron los siguientes ensayos

- Granulometría de los agregados por separado
- Dosificación teórica de los agregados y granulometría
- Ensayo de partículas planas y alargadas (Relación 5:1)
- Equivalente de arena
- Caras fracturadas
- Peso específico de los agregados
- Solidez
- Angularidad método A
- Índice de plasticidad
- Impurezas en Agregado grueso

Elaboro: 	Elaboro:  <small>LINEA 432 439</small> Jefe de planta
Nombre: Giovanni Mottoa Nieto	Nombre: Ing. Camilo Cuellar Cepeda
Cargo: Laboratorista	Cargo: Jefe de planta

EL CAIRO	DISEÑO DE METODO MARSHALL MDC-19 (60/70) INV.2013	ES PM 00
Generador	Producción de mezcla asfáltica	Versión 2
Fecha de elaboración	17 de febrero de 2022	Página 3 de 4

VALORES DE DISEÑO

- Nivel de Tránsito (NT3)**

Compactación golpes por cara	75
Estabilidad mínima (N)	9,000
Flujo (mm)	2.0 - 3.5
Relación estabilidad / flujo (KN/mm)	3.0 - 6.0
Vacios con aire (%)	4.0 - 6.0
Vacios mínimos agregados minerales (%)	15
Vacios llenos de asfalto (%)	65 - 75
Relación llenante / ligante efectivo, en peso	0.8 - 1.2

- Agregados**



Procedencia agregados gruesos	Río Risaralda
Procedencia arena lavada	Río Risaralda
Procedencia llenante mineral	Río Risaralda

- Asfalto**

Procedencia de asfalto	Barrancabermeja
Tipo de asfalto	60/70

- Temperatura de computación**

Temperatura de compactación	130°C
-----------------------------	-------

Elaboro: 	Elaboro:  1.608 x 53 x 59 jefe de planta
Nombre: Giovanni Mottoa Nieto	Nombre: Ing. Camilo Cuellar Cepeda
Cargo: Laboratorista	Cargo: Jefe de planta

EL CAIRO	DISEÑO DE METODO MARSHALL MDC-19 (60/70) INV.2013	ES PM 00
Generador	Producción de mezcla asfáltica	Versión 2
Fecha de elaboración	17 de febrero de 2022	Página 4 de 4

RESUMEN DISEÑO OBTENIDO

Se realizó dosificación según ajuste granulométrico de los agregados



Triturado 3/4"	23.8%
Triturado 1/2"	27.5%
Árena intermedia	30.0%
Llenante mineral	18.7%

Observando los contenidos obtenidos de cada juego de briquetas (3) con cada porcentaje de asfalto, se seleccionó el contenido óptimo de asfalto según lo exige la norma INVIAS 2013

Máxima estabilidad	5.42 %
Flujo 2.75 mm	5.14 %
Máxima densidad	5.81 %
5.0% de vacíos con aire	5.16 %
70.0% de vacíos llenos	<u>5.23 %</u>
Promedio	5.35 %

Resultado obtenidos con el 5.4 % de asfalto

	Diseño	Especificaciones
Estabilidad (N)	10400	Min 9360 – 13000 (N)
Flujo (mm)	3.0	Min 2.40 – 3.50 (mm)
Relación estabilidad / flujo (KN/mm)	3.5	Min 3.0 – 6.0 (KN/mm)
Vacios mezclas asfáltica (%)	4.5	Min 4.0 – 6.0 (%)
Vacios agregados minerales (%)	10.0	Min 15 (%)
Vacios llenos de asfalto (%)	72.0	Min 65 Max 75 (%)
Relación llenantes / ligante efectivo peso	1.08	Min. 0.8 Max 1.2

Elaboro: 	Elaboro:  1.198.433.699 Jefe de planta
Nombre: Giovanni Matteo Nieto	Nombre: Ing. Gemelo Cuellar Copeda
Cargo: Laboratorista	Cargo: Jefe de planta

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

EL CAIRO

RE CQ 03

MÉTODO MARSHALL

Forma 1

Objeto: GRANULOMETRÍA DE DISEÑO Y SERVICIO DE INGENIERO

Fecha: 17 de febrero de 2012


Gravidad específica aparente: 1.02 g/cm³

Gravidad específica absoluta: 2.65 g/cm³

Materia: ESCUELA AGRÍCOLA MECÁNICA VAJAS 2013

Procedencia: Sr. Nizaralla

Tamiz	Paso	Superficie	Retenido	Porcentaje	Tolerancia Formada		Especificación	
					Min	Max	Min	Max
4.75	75	0	0	0	100	0	100	
7.5	150	0	0	0	100	0	100	
15	300	0	0	0	100	0	100	
30	600	0	0	0	100	0	100	
60	1200	0	0	0	100	0	100	
75	1500	0	0	0	100	0	100	
106	2000	0	0	0	100	0	100	
150	3000	0	0	0	100	0	100	
200	4250	0	0	0	100	0	100	
250	6000	0	0	0	100	0	100	
300	8500	0	0	0	100	0	100	
425	12500	0	0	0	100	0	100	
600	25000	0	0	0	100	0	100	
750	37500	0	0	0	100	0	100	
1000	50000	0	0	0	100	0	100	
1500	75000	0	0	0	100	0	100	

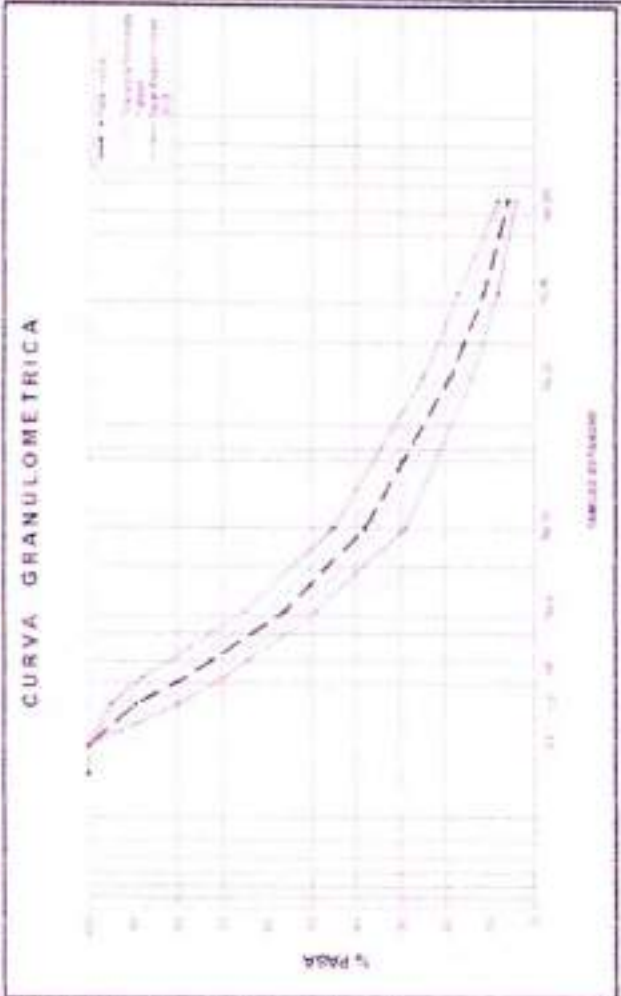

OTROS ACCIONES:

Propiedades	Resultado	Comentarios	Características
Gravidad específica aparente	1.02		1.02
Gravidad específica absoluta	2.65		2.65

Descripción	Módulo de Rotura	
	RT1	RT2
1500	5.35	7.1

[Signature]
 Ing. Carlos Nizaralla
 Jefe de Laboratorio


[Signature]
 Ing. Carlos Nizaralla
 Jefe de Laboratorio

EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
	PESO ESPECIFICO MAXIMO MEDIDO (RICE)
	INVIAS E-735

Ciente:		Fecha:	17 de febrero del 2022
Obra:	Diseño MDC-19 (NT-3)	Destino:	
Material:	Mazda asfáltica	Referencia:	Diseño

Contenido de asfalto (%)	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Peso del recipiente mas agua en gr. (a)	7388,0	7388	7388	7388	7388
Peso del recip. + agua+muestra gr. (b)	8593	8587	8581	8576	8571
Peso de la muestra seca gramos (c)	2000	2000	2000	2000	2000
Peso máx. med. (Rice)	2,516	2,497	2,478	2,463	2,448

METODO RICE

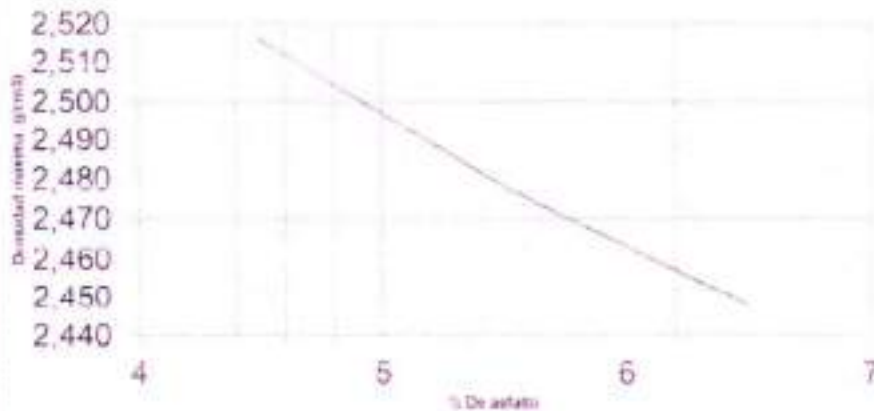

[Signature]
 Elabora: Giovanni Mottica
 Laboratorista

[Signature]
 Revisa: Ing. Camilo Cuellar C.
 Jefe de planta

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19

F LAB 03

Análisis granulométrico, contenidos de asfalto, densidad, estabilidad y flujo (NVIAS E-718)

Cliente: BARRIACERREJILIA
 Calle: RSC RESERVA
 Material: RSC RESERVA
 Fecha de ensayo: 13/03/2022

Tipo de asfalto: 60/70
 Gravedad específica asfalto: 1.01 g/cm³
 Gravedad específica agregados: 2.603 g/cm³

Procedencia asfalto: BARRIACERREJILIA
 Procedencia material: RSC RESERVA
 Temp. Compactación: 130 °C

Muestra No.	Alcance	Fecha	% Asfalto	PESO EN GRAMOS			PESO ESPECÍFICO			VOLUMEN - S. TOTAL			Vacíos (en %)	Vacíos (en %)	Vacíos (en %)	ESTABILIDAD (NI)		Flujo mm	
				En agua	En aire	En agua	h	i	j	k	l	m				n	o		p
1	PLANTA	17-Feb-22	5	1214.4	1215.5	607.9	318.7	2.376	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	7546.0	1.00	754.6	1.10
2	"	"	4.50	1210.1	1211.0	608.1	312.0	2.368	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	7056.0	1.00	705.6	1.10
3	"	"	4.50	1214.2	1215.2	750.5	313.9	2.370	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	8085.0	1.00	808.5	1.80
4	"	"	4.50	1214.2	1215.2	750.5	313.9	2.370	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	8085.0	1.00	808.5	1.80
5	"	"	4.50	1214.2	1215.2	750.5	313.9	2.370	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	8085.0	1.00	808.5	1.80
6	PLANTA	17-Feb-22	5	1209.2	1210.1	607.9	318.7	2.376	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9238.0	1.00	923.8	1.20
7	"	"	5.00	1238.6	1239.7	717.0	313.6	2.367	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9338.0	1.00	933.8	1.00
8	"	"	5.00	1220.2	1221.1	718.0	312.2	2.368	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9780.0	1.00	978.0	1.20
9	"	"	5.50	1216.7	1217.6	719.0	310.7	2.365	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9486.0	1.00	948.6	1.47
10	PLANTA	17-Feb-22	5	1219.6	1220.4	715.0	304.8	2.404	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	10145.0	1.00	1014.5	1.10
11	"	"	5.50	1221.9	1222.7	714.6	307.2	2.400	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	10174.0	1.00	1017.4	1.10
12	"	"	6.00	1216.7	1217.6	719.0	310.7	2.371	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	10135.0	1.00	1013.5	1.20
13	PLANTA	17-Feb-22	5	1214.3	1215.0	719.0	307.9	2.392	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9762.0	1.00	976.2	1.80
14	"	"	6.00	1216.7	1217.6	719.0	310.7	2.371	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9780.0	1.00	978.0	1.10
15	"	"	6.00	1215.4	1216.0	715.0	305.4	2.369	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9065.0	1.00	906.5	1.20
16	"	"	6.50	1217.4	1218.3	718.5	305.8	2.390	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	9065.0	1.00	906.5	1.00
17	"	"	6.50	1214.7	1215.5	718.5	304.2	2.366	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	5762.0	1.00	576.2	1.00
18	"	"	6.50	1214.7	1215.5	718.5	304.2	2.366	0.27	83.4	6.8	9.7	18.6	4.2	58.7	5762.0	1.00	576.2	1.00






OBSERVACIONES:

[Signature]

Eduard Guayas
Laboratorio

[Signature]
13/03/2022

Revisor: Ing. Camilo Guayas
Laboratorio

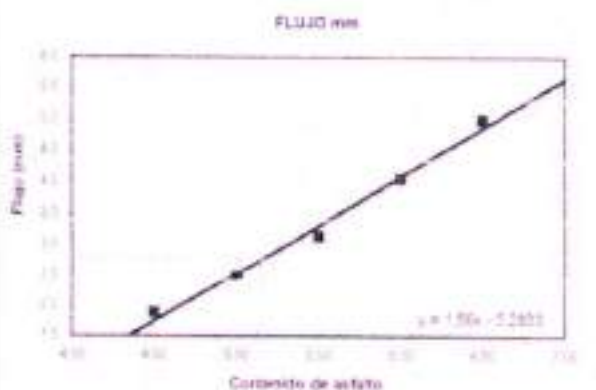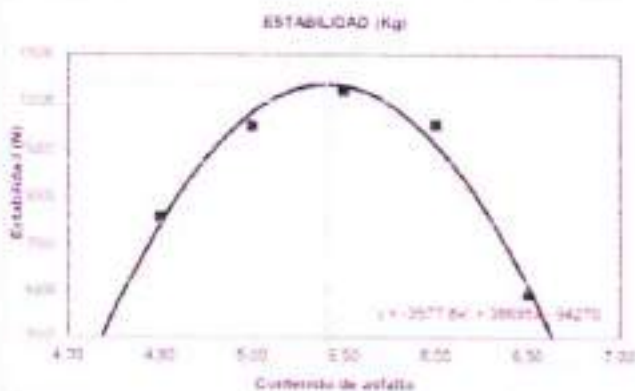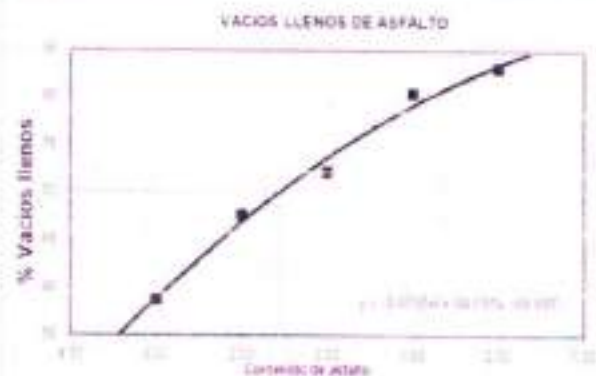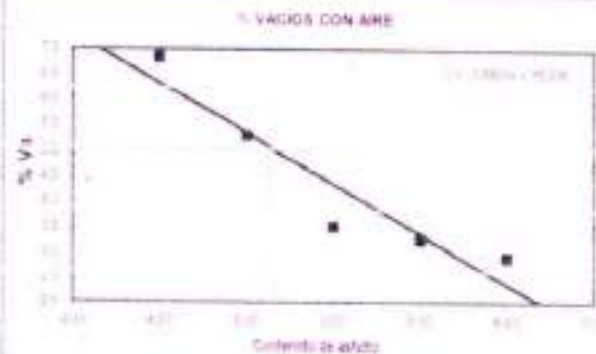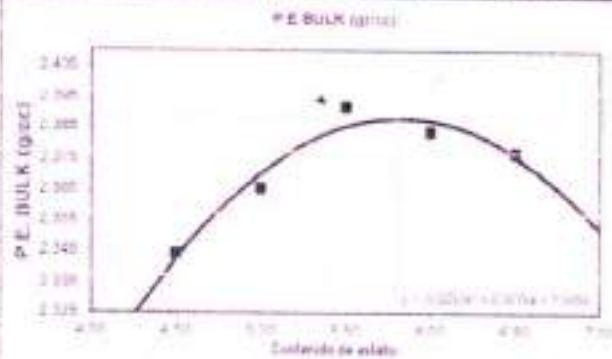

VALORES DE DISEÑO DE FEBRERO - 17 DE 2022

NORMA INV. - 2013

PARÁMETRO	% ASF.
Para máxima densidad	5,81
Para 5% de vacios aere	5,16
Para máxima estabilidad	5,42
Para 2,75% de Flujo	5,14
Para 70% de vacios llenos	5,23

% OPTIMO DE ASFALTO:	5,35
Estabilidad (N)	10400
Flujo (mm)	3,0
Relacion Est/Flujo KN/mm	3,5
Vacios con aire %	4,50
Vacios Agr. Miner %	16,0
Var. llenos de ast %	7,2
Relación Lien/Ligante	1,08

ESPECIFICACIÓN	Min	Max
Estabilidad (N)	9300	13000
Flujo (mm)	2,40	3,50
Relacion Est/Flujo KN/mm	3,0	6,0
Vacios con aire %	4,0	6,0
Vacios Agr. Miner %	15	
Var. llenos de ast %	6,5	7,5
Relación Lien/Ligante	0,8	1,2

PROMEDIO 5,35

[Firma]
Elaboró: Giovanni Mitoa


[Firma]
Revisó: Ing. Camila Cuellar

Cliete: _____
 Proyecto: _____
 Material: Grava triturada de 3/4"

Fecha: 10 de febrero de 2022
 Procedencia: Rio Revoralla

Peso inicial muestra húmeda (g) 3612.4 humedad (%) 2.9 Peso inicial muestra seca (g) 3510.9

TAMIZ		Peso Ret.	Retenido	Ret. acum.	Pasa - curva	NORMA NTC 174	
No	Aper. (mm)	g	(%)	(%)	(%)	Min	Max
1"	25.400	0	0.0	0	100	100	100
3/4"	19.000	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
1/2"	12.500	1100.9	31.4	31.4	68.6	80	95
3/8"	9.510	674.8	19.2	50.6	49.4	70	88
No 4	4.760	1023.0	29.1	79.7	20.3	49	65
No 10	2.000	580.1	16.5	96.2	3.8	20	45
No 40	0.430	103.6	3.0	99.4	0.6	14	25
No 80	0.180	5.5	0.2	99.8	0.2	8	17
No 200	0.075	6.0	0.2	99.8	0.2	4	8
pasa 200		5.0	0.2	100.0			

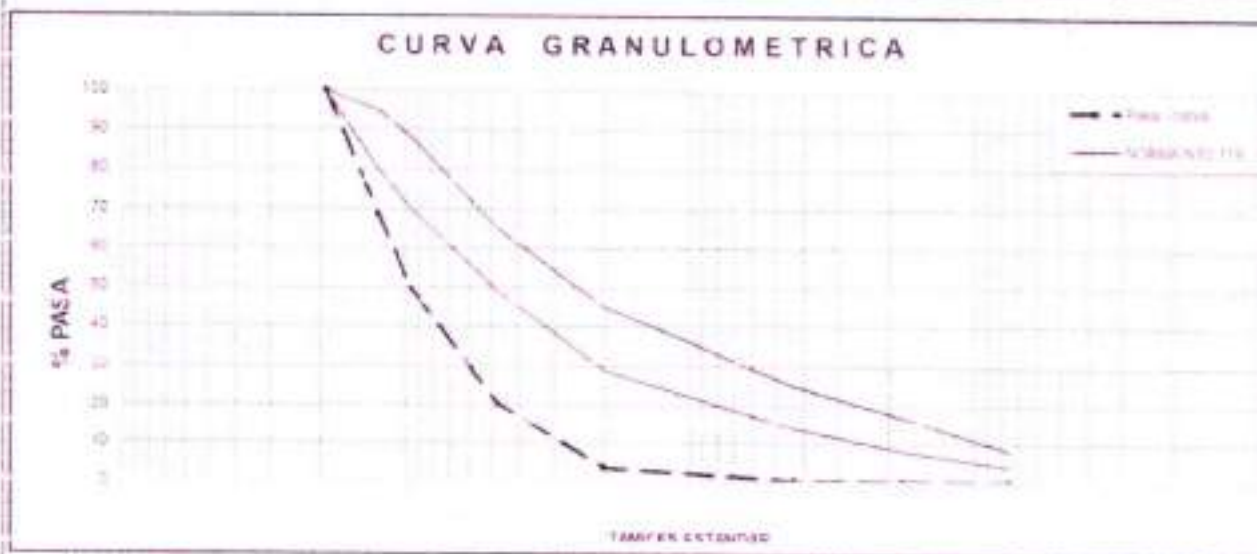

OBSERVACION:

Cumple con las especificaciones del INVIAS - 2013

Peso seco material	3510.9
Diferencia	5.0
% Pasa tamiz 200	0.2

[Signature]
 Elab. Giovanni Motta
 Laboratorio

[Signature] 1.45.2022
 Revisó: Ing. Camilo Cordero
 Jefe de planta

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Versión 1


Cliente: _____
 Proyecto: _____
 Material: grava triturada de 1/2"

Fecha: 12 de febrero de 2022
 Procedencia: Ara Pisarcata

Peso inicial muestra húmeda (g) 2898.6 humedad (%) 3.1 Peso inicial muestra seca (g) 2898.6

TAMIZ		Peso Ret.	Retenido	Ret. acum.	Pasa - curva	NORMA NTC 174	
No	Abert. (mm)	g	(%)	(%)	(%)	Mín	Máx
1"	25.400	0	0.0	0	100	100	100
3/4"	19.000	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
1/2"	12.500	169.2	5.8	5.8	94.2	80	95
3/8"	9.510	776.8	26.8	32.6	67.4	70	88
No 4	4.760	1234.5	42.6	75.2	24.8	49	65
No 10	2.000	619.9	21.4	96.6	3.4	20	45
No 40	0.430	78.6	2.7	99.3	0.7	14	25
No 80	0.180	5.5	0.2	99.5	0.5	5	17
No 200	0.075	6.2	0.2	99.7	0.3	4	8
pesa 200		7.9	0.3	100.0			

CURVA GRANULOMÉTRICA

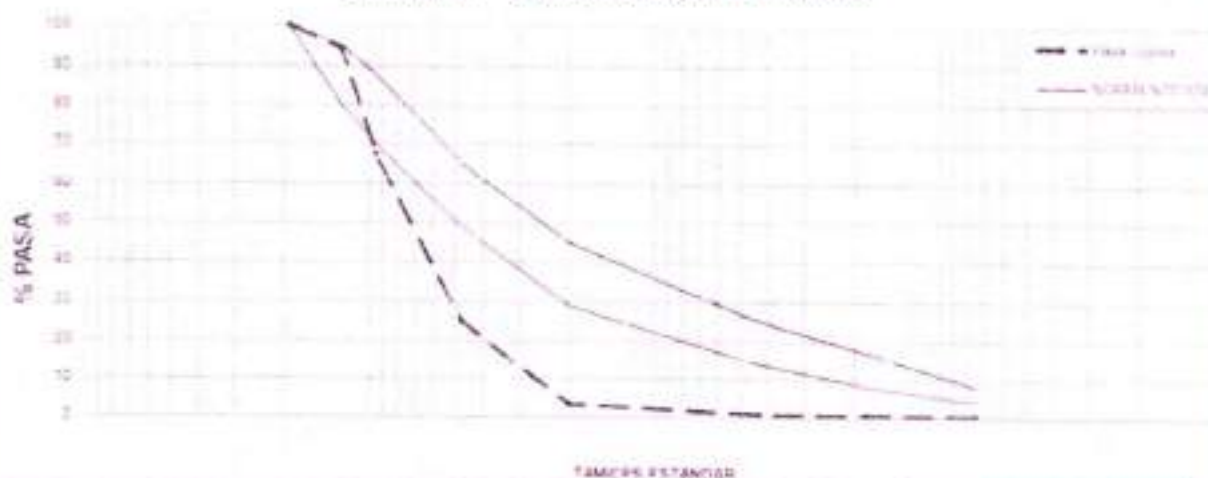

OBSERVACION:
 Cumplir con las especificaciones del Inviás - 2013

Peso seco material	2898.6
Diferencia	7.9
% Pasa tamiz 200	0.3

[Firma]
 Elaber Giovanni Melina
 LABORATORIAL

[Firma]
 Ing. Carlos Guerra
 Jefe de planta

Cliente: _____
Proyecto: _____
Material: Arena gruesa lavada


Fecha: 10 de febrero de 2022

Procedencia: Rio Nisaranca

Peso inicial muestra húmeda (g) 100 humedad (%) 5.2 Peso inicial muestra seca (g) 84.2

TAMIZ		Peso Ret.	Retenido	Ret. acum.	Pasa - curva	NORMA NTC 174	
No.	Abert. (mm)	g	%	%	%	Min	Max
1"	35.400	0	0.0	0	100	100	100
3/4"	19.000	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
1/2"	12.500	0.0	0.0	0.0	100.0	80	95
3/8"	9.510	0.0	0.0	0.0	100.0	70	88
No 4	4.750	0.0	0.0	0.0	100.0	40	65
No 10	2.000	253.0	20.8	20.8	79.2	20	35
No 40	0.430	471.5	55.5	85.3	14.7	14	25
No 80	0.180	87.1	10.3	95.6	4.4	8	17
No 200	0.075	32.2	3.8	99.4	0.6	4	8
pasa 200		5.4	0.6				

CURVA GRANULOMETRICA

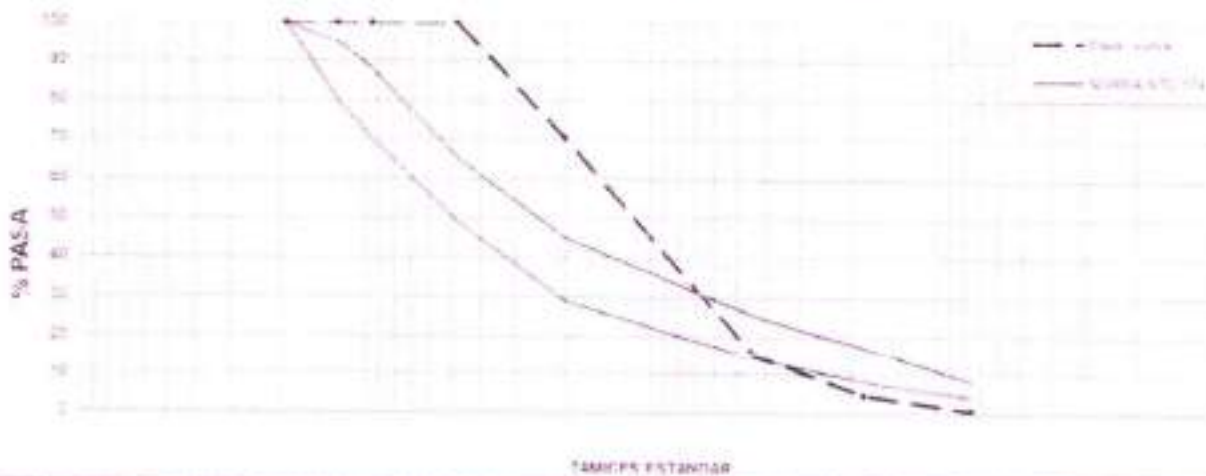

OBSERVACION:
Cumple con las especificaciones del Inviata - 2013

Peso seco material	84.2
Diferencia	5.4
% Pasa tamiz 200	0.6
Modulo finura (2.3-3.1)	2.1

[Firma]
Eliodoro Guevara
Laboratorio

[Firma] 1.02.2022
Revisó: Ing. Camilo Cañar
Jefe de planta

Cliente: _____
Material: Arena gruesa de 2022


Fecha: 10 de febrero de 2022

Procedencia: Ra. Risanada

Peso inicial muestra húmeda (g) 326.5 humedad (%) 6.9 Peso inicial muestra seca (g) 304.0

TAMIZ		Peso Ret	Retenido	Ret. acum	Pasa - curva	NORMA NTC 174	
No	Abert. (mm)	(g)	(%)	(%)	(%)	Min	Max
1"	25.400	0	0.0	0	100.0	100	100
3/4"	19.000	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
1/2"	12.500	0.0	0.0	0.0	100.0	80	95
3/8"	9.510	0.0	0.0	0.0	100.0	70	88
No 4	4.750	2.6	0.9	0.9	100.0	48	65
No 10	2.000	17.5	5.8	5.8	94.2	29	45
No 40	0.430	74.8	24.6	31.2	69.6	14	25
No 60	0.250	81.2	26.7	57.9	42.9	8	17
No 200	0.075	83.6	27.5	85.4	15.4	4	8
passa 200		44.3	14.6	100.0			

CURVA GRANULOMETRICA

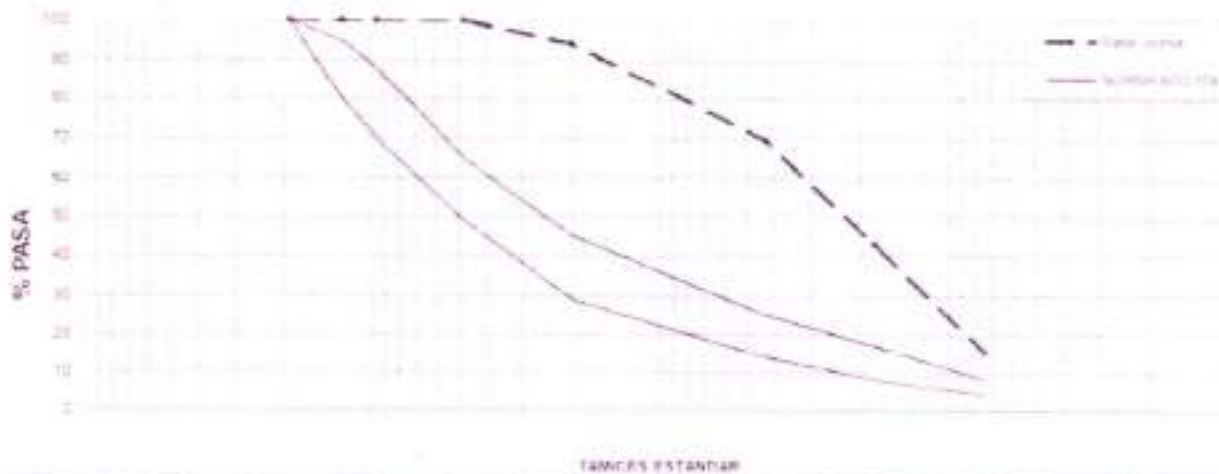

OBSERVACIÓN:

Peso seco material	304.0
Diferencia	44.3
% Pasa tamiz 200	14.6
Módulo finura (2.3 - 1.4)	1.0

[Firma]

Laboratorista: Giovanni Uccetta

[Firma]

REVISÓ: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	RE CQ 04
	ENSAYO DE PARTICULA PLANAS Y ALARGADAS (RELACION 5:1)	
	REV. E-245	versión 1

CLIENTE:	Itaeso MEC-19	FECHA:	17 de febrero de 2022
OBRA:		PROCEDENCIA:	Rio Risaralda
MATERIAL:	Agregado grueso para mezcla asfáltica		
TRITURADORA:	Mem		

TAMANO DE LA FRACCION	peso material gradacion original	Gradacion Original	Muestra de ensayo	particulas planas y alargadas	particulas planas y alargadas	particulas planas y alargadas corregidas
	10'	(%)	10'	10'	(%)	(%)
75-150	210.2					
30-75	3561.2	0.0	3561.2	0.0	0.0	0.0
15-30	1179.0	10.0	1179.0	5.4	0.0	4.8
3.75-15	1405.4	21.7	509.4	10.8	1.9	42.4
Totales	6745.8	32.2				49.2

Ensayo de particulas planas y Alargadas (%)	1,40
---	-------------

Observaciones	ESPECIFICACION INVIAS 2013
Cumple con las especificaciones del Invia - 2013	
	Agregado para concreto asfáltico
	10 (%) Itaeso

[Handwritten Signature]
 Elaboro: Giovanni Motta
 E. Calvo

[Handwritten Signature]
 1.40 + 5.19
 Jefe de planta
 Revisó: Ing. Camilo Cuellar
 Fecha: 17/02/2022

UBINA: _____

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

MATERIAL: Arena media

COMPENSACIÓN: D/A 2124241/13

ENSAYO	1	2	3	PROMEDIO
Lectura nivel de arena (mm)	84,0	87,0	94,0	64
ESPESOR DE LA LAMINA (mm)	150,0	152,0	155,0	
Equivalente de arena (%)	65	62	62	

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 64

OBSERVACIONES:

Cumple con las especificaciones del INVIAE - 2013

ESPECIFICACION INVIAE 2013

MATERIAL	MINIMO (%)
Agregado fino concreto asfáltico	50
Agregado fino para concreto	60

Elaboro: Giovanni Motica
Laboratorista

Revisó: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	RE-GQ-02
	ENSAYO DE CARAS FRACTURADAS	
	INV-F-307	Versión 1

CLIENTE: <u>Duerra MDC-18</u> OBRA: _____ MATERIAL: <u>2 pegamó grueso para medias estéticas</u> TRITURADORA: <u>MEM</u>	PROCEDECIA: _____ FECHA: <u>17 de febrero de 2022</u> <u>Río Pinar del</u>
---	--

Fracciones		Muestra inicial (g)	Material caras fract (g)	Caras fracturadas (g)	Gravación original (g)	Conectivo
Pasa	Retiene					
1"	3/4"	-	-	-	-	-
3/4"	1/2"	2006.5	1735.5	86.5%	10.5	9.1
1/2"	3/8"	1003.7	867.4	86.4%	11.2	9.9
3/8"	No. 4	200.7	200.2	99.7%	22.3	11.2
TOTAL					44.0	39.2

% CARAS FRACTURADAS (UNA CARA)	89
--------------------------------	----

Fracciones		Muestra inicial (g)	Material caras fract (g)	Caras fracturadas (g)	Gravación original (g)	Conectivo
Pasa	Retiene					
1"	3/4"	-	-	-	-	-
3/4"	1/2"	2006.5	1517.5	75.6%	10.5	7.8
1/2"	3/8"	1003.7	761.2	75.8%	11.2	8.7
3/8"	No. 4	200.7	157.5	78.0%	22.3	11.9
TOTAL					44.0	33.6

% CARAS FRACTURADAS (DOS CARAS)	76
---------------------------------	----

OBSERVACIONES
 Cumple con las especificaciones del Invas - 2013

ESPECIFICACIONES INVIA - 2013		
MATERIAL	CARAS FRACTURAD	NORMA
AGR. GRUESO MDC (NT-3)	UNA CARA	85 % Min
	DOS CARAS	70 % Min


 Laboratorio


 Revisó: Ing. Camilo Ochoa
 Jefe de Planta

EL CAIRO

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

RE CQ 06

SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO NORMA INVIAS I.N.V.E - 220


CLIENTE: _____ FECHA: 10 de febrero de 2022
 OBRA: _____
 TIPO DE MATERIAL: mezcla de mezcla asfáltica (MMA-1A) PROCEDENCIA: SIN DESIGNAR
 TIPO DE PRUEBA: Prueba de sulfatos N° DE CICLOS: 5


TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
2 1/2	2	-	-	-	-	-	-
2	1 1/2	-	-	-	-	-	-
1 1/2	1	-	-	-	-	-	-
1	3/4	-	-	-	-	-	-
3/4	1/2	13.5	899.8	888.3	0.3	0.0	0.06
1/2	3/8	11.2	388.9	367.5	1.2	0.2	0.03
3/8	4	22.3	451.2	450.6	0.4	0.1	0.02
TOTAL		44.0	1939.9	1907.9	2.1	0.1	0.05
PERDIDA DE FRACCION GRUESA (%)						0.1	



TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
3/4	No. 4	-	-	-	-	-	-
No. 4	No. 8	15.0	500.0	49.8	0.2	0.2	0.03
No. 8	No. 16	17.6	500.0	44.7	0.9	0.1	0.14
No. 16	No. 30	10.1	500.0	38.9	1.1	1.1	0.11
No. 30	No. 50	7.1	500.0	47.4	0.9	0.9	0.16
TOTAL		50.7	400.0	366.2	3.8	1.0	0.36
PERDIDA DE FRACCION FINA (%)						0.7	

	VALOR MAXIMO PERMITIDO	
	Sodio (Na) %	Magnesio (Mg) %
CONCRETO HIDRAULICO	12	12
MEZCLA ASFALTICA	N/A	18
BASE GRANULAR	12	18
SUB-BASE GRANULAR	12	18

OBSERVACIONES

Elaboro:  Giovanni Molino
 Laboratorio

Revisó:  Camillo Cuellar
 Jefe de planta

EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD		RE CQ 13
	CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS ANGULARIDAD METODO A INVE -239-07		
Cliente			VERSION 1
Proyecto	<u>Diseño mezcla asfáltica</u>	Fecha	<u>10 de febrero de 2022</u>
Material	<u>Agregado fino para mdc-19</u>	Procedencia	<u>Río Risaralda</u>
DATOS DE ENSAYO			
Método de prueba tipo	A		
Ensayo no	1	2	
Volumen del molde (cm ³)	100.0	100.0	
Gravedad específica del agregado fino seco	2.581	2.581	
Peso del material fino (g)	135.7	136.1	
Vacios agregado fino sin compactar (%)	52.3	52.7	
Angulosidad Metodo A (Agregado Fino) (%)	52.5		
ESPECIFICACIÓN 2013		MINIMO	
Rodadura mezcla asfáltica	45%		
Intermedia mezcla asfáltica	40%		
Base mezcla asfáltica	35%		
Observaciones	<u>Cumple con las especificaciones vigentes del Invia</u>		
 Flahm: Giovanni Motina Laboratorista		 1.02.051.009 Jefe de planta Revisó: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta	

EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	RE CQ 24
	LIMPIEZA SUPERFICIAL PARTICULAS DE AGREGADO GRUESO	
	I.N.V. E - 237-13	

Cliente: _____	Fecha: <u>10 de Febrero-2022</u>
Proyecto: _____	
Materia: <u>AGREGADO GRUESO PARA MDC 19</u>	Procedencia: <u>Pto. Barahona</u>

DATOS DE ENSAYO

Humedad de la muestra

Mh: Peso del material húmedo (g)	516.6
Ms: Peso del material seco (g)	511
W: Humedad (adimensional) $W=(Mh-Ms)/Ms$	0,0110


Datos muestra a ensayar

Mne: Peso muestra a ensayar numera (g)	2600
Mca: Peso muestra lavada sobre tamiz No. 35 y seca (g)	2561.4
m: Peso de la muestra tamizada No. 35 (g)	2555.8
l: Impureza superficial (g) $l= Mse-m$	5.6
Coefficiente de limpieza superficial (%) $(l/Mca) \times 100$	0,22

OBSERVACIONES:	ESPECIFICACIONES INVIAS 2013	NORMA
Cumple con especificación Invias 2013	Tratamiento superficial simple (ART 430-13)	0.5 % Max
	Tratamiento superficial doble (ART 431-13)	0.5 % Max
	Mezcla asfáltica en caliente (AKI 450-13)	0.5 % Max
	Mezcla abierta en caliente (ART 451-13)	0.5 % Max
	Mezcla discontinua en caliente para capa de rodadura (ART 452-13)	0.5 % Max



Gobierno: Giovanni Mota
Laboratorista



Reviso: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

EL CAIRO**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD****PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO**

NIV C-223

RE CO 10

Versión 1

Cliente: _____

Proyecto: _____

Material: Asfalto 2"Fecha: 10 de febrero de 2011Integradora: NemFuente: RIO ROSALDA

Ensayo #	1	2	Promedio
peso en el aire de la muestra seca (g) (A)	4526.0	4625.8	4575.9
Peso en el aire sec (g) (B)	1574.1	1675.3	1624.7
Peso muestra sumergida en agua (g) (C)	2951.0	3017.9	2984.5
Peso Especifico Aparente (A / B-C)	2.788	2.781	2.780
Peso Especifico Aparente S.S.S (B / B-C)	2.818	2.821	2.819
Peso Especifico Nominal (A / A.C)	2.874	2.877	2.875
Absorción ((B - A) / A) * 100	1.07	1.07	1.07

OBSERVACIONES:


Elabora: Evelyn Motta
Laboralista

Reviso: Ing. Camilo Cuellar
Director General

EL CAIRO

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

RE CO 10

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO

REV C-223

Version: 1

Cliente: _____
Proyecto: _____
Material: _____

Fecha: 20 de febrero de 2010
Trituradora: Man
Fuente: A.C. B. GARCIA

Ensayo #	1	2	Promedio
peso en el aire de la muestra seca (g) (A)	2197.9	2251.2	2224.6
Peso en el aire pes (g) (B)	2227.9	2292.0	2251.0
Peso muestra sumergida en agua (g) (C)	1397.5	1431.9	1414.7
Peso Especifico Aparente (A / B-C)	2.647	2.646	2.646
Peso Especifico Aparente S.S.S (B / B-C)	2.683	2.684	2.684
Peso Especifico Nominal (A / A.C)	2.748	2.748	2.747
Absorción ((B - A) / A) * 100	1.36	1.37	1.37

OBSERVACIONES:

Elaboró: Giovanni Muñoz

Revisó: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

EL CAIRO

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

RF CO 11

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO FINO

INV C-244

Versión 1

Cliente:

Fecha:

10 de febrero de 2022

Obra:

Material:

Arens media


Fuente:


Rio Risaralda

Ensayo #	1	2
Picnometro (Ref.)	1	2
Temperatura del ensayo °C	25.1	25.1
Peso picnometro + agua (curva) a T °C (B)	652.3	652.3
Peso muestra S.S.S (Grs) (S)	500.0	500.0
Peso picnometro + agua + muestra (Grs) (C)	988.2	988.8
Peso de la muestra seca (Grs) (A)	493.0	492.9

Peso Especifico Aparente $A / (B+S-C)$	2.649	2.653	2.651
Peso Especifico Aparente S.S.S $S / (B+S-C)$	2.687	2.691	2.689
Peso Especifico Nominal $A / (B+A-C)$	2.753	2.756	2.755
Absorción $((S - A) / A) * 100$	1.42	1.44	1.43

Observaciones:


Elaboro: Giovanni Motto
Laboratorista


Revisó: Ing. Camilo Cuellar
Gerente Comercial

EL CAIRO

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO FINO

INV C-222

RF CO 11

Versión 1

Cliente: _____

Fecha: _____

10 de febrero de 2022

Obra: _____

Material: _____

Lientante mineral

Fuente: _____

Rio Risaralda


Ensayo #	1	2
Picnometro (Ref.)	1	2
Temperatura del ensayo °C	25.1	25.1
Peso picnometro + agua (curva) a T °C (B)	652.3	652.3
Peso muestra S.S.S (Grs) (S)	500.0	500.0
Peso picnometro + agua + muestra (Grs) (C)	666.7	666.1
Peso de la muestra seca (Grs) (A)	487.3	487.1





Peso Especifico Aparente $A / (B+S-C)$	2.669	2.659	2.664
Peso Especifico Aparente S.S.S $S / (B+S-C)$	2.738	2.729	2.734
Peso Especifico Nominal $A / (B+A-C)$	2.868	2.860	2.864
Absorción $((S - A) / A) * 100$	2.61	2.65	2.63

Observaciones:


Elabora: Giovanni Monca
Laborantista

Revisó: Ing. Carlos Cuellar
Jefe de planta

Construcción EL CAIRO		LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD					
		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN - CONCRETO HIDRAULICO					
		TIPO DE CONCRETO :		21 MPA O 3000PSI			
		CLIENTE :		RED DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN			
OBRA :		ANSERMA, CALDAS.					
Resistencia específica (Mpa)	Fecha Vaciado	Fecha ensayo	Edad muestra (días)	Resistencia obtenida (Mpa)	Desarrollo resistencia (%)	Asentamiento (Pulg)	Observaciones
21 Mpa	17/03/2022	24/03/2022	7	15,96	108,7	6	
			7	15,99			
		14/04/2022	28	23,12	110,0	6	
			28	23,08			
21 Mpa	24/03/2022	31/03/2022	7	14,05	95,7	6	
			7	14,08			
		21/04/2022	28	21,17	100,7	6	
			28	21,13			
21 Mpa	13/04/2022	20/04/2022	7	16,36	111,2	6	
			7	16,33			
		11/05/2022	28	21,44	102,0	6	
			28	21,40			
		 Elaboro: Giovanni Motta Laboratorista					
		 Reviso: Ing. Camilo Cuellar Cepeda Jefe de planta					

CONTRATO No		101-1023		MUNICIPIO		ARCELLA											
NO TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO (CM) (ø)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PROYECTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)	
1	CONCRETO	RED INTERIOR DE ALCANTARILLADO	RED UNIDA DE ALCANTARILLA (Ø)	1.7"	PK NOVAOR T	RESOLUCION con apertura de corte	M	3722	KCHILC	15413181-1A	PAVCO		10/11/2012	1.7"	CONCRETO	18	
NOMBRE SUPERVISOR o INVENTOR		ING. MARIBEL SANDRA GAVARRIZ															
FIRMA SUPERVISOR o INVENTOR																	
NOMBRE SUPERVISOR o INVENTOR		RED DE MEDICION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION															
FIRMA SUPERVISOR o INVENTOR																	
NOMBRE SUPERVISOR o INVENTOR		NOMBRE CONTRATISTA															
FIRMA SUPERVISOR o INVENTOR		FIRMA CONTRATISTA															
NOMBRE SUPERVISOR o INVENTOR		RED DE MEDICION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION															
FIRMA SUPERVISOR o INVENTOR																	
NOMBRE SUPERVISOR o INVENTOR		RED DE MEDICION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION															
FIRMA SUPERVISOR o INVENTOR																	

WASTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION -
COORDINADOR DE HECHO

CONTRATO No.		201 DE 2009		MUNICIPIO		BOGOTÁ									
ETAPA DE TRABAJO	PROCESO	SECCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA	DIAMETRO (CM/IN)	MATERIAL	PROCESO DE INSTALACIÓN	PROCESO DE SECTOR REBOLUCIONADO (PROSE)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NOMBRE DE CERTIFICADO	# LOTE	SANCOJANE	RIT	FECHA DE INSTALACION (DD/MM/AAAA)	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (M)
OTA 3A	Replanteo y Manten	RAMA 10 LINEA CALLE 23 P 25A	2"	PVC	Instalación con apoyo de 1909		3	RIT 201 y 276	ESTRADA 11001	NOVA	BOGOTÁ	19/11/2009	2"	POLIETILENO D PEQUEÑA RIGID	50

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
 TRANSACCIONES DE TIERRAS - ALIENACIÓN

BOGOTÁ, D.C., 19 DE NOVIEMBRE DE 2009

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
 TRANSACCIONES DE TIERRAS - ALIENACIÓN

BOGOTÁ, D.C., 19 DE NOVIEMBRE DE 2009

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

ENFOCALDAS A.S. ESP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO		FECHA DE INICIO		FECHA DE INICIO		FECHA DE INICIO	
OBJETO DEL CONTRATO		ACTA No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CONTRATUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS Y LA OPTIMIZACION DE REDES DE AGUARDIO Y ALGANTARILLADO EN EL AREA DEL SAN BARRIO CARRERA 2E ENTRE CALLES 7A Y 7G EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS										
OBRA DE REPOSICION DE REDES DE ALGANTARILLADO EN EL SECTOR DEL AREA DEL SAN BARRIO CARRERA 2E ENTRE CALLES 7A Y 7G EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS										
1	REDES DE AGUAS									
1.1	Locación y reparación (incluye materiales, mano de obra y transporte) de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	51	\$ 6.296,11	\$ 321.102,00	51	\$ 321.102,00	0	\$ 0	51	\$ 321.102,00
1.2	Locación y reparación (incluye materiales, mano de obra y transporte) de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	51	\$ 14.262,92	\$ 732.909,00	51	\$ 732.909,00	0	\$ 0	51	\$ 732.909,00
1.3	Locación y reparación (incluye materiales, mano de obra y transporte) de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	1	\$ 168.533,34	\$ 168.533,00	1	\$ 168.533,00	0	\$ 0	1	\$ 168.533,00
1.4	Locación y reparación (incluye materiales, mano de obra y transporte) de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	1	\$ 853.151,17	\$ 853.151,00	1	\$ 853.151,00	0	\$ 0	1	\$ 853.151,00
2	CONEXIONES									
2.1	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	10,2	\$ 90.382,13	\$ 921.898,00	10,2	\$ 921.898,00	5,28	\$ 475.811,00	10,40	\$ 940.065,00
3	CONEXIONES									
3.1	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	76,5	\$ 29.310,13	\$ 2.227.889,00	76,5	\$ 2.227.889,00	37,17	\$ 1.105.056,00	100,67	\$ 2.985.575,00
3.2	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	27	\$ 29.533,79	\$ 797.207,00	27	\$ 797.207,00	3,49	\$ 43.872,00	11,48	\$ 1.077.099,00
3.3	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	1	\$ 31.410,56	\$ 31.410,00	1	\$ 31.410,00	0	\$ 0	0,00	\$ 0
3.4	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	20	\$ 25.633,39	\$ 512.667,00	20	\$ 512.667,00	0	\$ 0	20,00	\$ 512.667,00
3.5	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	55,125	\$ 37.679,00	\$ 2.084.164,00	55,125	\$ 2.084.164,00	62,09	\$ 2.400.324,00	151,81	\$ 5.730.213,00
4	CONEXIONES									
4.1	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	51	\$ 25.790,56	\$ 1.315.272,00	51	\$ 1.315.272,00	33,70	\$ 869.411,00	63,20	\$ 1.630.445,00
5	CONEXIONES									
5.1	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	4,59	\$ 1.308,96	\$ 6.009,30	4,59	\$ 6.009,30	3,49	\$ 45.512,00	6,15	\$ 80.524,30
5.2	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	22,85	\$ 24.006,52	\$ 1.239.472,00	22,85	\$ 1.239.472,00	32,33	\$ 775.835,00	75,52	\$ 1.813.003,00
5.3	Desarrollo de trabajos de conexión de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro para la reposición de tuberías dañadas en el sector del área del san barrio carrera 2e entre calles 7a y 7g en el municipio de Anserima Caldas	31,25	\$ 37.292,35	\$ 1.175.977,00	31,25	\$ 1.175.977,00	7,29	\$ 271.075,00	73,22	\$ 803.712,00

nr

ACORDAMIENTOS SOCIALES												
RECURSOS Y SALUD EN EL												
MUNICIPIO												
41	Acordamiento para el evento	GA	1	\$ 2.421.581,25	\$ 2.421.581,00			1,00 \$	2.421.581,20	0 \$	1,00 \$	2.421.581,00
42	Acordamiento para el evento	MMA	1	\$ 4.031.345,18	\$ 4.031.345,00			1,00 \$	4.031.345,00	0,50 \$	2.415.673,00	7.247.012,00
43	Acordamiento para el evento	GI	0	\$ 77.630,00	\$ 0,00			0 \$	-	0 \$	0,00 \$	-
44	Acordamiento para el evento	Clayton	300	\$ 4.517,70	\$ 1.355.310,00			0 \$	-	300,00 \$	300,00 \$	1.355.310,00
OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DEL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN OSORO EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA CALDAS												
1.1	Obra de reposición de la red de agua fría	m ²	10,2	\$ 28.634,22	\$ 292.074,00			9,58 \$	274.378,00	0,67 \$	19.113,00	293.497,00
1.2	Obra de reposición de la red de agua fría	m ²	3,075	\$ 35.635,00	\$ 136.308,00			11,90 \$	426.830,00	0	11,90 \$	426.830,00
1.3	Obra de reposición de la red de agua fría	m ²	51	\$ 4.300,73	\$ 219.437,00			84,80 \$	364.702,00	5,60 \$	24.094,00	388.796,00
1.4	Obra de reposición de la red de agua fría	m ²	7,14	\$ 24.081,17	\$ 171.940,00			10,10 \$	243.220,00	0	10,10 \$	243.220,00
1.5	Obra de reposición de la red de agua fría	m ²	3,06	\$ 37.292,31	\$ 134.173,00			8,00 \$	199.383,00	0,67 \$	25.064,00	324.447,00

Net.

OBRA 3: OBRAS DE RECLAMACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	M3	UB	\$/M3	\$/UB	\$/TOTAL	\$/SUBTOTAL	\$/TOTAL	\$/SUBTOTAL	\$/TOTAL	\$/SUBTOTAL	
41	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	408	\$ 73.137,75	\$ 2.982.775,00	20,00	\$ 1.467.123,00	27,10	\$ 1.981.901,00	0,00	\$ 42,10	\$ 3.448.624,00
42	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	10.241,4	\$ 24.100,13	\$ 2.468.556,82	0,00	\$ 2.468.556,82	2,95	\$ 7.286,00	0,00	\$ 2,95	\$ 7.286,00
43	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	84,76	\$ 31.488,41	\$ 2.658.258,00	0,00	\$ 2.658.258,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.658.258,00
44	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	236,5018	\$ 30.200,98	\$ 7.143.218,00	25,00	\$ 759.394,00	46,87	\$ 1.793.218,00	0,00	\$ 71,94	\$ 2.752.647,00
45	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	6685	\$ 115.932,04	\$ 772.981,00	0,00	\$ 772.981,00	65,08	\$ 11.212.036,20	0,00	\$ 65,08	\$ 11.212.036,20
46	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	57	\$ 183.023,74	\$ 10.426,39	0,00	\$ 10.426,39	46,75	\$ 18.551.510,20	0,47	\$ 86.662,00	\$ 86.641.72,00
47	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	1680	\$ 111.094,72	\$ 186.641,00	0,00	\$ 186.641,00	0,00	\$ 0,00	13,49	\$ 14.993.620,00	\$ 14.993.620,00
48	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	255	\$ 910,983	\$ 232.200,00	0,00	\$ 232.200,00	22,00	\$ 801.799,00	0,00	\$ 22,00	\$ 801.799,00
49	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	1	\$ 795.996,2	\$ 795.996,20	0,00	\$ 795.996,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 795.996,20
50	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	04	\$ 317.626,91	\$ 1.270,50	0,00	\$ 1.270,50	185,50	\$ 12.409.639,00	0,00	\$ 185,50	\$ 12.409.639,00
51	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	6	\$ 215.643,36	\$ 1.293.866,00	0,00	\$ 1.293.866,00	21,00	\$ 4.528.532,00	0,00	\$ 21,00	\$ 4.528.532,00
52	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	8	\$ 126.381,07	\$ 1.011.048,00	0,00	\$ 1.011.048,00	17,90	\$ 2.297.305,00	0,00	\$ 17,90	\$ 2.297.305,00
53	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	153	\$ 795,284	\$ 121.666,21	0,00	\$ 121.666,21	255,12	\$ 203.874,00	0,00	\$ 255,12	\$ 203.874,00
54	CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (M3) PARA LA ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO, ANSERMA CALDAS	m3	2,72	\$ 1.081.875,91	\$ 2.942.701,00	0,00	\$ 2.942.701,00	6,23	\$ 6.740.098,00	0,00	\$ 6,23	\$ 6.740.098,00

NR

COSTO TOTAL	
COSTO DIRECTO	
MATERIA PRIMA	0.28
SUPEMONTES	0.01
UTILIDADES	0.05
SUMA ANTES DE IVA	
IMPORTE UTILIDADES	0.11
TOTAL	

\$ 99,501,204.00
\$ 73,172,274.78
\$ 2,024,520.67
\$ 237,322.74
\$ 3,686,613.71
\$ 98,001,297.90
\$ 700,456.60
\$ 99,701,754.50

\$ 12,570,683.00
\$ 9,315,067.06
\$ 2,609,718.28
\$ 93,130.67
\$ 465,753.35
\$ 12,482,189.66
\$ 88,493.14
\$ 12,570,683.00

\$ 67,030,680.00
\$ 49,670,750.73
\$ 1,390,230.62
\$ 496,703.23
\$ 2,383,537.43
\$ 66,550,807.85
\$ 471,072.15
\$ 67,030,680.00

\$ 19,811,119.00
\$ 14,000,580.31
\$ 5,115,330.73
\$ 1,406,604.88
\$ 731,024.42
\$ 19,671,184.36
\$ 1,994,694.64
\$ 19,811,119.00

\$ 99,412,682.00
\$ 73,666,307.52
\$ 471,606,566.10
\$ 2,86,003.00
\$ 3,283,315.36
\$ 99,712,852.08
\$ 679,829.92
\$ 99,412,682.00

\$ 89,022.00

SALDO

Manuel S. Bayaréz
 JOHANN MANUEL VARGAS BAYARÉZ
 SUPERVISOR
 EMFOCALDAS S.A. ESP

Edgar Delgado Moreno
 EDGAR DELGADO MORENO
 CONTRATISTA
 REDIMAC SAS

OBRA2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DEL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

Ítem:	3.1	En material común de 0 a 2m				Unidad:	m ³
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad		
		5,60	0,30	0,40	1,00	0,67	DOMICILIARIA 9
TOTAL PRE-ACTA						0,67	

OBRA2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DEL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

Ítem:	4.2	Instalación de tubería PVC de 2". Incluye transporte desde la planta al sitio de instalación				Unidad:	m
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad		
		5,60			1,00	5,60	DOMICILIARIA 9
TOTAL PRE-ACTA						5,60	

JK

OBRA2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DEL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

Ítem:	2.3	Llenos con material cuneta de préstamo.				Unidad:	m ³	
Fecha medición	Frente	Medidas			Cantidad	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Profundidad				
		5,67	0,30	0,40	1,00	0,67	0,67	DESCUENTAR ?
TOTAL PRE-ACTA							0,67	

OBRA3: OBRAS DE RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

Ítem:	4.2	Suministro transporte e instalación de base granular tipo lavas (Incluye ensayos de laboratorio) para espesor de 0,7				Unidad:	m ³	
Fecha medición	Frente	Medidas			Cantidad	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Profundidad				
		1,00	4,80	0,20	1,00	0,96	0,96	DESDE CIERRE DE CALLE 25 HASTA SUNDERO
		1,90	0,85	0,30	-1,00	-0,49	-0,49	DESCUENTO INSTALACION DE TAPA CON ARO EN HF D=0,60M
TOTAL PRE-ACTA							0,47	

902

OBRA3: OBRAS DE RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS									
Item:	5.4	Suministro transporte e instalación de concreto asfáltico MDC-19 (no incluye imprimación)					Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad				
		44.32	4.35	0.07	1.00	13.49	13.49	PAVIMENTO TRAMO ABS 0+000 A ABS 0+051	
TOTAL PRE-ACTA							13.49		

Item:	5.5	Suministro transporte e instalación de negro de emulsión con emulsión asfáltica CP2-1					Unidad:	m2	
Fecha medición	Frente	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad				
		51.00	4.35		1.00	221.85	221.85	PAVIMENTO TRAMO ABS 0+000 A ABS 0+051	
TOTAL PRE-ACTA							221.85		

Not
