



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-22
Versión 11
2022-08-03

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	-076 DE 2022	Acta N°	4 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	216.194.689
CONTRATISTA	CONSORCIO SECOIN			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	901.407.766-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	216.194.689
CDP (#, rubro y fecha)	# 00202 RUBRO 2320101001030842 DEL 14 DE ENERO DE 2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	172.228.824
RP (#, rubro y fecha)	# 000329 RUBRO 2320101001030842 DEL 27 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	43.964.211
OBJETO DEL CONTRATO:	CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	RECURSOS PROPIOS - OBRAS POIR	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.654

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ	INGENIERO DE ZONA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
N° 086100194694	AHORROS	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

03-11-22

01-07-21

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE
2002 (PERSONAS
JURÍDICAS)


JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía 1.057.304.693 de Filadelfia, en mi condición de representante legal del CONSORCIO SECOIN identificado con NIT 901.407.766-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía 52.881.426 y tarjeta profesional N° 267031- T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de CONSORCIO SECOIN identificado con NIT 901.407.766-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Manizales, a los 09 días del mes de Junio de 2022.



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
R.L CONSORCIO SECOIN
C.C: 1.057.304.693



LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 267031-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1 C E 1 2 1 7 8 7 E 7 E 9 0 0 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52881426 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 267031-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

267031-T

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ
C.C. 52881426
RES. INSCRIPCION 2071 DEL 23/12/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



288869

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298860

Identificación Pública S.A. 180942-6119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 105730493		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión Salud 2022.05	9435807888	1	2022/06/22	Banco	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMETRICOS				
			ing	ret	ide	tas	lcp	top	cor	vt	sh	lma	vac	arr	vet	hi	tip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias
1	CC 105730493	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN															230301	30	EPS010	30	0	14-11	30	0	No
Total		Afiliados(1)																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC: 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2022-05	2022-05		9435607888		1	2022/06/22			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
TOTAL				1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600

TOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	A - 200 O MAS COTIZANTES		A - 200 O MAS COTIZANTES		CONSORCIO SECOIN		CARRERA 24 #30-28 APTO 102		MANIZALES-CALDAS		8580841		SI	
TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
nsión	Salud	943788571		Planilla E		2022/06/15						0			

Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES					
		ing	ret	tde	tae	tdp	lap	vop	cor	vt	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055910299	ARDILA ALEXANDER	X																230201	20	EP5037	20	CCF11	20	14-11	20	20	SI
CC 75002723	CFRENTES JOSE ALBERO	X																230301	1	EP5005	1	CCF11	1	14-11	1	1	SI
CC 105776480	GUARIN PARRA CRISTIAN DAHIL	X																230301	1	EP5005	1	CCF11	1	14-11	1	1	SI
CC 75004654	LOPEZ OSORIO ARISTOBULO	X																25-14	20	EP5041	20	CCF11	20	14-11	20	20	SI
CC 1055910958	MONTAYA RAMIREZ JOSE IVAN	X																231001	20	EP5037	20	CCF11	20	14-11	20	20	SI
CC 1055910920	OSORIO TANGARIFE JUAN CARLOS	X																230301	1	ESS662	1	CCF11	1	14-11	1	1	SI
CC 1110477957	VALENCIA CANO LUIS ALBERTO	X																230301	1	EP5041	1	CCF11	1	14-11	1	1	SI

1 ARIADOC(7)

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e KCBF	
1		CONSORCIO SECOIM		A - 200 O MAS COTIZANTES		CONSORCIO SECOIM		CARRERA 24 #30-28 APTO 102		MANIZALES-CALDAS		8580641		SI	

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Salud	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-05-	2022-06		9435788571		E		2022/06/15				0	
SUMEN DE PAGO												
SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
(ADMINISTRADORAS: 4)												
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$341,700	\$0	\$0	\$341,700				\$341,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$106,700	\$0	\$0	\$106,700				\$106,700
FORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$21,600	\$0	\$0	\$21,600				\$21,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$106,700	\$0	\$0	\$106,700				\$106,700
(ADMINISTRADORAS: 1)												
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$149,100	\$0	\$0	\$149,100				\$149,100
(ADMINISTRADORAS: 1)												
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	\$85,700	\$0	\$0	\$85,700				\$85,700
(ADMINISTRADORAS: 4)												
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$85,700	\$0	\$0	\$85,700				\$85,700
QUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$1,400	\$0	\$0	\$1,400				\$1,400
QUEVA EPS.MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400				\$53,400
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100				\$28,100
TAL				7	\$662,200	\$0	\$0	\$662,200				\$662,200



El empleo
es de todos

Mintrabajo

17-1080

Manizales

Señores
CONSORCIO SECOIN
NIT 901396694
Mirador de las lomas manzana 28 casa 4
riossebastian1990@gmail.com
Manizales - Caldas

No: 17-2-2022-004669

10/06/2022 2:53:26 p. m.

Asunto: Respuesta a radicado 7-2022-152143
Certificación FIC.

Respetados señores:

De acuerdo con la solicitud radicada el día 03 de junio del presente año, atentamente nos permitimos adjuntar copia del certificado generado por nuestro Sistema de Información SIREC, como documento oficial del SENA, en el que se evidencia el pago efectuado por concepto de FIC correspondiente al contrato de obra 076, suscrito con la EMPOCALDAS S.A. E.S.P., según recibo de pago número:

75655360

De otra parte, se les recuerda que los pagos que se hacen por contribución FIC los deben realizar dentro de los primeros diez días del mes siguiente a cada mes de ejecución de cada obra, teniendo en cuenta que el pago extemporáneo generará intereses moratorios establecidos por la Superintendencia Financiera.

Finalmente, para radicar las comunicaciones al SENA por vía electrónica lo deben hacer en el siguiente link: servicioalciudadano@sena.edu.co.

Atentamente,

RUBEN DARIO ALZATE ZULUAGA
Coordinador Grupo Relaciones corporativas e
internacionales

Anexos: un (1) folio, certiaportes.

NIS: 2022-01- 209761

Copia: Cesar Augusto Zamora Vasco, cazamora@sena.edu.co

Proyectó: César Augusto Zamora Vasco *CZ*
Cargo: Técnico G 03 - Grupo relaciones corporativas



CONSORCIO SECOIN

NIT: 901407766-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 24 30 28 AP 102, Manzales, Caldas, Colombia

Tel. 3127209638

Email. riossebastian1990@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764020702968 válida desde 2021-11-05 hasta 2022-11-05 rango desde FE5 hasta FE25.

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO
EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPICALDAS
S.A E.S.P

NIT: 890803239

Dirección: CR 23 75 82, Manzales, Caldas, Colombia

Teléfono: 8867080

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Tipo de negociación: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago: 25/11/2022

Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE13

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 09:05:01

FECHA FIRMADO: 28/10/2022 09:05:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
27	10	2022	25	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	COSTO DIRECTO ACTA N° 4 CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN ELMUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS	C39	1,00	\$32.578.149,00		0,00	\$32.578.149,00
2	02	ADMINISTRACION	C39	1,00	\$7.818.756,00		0,00	\$7.818.756,00
3	03	IMPREVISTOS	C39	1,00	\$1.628.907,00		0,00	\$1.628.907,00
4	04	UTILIDAD	C39	1,00	\$1.628.907,00	19,00	0,00	\$1.628.907,00

Notas:	Subtotal:	\$43.654.719,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cuarenta y tres millones novecientos sesenta y cuatro mil doscientos once pesos)	IVA:	\$309.492,00
CUFE: 492e5d4f2b29ead579f079e254f2a308990e6d89eaa4430b59c6559cf1920be78f4d9f7eb6319aff7ac01b7eb0ae7870	Total:	\$43.964.211,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.628.907,00	19,00%	\$309.492,00

Firma Digital: R05mxip2jgJmdBCntkuAIUDgqXBPZ0bjs4NurBhpw5Ny/uCdM9RAWPpsSQa5CB
KgUirDwnayMhc9D0fgw2mmp9xZmWGrq1MXIZB1wSfpaAGrK
Ye7Z0jgBRfTY ESixI22lvEYRZw66PTbiaHvV+PWZ9p0x7IMRY76Kpouc6LR31DEI7Nve5XAW B0IYH1j8nyOh3OyXQf5xVnNyr1JCTA9vl
R8GsX2r8OSC2Ki+Op7n9ZhbMMnLx aghDubO4F:PeLH2XrE7InoLMMB+TWw5XxhMIG8OwiHWJSHKckwvrrqHWg7r/zw VZ14W5dyjUkVAsVKBcw8
wv==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



INFORME DE OBRA N° 4 Y FINAL

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P



CONTRATISTA

CONSORCIO SECOIN

SUPERVISOR

EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ

MANIZALES, CALDAS

JUNIO DE 2022

1 OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **CONSORCIO SECOIN** en el periodo comprendido entre el 14 de Mayo - 20 de Mayo de 2022, en el marco de la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es **“CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS”**

1.1 FICHA TECNICA

CONTRATO:	076 DE 2022
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD DE UNICA OFERTA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S.P R.L ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
OBJETO :	CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SECOIN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$216.194.689.00) INCLUIDO IVA Y AIU
VALOR PRESENTE ACTA:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$43.964.211.00) INCLUIDO IVA Y AIU
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$216.193.035.00) INCLUIDO IVA Y AIU
FECHA DE INICIACION:	FEBRERO 14 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	FEBRERO 14 DE 2022
FECHA DE REANUDACION:	MARZO 07 DE 2022
FECHA FINALIZACION:	MAYO 20 DE 2022

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio de Marquetalia, Caldas, Vereda San Juan.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO: En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá en el presente contrato de obra.

A continuación, un resumen del estado en el que se registro fotográfico detallado.


1. RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA EN PLASTICO Y C

Por donde iba a pasar la tubería entre la quebrada se revisa tubería de los objetos que bajan por el cauce y que pueden



2. LLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Y DISPERSION DEL MATERIAL SOBRENTE


Despues de tener la excavacion hecha y la tuberia instalada en la brecha se procedio a llenar la brecha con el material de la excavacion y se disperso el material que sobraba de dicha actividad.

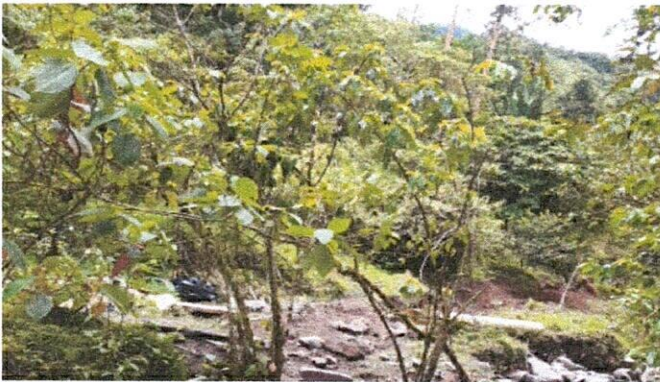

3. ACOMPAÑAMIENTO DE LA PROFESIONAL SST

Se hizo acompañamiento por parte de la profesional SST durante todo el tiempo que se ejecuto la obra



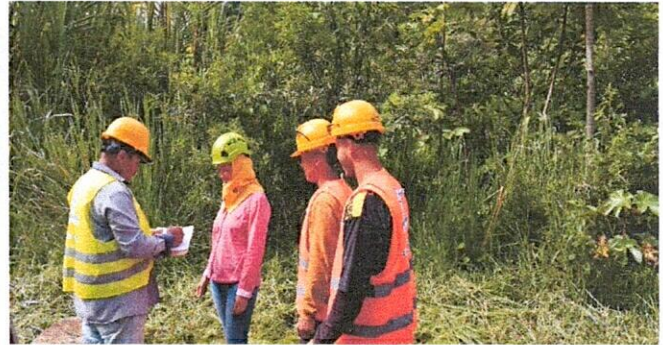

4. VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL

Se utilizo un vehiculo para transportar el personal que ejecuto la obra desde el municipio de marquetalia hasta la vereda san juan durante el tiempo de ejecucion, se lleva el personal en la mañana y se regresaba en la tarde de nuevo la municipio.

5. ARREGLO DE DAÑO EN EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO

Se utilizo el personal y materiales para el arreglo de daño en el acueducto municipal por fuertes lluvias en la zona que generaron corte en el suministro del servicio de agua.

6. TRANSPORTE DE TUBERIA

Se transporto la tuberia sobrante de la obra hacia otro municipio.



7. CAMARA DE INSPECCION

Construccion de una camara de inspeccion para la instalacion de valvula.



8. CONCRETO PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DE POLIETILENO

Recubrimiento de tuberia con concreto donde no se pudo meter en brecha por las condiciones del terreno el cual era muy rocoso lo que impedia la excavacion.



En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la cuarta y ultima acta en el contrato de obra cuyo objeto es la "**CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS** Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Eduardo Andrés Brand Ruiz el cual aprobó cada una de estas.



CONSORCIO SECOIN
R.L JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
1.057.304.693 DE FILADELFIA
CONTRATISTA



Nit. 901407766 - 1

INFORME FINAL SST

CONTRATISTA:

CONSORCIO SECOIN

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

REALIZADO POR:

BETZAIDA CARDONA CORDEIRO
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA 007- 0111

MUNICIPIO: MARQUETALIA CALDAS

Calle 11 A #8b - 03 VillaMaría
Email: riossebastian1990@gmail.com
Villamaria - Caldas - Colombia



Nit. 901407766 - 1

CONTRATO No: 076 DE 2022

OBJETO

El objeto del contrato es “CAMBIO DE RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.”

Gestión en seguridad y salud en el trabajo, obra realizada en la Vereda San Juan, del municipio de Marquetalia – Caldas.

Calle 11 A #8b - 03 VillaMaría
Email: riossebastian1990@gmail.com
Villamaria - Caldas - Colombia



Nit. 901407766 - 1

1. ALCANCE DEL INFORME

El alcance del presente informe abarca el cumplimiento de los compromisos contractuales ejecutados por el contratista, en cuanto a los aspectos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de informar la ejecución de todas las medidas previstas en el control y los efectos negativos y potenciar los positivos que el proyecto generó, desde su fecha de inicio hasta el final.

➤ Total Trabajadores = 5 ✓

Tabla 1. Consolidado de actividades

CUADRO COSOLIDADO DE ACTIVIDADES AL SISTEMA SEGURIDAD EN EL TRABAJO	
Actividades	Total
Inducciones personal	5
Conformación del Vigía	1
Capacitaciones y Charlas de seguridad	4
Divulgación Matrices de peligros (asegurando participación trabajadores) Inducción Inicial al personal	1
Inspección de botiquines	2
Inspecciones herramientas	4
Entrega de los EPP	2



Nit. 901407766 - 1

Verificación de los pagos al SGSS del personal del proyecto por mes	2
Reporte de Accidentes	0

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES

A continuación, se describen las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de la obra.

3. ACTIVIDADES

- Se realizó la revisión de las afiliaciones y los pagos de Seguridad Social mensuales del personal que ingresó al proyecto, las afiliaciones se realizaron a las entidades prestadoras de salud (EPS), la administradora del fondo de pensión (AFP) y las administradoras de riesgos laborales (ARL), cumpliendo con lo establecido en la ley 100 de 1993

Anexo # 1 soportes de las afiliaciones y pagos de abril y mayo 2022.

4. PLAN BÁSICO LEGAL

Dentro de las actividades ejecutadas por el Contratista para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Durante la ejecución de la obra se tuvo en cuenta las sugerencias del Vigía con respecto a la seguridad de los trabajadores y el público por las condiciones de la ejecución de la obra, en el cumplimiento con la Resolución 2013 de 1986

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Calle 11 A #8b - 03 VillaMaría
Email: riossebastian1990@gmail.com
Villamaria - Caldas - Colombia



Nit. 901407766 - 1

- La prevención se hace mediante la identificación y control de los factores de riesgo que permitan ser evaluarlos y vigilar los trabajadores expuestos a los riesgos específicos.
- Actividades de Inducciones, Capacitaciones y Divulgación.
- Durante la ejecución del proyecto se ejecutaron 4 capacitaciones

Anexo # 2 evidencia de las charlas y capacitaciones

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

- Es el conjunto de actuaciones dedicadas a la identificación, evaluación y control de los agentes disponiendo de los medios humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de las tareas de campo. El contratista CONOSRCIO SECION con el apoyo de la ARL SURA, en la ejecución de las actividades del proyecto realizó asesorías a la profesional de SST

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- La seguridad industrial por lo tanto requiere de la protección de los trabajadores, en la implementación de controles técnicos y la formación al control de los riesgos en el trabajo, para evitar y minimizar los accidentes laborales, las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del proyecto fueron las inspecciones, elaboración y cumplimiento de la matriz de riesgos.

Anexo # 3 inspección de herramientas áreas de trabajo

- La matriz de peligros del Contratista fue revisada y actualizada de acuerdo a los requerimientos y actividades desarrolladas en el Proyecto.
- Se realizaron inspecciones de seguridad a los sitios de trabajo con el fin de detectar los peligros y detectar los riesgos que pueden afectar a la población trabajadora y del común.
- Se estableció en la matriz de los elementos de protección personal utilizar el casco de seguridad, gafas, guantes, protector respiratorio, protector auditivo, botas de seguridad, equipo de protección contra caídas de ser necesario (arnés de seguridad, eslinga y línea de vida) e impermeable, Se realizó el suministro y reposición según las necesidades,

Anexo # 4 entrega de EPP

Calle 11 A #8b - 03 VillaMaría
Email: riossebastian1990@gmail.com
Villamaria - Caldas - Colombia



Nit. 901407766 - 1

RELACIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES.

- Durante la ejecución de la obra no se presentaron accidentes laborales

CASOS DE ENFERMEDAD GENERAL Y CASOS COVID

- Durante la ejecución del proyecto no se presentaron casos de covid-19 o ausentismo por enfermedades laborales o de origen común

ACTIVIDADES REALIZADAS POR SST EN CADA VISITA

- Acompañamiento en el desarrollo de las actividades en el frente de trabajo, verificación de cumplimiento de normas y estándares de seguridad
- Identificación de actos y condiciones inseguras y corrección de los mismos.
- Verificación de condiciones de seguridad
- Verificación de uso de los elementos de protección personal acorde con el riesgo de exposición.
- Verificación de pago de seguridad social y afiliaciones según vencimiento de estas
- Recorrido de seguridad por la obra
- Verificación de botiquín

ANEXOS

ANEXO # 1 SEGURIDAD SOCIAL



Nit. 901407766 - 1

ANEXO # 2 CAPACITACIONES

CONSORCIO SECIOIN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión 1
Cod. FI-SST-010 Fecha 12-04-2011 Página 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: HORA DE INICIO 15.03.22 HORA FINALIZACIÓN 7:00 - 9:00

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION: Inducción Nuevo Obra -

Nº	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Don Alberto Valdivia	1110411957	Trayecto	Don Alberto Valdivia
2	Don Alvaro Pacheco	75007773	Trayecto	Don Alvaro Pacheco
3	Don Roberto Lopez	75004550	Trayecto	Don Roberto Lopez
4	Don Alvaro Pacheco	1029718299	Trayecto	Don Alvaro Pacheco
5	Miguelangel Pacheco	1055916959	Trayecto	Miguelangel Pacheco
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Betancor Cordoba Firma Instructor: [Firma]

CONSORCIO SECIOIN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión 1
Cod. FI-SST-010 Fecha 12-04-2011 Página 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: HORA DE INICIO 31.03.22 HORA FINALIZACIÓN 10:00 - 10:30

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION: Uso Correcto y Constante de los EPP

Nº	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Juan Montoya	1025916957	Trayecto	Jose Juan Montoya
2	Miguelangel Pacheco	1029718299	Trayecto	Miguelangel Pacheco
3	Don Roberto Lopez	75004550	Trayecto	Don Roberto Lopez
4	Don Alvaro Pacheco	75007773	Trayecto	Don Alvaro Pacheco
5	Don Alberto Valdivia	1110411957	Trayecto	Don Alberto Valdivia
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Betancor Cordoba Firma Instructor: [Firma]

CONSORCIO SECIOIN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión 1
Cod. FI-SST-010 Fecha 12-04-2011 Página 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: HORA DE INICIO 19.04.22 HORA FINALIZACIÓN 10:00 - 10:30

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION: Uso Correcto de Herramientas Manuales

Nº	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Don Roberto Lopez	75004550	Trayecto	Don Roberto Lopez
2	Don Juan Montoya	1025916957	Trayecto	Don Juan Montoya
3	Don Alberto Valdivia	1110411957	Trayecto	Don Alberto Valdivia
4	Don Alvaro Pacheco	75007773	Trayecto	Don Alvaro Pacheco
5	Miguelangel Pacheco	1029718299	Trayecto	Miguelangel Pacheco
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Betancor Cordoba Firma Instructor: [Firma]

CONSORCIO SECIOIN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión 1
Cod. FI-SST-010 Fecha 12-04-2011 Página 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: HORA DE INICIO 03.05.22 HORA FINALIZACIÓN 10:00 - 10:30

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION: Política SST - Alcohol y Drogas

Nº	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Miguelangel Pacheco	1029718299	Trayecto	Miguelangel Pacheco
2	Don Juan Montoya	1025916957	Trayecto	Don Juan Montoya
3	Don Roberto Lopez	75004550	Trayecto	Don Roberto Lopez
4	Don Alvaro Pacheco	75007773	Trayecto	Don Alvaro Pacheco
5	Don Alberto Valdivia	1110411957	Trayecto	Don Alberto Valdivia
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Betancor Cordoba Firma Instructor: [Firma]



Nit. 901407766 - 1

ANEXO # 3 INPECCIONES

CONSORCIO SECOIN FORMATO INSPECCION DE BORGUN

Responsable de la Inspección: *Rafaela Cardenas* FECHA: 19/07/2022

Fecha de Inspección (dd/mm/aa)	Planta/Obrav/Obra/Dependencia	Ubicación	Estando												Observaciones		
			Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase			
19-07-22 19-04-22	Obra Obra	Manuel Manuel															

* Verificar las fechas de vencimiento. En caso de estar próximo a vencerse, gestionar su renovación.
** Además de gestionar su renovación se está próximo a vencerse, entregar el medicamento al jefe para que esta gestione su devolución. Como RESPEL.
*** Si está avanzado, entregar al Residente ambiental o Coordinador del SGA para que este gestione su disposición final.

CONSORCIO SECOIN FORMATO INSPECCION DE BORGUN

Responsable de la Inspección: *Rafaela Cardenas* FECHA: 19/07/2022

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
A	HERSAMIENTOS MANUALES	M NA
B	HERSAMIENTOS DE CORTE	M NA
C	HERSAMIENTOS DE GOLPE	M NA
D	HERSAMIENTOS DE TORSION - LLAVES	M NA
E	HERSAMIENTOS ELECTRICOS	M NA
F	HERSAMIENTOS MECANICOS	M NA

CONSORCIO SECOIN FORMATO INSPECCION DE BORGUN

Responsable de la Inspección: *Rafaela Cardenas* FECHA: 19/07/2022

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
A	HERSAMIENTOS MANUALES	M NA
B	HERSAMIENTOS DE CORTE	M NA
C	HERSAMIENTOS DE GOLPE	M NA
D	HERSAMIENTOS DE TORSION - LLAVES	M NA
E	HERSAMIENTOS ELECTRICOS	M NA
F	HERSAMIENTOS MECANICOS	M NA

CONSORCIO SECOIN FORMATO INSPECCION DE BORGUN

Responsable de la Inspección: *Rafaela Cardenas* FECHA: 19/07/2022

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
A	HERSAMIENTOS MANUALES	M NA
B	HERSAMIENTOS DE CORTE	M NA
C	HERSAMIENTOS DE GOLPE	M NA
D	HERSAMIENTOS DE TORSION - LLAVES	M NA
E	HERSAMIENTOS ELECTRICOS	M NA
F	HERSAMIENTOS MECANICOS	M NA

ANEXO # 4 ENTREGA DE EPP

CONSORCIO SECOIN		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Codigo SST-FR-07			
		FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL										Versión: 01			
												Fecha: Octubre 2021			
CENTRO DE TRABAJO													FECHA INICIAL		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACION	FECHA INICIO	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	NOMBRE TRABAJADOR
Alexander Trujillo	1055916799	15-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ALEXANDER A	
		31-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ALEXANDER A	
		19-4-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ALEXANDER A	
		3-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ALEXANDER A	
Alex & Montoya	1055916799	31-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Juan L. Montoya	
		19-4-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Juan L. Montoya	
		3-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Juan L. Montoya	

CERTIFICADO CON VIGENCIA QUE HE RECIBIDO INDICACION Y CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS POR LA EMPRESA EN LA FECHA INDICADA EN EL CUADRO ANTERIOR.

RESPONSABLE DE LA EMPRESA: Betancourt Cardenas CUI: SST

CONSORCIO SECOIN		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Codigo SST-FR-07			
		FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL										Versión: 01			
												Fecha: Octubre 2021			
CENTRO DE TRABAJO													FECHA INICIAL		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACION	FECHA INICIO	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	Fecha de entrega	Estado	NOMBRE TRABAJADOR
José Alvaro Cepeda	73002223	19-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	José Alvaro C.	
		31-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	José Alvaro C.	
		19-4-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	José Alvaro C.	
		3-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	José Alvaro C.	
Luis Alvaro Valencia	1110021907	12-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luis A. Valencia	
		31-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luis A. Valencia	
		19-4-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luis A. Valencia	
		3-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luis A. Valencia	
Hernando Lopez	73004554	15-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hernando L.	
		31-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hernando L.	
		3-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hernando L.	
José L. Montoya	1055916799	15-3-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	José L. Montoya	


CERTIFICADO CON VIGENCIA QUE HE RECIBIDO INDICACION Y CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS POR LA EMPRESA EN LA FECHA INDICADA EN EL CUADRO ANTERIOR.

RESPONSABLE DE LA EMPRESA: Betancourt Cardenas CUI: SST



Nit. 901407766 - 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

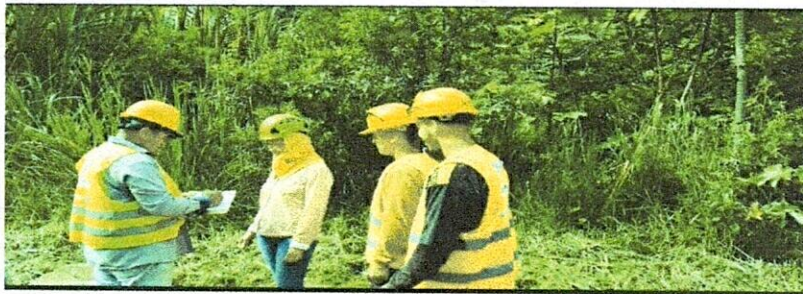

Calle 11 A #8b - 03 VillaMaría
Email: riossebastian1990@gmail.com
Villamaria - Caldas - Colombia



Betzaida Cardona Cordeiro
Profesional SST
Licencia # 007 -0111

Calle 11 A #8b - 03 VillaMaría
Email: riossebastian1990@gmail.com
Villamaria - Caldas - Colombia

RAZÓN SOCIAL	ASERCOM SAS	
IDENTIFICACION APORTANTE	Nº-810006079	
SUCURSAL	0	
FECHA PAGO	2022-05-17	
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-30356511	
NOMBRE EMPLEADO	BETZADA EUGENIA CARDONA CORDEIRO	
EPS	EPS SURA	
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	
CAJA COMPENSACION	Caja de Compensacion Familiar de Caldas CONFAMILIARES	
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRA S.A.	
NUMERO PLANILLA	23272534	
REFERENCIA PAGO(PIN)	E	
TIPO PLANILLA	E	
PERIODO PENSION	2022-04	
PERIODO SALUD	2022-05	
TIPO COTIZANTE	Dependiente	
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo	
NOVEDAD INGRESO INICIAL		
NOVEDAD INGRESO FINAL		

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Ingreso	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante			
30	1.272.000	0,1600000	\$ 203.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E:G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.272.000	0,0400000	\$ 50.900	\$ 0	0	\$ 0	Número Autorización 0 Valor \$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.272.000	0,0696000	\$ 88.600	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	
30	1.272.000	0,0400000	\$ 50.900	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 203.600	\$ 50.900	\$ 88.600	\$ 50.900	\$ 394.000

RAZÓN SOCIAL	ASERCOM SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-810006079
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-06-22
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-300366511
NOMBRE EMPLEADO	BETZANDA EUGENIA CARDONA CORDEIRO
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACION	Caja de Compensación familiar de Caidas CONFAMILIARES
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	23524295
REFERENCIA PAGO(PIN)	E
TIPO PLANILLA	2022-05
PERIODO PENSION	2022-06
PERIODO SALUD	Dependiente
TIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
SUBTIPO COTIZANTE	
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	TAE	TDE	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicia	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Inicia	Fecha Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL inicio	Fecha IRL Fin	
																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante			
30	1.272.000	0,16000000	\$ 203.600	\$ 0	\$ 0	\$ 203.600	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
				Número Autorización	Valor	
30	1.272.000	0,04000000	\$ 50.900	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.272.000	0,66660000	\$ 86.800	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa
30	1.272.000	0,04000000	\$ 50.900	0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 203.600	\$ 50.900	\$ 86.800	\$ 50.900	\$ 394.000

CONTRATO: CAMBIO RED DE CONDUCCION TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS



NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
Periodo del 01 de mayo al 15 de mayo de 2022

NOMBRE DE LA EMPRESA		CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO ADOS	AUXILIO DE VIVIENDA	AUXILIO DE ALIMENTACION	HORAS EXTRAS	HORAS DE CALIDAD	HORAS DE REPOSICION	DESCUENTO A SALUD 4,0%	DESCUENTO A PENSION 4,0%	TOTAL A PAGAR	FIRMA				
NOMBRE	NOMBRE DE LA EMPRESA																		
LUIS ALBERTO VALENCIA CAÑO	1110471957	20	2	1.000.000	1	33.333	3.906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.639	LUIS ALBERTO VALENCIA CAÑO				
CRISTIAN DAMILO GIGARRIN PARRA	1057786490	20	2	1.000.000	1	33.333	3.906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.639	CRISTIAN DAMILO GIGARRIN PARRA				
JUAN CARLOS OSORIO FANGARIFE	1055948560	20	2	1.000.000	1	33.333	3.906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.639	JUAN CARLOS OSORIO FANGARIFE				
JOSE ALBERTO CIPRIENTES	75022773	20	2	1.000.000	15	500.000	58.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	518.586	JOSE ALBERTO CIPRIENTES				
ARISTONILDO LOPEZ OSORIO	75022773	20	2	1.000.000	15	500.000	58.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	518.586	ARISTONILDO LOPEZ OSORIO				
JOSE IVAN MANTOYA RAMIREZ	1055948568	20	2	1.000.000	15	500.000	58.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	518.586	JOSE IVAN MANTOYA RAMIREZ				
ALEXANDER ARDILA	1055948599	20	2	1.000.000	15	500.000	58.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	518.586	ALEXANDER ARDILA				
SUMAS TOTALES																			
														1.613.332	191.382	65.200	65.200	1.694.314	

VoBo JOHAN BASTIAN RIOS

VoBo Residente de obra



CONTRATO: CAMBIO RED DE CONDUCCION TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 (SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

Periodo del 16 de mayo al 30 de mayo de 2022

NOMBRE DE LA EMPRESA		CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO ADOS	SALARIO GADO	AUXILIO	NO DE TRABAJO	DOCTRINA	CALIFICACION	HORAS V/O	HORAS EXT	VALORAS	HORAS	RECORRIDO	ARGUMENTOS	DESCUENTO A		TOTAL A PAGAR	FIRMA																		
NOMBRE																		4.0%	PENSIÓN																				
ARISTOBILLO LOPEZ OSCAR	79004554	IV	II	1.000.000	5	5.000.000	19.579		19.579									6.700	4.0%	6.700	172.796	ARISTOBILLO LOPEZ OSCAR																	
JOSE IVAN MONTENA RAMIREZ	1055916948	IV	II	1.000.000	5	5.000.000	19.579		19.579									6.700	4.0%	6.700	172.796	JOSE IVAN MONTENA RAMIREZ																	
ALEXANDER ARELLANO	1055916299	IV	II	1.000.000	5	5.000.000	19.579		19.579									6.700	4.0%	6.700	172.796	ALEXANDER ARELLANO																	
SUMAS TOTALES																			20.100	20.100	518.388																		

VoBo Residente de obra

VoBo JOHAN F BASTIAN RIOS



PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACION


CONTRATO CONTRATO: CAMBIO RED DE CONDUCCION TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

PLANILLA DE LIQUIDACIONES RECIBIMOS VALORES A QUE SE REFIERE ESTA PLANILLA Y DECLARAMOS ESTAR A PAZ Y SALVO CON EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE TRABAJO ORDINARIO, HORAS EXTRAS, DEGANISOS DOMINICAL Y FESTIVOS DURANTE EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO EN LA OBRA

NOMBRE	CERRA	CARGO	SALARIO	SUB TRANS	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEVENG VAC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	INTERESES CESANTIAS	VAGACIONES	PRIMA	TOTAL LIQUIDACION	FIRMA Y CEDULA
LUIS ALBERTO VALENZUELA CANO	1110471951	05 02 02	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 1.117.172	\$ 1.117.172	30/04/2022	1/05/2022	2	\$ 6.207	\$ 2.778	\$ 6.207	\$ 15.192	LUIS ALBERTO VALER 41820 Gt en r. r.
JOSE ALBERTO CIFUENTES	75082720	05 02 02	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 1.117.172	\$ 1.117.172	06/03/2022	26/06/2022	54	\$ 197.576	\$ 75.000	\$ 167.576	\$ 433.166	LUIS ALBERTO VALER 41820 Gt en r. r.
ARISTOBULO LOPEZ OSORIO	75064554	05 02 02	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 1.117.172	\$ 1.117.172	03/04/2022	30/06/2022	73	\$ 226.538	\$ 5.512	\$ 232.050	\$ 569.977	LUIS ALBERTO VALER 41820 Gt en r. r.
JOSE IVAN MONTOYA RAMIREZ	1055918658	05 02 02	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 1.117.172	\$ 1.117.172	05/03/2022	30/06/2022	73	\$ 226.538	\$ 5.512	\$ 232.050	\$ 569.977	JOSE IVAN MONTOYA RAMIREZ 1055918658
ALEXANDER ARBUIA	1055918256	05 02 02	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 1.117.172	\$ 1.117.172	06/03/2022	20/06/2022	73	\$ 226.538	\$ 5.512	\$ 232.050	\$ 569.977	ALEXANDER ARBUIA 1055918256
CRISTIAN DAVID GUARAN PARRA	1057784560	05 02 02	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 1.117.172	\$ 1.117.172	30/04/2022	10/06/2022	2	\$ 6.207	\$ 2.778	\$ 6.207	\$ 15.192	CRISTIAN DAVID GUARAN PARRA 1057784560
JUAN CARLOS OSORIO TANGARIFE	1055918970	05 02 02	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 1.117.172	\$ 1.117.172	30/04/2022	10/06/2022	2	\$ 6.207	\$ 2.778	\$ 6.207	\$ 15.192	JUAN CARLOS OSORIO TANGARIFE 1055918970
TOTAL A PAGAR \$ 2.138.887														

YoBo Residente de Obra

YoBo JUAN SEBASTIAN RIOS

 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	4	Fecha del informe	25/05/2022	Acta parcial		Acta final	4
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	076 DE 2022
Objeto:	CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS
Nombre Contratista:	CONSORCIO SECOIN
Fecha del contrato:	25/01/2022
Plazo de ejecución:	60 DIAS
Valor inicial:	\$ 216.194.689
Fecha de iniciación:	14/02/2022
Fecha de suspensión:	14/02/2022
Fecha de reiniciación:	07/03/2022
Fecha de terminación inicial:	14/04/2022
Nueva fecha de terminación:	05/05/2022
Adición (en valor):	-
Prórroga (en tiempo):	15 DIAS
Nueva fecha de terminación:	20/05/2022
Supervisor:	EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	20.34 %
Avance físico Acumulado	99.99 %

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
MARQUETALIA	ACUEDUCTO	0.37

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	75 DIAS
Tiempo total transcurrido:	75 DIAS
Avance Porcentual:	99.99 %


1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

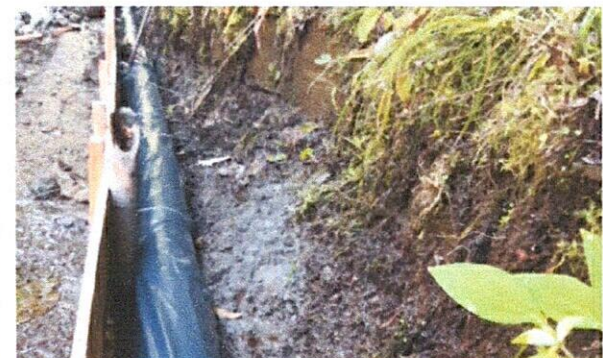




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

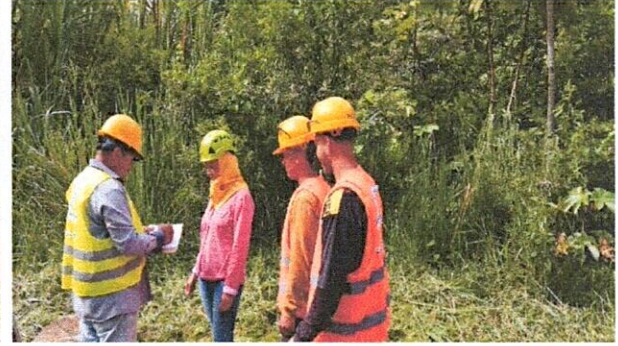



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


1.5. Problemáticas con la obra

Debido a la complejidad del sitio donde se esta llevando a cabo la obra que es una zona alejada de la vía principal del municipio se debió transporter la tubería en vehiculo, al hombre y a lomo de mula, lo que afecta los tiempos de ejecucion, ademas que el personal se debio conseguir de la cabecesra municipal debido a que las hay pocas personas de la zona de influencia de la obra..

Por las Fuertes lluvias que se han presentado como consecuencia de la ola invernal Tambien se ha visto afectada la obra porque en muchas ocasiones se ha retrasado la hora de comienzo de las labors porque escampa tarde esto Tambien afecta los tiempos de ejecucion.

En las excavaciones de las brechas por donde va a ir la tubería del acueducto hay presencia de una gran cantidad de roca lo que hace que la excavacion sea en un 30% material comun, un 20% en roca y un 50% en conglomerado lo que Tambien retrasa mucho las labors y no deja avanzar en el tiempo de ejecucion.

Por la ola invernal que esta atravesando el pais se ha dificultado mucho darle manejo al cauce ya que apenas se desvia al dia siguiente con la crecidas de la quebrada en horas de la noche barre con lo elementos utilizados para desviar o manejar el cauce.

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero


Inversión Contratada:	\$ 216.194.689
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 43.964.211
Porcentaje ejecutado en el periodo:	20.34%
Inversión total ejecutada:	\$ 216.193.035
Porcentaje total ejecutado:	99.99 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101050808	14/02/2022	20/08/2022	64.858.406,70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101050808	14/02/2022	20/05/2025	43.238.937,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101050808	14/02/2022	5 AÑOS	43.238.937,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101038790	14/02/2022	20/08/2022	64.858.406,70

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
LUIS ALBERTO VALENCIA	X	X	X	X	
JOSE ALBEIRO CIFUENTES	X	X	X	X	
ARISTOBULO LOPEZ OSORIO	X	X	X	X	
ALEXANDER ARDILA	X	X	X	X	
JOSE IVAN MONTOYA RAMIREZ	X	X	X	X	

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
25/05/2022	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE INFORME.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Población del municipio de Anserma Caldas que usan la vía y adicionalmente los usuarios del alcantarillado.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

NOMBRE DEL SUPERVISOR


EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ

CONTRATO No. 076-2022. MUNICIPIO MARQUETALIA

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO (m)	LONGI (m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (RUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
TRAMO 5	Conduccion	VEREDA SAN JUAN	10"	273	POLIE TILENO	Instalación con apertura de zanja		SI	NTC 4585	ICONTEC	E6020	EXTRUCOL	800.022.371-4	27/03/2022	8"	GALVANIZADO	273
TRAMO 6	Conduccion	VEREDA SAN JUAN	8"	130	POLIE TILENO	Instalación con apertura de zanja		SI	NTC 4586	ICONTEC	RT 007	EXTRUCOL	800.022.371-5	25/03/2022	8"	CONCRETO	130

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: 

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO SECOIN
 FIRMA CONTRATISTA: 

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL


CONTRATO	076 DEL 25 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SECOIN
NIT:	901.407.766-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C.	1.057.304.693
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	CAMBIO DE RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

COSTO DIRECTO INICIAL	\$ 216.194.689
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 160.203.549
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 38.448.852
IMPREVISTOS 5 %	\$ 8.010.177
UTILIDAD 5 %	\$ 8.010.177
I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 1.521.934
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 216.194.689


VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 216.193.035
SALDO NO EJECUTADO	\$ 1.654

RECURSOS	RECURSOS PROPIOS – OBRAS POIR
SUPERVISIÓN INICIAL	INGENIERO EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
PLAZO INICIAL	60 DIAS CALENDARIO
PRORROGA 01	15 DIAS CALENDARIO
CDP	000202 DEL 14-ENERO-2022
RP	000329 DEL 27-ENERO-2022

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de Mayo de 2022, se reunieron los señores EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ, Ingeniero de Zona, Supervisor del contrato por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el ingeniero JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO, representante legal del Consorcio SECOIN, NIT 901.407.766-1, contratista de obra, con el fin de suscribir el acta de recibo final del Contrato No 076 de 2022.



EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
INGENIERO DE ZONA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SECOIN
CONTRATISTA

CONTROL DE CANTIDADES								
Cambio red de conducción tramo 5 sector (segundo daño) en el municipio de Marquetalia Caldas.								
Fecha	ITEM:	19	Término fusión e instalación de Tubería de polietileno de 10"			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	ML			Total ML	Total ML		
	Cambio red de conducción tramo 5	18,00			18,00	18,00	termofusion tubería de 10" de polietileno	
	Total				18,00			
Fecha	ITEM:	19	Vehículo para transportar personal			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Día			Total Día	Total Día		
	Cambio red de conducción tramo 5	40,00			40,00	40,00	Transporte de personal para el cambio de la conducción sector 5	
	Total				40,00			
Fecha	ITEM:	27	Acompañamiento social durante toda la obra			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Mes			Total MES	Total MES		
	Cambio red de conducción tramo 5	0,50			0,50	0,50	Acompañamiento social durante la ejecución de la obra	
	Total				0,50			
Fecha	ITEM:	29	Trabajador Siso			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Mes			Total Mes	Total Mes		
	Cambio red de conducción tramo 5	0,70			0,70	0,70	Acompañamiento siso durante la ejecución de la obra	
	Total				0,70			
Cambio de red de conducción tramo 6 (SECTOR EL GUADUAL) en el municipio de Marquetalia Caldas								
Fecha	ITEM:	14	Sobre acarreo de Tubería al hombro y en bestia			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	ML			Total ML	Total ML		
	Cambio red de conducción tramo 6	4,00			4,00	4,00		
	Total				4,00			
Fecha	ITEM:	19	Vehículo para transportar personal			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Día			Total Día	Total Día		
	Cambio red de conducción tramo 6	20,00			20,00	20,00	Transporte de personal para el cambio de la conducción sector 5	
	Total				20,00			
ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 02								
Fecha	ITEM:	NP8	ARREGLO DAÑO ACUEDUCTO MUNICIPAL			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Und			Total Día	Total Día		
	Cambio red de conducción tramo 6	1,00			1,00	1,00	Arreglo de daño en el acueducto municipal	
	Total				1,00			
Fecha	ITEM:	NP9	TRANSPORTE TUBERIA DESDE SALAMINA A MARQUETALIA			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Viaje			Total Viaje	Total Viaje		
	Cambio red de conducción tramo 6	1,00			1,00	1,00	Transporte de tubería	
	Total				1,00			
ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 03								
Fecha	ITEM:	NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1'1'1 m. (incluye tapa con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Viaje			Total Viaje	Total Viaje		
	Cambio red de conducción tramo 6	1,00			1,00	1,00	Caja de inspección para instalación de válvula	
	Total				1,00			
Fecha	ITEM:	NP11	Suministro, transporte e instalación de concreto para recubrimiento de tubería de polietileno			Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Tubo	Total M3		Total M3
	Cambio red de conducción tramo 5	69,90	0,50	0,60	0,54	20,43	20,43	Camino real tubería de 8"
	Total					20,43		


 EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


 JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO
 Representante
 Contratista

Cambio de red de conducción tramo 6 (SECTOR EL GUADUAL) en el municipio de Marquetalia Caldas

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	
1	Localización y replanteo	ml	4,557.00	\$ 574.182	\$ 2,625,000	0,0	\$ 574.182	0,0	\$ 0,0	
2	Rocería y limpieza	m2	2,543.00	\$ 640.836	\$ 1,640,836	0,0	\$ 640.836	0,0	\$ 0,0	
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañueñas	m3	106.125	\$ 53.063	\$ 5,630,000	0,3	\$ 53.063	0,3	\$ 15,919,000	
4	Excavación en material común	m3	33.522	\$ 760.279	\$ 25,488,000	0,0	\$ 760.279	0,0	\$ 0,0	
5	Excavación en roca	m3	64.935	\$ 981.817	\$ 64,112,000	0,0	\$ 981.817	0,0	\$ 0,0	
6	Dispersión de material sobrante	m3	25.614	\$ 174.175	\$ 4,461,000	0,0	\$ 174.175	0,0	\$ 0,0	
7	Suministro, transporte e instalación dado en concreto Incluye formaleta	m3	1.518.264	\$ 2.823.971	\$ 4,286,000	0,0	\$ 2.823.971	0,0	\$ 0,0	
8	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo de 1/4" y 1/4" de 4.20 mpa (4200 kg/cm2)	kg	10.989	\$ 549.450	\$ 5,999,000	0,0	\$ 549.450	0,0	\$ 0,0	
9	Suministro, transporte e instalación de soldado de limpieza	m3	1.003.675	\$ 501.838	\$ 503,000	0,5	\$ 501.838	0,5	\$ 250,919,000	
10	Termo fusión e instalación de Tubería de polietileno de 8"	ml	86.505	\$ 10.899.630	\$ 933,000	0,0	\$ 10.899.630	0,0	\$ 0,0	
11	Empalmes a Tubería existente polietileno a AC Anclajes y Tubería galv. de longitud 2 m de 2". Debidamente con tornos de alambre galv. cal. 13	Un	1.398.600	\$ 1.398.600	\$ 1,943,000	0,0	\$ 1.398.600	0,0	\$ 0,0	
12	Termo fusión de portaflanche de 8" PN 12.5	Un	471.853	\$ 943.706	\$ 445,000	0,0	\$ 943.706	0,0	\$ 0,0	
13	Sobre acarreo de Tubería al hombro y en bestia	ml	19.980	\$ 2.517.480	\$ 50,000	0,0	\$ 2.517.480	0,0	\$ 0,0	
14	Acarreos en vehículo automotor desde el sitio donde está la Tubería hasta donde se placea la carga al hombro	Viaje	249.750	\$ 499.500	\$ 124,500	0,0	\$ 499.500	0,0	\$ 0,0	
15	Vehículo para transportar personal	Día	349.650	\$ 1.398.600	\$ 487,000	0,0	\$ 1.398.600	0,0	\$ 0,0	
16	Acarreos en bestia	Carga	88.978	\$ 4.448.900	\$ 394,000	30,0	\$ 4.448.900	30,0	\$ 133,437,000	
ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 01										
NP1	LLENO CON MATERIAL SOBRIANTE DE EXCAVACION	M3	35.498	\$ 6.530.212	\$ 232,000	63,0	\$ 6.530.212	63,0	\$ 413,331,000	
NP2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICO PARA PROTECCION DE TUBERIA	ML	9.176	\$ 367.040	\$ 3,364,000	55,5	\$ 367.040	55,5	\$ 20,341,000	
NP3	MANEJO DE CAUCE	UND	495.996	\$ 1.983.984	\$ 984,000	0,0	\$ 1.983.984	0,0	\$ 0,0	
NP4	EXCAVACION EN ZANIA - CONGLONERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	48.520	\$ 5.181.936	\$ 251,000	42,0	\$ 5.181.936	42,0	\$ 218,340,000	
NP5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PORTAFLANCHE EN POLIETILENO DE 8"	UN	651.273	\$ 651.273	\$ 405,000	0,0	\$ 651.273	0,0	\$ 0,0	
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BRIDA LOCA DE 8" EN HIERRO DUCTIL	UN	384.196	\$ 384.196	\$ 153,000	0,0	\$ 384.196	0,0	\$ 0,0	
ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 02										
NP7	Suministro, transporte e instalación de concreto para paso de quebrada Incluye formaleta	M3	1.518.264	\$ 1.518.264	\$ 2,299,000	29,0	\$ 1.518.264	29,0	\$ 43,999,000	
NP8	ARRREGLO DAÑO ACUEDUCTO MUNICIPAL	UN	643.539	\$ 643.539	\$ 643,539	1,0	\$ 643.539	1,0	\$ 643,539,000	
NP9	TRANSPORTE TUBERIA DESDE SALAMINA A MARQUETALIA VIAJE	VIAJE	1.201.055	\$ 1.201.055	\$ 1,201,055	1,0	\$ 1.201.055	1,0	\$ 1,201,055,000	
ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 03										
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1" * 1 m. (Incluye tapa con parrilla en vanilla 3/8 cada 10 cm.)	UN	1.323.374	\$ 1.323.374	\$ 1,323,374	1,0	\$ 1.323.374	1,0	\$ 1,323,374,000	
NP11	Suministro, transporte e instalación de concreto para recubrimiento de tubería de polietileno	M3	1.518.264	\$ 1.518.264	\$ 2,299,000	20,4	\$ 1.518.264	20,4	\$ 31,018,133,500	
COSTO TOTAL (INCLUYE A.I.U.)										
				\$ 216.194.689	\$ 160.203.549	\$ 147.116.991	\$ 109.015.925	\$ 92.231.069	\$ 68.344.623	\$ 62.967.195
				\$ 160.203.549	\$ 147.116.991	\$ 109.015.925	\$ 92.231.069	\$ 68.344.623	\$ 62.967.195	\$ 43.964.212
				\$ 38.448.852	\$ 8.010.177	\$ 5.450.796	\$ 5.450.796	\$ 26.183.822	\$ 16.402.710	\$ 11.988.316
				\$ 8.010.177	\$ 8.010.177	\$ 5.450.796	\$ 5.450.796	\$ 3.417.231	\$ 3.417.231	\$ 2.332.982
				\$ 214.672.765	\$ 1.521.934	\$ 146.081.340	\$ 1.035.651	\$ 91.581.795	\$ 16.910.671	\$ 62.523.928
				\$ 1.521.934	\$ 1.521.934	\$ 1.035.651	\$ 1.035.651	\$ 649.274	\$ 443.267	\$ 119.889
VALOR TOTAL OBRA				\$ 216.194.689	\$ 160.203.549	\$ 147.116.991	\$ 109.015.925	\$ 92.231.069	\$ 68.344.623	\$ 62.967.195
				\$ 160.203.549	\$ 147.116.991	\$ 109.015.925	\$ 92.231.069	\$ 68.344.623	\$ 62.967.195	\$ 43.964.212
				\$ 38.448.852	\$ 8.010.177	\$ 5.450.796	\$ 5.450.796	\$ 26.183.822	\$ 16.402.710	\$ 11.988.316
				\$ 8.010.177	\$ 8.010.177	\$ 5.450.796	\$ 5.450.796	\$ 3.417.231	\$ 3.417.231	\$ 2.332.982
				\$ 214.672.765	\$ 1.521.934	\$ 146.081.340	\$ 1.035.651	\$ 91.581.795	\$ 16.910.671	\$ 62.523.928
				\$ 1.521.934	\$ 1.521.934	\$ 1.035.651	\$ 1.035.651	\$ 649.274	\$ 443.267	\$ 119.889
ADMINISTRACION										\$ 3.028.777
IMPREVISTOS										\$ 630.995
UTILIDADES										\$ 630.995
SUMA ANTES IVA										\$ 16.910.671
I. V. A.										\$ 119.889
VALOR TOTAL OBRA										\$ 17.030.560
										\$ 12.619.904
										\$ 11.988.316
										\$ 630.995
										\$ 630.995
										\$ 16.910.671
										\$ 119.889
VALOR TOTAL OBRA										\$ 17.030.560

CONSORCIO FERRER... PALACIO
JOHAN SEBASTIAN...
CONTRATISTA

EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
INGENIERO DE ZONA ORIENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE13Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-27 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
492e5d4f2b29ead579f079e254f2a308990e6d89eaa4430b59c6
559cf1920be78f4d9f7eb6319aff7ac01b7eb0ae7870RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CONSORCIO SECOINRAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS S.A E.S.PNIT:
901407766NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
43964211FORMA DE PAGO:
CONTADODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-11-25 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
5dea8623b2194631698091a7b5dbfd7cf06dc8e2b4a0c25cb3a6
a92674744d7b9f42846431c0a2a50b05eaba8396db46PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-28 09:05:04.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO SECOIN**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE13

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-27 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
492e5d4f2b29ead579f079e254f2a308990e6d89eaa4430b59c6
559cf1920be78f4d9f7eb6319aff7ac01b7eb0ae7870

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
ee53c2cee8444d4b27b6f4c9f6a0b22de53346ab5fee4c69c28f4
9b13843667cf05f527c7b0beefb41f8c0f43f574ff

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-28 12:00:00.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO SECOIN

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
915c66efee9c05926313048589e0a7ea8b9c1737daf5d91b6f23
831b5ce150817dca6f397b10b81f8787aa72944774aa

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-28 12:00:00.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO SECOIN

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Agricultura

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

✓

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE13

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-27 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
492e5d4f2b29ead579f079e254f2a308990e6d89eaa4430b59c6
559cf1920be78f4d9f7eb6319aff7ac01b7eb0ae7870

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
5acc7028998281b19c86e5af381c7f45d6cf660124094adea80d
780f41eaae06383d5739a966260cf24bceaa7ae712a5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-28 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO SECOIN

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

✓ Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 10/28/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ





El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO SECOIN CONSORCIO SECOIN identificado con el NIT 901407766, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
076	CAMBIO RED TRAMO 1, 4, 5	Marquetalia Caldas	431,750	2022-05	07-JUN-2022	75655360
		Total	431,750			

Expedido por el SENA, a los siete (07) días del mes de Junio de 2022

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2022-06-07

Generado por : Cesar Augusto Zamora Vasco

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 4089419034 - 146366

SENA, MÁS TRABAJO



Certifico No.
SC-CER339681-1

Pág. 1





17 - 1080
Manizales

Señores
CONSORCIO SECOIN
NIT 901396694
Mirador de las lomas manzana 28 casa 4
riossebastian1990@gmail.com
Manizales - Caldas

Asunto: Respuesta a radicado 7-2022-152143

Certificación FIC. 77-06609

Respetados señores:

01 NOV 2022


De acuerdo con la solicitud radicada el día 03 de junio del presente año, atentamente nos permitimos adjuntar copia del certificado generado por nuestro Sistema de Información SIREC, como documento oficial del SENA, en el que se evidencia el pago efectuado por concepto de FIC correspondiente al contrato de obra 076, suscrito con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de marzo abril y mayo de 2022, según recibo de pago número:

75655360

De otra parte, se les recuerda que los pagos que se hacen por contribución FIC los deben realizar dentro de los primeros diez días del mes siguiente a cada mes de ejecución de cada obra, teniendo en cuenta que el pago extemporáneo generará intereses moratorios establecidos por la Superintendencia Financiera.

Finalmente, para radicar las comunicaciones al SENA por vía electrónica lo deben hacer en el siguiente link: servicioalciudadano@sena.edu.co.

Atentamente,


JEANNETH ADRIANA GIL BOHORQUEZ
Coordinadora Grupo relaciones corporativas

Anexos: un (1) folio, certiaportes.

NIS: 2022-01- 209761

Copia: Cesar Augusto Zamora Vasco, cazamora@sena.edu.co

Proyectó: César Augusto Zamora Vasco
Cargo: Técnico G 03 - Grupo relaciones corporativas

Regional Caldas
Kilometro 10 vía al Magdalena, Manizales-PBX 606 8931720

