	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 009 DE 2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	9.463.000,00
				2. VALOR ADICION	0,00
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.463.000,00
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0,00
CDP (#, rubro y fecha)	20230297 DE 27/01/2023, RUBRO 2320101001030812			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.463.000,00
RP (#, rubro y fecha)	322 DE 08/02/2023, RUBRO 2320101001030812			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0,00

OBJETO DEL CONTRATO: DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés E.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X


Fecha de presentación 09/08/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

13-03-23  
p. 12 m



	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 009 DE 2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	9.463.000,00	
				2. VALOR ADICION	0,00	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.463.000,00	
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0,00	
CDP (#, rubro y fecha)	20230297 DE 27/01/2023, RUBRO 2320101001030812			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.463.000,00	
RP (#, rubro y fecha)	322 DE 08/02/2023, RUBRO 2320101001030812			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0,00	
OBJETO DEL CONTRATO:	DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SEC FOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>						
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en: Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X	
15- Acta parcial o final del contrato.					X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Giraldo R  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

09/03/23

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOHANN MANUEL SABOGAL	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
70556183867	CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## **JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**

**CC 15.902.864**

**T.P 26804-T**

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
NIT 4.413.512-7**

Que la empresa **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, con Nit **4.413.512**, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de enero del 2023.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los (23) días del mes febrero (02) de dos mil veintitrés 2023.

Atentamente;



---

**JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**  
Contador Público Titulado  
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T



JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO  
C.C. 15902864  
RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990  
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

257582


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 15.902.864  
GIRALDO NARIÑO

APELLIDOS JOHN JAIRO

NOMBRES

*John Jairo Narino*  
FIRMA




Identificación Pública S.A. 1420770119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 5444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960  
CHINCHINA (CALDAS)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 O+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
12-JUL-1979 CHINCHINA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008 0004109994A 1 4820002221

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 02	Año: 2023	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$2.362.534		25757088



IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
PT-939486	01	No	No	No	17	174	5432201	Fijo	PRINS MENDEZ EDGARDO JOSE		\$1.160.000
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	5454302	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID		\$1.589.200

Identificación	I N G	R E T	D A D	T V	V V S	F e c h a	NOVEDADES			F e c h a	I r p	F e c h a
							F e c h a	I g e	F e c h a			
PT - 939486	X											
CC - 1054996263												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES							
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot
PT - 939486	FORVENIR	20	\$773.334	0.1600000	\$123.800	\$0	\$123.800
CC - 1054996263	FORVENIR	30	\$1.589.200	0.1600000	\$254.300	\$0	\$254.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD														
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
											IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
PT - 939486	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	\$773.334	0.0400000	\$31.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$773.334	17	0.0696000	\$53.900
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.589.200	0.0400000	\$63.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.589.200	17	0.0696000	\$110.700

AFORTES PARAFISCALES											
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
PT-939486	CCF DE CALDAS	20	\$773.334	0.0400000	\$31.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.589.200	0.0400000	\$63.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

**TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 02**

**TOTAL APORTE DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$378.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$378.100

**TOTAL APORTE DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TIGE	AUT. TIGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORES COT	SUBTOT AL APORES	RADICACIÓN AUTOLIGAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$63.60	\$0	0	0	\$0	\$63.60	0	\$0	\$0	\$63.60	\$0	0	\$0	\$0	\$63.60	\$0	\$0	\$63.60
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$31.00	\$0	0	0	\$0	\$31.00	0	\$0	\$0	\$31.00	\$0	0	\$0	\$0	\$31.00	\$0	\$0	\$31.00

**TOTAL APORTE DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$164.600	0	\$0	\$0	\$164.600	0	\$0	\$164.600	0	\$0	\$0	\$164.600

**TOTAL APORTE PARAFISCALES**

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTE	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$94.600	0	\$0	\$94.600
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0



		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		VALOR
SALUD	2		\$94.600
PENSIONES	1		\$378.100
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$164.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$94.600
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
FSAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$731.900

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2023-03-03 Fecha límite de pago: 2023-03-03 Fecha de pago: 2023-03-03 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2023-02 Período salud: 2023-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25757088	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$378.100	\$378.100	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$378.100	\$378.100	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$63.600	\$63.600	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$0	\$0	\$0	\$31.000	\$31.000	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		2	2	\$0	\$0	\$0	\$94.600	\$94.600	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$164.600	\$164.600	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$164.600	\$164.600	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$94.600	\$94.600	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$94.600	\$94.600	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$731.900	\$731.900	

Imprimir
Descargar Resumen



# CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDEZ ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2023-03-03
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDEZ ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	25547696
REFERENCIA PAGO(PIN)	I
PERIODO PENSIÓN	2023-02
PERIODO SALUD	2023-02
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TAE	TDE	TAP	TDP	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LIMA	Fecha LIMA Inicio	Fecha LIMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin	
																										0		

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o Valor
					Número Autorización	Valor	
30	1,160,000	0,1250000	\$ 145,000	\$ 0	0	\$ 0	0

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,160,000	0,0666000	\$ 80,800	17174

## APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar:		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot.	Cot. Obligatoria
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000

## TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 145,000	\$ 80,800	\$ 0	\$ 225,800

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2023-03-03 Fecha limite de pago: 2023-03-03 Fecha de pago: 2023-03-03 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2023-02 Período salud: 2023-02 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25547696	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	<a href="#">SELECCIONAR TODOS</a>   <a href="#">SELECCIONAR NINGUNO</a>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$145.000	\$145.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA- SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$80.800	\$80.800	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$225.800	\$225.800	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 25757088  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2023-03-03

**PAGADA**

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL VALLEGO HERRERA	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D. V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMA IL.COM
FAX	8403316	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL, Tipo de aportante
			0
			Empleador
			CHINCHINA
			98403316

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 02	Año: 2023	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$2.362.534	Nro. DE RADICACIÓN
				25757088



IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
PT-939486	01	No	No	No	17	174	5432201	Fijo	PRINS MENDEZ EDGARDO JOSE	\$1.160.000
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	5454302	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID	\$1.589.200

NOVEDADES														
Identificación	I Fecha Ing	R Fecha Ret	T T D A S	V V S	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L	Fecha T S L
PT - 939486		X												
CC - 1054996263														

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES						
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil
PT - 939486	PORVENIR	20	\$773.334	0.1600000	\$123.800	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.589.200	0.1600000	\$254.300	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD														
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
											IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	Valor
PT - 939486	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	\$773.334	0.0400000	\$31.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	17	0.0696000	\$53.900
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.589.200	0.0400000	\$63.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	17	0.0696000	\$110.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
PT-939486	CCF DE CALDAS	20	\$773.334	0.0400000	\$31.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.589.200	0.0400000	\$63.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0



TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$378.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR NETO APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR	TOTAL PAGAR UPC	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$63.60	\$63.60	0	\$0	\$0	\$0	\$63.60	\$0	0	\$0	\$0	\$63.60	\$0	\$0	\$63.60
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$31.00	\$31.00	0	\$0	\$0	\$0	\$31.00	\$0	0	\$0	\$0	\$31.00	\$0	\$0	\$31.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERIOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$164.600	\$0	\$0	\$164.600	0	0	\$0	\$164.600	0	\$0	\$0	\$164.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE CALDAS	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	2	\$94.600	0	\$0	\$94.600
SENA	0	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	0	\$0	0	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	2		\$94.600
PENSIONES	1		\$378.100
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$164.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$94.600
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$731.900



# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	85340975	1932902086	23/02/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.152**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 58,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 58,000.00	COP\$ 58,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	85340975	1932902086	23/02/2023

**Número de Identificación**

4413512

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

VALLEJO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadania

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 7 No. 6 - 27

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

claudi3032@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

009

**Nombre Obra**

EMERGENCIA MARMATO ✓

**Fecha Terminación Obra**

20/02/2023 ✓

**Tipo FIC**

Mensual ✓

**Mes Periodo a Pagar**

2

**Costo Total Mano de Obra**

9463000.00 ✓

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

HERNADO ANTONIO ✓

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8446597

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

009 ✓

**Fecha Inicio Obra**

06/02/2023 ✓

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

4413512 ✓

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

9463000.00 ✓

**Número de Trabajadores en el Periodo**

2 ✓

**Aporte FIC**

58000.00

**Valor del Pago**

58000.00





HERNANDO ANTONIO  
VALLEJO HERRERA  
NIT 4.413.512-7  
CR 7 6 27  
Tel: (57) 3148446597  
Chinchiná - Colombia



Nota Crédito  
No. 1 14

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha Nota Crédito	2023-03-03
Factura de Venta	FE-80
Generación	03/03/2023, 17:20
Expedición	03/03/2023, 17:20
Vencimiento	25/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESVIO DE TUBERIA POR TERMO FUSION Y EMERGENCIA SECTOR LA QUIEBRA Y RETIRO DE VALVULAS SECTOR ECHANDIA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS	1.00	7,012,227.00
2	ADMINISTRACION	1.00	2,033,546.00
3	UTILIDADES	1.00	417,227.09

Total ítems: 3

**Valor en Letras:**

Nueve millones cuatrocientos sesenta y tres mil pesos m/cte con nueve cent.

**Condiciones de Pago:**

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-03-25 por \$ 9,463,000.09

Total Bruto	9,396,384.00
IVA 19%	66,616.09
Total	9,463,000.09

**Observaciones:**

CUDE: e8d8594449b90cb36942616a7cef48e1c746f855ff8f396a5c8071d5ad6962ff299d27d506488fd00a1ca197cf1f5e4c  
CUFE factura: 99601691f8e43d0015ec6b9b3872ae41f27d4e4b5b53c38666b4314f58b13824ceca5ff9a167cf623f69d892228f661



HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
HERRERA  
NIT 4.413.512-7  
CR 10 2 13  
Tel: (036) 3116183675  
Chinchiná - Colombia  
daudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 82

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2023, 17:29 ✓
Expedición	03/03/2023, 17:29 ✓
Vencimiento	02/04/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESVO DE TUBERIA POR TERMO FUSION Y EMERGENCIA SECTOR LA QUIEBRA Y RETIRO DE VALVULAS SECTOR ECHANDIA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS	7,012,227.00	7,012,227.00
2	ADMINISTRACION	2,033,546.00	2,033,546.00
3	UTILIDADES	350,611.00	417,227.09

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Nueve millones cuatrocientos sesenta y tres mil pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-02 por \$ 9,463,000.09

Total Bruto	9,396,384.00
IVA 19%	66,616.09
Total a Pagar	9,463,000.09

Observaciones:

ACTA 009 DE 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
CUFE: 3156c4e8e2bd322c165c6034ed099f2c8d3f03e3865c1ea7742bb47a16e7bca6b1e20c67dc7bd13df48206da3ed8b8

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo S.A.S Nit: 830.049.145-9

MAL



**INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL**

**CONTRATANTE**

**EMPOCALDAS S.A E.S.P.**



**CONTRATISTA**

**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA** ✓

**ACTO 009 DE 2023 "DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS".** ✓

**SUPERVISOR**

**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ** ✓

**MANIZALES, CALDAS** ✓

**FEBRERO DE 2023** ✓

**1 OBRA:**

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **HERNANDO VALLEJO** en el periodo comprendido entre el 06 de FEBRERO de 2023 - 20 de FEBRERO de 2023, en el marco de la ejecución del acto 009 de 2023 por emergencia cuyo objeto es "DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS".

**1.1 FICHA TECNICA**

Número del contrato	ACTO 009 DE 2023 /
Objeto:	"DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS". /
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	06 de febrero de 2023 /
Plazo de ejecución:	15 días calendario /
Valor Total:	\$ 9.463.000 /
Fecha de iniciación:	06 de febrero de 2023 /
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación:	20 de febrero de 2023 /
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ /

**1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO**

"DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS".

**1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA**

Municipio de MARMATO CALDAS.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:**

En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá, posterior a esto, se realizaron las actividades correspondientes a cada ítem contractual, excavación en zanja de material rocoso y conglomerado, instalación de tubería de 2" en polietileno por termofusión, instalación de acometidas de 1/2", Traslado de medidores y finalizar con la reparación de pavimento afectado durante la ejecución de obra.

A continuación, un resumen del estado en el que se entrega el contrato terminado en su totalidad.



ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENTE ACTA		
			VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Localización y replanteo	Gl	\$ 100.000	1,00	\$ 100.000,00
<b>3</b>	<b>EXCAVACIONES</b>				
4	Excavaciones en zanja- material Rocoso	m3	\$ 45.000	18,00	\$ 810.000,00
5	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	\$ 25.000	17,00	\$ 425.000,00
6	Dispersión de sobrantes	m3	\$ 18.000	1,00	\$ 18.000,00
<b>7</b>	<b>ACUEDUCTO</b>				
8	Instalación de tubería de 2" polietileno por termo fusión	ml	\$ 8.000	70,25	\$ 562.000,00
9	Empalmes de tubería de 2" polietileno a polietileno	Un	\$ 500.000	2,00	\$ 1.000.000,00
10	Demolición de pavimento	m3	\$ 120.000	2,00	\$ 240.000,00
11	Reconstrucción de pavimento	m3	\$ 1.100.000	2,00	\$ 2.200.000,00
12	Suministro e instalación de acometida de 1/2" (incluye silleta, manguera de 1/2" y llave) longitud promedio 15 mts	Un	\$ 175.000	6,00	\$ 1.050.000,00
13	Traslado de medidores (incluye instalación de la caja)	Un	\$ 50.000	6,00	\$ 300.000,00
14	Transporte de tubería de Chinchiná a Marmato (un rollo de 2")	Gl	\$ 350.000	1,00	\$ 350.000,00
15	Transporte de personal de Chinchiná a Marmato	Día	\$ 320.000	5,00	\$ 1.600.000,00
16	Retiro de válvulas en sector de Echandía y empalme de nuevo	Gl	\$ 650.000	1,00	\$ 650.000,00
<b>17</b>	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				

18	Suministro e Instalación de collarín para acometida domiciliaria en tubería de polietileno de conexión de 2" a 1/2"	Un	\$ 15.8000	10,00	\$ 158.000,00
<b>COSTO TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 9.463.000,00</b>


COSTO DIRECTO		\$ 7.012.227,00
ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 2.033.546,00
IMPREVISTOS	0%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ 350.611,00

SUMAS ANTES DE IVA		\$ 9.396.384,00
IVA Sobre utilidades	19%	\$ 66.616,00


<b>COSTO TOTAL OBRA</b>		<b>\$ 9.463.000,00</b>
-------------------------	--	------------------------

<b>TOTAL, ACTA 01 Y FINAL</b>		<b>\$ 9.463.000,00</b>
-------------------------------	--	------------------------



1. REGISTRO FOTOGRAFICO

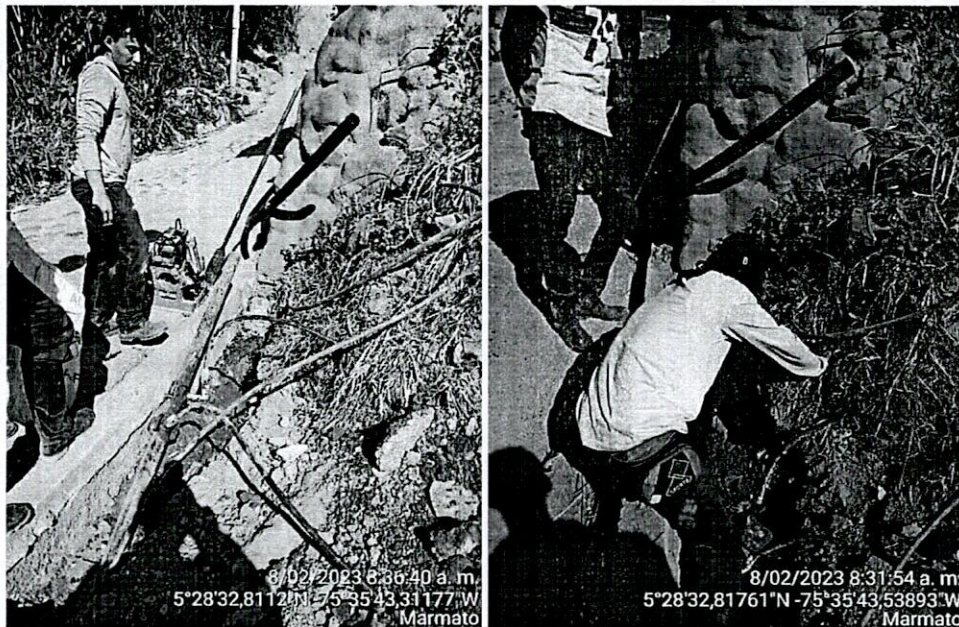





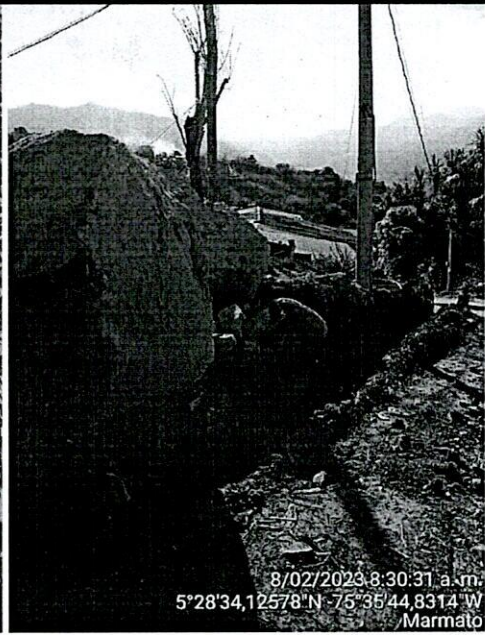






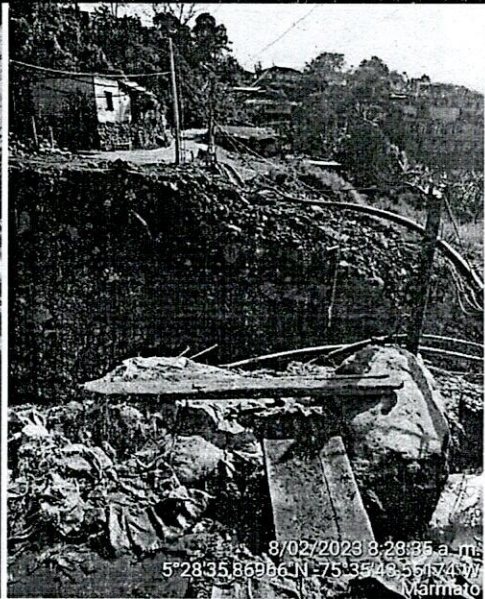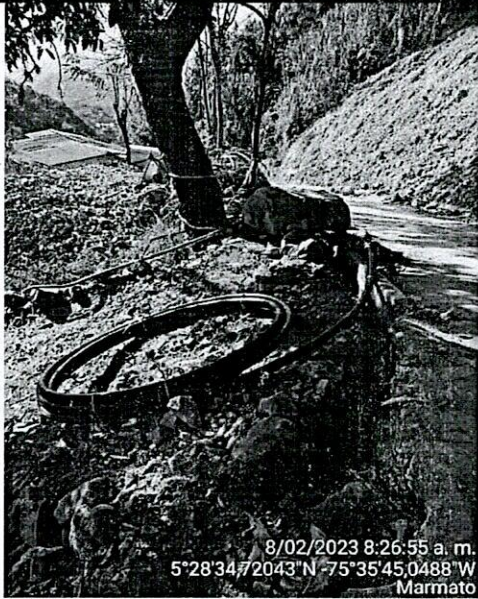





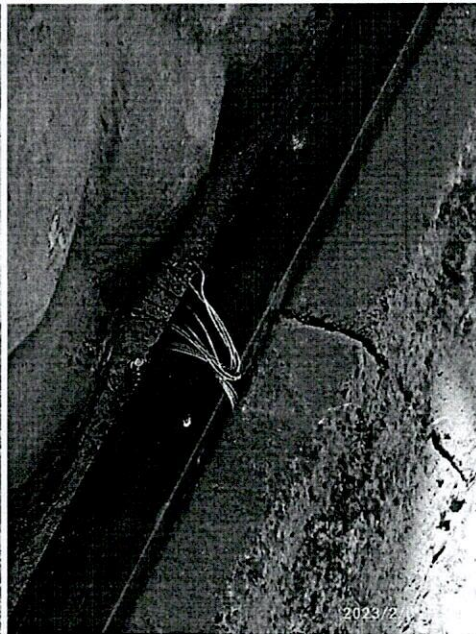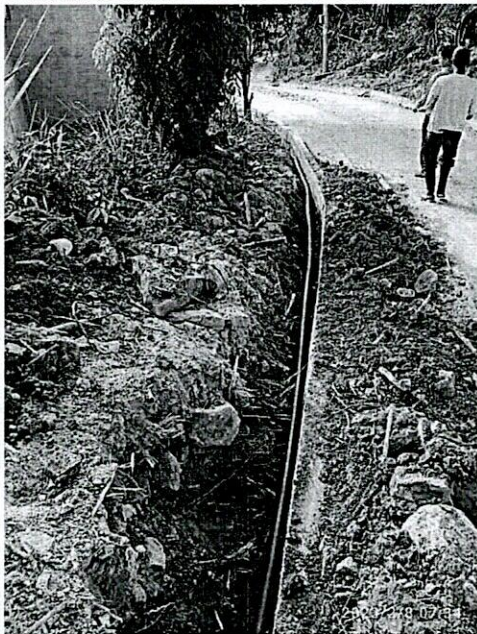






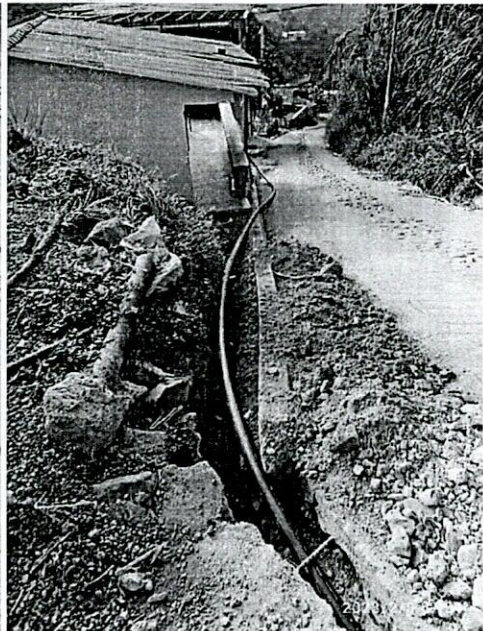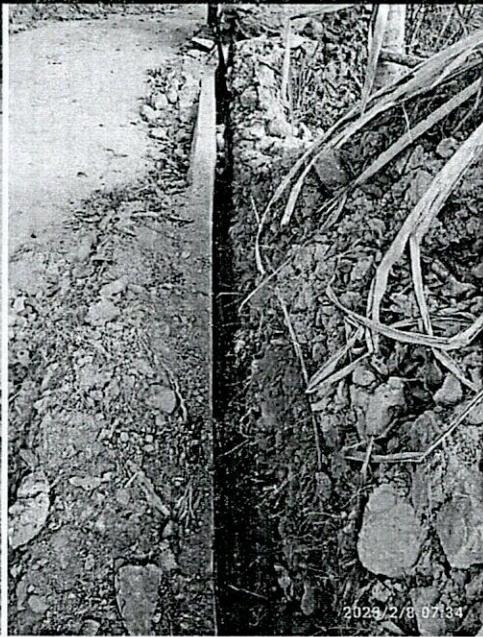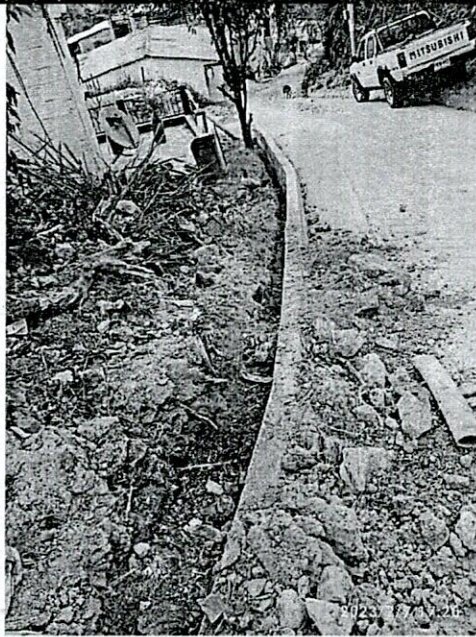





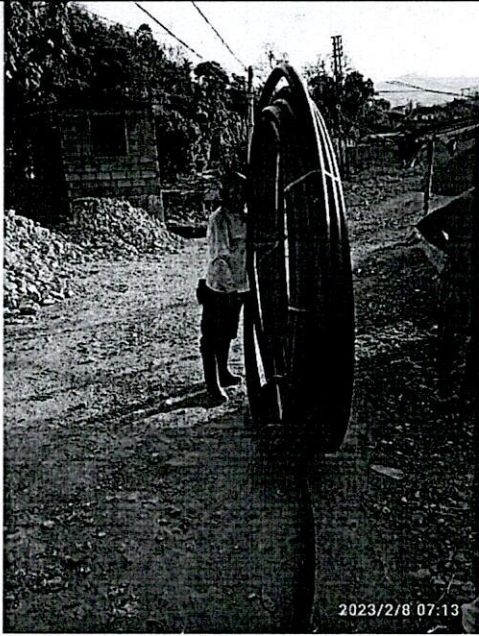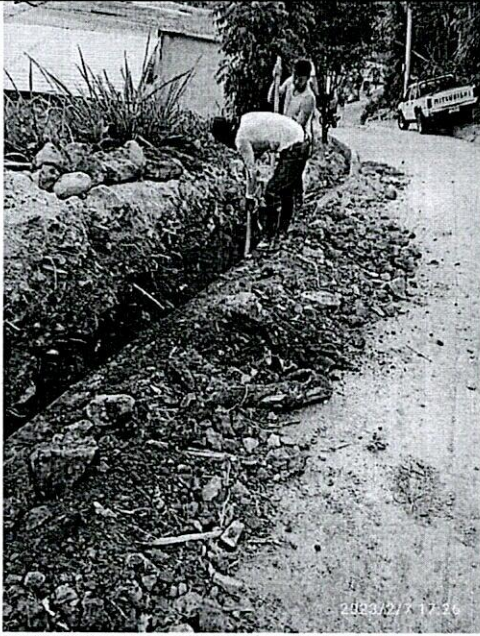






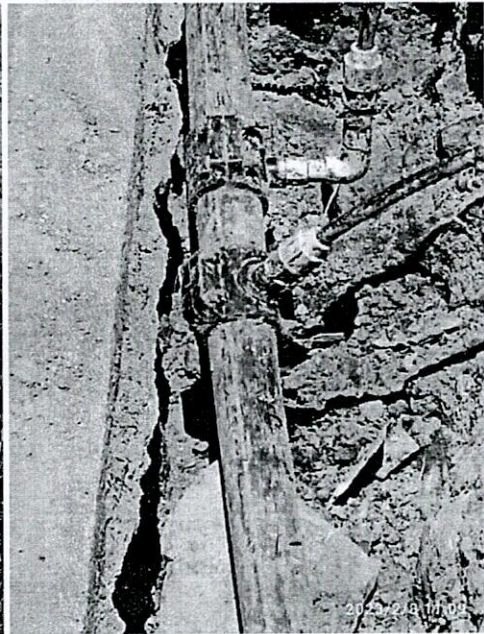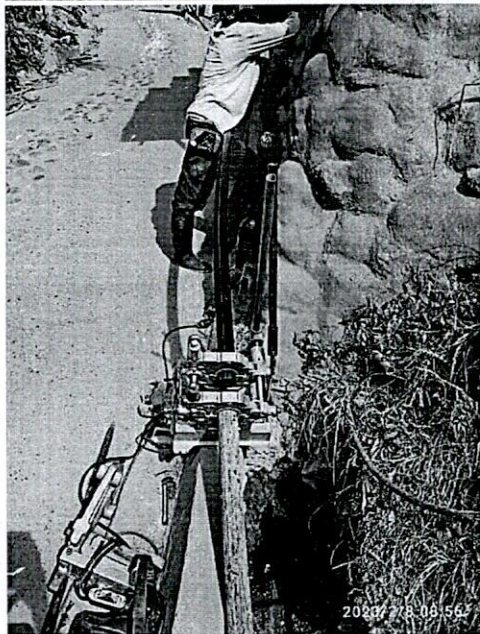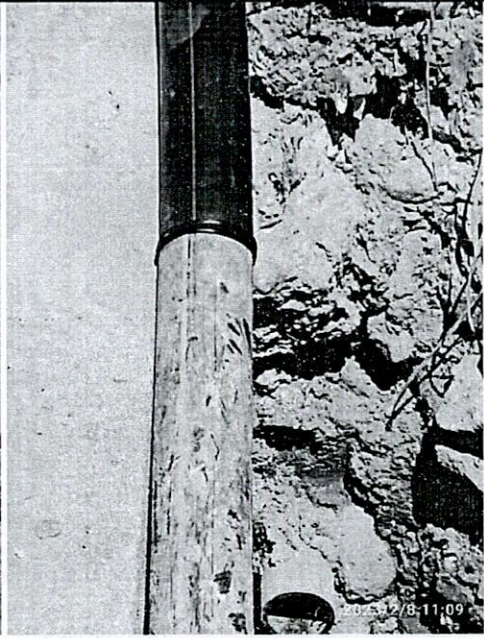





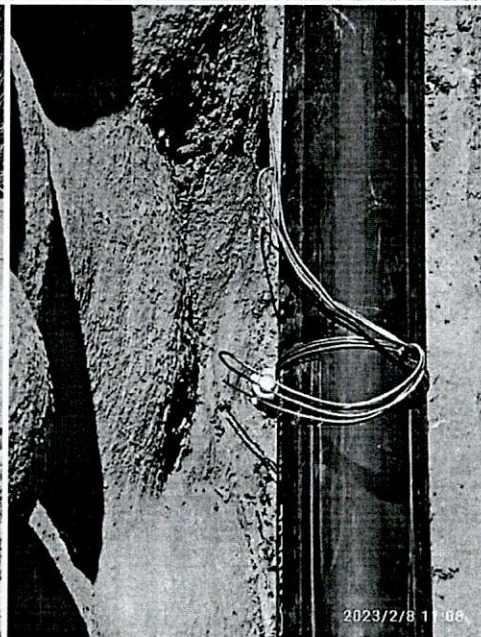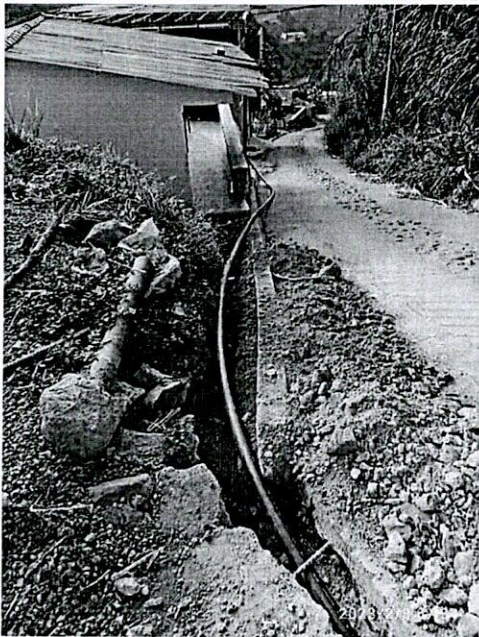






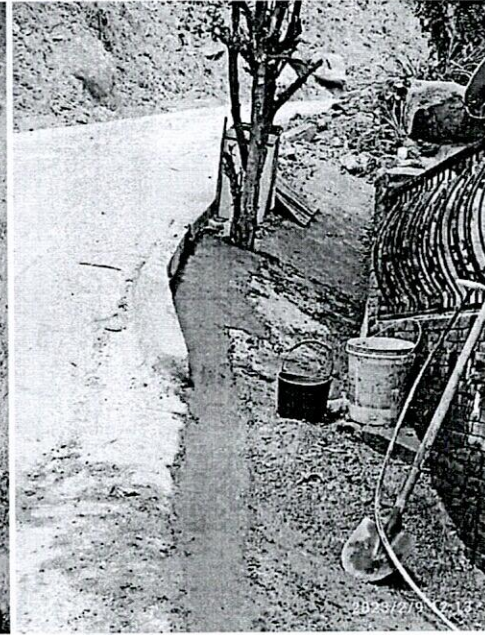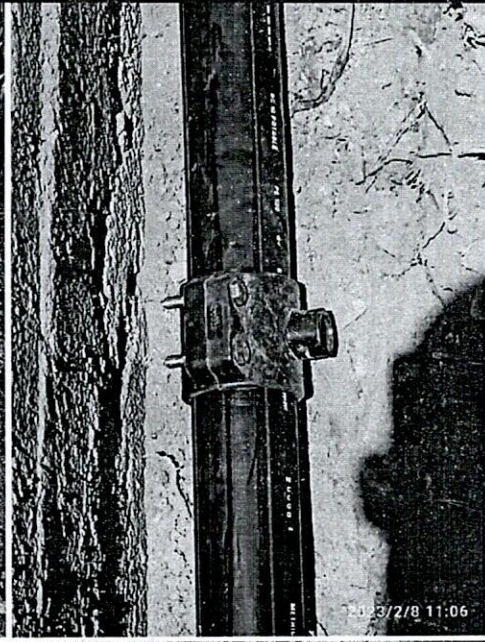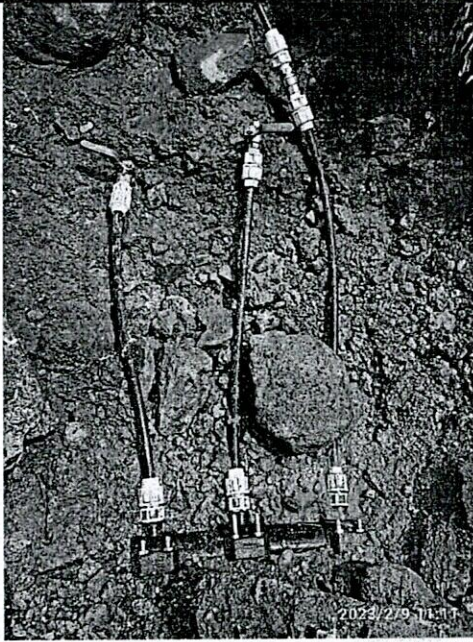



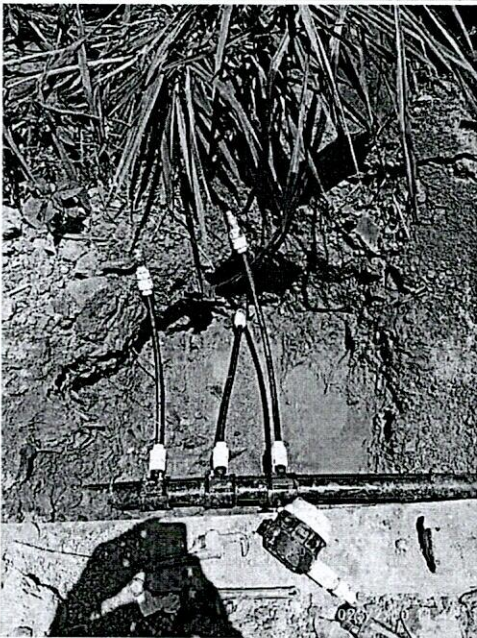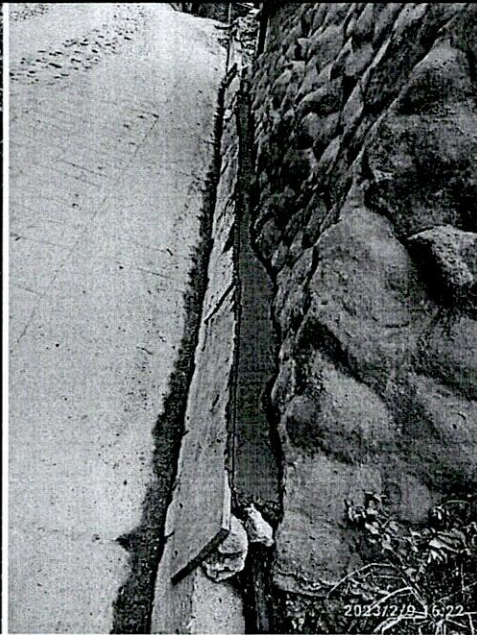



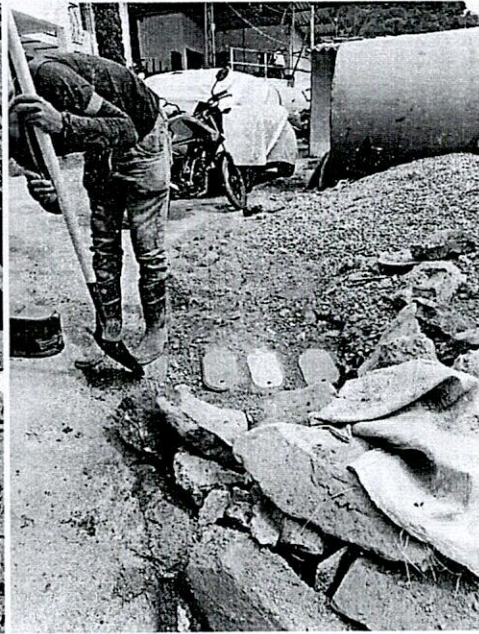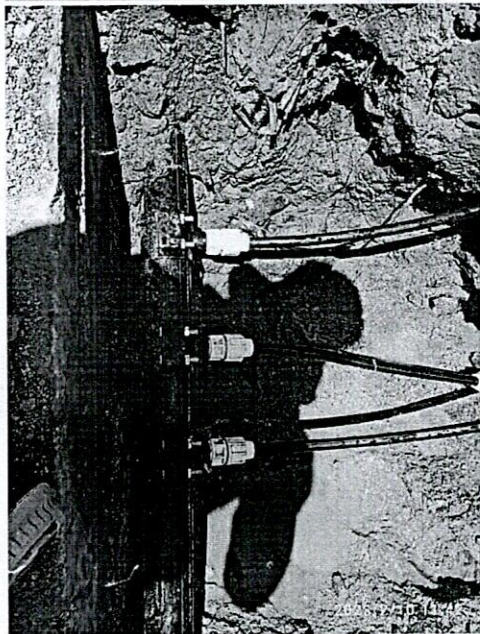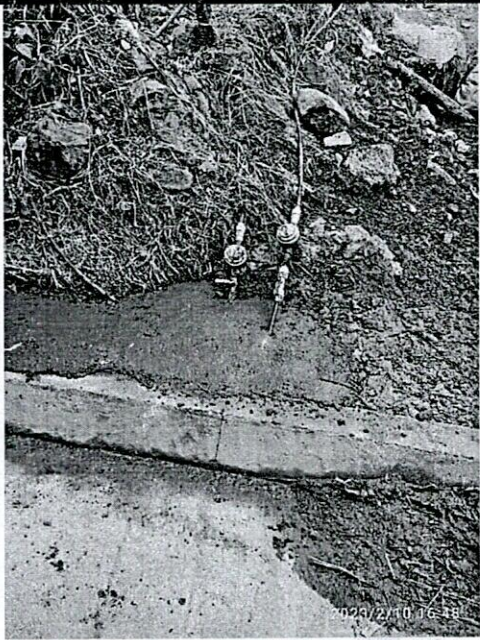






En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta parcial y final en el contrato de obra cuyo objeto es la "DESIVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS".

Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Johann Manuel Sabogal Ramírez el cual aprobó cada una de estas.

  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
4.413.512  
CONTRATISTA

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NIT:4.413.512

NOMINA DEL 06 DE FEBRERO HASTA 20 DE FEBRERO 2023

ACTA 009


No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE	Dias	Salario	Auxilio	Devengado	Salud		Pensión	NETO A PAGAR QUINCENAL	RR/MA	
		NOMBRES	APELLIDOS						CARGO	SUELDO				DIAS TRABAJADOS
1	1054896263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.589.200	15	794.600	70.000	864.600	-	31.784	31.784	801.032	<i>[Signature]</i>
2	939488	JOSE EDGARDO	PRINS MENDEZ	AUXILIAR	\$ 1.160.000	15	580.000	70.000	650.000		23.200	23.200	603.600	<i>[Signature]</i>
		TOTAL			2.749.200	30	1.374.600	140.000	1.514.600	0	54.984	0	1.404.632	

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NIT:4.413.512

*[Handwritten mark]*



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	01 ✓	Fecha del informe	Febrero 20 de 2023 ✓	Acta parcial		Acta final	X
----------------	------	-------------------	----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 009 DE 2023 ✓
Objeto:	"DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS". ✓
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓
Fecha del Acto:	06 de febrero de 2023 ✓
Plazo de ejecución:	15 días calendario ✓
Valor inicial:	\$ 9.463.000 ✓
Fecha de iniciación:	06 de febrero de 2023 ✓
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	20 de febrero de 2023 ✓
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)



<b>INSTALACIÓN DE TUBERÍA</b>		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
MARMATO	ACUEDUCTO	0.07

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15 DIAS
Tiempo total transcurrido:	15 DIAS
Avance Porcentual:	100%



1.4. Registro fotográfico

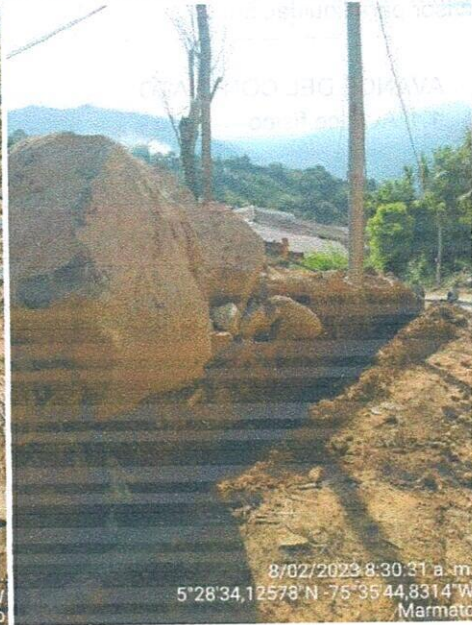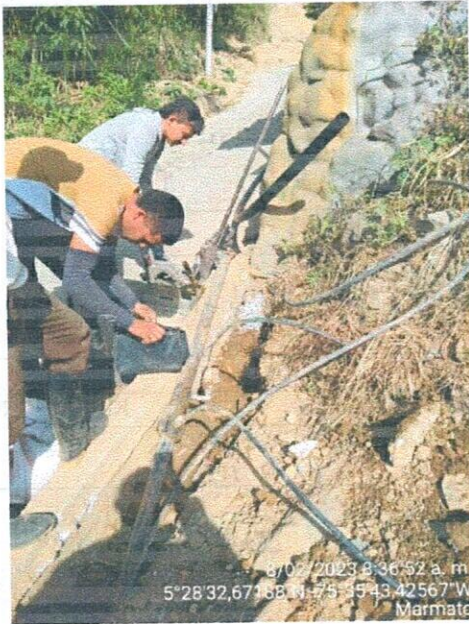







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

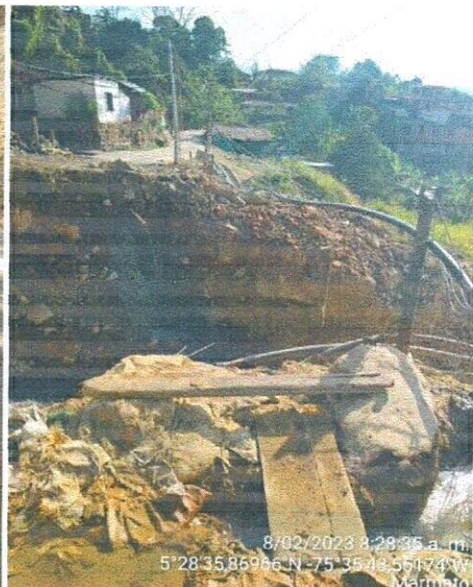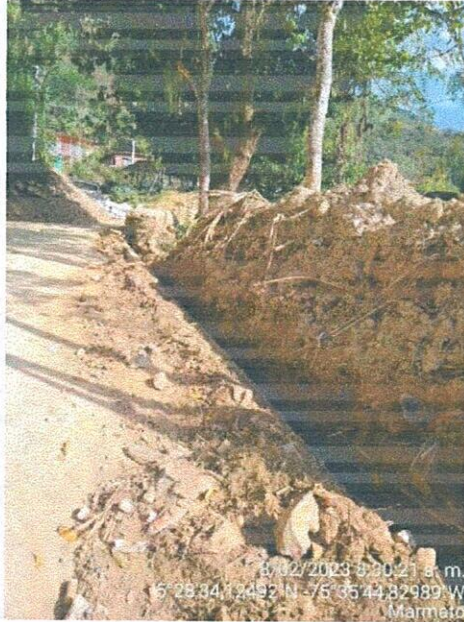






F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

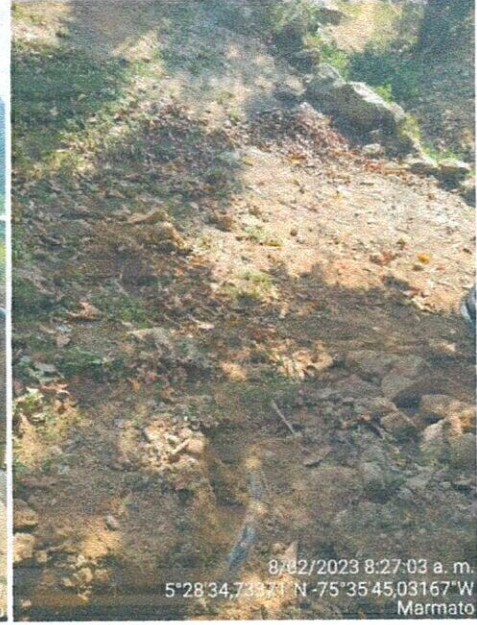





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL








F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

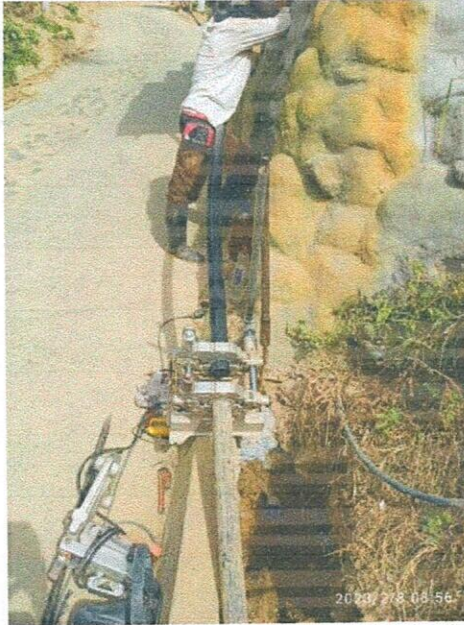






F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

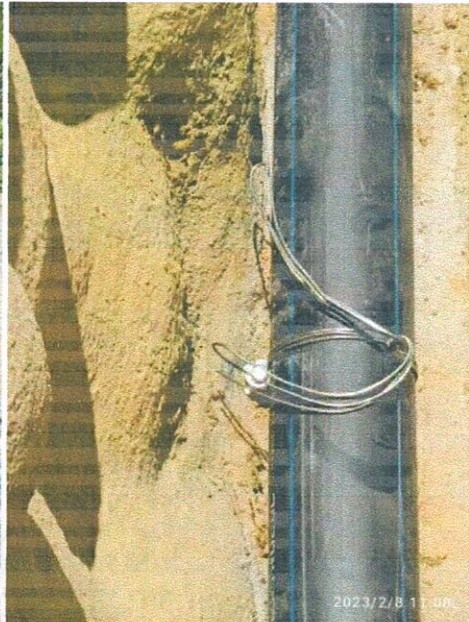





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL








F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

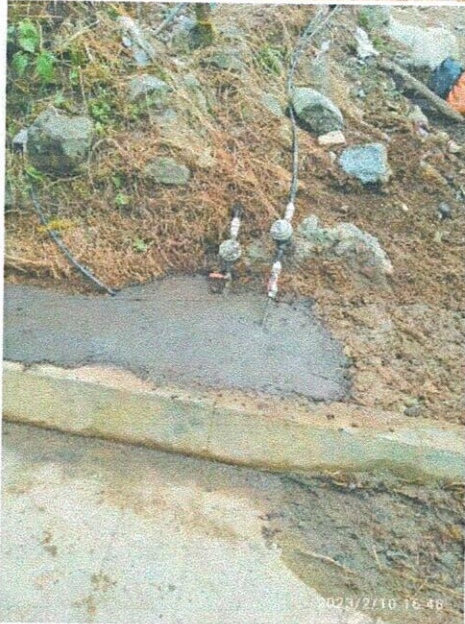






#### 1.5. Problemáticas con la obra.

Al realizar el alineamiento por otro costado de la tubería se debió pensar en realizar la instalación de todas las acometidas con sus respectivos collarines desde el nuevo trazado y adicionalmente colocar toda la longitud desde allí desde este punto la instalación de los



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

medidores a un costado de la vía y llevar hasta el punto de conexión al frente de las viviendas. Adicionalmente se encontró roca y mucho material conglomerado en las excavaciones

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	9.463.000
Inversión ejecutada en el periodo:	9.463.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	9.463.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

#### 2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	X	X	X
JOSE EDGARDO PRINS MENDEZ	X	X	X

#### 3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)


Se anexan planillas de pago de seguridad social de persona natural en la lista de chequeo de pago actas

#### 4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica




 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENTE ACTA		
			VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Localización y replanteo	Gl	\$ 100.000	1,00	\$ 100.000,00
<b>3</b>	<b>EXCAVACIONES</b>				
4	Excavaciones en zanja- material Rocoso	m3	\$ 45.000	18,00	\$ 810.000,00
5	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	\$ 25.000	17,00	\$ 425.000,00
6	Dispersión de sobrantes	m3	\$ 18.000	1,00	\$ 18.000,00
<b>7</b>	<b>ACUEDUCTO</b>				
8	Instalación de tubería de 2" polietileno por termo fusión	ml	\$ 8.000	70,25	\$ 562.000,00
9	Empalmes de tubería de 2" polietileno a polietileno	Un	\$ 500.000	2,00	\$ 1.000.000,00
10	Demolición de pavimento	m3	\$ 120.000	2,00	\$ 240.000,00
11	Reconstrucción de pavimento	m3	\$ 1.100.000	2,00	\$ 2.200.000,00
12	Suministro e instalación de acometida de 1/2" (incluye sileta, manguera de 1/2" y llave) longitud promedio 15 mts	Un	\$ 175.000	6,00	\$ 1.050.000,00



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>				
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>				

13	Traslado de medidores (incluye instalación de la caja)	Un	\$ 50.000	6,00	\$ 300.000,00
14	Transporte de tubería de Chinchiná a Marmato (un rollo de 2")	Gl	\$ 350.000	1,00	\$ 350.000,00
15	Transporte de personal de Chinchiná a Marmato	Día	\$ 320.000	5,00	\$ 1.600.000,00
16	Retiro de válvulas en sector de Echandía y empalme de nuevo	Gl	\$ 650.000	1,00	\$ 650.000,00
17	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
18	Suministro e Instalación de collarín para acometida domiciliaria en tubería de polietileno de conexión de 2" a 1/2"	Un	\$ 15.800	10,00	\$ 158.000,00
<b>COSTO TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 9.463.000,00</b>


### 5.1. ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS

Para realizar la instalación de las acometidas domiciliarias en el nuevo alineamiento planteado, fueron necesarios comprar 10 collarines

Suministro e Instalación de collarín para acometida domiciliaria en tubería de polietileno de conexión de 2" a 1/2"

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
18	Suministro e Instalación de collarín para acometida domiciliaria en tubería de polietileno de conexión de 2" a 1/2"	Un	\$ 15.800	10,00	\$ 158.000



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>		

## 6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

### 6.1. EMPLEOS GENERADOS

<b>Personal Contratista de Construcción</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
<b>TOTALES</b>				
<b>Personal Interventoria</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

USUARIOS DE LOS SECTORES DE QUEBRADA, COLLAREJO Y CASCAJERO (ALREDEDOR DE 180 USUARIOS) Y SECTORES BETULIA Y TEJAR (ALREDEDOR DE 600 USUARIOS) DEL MUNICIPIO DE MARMATO



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

**DOCUMENTOS ANEXOS**

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ**  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


  
 FIRMA DEL SUPERVISOR



CONTRATO No	C.E. 099 DE 2023	MUNICIPIO	MARMATO
-------------	------------------	-----------	---------

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA	DIÁMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN	NÚMERO DE SECTOR HIDRÁULICO (NUSH)	CERTIFICACIÓN DE TUBERÍA	NÚMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACIÓN	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA ANTERIOR	MATERIAL TUBERÍA ANTERIOR	LONGITUD TUBERÍA ANTERIOR (m)
K0+000 - K0+070	Reposición	Sector Cascajero - Marmato	2"	70	PEAD	Instalación con apertura de zanja		NTC 4585	RES 0501	ICONTEC	221004	EXTRUCOL	8000223714	2/10/2023	2"	PEAD	70

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	

NOMBRE CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO	
---	--







**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**ZONA OCCIDENTE**

CONTRATO No.:	C.E. ACTO 009 DE 2023	ACTA No.:	ACTA 01 Y FINAL	FECHA CORTE:	20 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO CONTRATO:	DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS	FECHA INICIACIÓN:	06 DE FEBRERO DE 2023	FECHA VENCIMIENTO:	20 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	PRORROGA:	N/A	VALOR ADICION:	N/A
		SUPERVISOR:	JOHANN MANUEL SABOGAL R.	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL				PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES									
2	Localización y replanteo	Gl	1.00	\$ 100,000	\$ 100,000.00	1.06%	1.00	\$ 100,000.00	1.00	\$ 100,000.00
3	EXCAVACIONES									
4	Excavaciones en zanja- material Rocoso	m3	18.00	\$ 45,000	\$ 810,000.00	8.56%	18.00	\$ 810,000.00	18.00	\$ 810,000.00
5	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	17.00	\$ 25,000	\$ 425,000.00	4.49%	17.00	\$ 425,000.00	17.00	\$ 425,000.00
6	Dispersión de sobrantes	m3	1.00	\$ 18,000	\$ 18,000.00	0.19%	1.00	\$ 18,000.00	1.00	\$ 18,000.00
7	ACUEDUCTO									
8	Instalación de tubería de 2" polietileno por termo fusión	ml	90.00	\$ 8,000	\$ 720,000.00	7.61%	70.25	\$ 562,000.00	70.25	\$ 562,000.00
9	Empalmes de tubería de 2" polietileno a polietileno	Un	2.00	\$ 500,000	\$ 1,000,000.00	10.57%	2.00	\$ 1,000,000.00	2.00	\$ 1,000,000.00
10	Demolición de pavimento	m3	2.00	\$ 120,000	\$ 240,000.00	2.54%	2.00	\$ 240,000.00	2.00	\$ 240,000.00
11	Reconstrucción de pavimento	m3	2.00	\$ 1,100,000	\$ 2,200,000.00	23.25%	2.00	\$ 2,200,000.00	2.00	\$ 2,200,000.00
12	Suministro e instalación de acometida de 1/2" (incluye sileta, manguera de 1/2" y llave) longitud promedio 15 mts	Un	6.00	\$ 175,000	\$ 1,050,000.00	11.10%	6.00	\$ 1,050,000.00	6.00	\$ 1,050,000.00
13	Traslado de medidores (incluye instalación de la caja)	Un	6.00	\$ 50,000	\$ 300,000.00	3.17%	6.00	\$ 300,000.00	6.00	\$ 300,000.00
14	Transporte de tubería de Chinchiná a Marmato (un rollo de 2")	Gl	1.00	\$ 350,000	\$ 350,000.00	3.70%	1.00	\$ 350,000.00	1.00	\$ 350,000.00
15	Transporte de personal de Chinchiná a Marmato	Día	5.00	\$ 320,000	\$ 1,600,000.00	16.91%	5.00	\$ 1,600,000.00	5.00	\$ 1,600,000.00
16	Retiro de válvulas en sector de Echandía y empalme de nuevo	Gl	1.00	\$ 650,000	\$ 650,000.00	6.87%	1.00	\$ 650,000.00	1.00	\$ 650,000.00
17	ITEMS NO PREVISTOS									
18	Suministro e instalación de collarín para acometida domiciliar en tubería de polietileno de conexión de 2" a 1/2"	Un	0.00	\$ 15,800	\$ -	0.00%	10.00	\$ 158,000.00	10.00	\$ 158,000.00
<b>COSTO TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 9,463,000.00</b>			<b>\$ 9,463,000.00</b>		<b>\$ 9,463,000.00</b>

<b>COSTO DIRECTO</b>	
ADMINISTRACIÓN	29%
IMPREVISTOS	0%
UTILIDAD	5%

\$ 7,012,227.00
\$ 2,033,546.00
\$ -
\$ 350,611.00

\$ 7,012,227.00
\$ 2,033,546.00
\$ -
\$ 350,611.00

\$ 7,012,227.00
\$ 2,033,546.00
\$ -
\$ 350,611.00

<b>SUMAS ANTES DE IVA</b>	
IVA Sobre utilidades	19%

\$ 9,396,384.00
\$ 66,616.00

\$ 9,396,384.00
\$ 66,616.00

\$ 9,396,384.00
\$ 66,616.00

<b>COSTO TOTAL OBRA</b>
-------------------------

\$ 9,463,000.00
-----------------

\$ 9,463,000.00
-----------------

<b>TOTAL ACTA 01 Y FINAL</b>
------------------------------

\$ 9,463,000.00
-----------------

\$ 9,463,000.00
-----------------

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 9,463,000.00
VALOR ACTA 01	\$ 9,463,000.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 9,463,000.00</b>

\$ 9,463,000.00
\$ -
\$ 9,463,000.00

  
 Vo. Bo. JOHANN MANUEL SABOGAL R.  
 ING. ZONA OCCIDENTE  
 SUPERVISOR

  
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 Contratista





ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1

**CONTRATO N°:** ACTO 009 DE 2023  
**CONTRATISTA:** HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
**OBJETO:** "DESVIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS".  
**VALOR:** \$ 9.463.000,00  
**RECURSOS:** PROPIOS

En la ciudad de Marmato, Caldas a los quince (15) día del mes de febrero de 2023 se reunieron los señores ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., JOHANN MANUEL SABOGAL como Supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como Contratista, con el fin de convenir el acta de convenio de precios No. 01 al contrato por emergencia ACTO 009 DE 2023.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP01	Suministro e Instalación de collarín para acometida domiciliaria en tubería de polietileno de conexión de 2" a 1/2"	Un	\$ 15.800,00

**Nota 1: Todos los precios incluyen AIU e IVA SOBRE UTILIDADES**


**Nota 2: Los valores de prestaciones sociales de los trabajadores está desglosados así: Salud 4%, Pensión 16%, ARL 6,96%, Caja de compensación 4%, Cesantías 8,33%, Int. Cesantías 1%, Prima 8,33%, Vacaciones 4,17%, Aux. Transporte 11,72%.**


Sin ningún otro motivo de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.

  
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista

  
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
Vo.Bo. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Dpto. de Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ  
Secretaria General  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

17/2






## ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	ACTO 009 DE 2023
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	DESUDIO DE TUBERÍA POR TERMO FUSIÓN Y EMERGENCIA SECTOR LA QUEBRADA Y RETIRO DE VÁLVULAS SECTOR ECHANDÍA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 7.012.227,00
ADMINISTRACION 29%	\$ 2.033.546,00
IMPREVISTOS 0%	\$ 0,00
UTILIDAD 5%	\$ 350.611,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 66.616,00
VALOR TOTAL ACTO 009	\$ 9.463.000,00
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	ING. JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PLAZO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
CDP	20230297 DE 27/01/2023
RP	322 DE 08/02/2023

En el municipio de Marmato, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2023, se reunieron los señores JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO FINAL, Según Acto 009 de 2023.



**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ**  
Ingeniero de Zona Occidente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO**  
Contratista

Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

03-03-2023 03-03-2023 FE FE62 Factura electrónica 4413512 HERNANDO ANTONI... 690603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación  Factura Electrónica \$9,463,000
