



F-GC-22  
Versión 8  
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA ACTO No. 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AII e IVA)	52.288.252
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	52.288.252
NIT O CC:	810. 002.768-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
GDP (#, rubro y fecha)	00132 DE ENERO 02 DE 2019 Y 00305 DE FEBRERO 07 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	52.081.929
RP (#, rubro y fecha)	000288 DE FEBRERO 12 DE 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	206.323
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCIÓN COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSÉ RESTREPO. Y CONSTRUCCIÓN CÁMARAS PARA DESTAPONAR TUBERÍA DE ALCANTARILLA, DIAGONAL ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS

	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	<input checked="" type="checkbox"/>	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	<input checked="" type="checkbox"/>	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	
5- Informe de actividades o Bitácora.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	<input checked="" type="checkbox"/>	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	<input checked="" type="checkbox"/>	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	<input checked="" type="checkbox"/>	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	<input checked="" type="checkbox"/>	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	<input checked="" type="checkbox"/>	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A. 22/05/19  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA


	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente	<input checked="" type="checkbox"/>
Acta original	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA NORTE SUR	<u>Abel Rojas</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Juan Camilo A.




## CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

El suscrito MAURICIO MAFLA GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía como aparece al pie de mi firma, Ingeniero Civil de profesión, y como representante legal de la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – NIT.810.002.768-5, certifico bajo la gravedad de juramento que a la fecha, he dado cumplimiento a las normas establecidas acerca del pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados que he tenido bajo mi cargo, de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999, por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de Diciembre 24/98, se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Como con las disposiciones del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificada por la ley 828 de 2003.

Así mismo he pagado oportunamente en su totalidad los aportes al subsidio familiar, instituto de bienestar familiar y SENA.

Este certificado se expide desde el período comprendido desde el mes de enero a mayo de 2019, con relación a las obras del Acto No.002 del 12 de febrero de 2019 cuyo objeto es: "REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS"

Para constancia se firma en Manizales a los 02 días del mes de mayo de 2019.

  
MAURICIO MAFLA GARCÍA  
CC.10.011.673 de Pereira  
Ingeniero Civil  
T.P. 17202091362 CLD

  
HÉCTOR EDISSON HENAO RESTREPO  
C.C.10.286.271 de Manizales  
Contador Público  
T.P. 70960-T

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**70960-T**

**HECTOR EDISON  
HENAO RESTREPO  
C.E. 10286271**

**RESOLUCION INSCRIPCION 50  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

**FECHA 09/03/2000**

Presidente

00079571

CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

00079571

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



010286271

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 7 9 8 6 5 4 3 7 3 4 1 A 0 3 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286271 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 70960-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDEULA DE CALIFICACION**

N.º IDENTIFICACION: **10.286.271**  
**HENAO RESTREPO**  
 NOMBRE: **HECTOR EDISSON**


FECHA DE NACIMIENTO: **22-DIC-1969**  
**MANIZALES**  
 (CALDAS)  
**1.72**      **B+**      **M**  
ESTATURA      GRUPO SANGUINEO      SEXO  
**30-ABR-1988 MANIZALES**  
FECHA DE EMISION



SECRETARIA NACIONAL DE IDENTIFICACION  
BOGOTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002768	5	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAUCA	CALLE #8 No. 18 - 20	MANIZALES-CALDAS	8883511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión Salud 2019-03	8490202247	Planilla E	2019/03/15
Pago 424888300		Planilla E	2019/03/15
Limite		Pago	Valor
2019/03/15		2019/03/15	\$937,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$483,700	\$0	\$0	\$483,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$75,100	\$0	\$0	\$75,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$79,500	\$0	\$0	\$79,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$275,700	\$0	\$0	\$275,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$211,000	\$0	\$0	\$211,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$211,000	\$0	\$0	\$211,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	3	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$22,600	\$0	\$0	\$22,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	\$12,300	\$0	\$0	\$12,300
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$937,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$937,700</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
MIT 816002766	5	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAUCA	CALLE 48 No. 18 - 20	MANIZALES-CALDAS	8893511	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo			Clave			Fecha			Pago		
Pensión	Salud	2019-03	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2019-02			424888300	8490202247	E		2019/03/15	2019/03/15	0	\$937,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO													NOVEDADES																				
Nc.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extra Temp. Jero Ext.	Fecha Radicacion en el Exterior	lng	Fecha lng	ret	Fecha ret	tde ltae	tdp ltae	tdp vsp	Fecha inicio vsp	cor vsp	Fecha inicio sth	Fecha Fin sth	lge	Fecha inicio lge	Fecha Fin lma	Fecha inicio vac-lf	Fecha Fin vac-lf	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lf	Fecha inicio vac-lf	Fecha Fin vac-lf				
1	CC	4551937	AGUIRRE VILLADA LUIS ORLANDO	Dependiente	0	No		X	2019/02/26																								
2	CC	9846950	FRANCO LADINO DUBAN JURELO	Dependiente	0	No		X	2019/02/19																								
3	CC	6400046	GRUENO OBREGON JUSTINO	Dependiente	0	No		X	2019/02/25																								
4	CC	109493158	HERBERA LONDINO RONALD ALEJANDRO	Dependiente	0	No		X	2019/02/19																								
5	CC	10252468	NUÑEZ SOTO PEDRO ANTONIO	Dependiente	0	No		X	2019/02/18																								
6	CC	10616236	OROZCO BERAUDEZ WILSON HERNAN ALEJANDRO	Dependiente	0	No		X	2019/02/19																								
7	CC	10597872	OSPINA CANDIL SERGIO ALEJANDRO	Dependiente	0	No		X	2019/02/25																								
8	CC	7199121	OSPINA SANCHEZ GABRIEL DARIO	Dependiente	0	No		X	2019/02/19																								
9	CC	7508488	SOTO TDRD JOSE OVIDIO	Dependiente	0	No		X	2019/02/21																								
10	CC	10537671	VELEZ MONTOYA HUGO ALBERTO	Dependiente	0	No		X	2019/02/19																								
<b>Total</b>		<b>Afiliados(10)</b>																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002768	5	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAUCA	CALLE 48 No. 18 - 20	MANIZALES-CALDAS	8883511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2019-03	8491281907	E	2019/04/15	2019/04/15	0	\$2,644,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MDRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$1,366,200	\$0	\$0	\$1,366,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$234,100	\$0	\$0	\$234,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$265,000	\$0	\$0	\$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$707,100	\$0	\$0	\$707,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$594,700	\$0	\$0	\$594,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$594,700	\$0	\$0	\$594,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$73,200	\$0	\$0	\$73,200
SALUDVIDA S.A. - EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	\$50,800	\$0	\$0	\$50,800
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$2,644,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,644,900</b>



SALARIO										PENSION										SALUD							
Fecha inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha inicio ht	Fecha Fin ht	Valor vip	Valor	Inseg. ral.	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Contratación Voluntaria Empleador	Contratación Voluntaria Afiliado	Fondo Subsistencia Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	
					\$ 828.116	No	COLFONDOS	23	\$ 634.889	16% SIN RIESGO		\$ 101.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.600		SALUDVIDA S.A. EPS	23	\$ 634.889	4%	\$ 25.400	\$ 0	\$ 2
					\$ 828.116	No	PORVENIR	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		MEDIMAS MOVILIDAD	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	\$ 0	\$ 3
					\$ 828.116	No	COLPESIONES	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		MEDIMAS MOVILIDAD	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	\$ 0	\$ 3
					\$ 828.116	No	PORVENIR	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		MEDIMAS MOVILIDAD	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	\$ 0	\$ 3
					\$ 1.300.000	No	PORVENIR	30	\$ 1.300.000	16% SIN RIESGO		\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000		NUEVA E.P.S.	30	\$ 1.300.000	4%	\$ 52.000	\$ 0	\$ 5
					\$ 828.116	No	COLFONDOS	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		MEDIMAS EPS	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	\$ 0	\$ 3
					\$ 828.116	No	PORVENIR	23	\$ 634.889	16% SIN RIESGO		\$ 101.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.600		SALUDVIDA S.A. EPS	23	\$ 634.889	4%	\$ 25.400	\$ 0	\$ 2
					\$ 828.116	No	COLPESIONES	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		MEDIMAS MOVILIDAD	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	\$ 0	\$ 3
					\$ 1.000.000	No	PROTECCION	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000		SALUD TOTAL	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$ 0	\$ 4
					\$ 828.116	No	PORVENIR	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		MEDIMAS EPS	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	\$ 0	\$ 3
																		\$ 1.386.200								\$ 34	



## Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 810002768	5	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NO APLICA 2	CALLE 48 No. 18 - 20	MANTALES-CALDAS	8883511	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-04 / 2019-05	446974078	Planilla (E)	2019/05/16	2019/05/16	2019/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$56,900	

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$13,300	\$0	\$0	\$13,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
MEDIWAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>\$56,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$56,900</b>



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF	
NT 810002768	5	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NO APLICA 2	CALLE 48 No. 18 - 20	MANIZALES-CALDAS	8883511	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	446974078	8492421113	(E)	2019/05/15	2019/05/15	BANCOLOMBIA		0	\$56,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO														
No.	Tipos Id	No id	Nombre	Tipos Cotizante	Horas Laboradas	ExonTemp. Jero D.C.	Fecha Reubicacion Exterior	Fecha Ing	Fecha ret	Fecha ret	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CC	1061625618082500	BERNARDO PEREZ	Dependiente	0	No		X	2019/04/03					
2	CC	75044883070	TOÑO JOSE OVIDIO	Dependiente	0	No		X	2019/04/03					
<b>Total Afiliados(2)</b>														

NOVEDADES

Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin
vac-tr	vac-tr	vac-tr	vac-tr	vac-tr	vac-tr	vac-tr	vac-tr

SALARIO				PENSION										SALUD											
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	Fecha Inicio int	Fecha Fin int	Valor	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Riesgo Pension	Valor Cobertura	Cotización Voluntaria Empleado	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Substancia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cobertura	Valor UPC	Total	
				\$ 828.110	NO COLONOS	3	\$ 82.812	16%	RIESGO	\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.200		MEBIMAS EPS	3	\$ 82.812	4%	\$ 3.400	\$ 0	\$ 0	
				\$ 1.000.000	PROTECCION	3	\$ 100.000	16%	RIESGO	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000		SALUD TOTAL	3	\$ 100.000	4%	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0
																\$ 29.300							\$ 7.400	\$ 0	

EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MBN	Valor Cotización MBN	Exonerado SENA e ICBF
3.400	CONFAMILIARES	3	\$ 82.812	4%	\$ 3.400.000	CONFAMILIARES	3	\$ 82.812	0,96%	3	\$ 5.800	3	\$ 82.812	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
4.000	CONFAMILIARES	3	\$ 100.000	4%	\$ 4.000.000	CONFAMILIARES	3	\$ 100.000	0,96%	3	\$ 7.000	3	\$ 100.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
7.400					\$ 7.400						\$ 12.800				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 810002768	5	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Direccion
		EMPOCALDAS NEIRA	CALLE 48 No. 18 - 20
		Manizales-Caldas	
		Exonerado SENA e ICBF	SI
		Teléfono	8888888

Periodo			
Pensión	Salud	Clave	Pago
2019-04	2019-05	8492385305	446186069
		Planilla	Limite
		Planilla	2019/05/16
		Tipo	Fecha
		Planilla	Pago
		Planilla	2019/05/14
		Banco	Valor
		Banco	\$1,507,600

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$777,700	\$0	\$0	\$777,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$22,100	\$0	\$0	\$22,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$473,300	\$0	\$0	\$473,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$264,500	\$0	\$0	\$264,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$338,900	\$0	\$0	\$338,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	\$195,500	\$0	\$0	\$195,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$24,600	\$0	\$0	\$24,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$1,400	\$0	\$0	\$1,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$6,700	\$0	\$0	\$6,700
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	5	\$24,700	\$0	\$0	\$24,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$131,400	\$0	\$0	\$131,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$6,700	\$0	\$0	\$6,700
<b>TOTAL</b>				<b>18</b>	<b>\$1,507,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,507,600</b>

EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
	Administradora	Días	Tarifa	Valor Cotización	Administreador	Días	IBC	Tarifa	Clase Riego	Valor Cotización	IBC	Tarifa SEVA	Valor Cotización SEVA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Expendido SENAE ICBF	
0.000	CONFAMILIARES	9	\$ 248.435	4%	\$ 10.000	ARL SURA	9	\$ 248.435	6,96%	5	\$ 17.300	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
7.800	CONFAMILIARES	7	\$ 193.228	4%	\$ 7.800	ARL SURA	7	\$ 193.228	6,96%	5	\$ 13.500	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
5.600	CONFAMILIARES	5	\$ 138.020	4%	\$ 5.600	ARL SURA	5	\$ 138.020	6,96%	5	\$ 9.700	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
1.200	CONFAMILIARES	1	\$ 27.604	4%	\$ 1.200	ARL SURA	1	\$ 27.604	6,96%	5	\$ 2.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
2.300	CONFAMILIARES	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	ARL SURA	2	\$ 55.208	6,96%	5	\$ 3.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
3.400	CONFAMILIARES	3	\$ 82.812	4%	\$ 3.400	ARL SURA	3	\$ 82.812	6,96%	5	\$ 5.800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
2.300	CONFAMILIARES	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	ARL SURA	2	\$ 55.208	6,96%	5	\$ 3.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
6.700	CONFAMILIARES	6	\$ 165.624	4%	\$ 6.700	ARL SURA	6	\$ 165.624	6,96%	5	\$ 11.600	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
6.700	CONFAMILIARES	27	\$ 745.305	4%	\$ 29.900	ARL SURA	27	\$ 745.305	6,96%	5	\$ 51.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
5.600	CONFAMILIARES	6	\$ 165.624	4%	\$ 5.600	ARL SURA	6	\$ 165.624	6,96%	5	\$ 11.600	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
5.600	CONFAMILIARES	5	\$ 138.020	4%	\$ 5.600	ARL SURA	5	\$ 138.020	6,96%	5	\$ 9.700	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
6.000	CONFAMILIARES	30	\$ 900.000	4%	\$ 36.000	ARL SURA	30	\$ 900.000	6,96%	5	\$ 62.700	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
1.400	CONFAMILIARES	1	\$ 33.334	4%	\$ 1.400	ARL SURA	1	\$ 33.334	6,96%	5	\$ 2.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
2.000	CONFAMILIARES	30	\$ 1.300.000	4%	\$ 52.000	ARL SURA	30	\$ 1.300.000	6,96%	5	\$ 90.500	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
0.000	CONFAMILIARES	9	\$ 248.435	4%	\$ 10.000	ARL SURA	9	\$ 248.435	6,96%	5	\$ 17.300	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
0.000	CONFAMILIARES	9	\$ 248.435	4%	\$ 10.000	ARL SURA	9	\$ 248.435	6,96%	5	\$ 17.300	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
2.300	CONFAMILIARES	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	ARL SURA	2	\$ 55.208	6,96%	5	\$ 3.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
2.300	CONFAMILIARES	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	ARL SURA	2	\$ 55.208	6,96%	5	\$ 3.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	SI
5.500					\$ 195.500						\$ 338.900		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		SI

SALARIO										PENSION										SALUD						
Fecha inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha inicio ht	Fecha Fin ht	Valor	Insecuridad	Administradora	Días	IBC	Tarifa Riesgo Pension	Tarifa Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subistencia	Valor No retenido	Total	A/P Deducible	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	9	\$ 248.435	16%	RIESGO	\$ 39.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.800		ASMET SALUD	9	\$ 248.435	4%	\$ 10.000	\$ 0	\$ 1	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	7	\$ 193.228	16%	RIESGO	\$ 31.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.000		MEDIMAS	7	\$ 193.228	4%	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	5	\$ 138.020	16%	RIESGO	\$ 22.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.100		ASMET SALUD	5	\$ 138.020	4%	\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	1	\$ 27.604	16%	RIESGO	\$ 4.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.300		EPS SAS	1	\$ 27.604	4%	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	COLFONDOS	2	\$ 55.208	16%	RIESGO	\$ 8.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.900		NUEVA E.P.S.	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	3	\$ 82.812	16%	RIESGO	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.300		MEDIMAS	3	\$ 82.812	4%	\$ 3.400	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	COLFONDOS	2	\$ 55.208	16%	RIESGO	\$ 8.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.900		ASMET SALUD	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	6	\$ 165.624	16%	RIESGO	\$ 26.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.500		MEDIMAS	6	\$ 165.624	4%	\$ 6.700	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	27	\$ 745.305	16%	RIESGO	\$ 119.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.300		SALUD TOTAL	6	\$ 165.624	4%	\$ 6.700	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	6	\$ 165.624	16%	RIESGO	\$ 26.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.500		NUEVA E.P.S.	27	\$ 745.305	4%	\$ 26.900	\$ 0	\$ 2	
				\$ 828.116	No	COLPENSIONES	5	\$ 138.020	16%	RIESGO	\$ 22.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.100		MEDIMAS EPS	6	\$ 165.624	4%	\$ 6.700	\$ 0	\$ 0	
				\$ 900.000	No	PROTECCION	30	\$ 900.000	16%	RIESGO	\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.000		ASMET SALUD	5	\$ 138.020	4%	\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	
				\$ 1.000.000	No	PROTECCION	1	\$ 33.334	16%	RIESGO	\$ 5.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400		NUEVA E.P.S.	30	\$ 900.000	4%	\$ 36.000	\$ 0	\$ 3	
				\$ 1.300.000	No	PORVENIR	30	\$ 1.300.000	16%	RIESGO	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	\$ 33.334	4%	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	9	\$ 248.435	16%	RIESGO	\$ 39.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.800		NUEVA E.P.S.	30	\$ 1.300.000	4%	\$ 52.000	\$ 0	\$ 5	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	9	\$ 248.435	16%	RIESGO	\$ 39.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.800		NUEVA E.P.S.	9	\$ 248.435	4%	\$ 10.000	\$ 0	\$ 1	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	2	\$ 55.208	16%	RIESGO	\$ 8.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.900		MEDIMAS	9	\$ 248.435	4%	\$ 10.000	\$ 0	\$ 1	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	2	\$ 55.208	16%	RIESGO	\$ 8.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.900		NUEVA E.P.S.	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	2	\$ 55.208	16%	RIESGO	\$ 8.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.900		MEDIMAS	2	\$ 55.208	4%	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	
																	\$ 777.700							\$ 195.500		\$ 19





Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	ACTO 002-2019 ✓
Nombre Obra	ALCANTARILLADO ARAUCA ✓
Fecha Inicio Obra	18/02/2019
Fecha Terminación Obra	31/03/2019 ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA PALESTINA CALDAS ✓
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019 ✓
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$52,288,252.00 ✓
Costo Total Mano de Obra	\$7,177,964.00 ✓
Número de Trabajadores en el Periodo	10 ✓
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$71,780.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$71,780.00
Total Pagado	\$71,780.00
Valor del Pago	\$71,780.00
IP Origen	172.31.44.253
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62622530
Fecha de Creación	14/05/2019 01:29:19 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	446229050 ✓
Estado de la Transacción	APROBADA ✓

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	ACTO 002-2019 ✓
Nombre Obra	ALCANTARILLADO ARAUCA ✓
Fecha Inicio Obra	18/02/2019
Fecha Terminación Obra	31/03/2019 ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA PALESTINA CALDAS ✓
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019 ✓
Mes Periodo a Pagar	MARZO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$52,288,252.00
Costo Total Mano de Obra	\$11,306,077.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10 ✓
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$113,061.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$113,061.00
Total Pagado	\$113,061.00
Valor del Pago	\$113,061.00
IP Origen	172.31.44.253
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62622581
Fecha de Creación	14/05/2019 01:37:01 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	446232171
Estado de la Transacción	APROBADA ✓

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**


**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	ACTO 002 - 2019 ✓
Nombre Obra	ALCANTARILLADO ARAUCA ✓
Fecha Inicio Obra	18/02/2019
Fecha Terminación Obra	03/04/2019 ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA PALESTINA CALDAS ✓
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	ABRIL ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$52,288,252.00
Costo Total Mano de Obra	\$450,176.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3 ✓
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$4,502.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$4,502.00
Total Pagado	\$4,502.00
Valor del Pago	\$4,502.00
IP Origen	172.31.27.171
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62649514
Fecha de Creación	17/05/2019 02:07:45 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	447793666
Estado de la Transacción	APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**



# LICITACIONES Y PROYECTOS SAS

Nit. 810.002.768-5 Régimen Común

Calle 70A N° 21A -14 AP 204 Teléfonos: 881 5647 - 874 5060

Email: lyp.sas@unc.net.co

Manizales - Colombia

FACTURA DE VENTA

0372

FECHA EXPEDICIÓN		
DÍA	MES	AÑO
16	05	2019

FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
16	05	2019

Nombre: EMPOCALDAS S.A.E.S.P.	
Empresa: EMPOCALDAS S.A.E.S.P.	Nit / C.C. 890803239-9
Dirección: CARRERA 23 NÚMERO 75-82	
Teléfono: (68) 867080	Ciudad: MANIZALES - CALDAS
Forma de pago: EFECTIVO	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<p><b>DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 48 No.18-20 PISO 1 - SAN JORGE - MANIZALES</b></p> <p><b>AUTORIZA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No.: 18762004169906- FECHA: JULIO 26 DE 2017 - RANGO: 0315 AL 0500</b></p>			
ACTA DE OBRA No.01 Y FINAL CONTRATO ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019 OBJETO: REPOSICIÓN ALCANTARILLADO POR EMERGENCIABARRIO ACCIÓN COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSÉ RESTREPO Y CONSTRUCCIÓN CÁMARA PARA DESTAPONAR TUBERÍA DE ALCANTARILLA DIAGONAL A LA ESTACIÓN DE SERVICIO - ARAUCA - MPIO DE PALESTINA			
VALOR ACTA A COSTO DIRECTO			38.593.501
ADMINISTRACIÓN (A=24%)			9.262.440
IMPREVISTOS (I=5,00%)			1.929.675
UTILIDAD (U=5,00%)			1.929.675

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE	SUBTOTAL	51.715.291
	IMPUESTO IVA	366.638
	TOTAL A PAGAR	52.081.929

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Nota: Después de la fecha de vencimiento de la factura, se causará un interés mensual de acuerdo a la tasa vigente.

IMPRESO POR MOLANO LONDINO EN ALICIA LITIA EDITORIAL ZAPATA - NIT 990.896.898-3 MANIZALES AUTORIZA RESOLUCIÓN DIAN N° 1800035-4890 FECHA: ABRIL 23 DE 2010 RANGO: 0301 AL 0500

DÍA	MES	AÑO

Hoy \_\_\_\_\_, declaro recibidos los servicios arriba descritos, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador debidamente autorizado por este como su representante legal, delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido copia de la misma.


Firma autorizada, \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

C.C. N° \_\_\_\_\_

Fecha recibido: \_\_\_\_\_

Firma autorizada del emisor:



Nit. 10011673



**EMPOCALDAS S.A.E.S.P.**

**ACTO No.002 DE FEBRERO 12 DEL 2019**

**OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION  
COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA  
PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO  
CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA,  
CALDAS**

**CONTRATISTA: LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.**

**INFORME DE EJECUCIÓN FINAL**

**MANIZALES MAYO DE 2019**

**LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS**



## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

**ACTO No.:** 002 DE FEBRERO 12 DE 2019

**OBJETO:** REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

**CONTRATISTA:** LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

**VALOR INICIAL:** \$ 52.288.252,00 – INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES

**VALOR ADICIÓN:** \$ 0

**VALOR TOTAL:** \$ 52.081.929 00 – INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES

**FECHA DE INICIO:** FEBRERO 18 DE 2019

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2019

**PRORROGA No.1:** 30 DÍAS

### GARANTÍAS:

Pólizas iniciales del contrato

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	12-02-2019	12-06-2019	15.686.475,60
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	12-02-2019	12-03-2022	10.457.650,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 28 DIAS		10.457.650,40

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		10.457.650,40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101029595	12-02-2019	12-06-2019	15.686.475,60

Pólizas prórroga – Marzo 14 de 2019

GARANTIAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	12-02-2019	19-07-2019	15.686.475,60
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	12-02-2019	12-04-2022	10.457.650,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	SI AMPARA 2 AÑOS, 2 MESES Y 6 DIAS		10.457.650,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039354	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		10.457.650,40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101029595	12-02-2019	19-07-2019	15.686.475,60

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



## ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

### 1. Valla Alusiva a la obra



## 2. Socialización inicial del proyecto



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

### 3. Cerramiento en yute



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

#### 4. Demolición de estructuras de concreto



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

### 5. Excavaciones en zanja en material común y roca



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS





LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

6. Instalación de arena para base y atraque



7. Instalación de tuberías y "sillas" YEE





LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

8. Cajas de inspección para domiciliarias de alcantarillado



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

9. Cámara de inspección Diámetro=1,2m, recuadro de cámara y tapa en HF – Frente 2



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

10. Material de Sub base para pavimento y escalas



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS





LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

#### IMPREVISTOS EN LA OBRA.

- El proyecto original tuvo que modificarse debido a las condiciones del terreno, es decir, la presencia considerable de volúmenes de roca para la realización de las excavaciones.
- La creciente temporada invernal ocasiono que las labores del proyecto se dificultaran retrasando de las mismas.
- El poco espacio para la realización de la totalidad de las actividades, debido a la estrechez de las peatonales que comunican una calle con la otra, sumado a las fuertes pendientes de la misma, dificulto de manera importante el desarrollo de las obras inherentes al contrato.
- Debido a que la tubería de alcantarillado y de los concretos de peatonales y escalas se encontraban en un estado de deterioro demasiado alto, en el caso de la tubería de concreto la misma se encontraba totalmente colapsada y las aguas "servidas" de las viviendas beneficiadas circulaban por encima y dentro del mismo terreno, sin ninguna restricción, las excavaciones se desarrollaron en materiales totalmente contaminados, sumado a las fuertes lluvias, por lo tanto los mismos tuvieron que ser retirados manualmente (al hombro) del sitio, y ser reemplazados por material de préstamo y subbase.

Atentamente,



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
CONTRATISTA  
R.L. Mauricio Mafla García

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**

**ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.**

NIT. 810002768-5

**NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES**  
**PERIODO DE FEBRERO 17 A MARZO 03 DE 2019**

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.252.468	1.300.000	97.032	43.333,33	14,00	242.667	24.267	24.267	605.667	45.282	846.082	<i>Edwin MS</i>
2	JOSÉ OVIDIO SOTO TORO	75.084.688	1.000.000	97.032	33.333,33	14,00	186.667	18.667	18.667	466.667	45.282	661.282	<i>Jose Ovidio Soto</i>
3	RONALD ALEJANDRO HERRERA LONDOÑO	1.094.932.158	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	<i>Donald Herrera</i>
4	WILSON HERNAN OROZCO BERMUDEZ	1.061.625.618	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	<i>Wilson Orozco</i>
5	GABRIEL DARIO OSPINA SANCHEZ	71.991.211	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	<i>Dario Ospina</i>
6	DUBAN AURELIO FRANCO LADINO	9.846.950	828.116	97.032	27.603,87	15,00	165.623	16.562	16.562	414.058	48.516	595.072	<i>Duvan Franco</i>
7	HUGO ALBERTO VELEZ MONTOYA	1.053.767.142	828.116	97.032	27.603,87	16,00	176.665	17.666	17.666	441.862	51.750	634.744	<i>Hugo Alberto Velez M</i>
8	JUSTINO GREGORIO OBREGON	6.400.046	828.116	97.032	27.603,87	17,00	187.706	18.771	18.771	469.266	54.985	674.415	<i>Justino Obregon</i>

*[Handwritten signature]*

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

MIT. 810002768-5

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES PERIODO DE FEBRERO 17 A MARZO 03 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA							
9	SERGIO ALEJANDRO OSPINA CANDIL	1.059.787.248	828.116	97.032	27.603,87	18,00	198.748	19.875	19.875	496.870	58.219	714.087	<i>Sergio Ospina</i>							
10	LUIS ORLANDO AGUIRRE VILLADA	4.551.837	828.116	97.032	27.603,87	18,00	209.789	20.979	20.979	524.473	61.454	753.759	<i>Orlando Aguirre</i>							
												970.320,00	297.497,60	155,00	1.831.611,00	183.160,98	183.160,98	4.579.024,40	501.332,00	6.545.645,45








*[Signature]*  
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
CONTRATISTA

EMFOCALDAS S.A. E.S.P

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
NIT. 81002768-5

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES  
PERIODO DE MARZO 04 AL 17 DE 2019

N.	NOMBRE	CEBULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.252.468	1.300.000	97.032	43.333,33	14,00	242.667	24.267	24.267	606.667	45.282	846.082	
2	JOSÉ CVIDIO SOTO TORO	75.084.888	1.000.000	97.032	33.333,33	14,00	186.667	18.667	18.667	486.667	45.282	661.282	
3	RONALD ALEJANDRO HERRERA LONDOÑO	1.084.932.158	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	
4	WILSON HERNÁN OROZCO BERMUDEZ	1.061.625.618	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	
5	GABRIEL DARIO OSPINA SANCHEZ	71.991.211	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	
6	DUBAN AURELIO FRANCO LADINO	9.846.950	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	
7	HUGO ALBERTO VELEZ MONTOYA	1.053.767.142	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	




EMPOCALDAS S.A E.S.P

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS  
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
 NIT. 810002768-5

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES  
 PERIODO DE MARZO 04 AL 17 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORAOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
8	JUSTINO GRIJESO OBREGON	6.400.046	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	X JORNO OBREGON
9	SERGIO ALEJANDRO OSPINA CANDIL	1.058.787.249	828.116	97.032	27.603,87	13,00	143.540	14.354	14.354	358.850	42.047	515.729	Sergio Ospina Candil
10	LUIS ORLANDO AGUIRRE VILLADA	4.551.937	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	X Gerardo Aguirre
				970.320,00	287.487,60	139,00	1.654.948,00	165.494,50	165.494,50	4.137.362,50	149.581,60	5.910.903,13	


  
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
 CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS  
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
NIT. 810002768-5

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES  
PERIODO DE MARZO 18 AL 24 DE 2019


N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	SERGIO ALEJANDRO OSPINA CANDIL	1.059.787.249	828.116	97.032	27.603,87	7,00	77.291	7.729	7.729	193.227	22.641	277.701	Sergio Ospina Candil
2	LUIS ORLANDO AGUIRRE VILLADA	4.551.937	828.116	97.032	27.603,87	7,00	77.291	7.729	7.729	193.227	22.641	277.701	F. ORLANDO
				194.064,00	55.207,73	14,00	154.582,00	15.456,17	15.456,17	386.454,13	45.281,60	555.401,40	

  
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
CONTRATISTA



EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
 ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR  
 TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS  
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
 NIT. 810002768-5

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES  
 PERIODO DE MARZO 18 AL 31 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.252.468	1.300.000	97.032	43.333,33	14,00	242.667	24.267	24.267	606.667	45.282	846.082	
2	JOSÉ OVIDIO SOTO TORO	75.064.888	1.000.000	97.032	33.333,33	14,00	186.667	18.667	18.667	486.667	45.282	661.282	Jose Ovidio Soto
3	RONALD ALEJANDRO HERRERA LONDOÑO	1.094.932.158	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	RONALD H-
4	WILSON HERNÁN CROZCO BERMUDEZ	1.081.625.618	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Wilson Crozco
5	GABRIEL DARIO OSPINA SANCHEZ	71.991.211	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Dario Ospina
6	DUBAN AURELIO FRANCO LADINO	9.846.950	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	DUBAN AURELIO FRANCO




EMPOCALDAS S.A E.S.P

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. NIT. 810002768-6



NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES  
PERIODO DE MARZO 18 AL 31 DE 2019


N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA						
7	HUGO ALBERTO VELEZ MONTOYA	1.053.787.142	828.116	97.032	27.603.87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	HUGO ALBERTO VELEZ						
8	JUSTINO GRUESO OBREGON	6.400.046	828.116	97.032	27.603.87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	JUSTINO GRUESO						
												776.258	242.290	112	1.358.826	135.692	3.392.056	362.253	4.839.772

  
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
**ACTO No. 002 DE 2018 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAFONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS**  
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
 NIT. 810002768-6

**NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES  
 PERIODO DE ABRIL 1 AL 3 DE 2019**

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.252.468	1.300.000	97.032	43.333	3,00	52.000	5.200	5.200	130.000	9.703	181.303	
2	JOSÉ OVIDIO SOTO TORO	75.084.888	1.000.000	97.032	33.333	3,00	40.000	4.000	4.000	100.000	9.703	141.703	
				194.064	76.667	6	92.000	9.200	9.200	230.000	19.406	323.006	

  
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
 CONTRATISTA

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 10.252.468  
 CARGO Maestro  
 FECHA INGRESO febrero 18, 2019  
 FECHA RETIRO abril 3, 2019  
 DIAS LABORADOS 45 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 43.333

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:**

CESANTIAS	( 45 días/360) x 30 x 46.568	= \$	174.629
INTERESES CESANTIAS	( 45 días/30) x 1% x 174.629	= \$	2.619
PRIMA DE SERVICIOS	( 45 días/180) x 15 x 46.568	= \$	174.629
VACACIONES	( 45 días/360) x 15 x 43.333	= \$	81.250
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>433.127</b>


**LIQUIDACIÓN SALARIOS:**

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 17-02-19 AL 03-04-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 17-02-19 AL 03-04-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 17-02-19 AL 03-04-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,



PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO

10.252.468

Arauca (Caldas), Abril 03 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JOSÉ OVIDIO SOTO TORO  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 75.084.888  
 CARGO Oficial  
 FECHA INGRESO febrero 18, 2019  
 FECHA RETIRO abril 3, 2019  
 DIAS LABORADOS 45 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 33.333

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	( 45 días/360) x 30 x 36.568	= \$	137.129
INTERESES CESANTIAS	( 45 días/30) x 1% x 137.129	= \$	2.057
PRIMA DE SERVICIOS	( 45 días/180) x 15 x 36.568	= \$	137.129
VACACIONES	( 45 días/360) x 15 x 33.333	= \$	62.500
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>338.815</b>

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 17-02-19 AL 03-04-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 17-02-19 AL 03-04-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 17-02-19 AL 03-04-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibí conforme,

Jose Ovidio Soto Toro  
 JOSÉ OVIDIO SOTO TORO 75.084.888

Arauca (Caldas), Abril 03 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

**ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS**

NOMBRE TRABAJADOR RONALD ALEJANDRO HERRERA LONDOÑO  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.094.932.158  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 19, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 31, 2019  
 DIAS LABORADOS 41 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:**

CESANTIAS	( 41 días/360) x 30 x 30.838	= \$	105.363
INTERESES CESANTIAS	( 41 días/30) x 1% x 105.363	= \$	1.440
PRIMA DE SERVICIOS	( 41 días/180) x 15 x 30.838	= \$	105.363
VACACIONES	( 41 días/360) x 15 x 27.604	= \$	47.157
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>259.323</b>

**LIQUIDACIÓN SALARIOS:**

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE**

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

  
 RONALD ALEJANDRO HERRERA LONDOÑO  
 1.094.932.158

Arauca (Caldas), Marzo 30 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR WILSON HERNÁN OROZCO BERMUDEZ  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.061.625.618  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 19, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 31, 2019  
 DIAS LABORADOS 41 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	( 41 días/360) x 30 x 30.838	= \$	105.363
INTERESES CESANTIAS	( 41 días/30) x 1% x 105.363	= \$	1.440
PRIMA DE SERVICIOS	( 41 días/180) x 15 x 30.838	= \$	105.363
VACACIONES	( 41 días/360) x 15 x 27.604	= \$	47.157
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>259.323</b>

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Wilson Orozco  
 WILSON HERNÁN OROZCO BERMUDEZ  
 1.061.625.618



Arauca (Caldas), Marzo 30 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR GABRIEL DARIO OSPINA SÁNCHEZ  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71.991.211  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 19, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 31, 2019  
 DIAS LABORADOS 41 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	( 41 días/360) x 30 x 30.838	= \$	105.363
INTERESES CESANTIAS	( 41 días/30) x 1% x 105.363	= \$	1.440
PRIMA DE SERVICIOS	( 41 días/180) x 15 x 30.838	= \$	105.363
VACACIONES	( 41 días/360) x 15 x 27.604	= \$	47.157
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>259.323</b>

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Dario Ospina  
 GABRIEL DARIO OSPINA SÁNCHEZ  
 71.991.211



Arauca (Caldas), Marzo 30 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR DUBAN AURELIO FRANCO LADINO  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 9.846.950  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 19, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 31, 2019  
 DIAS LABORADOS 41 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:**

CESANTIAS	( 41 días/360) x 30 x 30.838	= \$	105.363
INTERESES CESANTIAS	( 41 días/30) x 1% x 105.363	= \$	1.440
PRIMA DE SERVICIOS	( 41 días/180) x 15 x 30.838	= \$	105.363
VACACIONES	( 41 días/360) x 15 x 27.604	= \$	47.157
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>259.323</b>

**LIQUIDACIÓN SALARIOS:**


SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE**

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

DUBAN AURELIO FRANCO  
 DUBAN AURELIO FRANCO LADINO  
 9.846.950



Arauca (Caldas), Marzo 30 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR HUGO ALBERTO VELEZ MONTOYA  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.053.767.142  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 19, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 31, 2019  
 DIAS LABORADOS 41 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:**

GESANTIAS	( 41 días/360) x 30 x 30.838	= \$	105.363
INTERESES CESANTIAS	( 41 días/30) x 1% x 105.363	= \$	1.440
PRIMA DE SERVICIOS	( 41 días/180) x 15 x 30.838	= \$	105.363
VACACIONES	( 41 días/360) x 15 x 27.604	= \$	47,157
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>259.323</b>



**LIQUIDACIÓN SALARIOS:**

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

   
 HUGO ALBERTO VELEZ MONTOYA  
 1.053.767.142

Arauca (Caldas), Marzo 30 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JUSTINO GRUESO OBREGON  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 6.400.046  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 25, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 31, 2019  
 DIAS LABORADOS 35 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:**

CESANTIAS	( 35 días/360) x 30 x 30.838	= \$	89.944
INTERESES CESANTIAS	( 35 días/30) x 1% x 89.944	= \$	1.049
PRIMA DE SERVICIOS	( 35 días/180) x 15 x 30.838	= \$	89.944
VACACIONES	( 35 días/360) x 15 x 27.604	= \$	40.256
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>221.193</b>

**LIQUIDACIÓN SALARIOS:**

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 25-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 25-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 25-02-19 AL 31-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

JUSTINO GRUESO  
 JUSTINO GRUESO OBREGON  
 6.400.046



Arauca (Caldas), Marzo 30 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR SERGIO ALEJANDRO OSPINA CANDIL  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.059.787.249  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 25, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 24, 2019  
 DIAS LABORADOS 28 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:**

CESANTIAS	( 28 días/360) x 30 x 30.838	= \$	71.955
INTERESES CESANTIAS	( 28 días/30) x 1% x 71.955	= \$	672
PRIMA DE SERVICIOS	( 28 días/180) x 15 x 30.838	= \$	71.955
VACACIONES	( 28 días/360) x 15 x 27.604	= \$	32.205
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>176.787</b>

**LIQUIDACIÓN SALARIOS:**

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 25-03-19 AL 24-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 25-03-19 AL 24-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 25-03-19 AL 24-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

**SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MICTE**

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Sergio Ospina Candil  
 SERGIO ALEJANDRO OSPINA CANDIL  
 1.059.787.249



Filadelfia (Caldas), Marzo 23 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

ACTO No. 002 DE 2019 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR LUIS ORLANDO AGUIRRE VILLADA  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.551.937  
 CARGO Ayudante  
 FECHA INGRESO febrero 26, 2019  
 FECHA RETIRO marzo 24, 2019  
 DIAS LABORADOS 27 días  
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234  
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:**

CESANTIAS	( 27 días/360) x 30 x 30.838	= \$	69.386
INTERESES CESANTIAS	( 27 días/30) x 1% x 69.386	= \$	624
PRIMA DE SERVICIOS	( 27 días/180) x 15 x 30.838	= \$	69.386
VACACIONES	( 27 días/360) x 15 x 27.604	= \$	31.055
<b>VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>= \$</b>	<b>170.451</b>

**LIQUIDACIÓN SALARIOS:**

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 25-03-19 AL 24-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 25-03-19 AL 24-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 25-03-19 AL 24-03-19	= \$	0
<b>VALOR LIQUIDACION SALARIOS</b>		<b>= \$</b>	<b>0</b>

SON: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,



*Luis Orlando Aguirre Villada*  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS ORLANDO AGUIRRE VILLADA

4.551.937

Filadelfia (Caldas), Marzo 23 de 2019



F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Abril 12 de 2019	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	EMERGENCIA ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019
Objeto:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCIÓN COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSÉ RESTREPO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS PARA DESTAPONAR TUBERÍA DE ALCANTARILLA, DIAGONAL ESTACIÓN DE SERVICIO, CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.-
Nombre Contratista:	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
Fecha del contrato:	FEBRERO 12 DE 2019
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 52.288.252,00
Fecha de iniciación:	FEBRERO 18 DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MARZO 19 DE 2019
Nueva fecha de terminación:	ABRIL 19 DE 2019
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

**1. AVANCE DEL CONTRATO**

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	99.61%
Avance físico Acumulado	99.61%



1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo




Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	54
Avance Porcentual:	90,00%

*ASR*

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

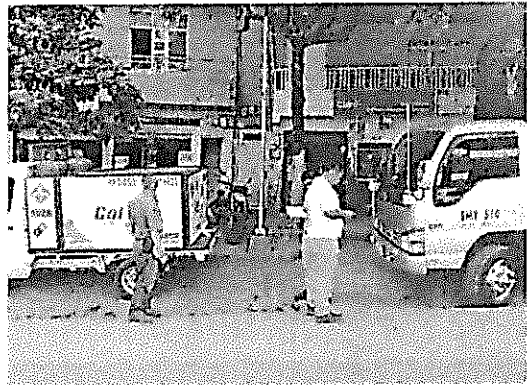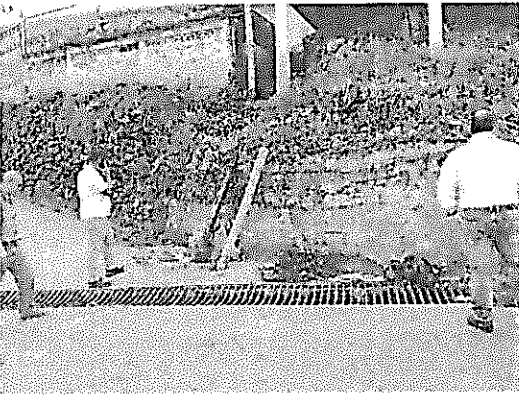


177

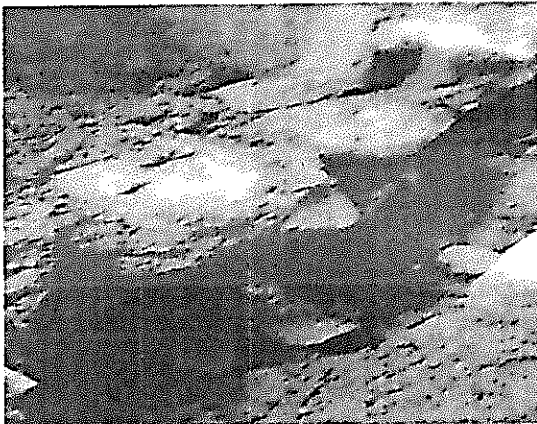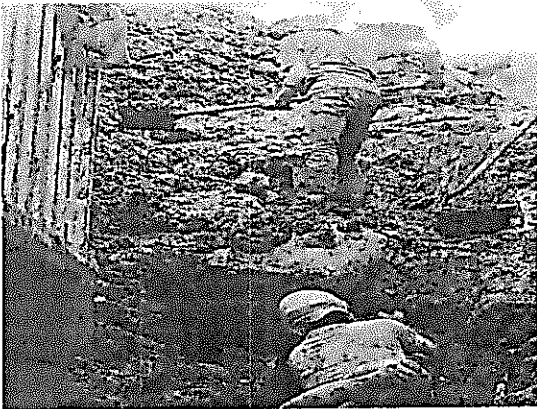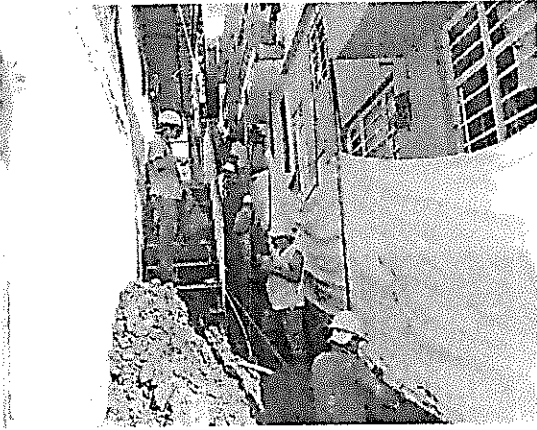


A/R



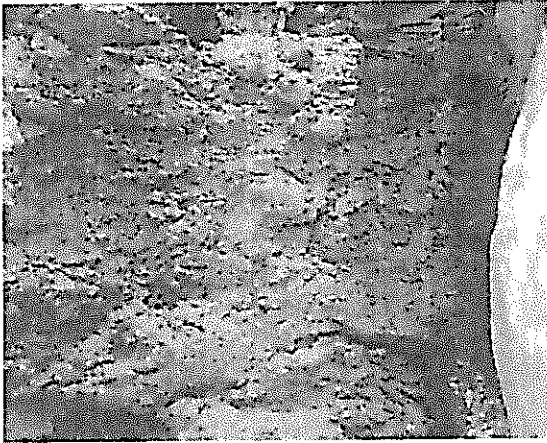

ABP

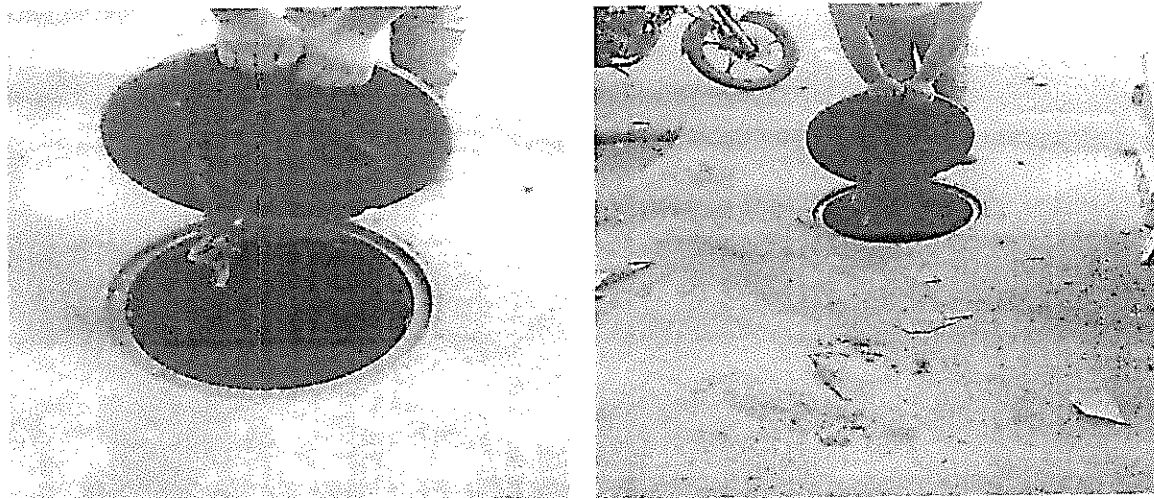

#### 1.5. Problemáticas con la obra

##### ANTECEDENTES:

-LA EMERGENCIA fue legalizada mediante la ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019, se presento el colapso de la tubería de 8" afectando a 12 viviendas del sector, con afloramiento en el sendero peatonal en escalas y al interior de algunas viviendas perjudicando los habitantes en lo que respecta a la salud.

-El Otro sector se localizo frente a la estación de servicio frente a la nomenclatura 10ª-08, donde la tubería del sector se represso y produjo afloramientos de aguas Negras sobre la Calzada con olores perjudiciales para la salud de peatones y residentes del lugar.

##### DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El procedimiento a seguir fue construir una red de longitud 55.72 metros en tubería de 12", con intervención de toda la zona peatonal la cual por encontrarse terreno con gran cantidad de roca, toda el área que conformaba el peatonal se levanto aumentando la cantidad de obra contratada en algunos ítems.

-Debido a los cambios de alineamiento presentado y los cambios de pendiente se presenta la necesidad de construir dos cámaras de Inspección para modificar las pendientes inicial proyectadas.

-Todas la Domiciliarias del sector fueron modificadas y construidas técnicamente y modificándose su respectivas cajas de inspección donde la Mayoría de las viviendas carecían de esta estructura.

El total de la inversión Final para la EMERGENCIA No. 002 de Febrero 12 de 2019 fue de \$ 52.081.929,00 equivalente al 99.61%.

*Handwritten signature*

-Se hicieron algunas obras internas en una vivienda debido a la humedad interior que presentaba por la falla en la red Principal la cual se filtro por el sub-suelo y afloro a la superficie.

-Las excavaciones tenían un gran contenido de rocas, aproximada al 85% dando lugar a su remoción y ampliar las zanjas para poder nivelar el fondo y colocar la tubería dando lugar a que la profundidad variara para un promedio aproximado de 1,30 m.

#### 1.6.-Avance financiero

Inversión Contratada:	52.288.252
Inversión ejecutada en el periodo:	52.081.929
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.61%
Inversión total ejecutada:	52.081.929
Porcentaje total ejecutado:	99.61%

#### CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	Nº. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101039354	12/02/2019	12/03/2022	10.457.650,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101039354	CINCO AÑOS 0 MESES	0 DÍAS	10.457.650,40
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101039354	12/02/2019	12/06/2019	15.686.475,60
Reponsabilidad Civil	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40-101029595	12/02/2019	12/06/2019	15.686.475,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101039354	Dos años 0 meses	28 días.	10.457.650,40

#### 2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Ingeniero zona	X	X	X	X	X
Maestro de obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	x	X	X	X	X

*APB*

**CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)**  
**SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)**

3. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARZO 21 DE 2019	A	A	A	A	N/A	A	A	N/A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

4. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ABEL ROJAS RUBIANO  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION		DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)	
														DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA				
		Acto No. 002 de febrero 12 de 2019					PALESTINA												
C0-C1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181508	PAVCO	860.005.050-1	22/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C0-C1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181226	PAVCO	860.005.050-1	25/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C0-C1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	0,40	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181203	PAVCO	860.005.050-1	25/02/2019		N/A	N/A	N/A	
C1-C2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	4,80	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181208	PAVCO	860.005.050-1	28/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C1-C2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181245	PAVCO	860.005.050-1	4/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C1-C2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181238	PAVCO	860.005.050-1	4/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C1-C2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181508	PAVCO	860.005.050-1	12/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C2-C3	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	5,52	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181203	PAVCO	860.005.050-1	12/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C2-C3	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181232	PAVCO	860.005.050-1	15/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C2-C3	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181221	PAVCO	860.005.050-1	19/03/2019		N/A	N/A	N/A	
C2-C3	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	304,8 MM - (12")	6,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	12681181232	PAVCO	860.005.050-1	19/03/2019		N/A	N/A	N/A	
Código 01224	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	2,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	919070609	PAVCO	860.005.050-1	25/02/2019		N/A	N/A	N/A	
Código 01225	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	1,50	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	919070609	PAVCO	860.005.050-1	25/02/2019		N/A	N/A	N/A	
Código 01226	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	4,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	919095003	PAVCO	860.005.050-1	25/02/2019		N/A	N/A	N/A	
Código 01226	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	2,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	170708P	SAP 2900839	919070609	PAVCO	860.005.050-1	25/02/2019		N/A	N/A	N/A	

CONTRATO No	Acto No. 002 de febrero 12 de 2019	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	PALESTINA	SI	170708P	SAP 2500839	919080503	PAVCO	860.005.050-1	1/04/2019	N/A	N/A	N/A
		RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	PVC	SI	170708P	SAP 2500839	919080503	PAVCO	860.005.050-1	1/04/2019	N/A	N/A	N/A
		RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	PVC	SI	170708P	SAP 2500839	919110302	PAVCO	860.005.050-1	1/04/2019	N/A	N/A	N/A
		RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	PVC	SI	170708P	SAP 2500839	919110302	PAVCO	860.005.050-1	18/04/2019	N/A	N/A	N/A
		RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	PVC	SI	170708P	SAP 2500839	919110302	PAVCO	860.005.050-1	18/04/2019	N/A	N/A	N/A
		RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	PVC	SI	170708P	SAP 2500839	919208621	PAVCO	860.005.050-1	23/04/2019	N/A	N/A	N/A
		RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	152,4 MM - (6")	PVC	SI	170708P	SAP 2500839	919208621	PAVCO	860.005.050-1	23/04/2019	N/A	N/A	N/A
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S - R.L. MAURICIO MARLA-PIGUA															
NOMBRE CONTRATISTA															
FIRMA CONTRATISTA															

Abel Rojas Rueda  
 A. ROJAS R.

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

Manizales, Mayo 17 de 2019

Doctor  
JUAN PABLO TOBON  
Jefe Departamento comercial.  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


REF: Documentos para el cobro de Domiciliarias- Emergencia ACTO No. 002 de 2019.

Para el trámite correspondiente, me permito adjuntar los documentos debidamente diligenciados y corregidos por la Trabajadora Social de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Correspondiente a la EMERGENCIA ACTO No. 002 DE 2019.

SE ADJUNTA:

- a.- Formato F-GC-43 Tramitado por la Trabajadora Social de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Donde se manifiesta que los documentos exigidos se encuentran dentro el debido proceso de socialización.
- b.- Todos los formatos, Informes, que hacen parte de la Socialización por parte del CONTRATISTA. Incluye F-G-25, F-GC-50, F-GC-51, FG-C-52 Y PRESUPUESTO FINAL DE LAS Domiciliarias.-

Cordialmente,



ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Norte  
Supervisor.

Recibi:  
Fausto Lopez.  
17/05/2019



Manizales, Mayo 17 de 2019

Ingeniero:  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de zona  
**EMPOCALDAS S.A.E.S.P.**


Asunto: Remisión F-AC-52 Acto No.002 del 12 de febrero de 2019

Respetado ingeniero,

Me permito remitirle los formatos F-AC-52 correspondientes al Acto No.002 del 12 de febrero de 2019 cuyo objeto es: "REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS, que se relacionan a continuación:

No.	SUSCRIPTOR	DIRECCIÓN	VALOR
1	Angie Vanesa Morales	Calle 3 - Escalas Oscar Zapata	889.543,0
2	Fernando Berrio	Calle 3 - Escalas Oscar Zapata (Piso 2)	889.543,0
3	Leonardo Acevedo - Francy Nelly Herrera	Escalas José Restrepo - Piso 2	889.543,0
4	José Johan - Restrepo	Escalas José Restrepo - Piso 1	777.982,0
5	Gladis Aguirre	Cra.3 #3B-10	777.982,0
6	Juan Bautista Maldonado	Escalas José Restrepo	334.681,0
7	Carolina Jaramillo	Escalas José Restrepo - Piso 2	889.543,0
8	Maria Aracelly Ríos	Cra.3 Calle 3 #231	846.061,0
9	Gabriela Moncada	Calle 3 #3-40	1.335.785,0
10	Luis Fernando Berrio - Verónica López	Calle 3 #3B-17	734.501,0

Atentamente,

  
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
NIT: 810002768-5  
R.L.: MAURICIO MAFLA GARCIA

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE  
TEL: 3128431238  
MANIZALES - CALDAS



FECHA DE VISITA  
 DIA 8 MES Marzo AÑO 2019 HORA 6:00

NOMBRE DEL USUARIO: Jose Reinel Aguirre  
 DIRECCION: Calle 3 a 2810 MUNICIPIO: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO: 312031811 HORA DE INICIO: \_\_\_\_\_ HORA DE FINALIZACION: \_\_\_\_\_  
 CODIGO DE USUARIO: 02197

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).  
PVC

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO \_\_\_\_\_ SI   
 NO

INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA  
 NOMBRE DEL TÉCNICO PARTICULAR: \_\_\_\_\_  
 MATRICULA: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO CONTACTO: \_\_\_\_\_


El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALIBAS le cambie la acometida  
Reinel Aguirre SI   
 FIRMA DEL USUARIO NO

**FECHA DE VISITA**  
 DIA 12 MES Marzo AÑO 2019 HORA 9:00

NOMBRE DEL USUARIO: Georgina Acevedo - Nancy Nelly Hosten  
 DIRECCION: Georgina Acevedo - MUNICIPIO: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ HORA DE INICIO: \_\_\_\_\_ HORA DE FINALIZACION: \_\_\_\_\_  
 CODIGO DE USUARIO: 01181 HORA DE INICIO: 9:00

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).

**ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

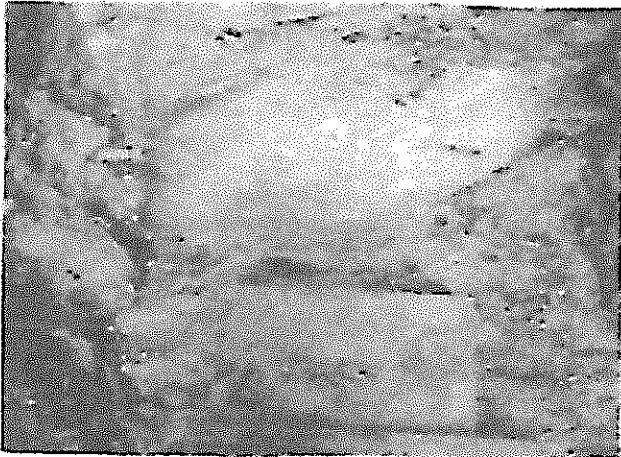

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO  SI  NO  
 NO  SI

**INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA**  
 NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR: \_\_\_\_\_  
 MATRICULA: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO CONTACTO: \_\_\_\_\_

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALDAS le cambie la acometida

  
 FIRMA DEL USUARIO  SI  NO  
 NO  SI

FECHA DE VISITA  
 DIA 8 MES Marzo AÑO 2019 HOJA 5 DE 00

NOMBRE DEL USUARIO: José Manuel Ojeda  
 DIRECCION: Calle 3 # 2810 MUNICIPIO: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO: 312 20 21811 HORA DE INICIO: \_\_\_\_\_ HORA DE FINALIZACION: \_\_\_\_\_  
 CODIGO DE USUARIO: 02197

Características generales de la acometida y estado (Obras requeridas, costos, materiales, etc).  
PVC

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, en las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO: \_\_\_\_\_ SI  NO

INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA  
 NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR: \_\_\_\_\_  
 MATRICULA: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO CONTACTO: \_\_\_\_\_

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALONS le cambie la acometida  
Reinel Ojeda SI  NO   
 FIRMA DEL USUARIO



FAC-01  
Versión 3  
Abril 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.F.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO  
ACTA DE VISITA A ACOMETIDA

FECHA DE VISITA  
DIA 17 MES Marzo AÑO 2018 HORA 12:00

NOMBRE DEL USUARIO: Tatiana Piedrahíta - Jose Jehon Restrepo  
 REGION: Guayas - Oscar Zapata MUNICIPIO: Valencia - Palenque  
 TELEFONO: 3215968940 HORA DE INICIO: 12:00 HORA DE FINALIZACION: 12:30  
 CODIGO DE USUARIO: 012045

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).  
  
PUL

**ANEXOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA**



El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO  SI   
 NO

**INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA**

NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR:  
 MATRICULA:  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
 TELEFONO CONTACTO:

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALDAS le cambie la acometida

Tatiana Piedrahíta  SI   
 FIRMA DEL USUARIO  NO



EM 51  
Versión 3  
Abril 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO  
ACTA DE VISITA A ACOMETIDA

FECHA DE VISITA

DA B MES Uganda AÑO 2019 HORA 10:00 am

NOMBRE DEL USUARIO: Edys Aguirre  
 DIRECCION: Carrera 3 - 3810 MUNICIPIO: Aracataca  
 TELEFONO: 3122031811 HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE FINALIZACION: 10:30  
 CODIGO DE USUARIO: 02193

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).

PVC

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA



El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO

SI

NO

INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA

NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR:

MATRICULA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TELEFONO CONTACTO:

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALDAS le cambie la acometida

FIRMA DEL USUARIO

SI

NO



EMPOCALDAS  
Versión 3  
Año 2016


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO  
ACTA DE VISITA A ACOMETIDA

FECHA DE VISITA  
DÍA 8 MES 3 AÑO 2019 HORA 11:00

NOMBRE DEL USUARIO: Miana Patricia Aguilar - Luz Galicia  
DIRECCION: calle ESR # 23 B 24 MUNICIPIO: MEXCALCO  
TELEFONO: 3132112294 HORA DE INICIO: 11:00 HORA DE FINALIZACION: 11:30  
CODIGO DE USUARIO: 0122

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc.)  
PVC

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA

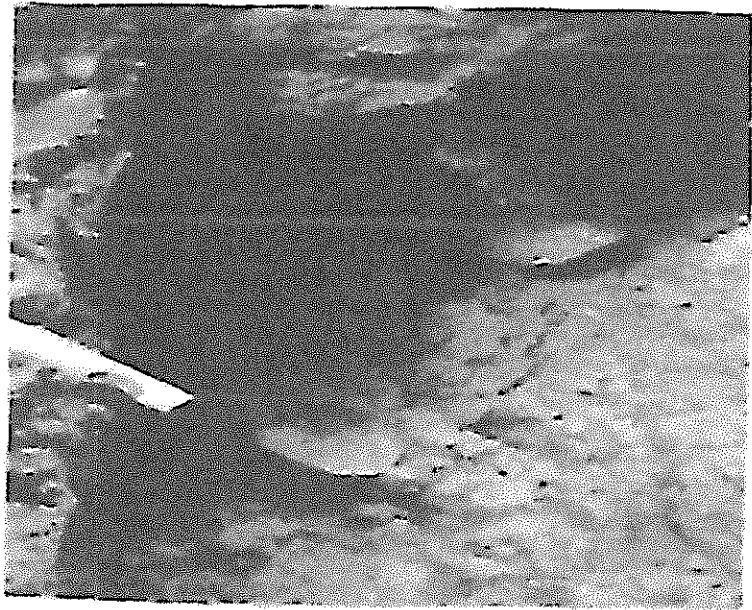

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO  SI  NO

INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA

NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR:  
MATRICULA:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
TELEFONO CONTACTO:

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALDAS le cambie la acometida

Miana Lucena Salcedo  SI  NO  
FIRMA DEL USUARIO

FECHA DE VISITA  
 DIA 8 MES Noviembre AÑO 2019 HORA 2:00

NOMBRE DEL USUARIO: Norberto Luyx Herrera  
 DIRECCION: calle 3 # 3-40 MUNICIPIO: Diqueno  
 TELEFONO: 3215145262 HORA DE INICIO: 1:00 pm HORA DE FINALIZACION: 2:45 pm  
 CODIGO DE USUARIO: 01228

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).  
Cemento

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA



El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO \_\_\_\_\_ SI   
 NO


INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA  
 NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR: \_\_\_\_\_  
 MATRICULA: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO CONTACTO: \_\_\_\_\_

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALDAS le cambie la acometida  
 FIRMA DEL USUARIO [Signature] SI   
 NO

FECHA DE VISITA  
 DIA 6 MES Marzo AÑO 2019 HORA 9:00

NOMBRE DEL USUARIO: Veronica Lopez  
 DIRECCION: Calle 3 # 3817 MUNICIPIO: Ortega  
 TELEFONO: 3195201680 HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE FINALIZACION: 9:30  
 CODIGO DE USUARIO: 01225

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).  
PVC

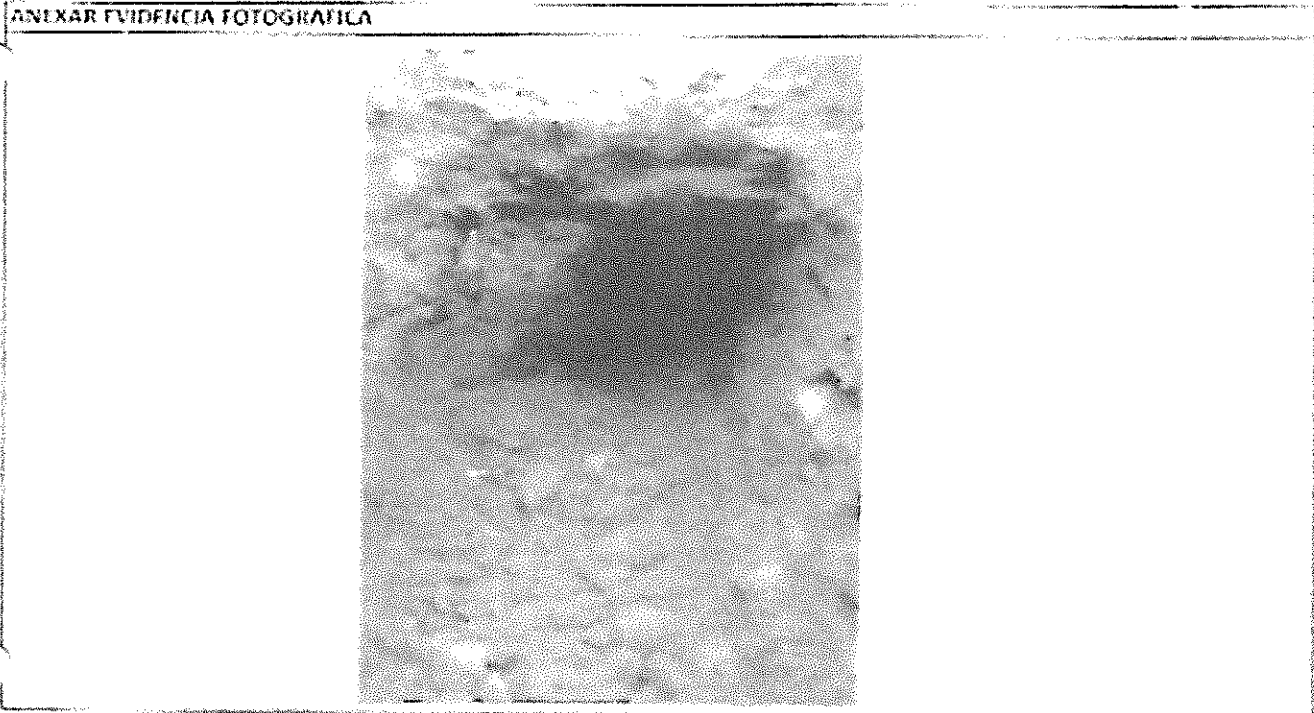

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI   
 FIRMA DEL USUARIO   
 NO

INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA

NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR: \_\_\_\_\_  
 MATRICULA: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO CONTACTO: \_\_\_\_\_

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALDAS le cambie la acometida

Veronica Lopez  SI   
 FIRMA DEL USUARIO  NO



FECHA DE VISITA  
 DIA 12 MES Marzo AÑO 2019 HORA 11:00

NOMBRE DEL USUARIO: <u>Carolina Jaramillo</u>		
DIRECCION:	MUNICIPIO:	
TELEFONO: <u>3144425644</u>	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION
CODIGO DE USUARIO: <u>01202</u>	<u>11:00</u>	<u>11:30</u>

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).

ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA



El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO

SI

NO

INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA

NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR:  
 MATRICULA:  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
 TELEFONO CONTACTO:

El usuario voluntariamente acepta que EMPOCALDAS le cambie la acometida

Carolina Jaramillo

FIRMA DEL USUARIO

SI

NO

FECHA DE VISITA  
 DIA 12 MES Nov AÑO 2019 HORA 10:00

NOMBRE DEL USUARIO: Juan Bautista Valderrama  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: Draque  
 TELEFONO: 01182 HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE FINALIZACION: 10:30  
 CODIGO DE USUARIO: 01182

Características generales de la acometida y estado (Obra requerida, costos, materiales, etc).  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

FIRMA DEL USUARIO  SI  NO

INFORMACION DEL PARTICULAR QUE REALIZARA LA OBRA  
 NOMBRE DEL TECNICO PARTICULAR: \_\_\_\_\_  
 MATRICULA: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO CONTACTO: \_\_\_\_\_

El usuario voluntariamente acepta que IMPOCALDAS le cambie la acometida  
 FIRMA DEL USUARIO Juan Valderrama  SI  NO

FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - fin)	8:45 a. m.   9:50AM
NOMBRE SUSCRIPTOR	ANGIE VANESA MORALES	CODIGO	1226
DIRECCIÓN	CALLE 3 - ESCALAS OSCAR ZAPATA	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS

**CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**  
NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

**PRESUPUESTO DEFINITIVO:**

CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>EXCAVACION</b>					
	En material común	m <sup>3</sup>	0,36	\$ 26.317,0	\$ 9.474,0
	En roca	m <sup>3</sup>	1,44	\$ 61.372,0	\$ 88.376,0
<b>ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO</b>					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	2,00	\$ 133.641,0	\$ 267.282,0
	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Instalación de silletas de 12"x6"	un	1,00	\$ 43.482,0	\$ 43.482,0
<b>LLENOS</b>					
	Arena para base y atraque	m <sup>3</sup>	0,12	\$ 120.657,0	\$ 14.479,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m <sup>3</sup>	1,44	\$ 22.131,0	\$ 31.869,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m <sup>2</sup>	0,24	\$ 144.847,0	\$ 34.763,0

<b>COSTO DIRECTO</b>				\$ 659.165,0
ADMINISTRACION	%	\$ 659.165,0	24	\$ 158.200,0
IMPREVISTOS	%	\$ 659.165,0	5	\$ 32.958,0
UTILIDADES	%	\$ 659.165,0	5	\$ 32.958,0
I.V.A.	%	\$ 32.958,0	19	\$ 6.262,0

**TOTAL AIU** \$ 230.378,0

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

**SUMA MATERIALES** \$ -

**VALOR TOTAL OBRAS** \$ 889.543,0

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
<b>OBSERVACIONES</b>			
LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO			

Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario". EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	0 MESES
--	---------

**OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)**  
La señora Angie Vanesa no se encuentra en el domicilio firman 2 vecinas

Andrés Orozco Ramos

Firma de quien realiza la visita

Firma del Administrador

(Angie Vanesa)

Firma Suscriptor o Usuario

• Mariana Martínez.  
• Freddy Pico

FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - Fin)	11:00 a. m.	11:15AM
NOMBRE SUSCRIPTOR	FERNANDO BERRIO	CODIGO	1227	
DIRECCIÓN	CALLE 3 ESCALAS OSCAR ZAPATA PISO 2	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS	

**CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**  
NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

**PRESUPUESTO DEFINITIVO:**

CONTRATO:	ACTO 002 DE FERRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
EXCAVACION					
	En material común	m <sup>3</sup>	0,36	\$ 26.317,0	\$ 9.474,0
	En roca	m <sup>3</sup>	1,44	\$ 61.372,0	\$ 88.376,0
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	2,00	\$ 131.641,0	\$ 267.282,0
	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Instalación de silletas de 12"x6"	un	1,00	\$ 43.482,0	\$ 43.482,0
LLENOS					
	Arena para base y atraque	m <sup>3</sup>	0,12	\$ 120.657,0	\$ 14.479,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m <sup>3</sup>	1,44	\$ 22.131,0	\$ 31.869,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m <sup>3</sup>	0,24	\$ 144.847,0	\$ 34.763,0

COSTO DIRECTO				\$ 659.165,0
ADMINISTRACION	%	\$ 659.165,0	24	\$ 158.200,0
IMPREVISTOS	%	\$ 659.165,0	5	\$ 32.958,0
UTILIDADES	%	\$ 659.165,0	5	\$ 32.958,0
I.V.A.	%	\$ 32.958,0	19	\$ 6.262,0
<b>TOTAL AIU</b>				<b>\$ 230.378,0</b>

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>SUMA MATERIALES</b>				<b>\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL OBRAS</b>				<b>\$ 889.543,0</b>

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
<b>OBSERVACIONES</b>			
LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO			

Supervisor o Interventor del Contrato *[Firma]*

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	0 MESES
--	---------

**OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)**

*Andreo Orozco Ramos*  
Firma de quien realiza la visita  
*[Firma]*  
Firma del Administrador

*Mariluzena Gallego*  
Firma Suscriptor/Usuario

FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (inicio - fin)	8:30 AM a. m.	8:45AM
NOMBRE SUScriptor	LEONARDO ACEVEDO - FRANCY NELLY HERRERA	CODIGO	1181	
DIRECCIÓN	ESCALAS JOSÉ RESTREPO - PISO 2	MUNICIPIO	COREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS	

**CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**

NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE


PRESUPUESTO DEFINITIVO:

CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	<input checked="" type="checkbox"/>
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>EXCAVACION</b>					
	En material común	m <sup>3</sup>	0,36	\$ 26.317,0	\$ 9.474,0
	En roca	m <sup>3</sup>	1,44	\$ 61.372,0	\$ 88.376,0
<b>ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO</b>					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	2,00	\$ 133.641,0	\$ 267.282,0
	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Instalación de silletas de 12"x6"	un	1,00	\$ 43.482,0	\$ 43.482,0
<b>LLENOS</b>					
	Arena para base y atraque	m <sup>3</sup>	0,12	\$ 120.657,0	\$ 14.479,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m <sup>3</sup>	1,44	\$ 22.131,0	\$ 31.869,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m <sup>3</sup>	0,24	\$ 144.847,0	\$ 34.763,0

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>\$ 659.165,0</b>
ADMINISTRACION	% \$ 659.165,0 24 \$ 158.200,0
IMPREVISTOS	% \$ 659.165,0 5 \$ 32.958,0
UTILIDADES	% \$ 659.165,0 5 \$ 32.958,0
I.V.A.	% \$ 32.958,0 19 \$ 6.262,0
<b>TOTAL AIU</b>	<b>\$ 230.378,0</b>
<b>MATERIALES</b>	<b>UND CANT. VR. UNITARIO VALOR TOTAL</b>
<b>SUMA MATERIALES</b>	<b>\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL OBRAS</b>	<b>\$ 889.543,0</b>

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OBSERVACIONES</b>			
LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO			


Supervisor o Interventor del Contrato 

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuarios". EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	0 MESES
--	---------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Andrea Drozco Ramos  
 Firma de quien realiza la visita

  
 Firma del Administrador

Carolina Baena H.  
 Firma Suscriptor o Usuario

	F-AC-82 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA
--	-----------------------------------	---

FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - fin)	8:30 AM a. m.   8:45 AM
NOMBRE SUSCRIPTOR	JOSÉ JOHAN RESTREPO	CODIGO	1204
DIRECCIÓN	ESCALAS JOSÉ RESTREPO - PISO 1	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CAIDAS

**CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**

NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

**PRESUPUESTO DEFINITIVO:**

CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>EXCAVACION</b>					
	En material común	m <sup>3</sup>	0,27	\$ 26.317,0	\$ 7.106,0
	En roca	m <sup>3</sup>	1,08	\$ 61.372,0	\$ 66.282,0
<b>ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO</b>					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	1,50	\$ 132.641,0	\$ 200.462,0
	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Instalación de silletas de 12"x6"	un	1,00	\$ 43.482,0	\$ 43.482,0
<b>LLENOS</b>					
	Arena para base y atraque	m <sup>3</sup>	0,09	\$ 120.657,0	\$ 10.859,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m <sup>3</sup>	1,08	\$ 22.131,0	\$ 23.901,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m <sup>3</sup>	0,18	\$ 144.847,0	\$ 26.072,0

COSTO DIRECTO				\$ 576.496,0
ADMINISTRACION	%	\$ 576.496,0	24	\$ 138.359,0
IMPREVISTOS	%	\$ 576.496,0	5	\$ 28.825,0
UTILIDADES	%	\$ 576.496,0	5	\$ 28.825,0
I.V.A.	%	\$ 28.825,0	19	\$ 5.477,0
<b>TOTAL AJU</b>				<b>\$ 701.486,0</b>
<b>MATERIALES</b>	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMA MATERIALES				\$ -
VALOR TOTAL OBRAS				\$ 777.982,0

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?  SI  NO

**OBSERVACIONES**

LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO

Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario". EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación suscrita 30 días de finalización de la obra.

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago  MESES

**OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)**

Andrés Orozco Ramos  
Firma de quien realiza la visita

[Firma]  
Firma de Administrador

[Firma]  
Firma Suscriptor o Usuario

	F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPQCALDAS S.A.E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA	

FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - fin)	10:30 a. m.   10:45AM
NOMBRE SUSCRIPTOR	GLADIS AGUIRRE	CODIGO	2197
DIRECCIÓN	CARRERA 3 # 3810	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS

**CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**

NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

PRESUPUESTO DEFINITIVO:				
CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
EXCAVACION					
	En material común	m³	0,27	\$ 26.317,0	\$ 7.106,0
	En roca	m³	1,08	\$ 61.372,0	\$ 66.282,0
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	1,50	\$ 133.641,0	\$ 200.462,0
	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Instalación de silleas de 12"x6"	un	1,00	\$ 43.482,0	\$ 43.482,0
LLENOS					
	Arena para base y atraque	m³	0,09	\$ 120.657,0	\$ 10.859,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m³	1,08	\$ 21.131,0	\$ 23.501,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m³	0,18	\$ 144.847,0	\$ 26.072,0

COSTO DIRECTO					\$ 576.496,0
ADMINISTRACION	%	\$ 576.496,0	24	\$ 138.359,0	
IMPREVISTOS	%	\$ 576.496,0	5	\$ 28.825,0	
UTILIDADES	%	\$ 576.496,0	5	\$ 28.825,0	
I.V.A.	%	\$ 28.825,0	19	\$ 5.477,0	

TOTAL AIU \$ 201.486,0

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

SUMA MATERIALES \$ -

VALOR TOTAL OBRAS \$ 777.982,0

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
OBSERVACIONES			
LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO			

Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".  
EMPQCALDAS S.A.E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	0 MESES
--	---------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Andreo Drozco Ramos

Firma de quien realiza la visita

*[Firma]*

Firma del Administrador

*[Firma]*  
Firma Suscriptor o Usuario

FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - fin)	8:30 AM a. m. 8:45AM
NOMBRE SUSCRIPTOR	JUAN BALISTITA MALDONADO	CODIGO	1182
DIRECCIÓN	ESCALAS JOSÉ RESTREPO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS

**CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**  
 NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

**PRESUPUESTO DEFINITIVO:**

CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>EXCAVACION</b>					
	En material común	m³	0,27	\$ 26.117,0	\$ 7.106,0
	En roca	m³	1,08	\$ 61.372,0	\$ 66.282,0
<b>ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO</b>					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	1,50	\$ 131.641,0	\$ 200.462,0
	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	0,00	\$ 399.818,0	\$ -
	Instalación de silletes de 12"x6"	un	0,00	\$ 43.482,0	\$ -
<b>LLENOS</b>					
	Arena para base y atraque	m³	0,09	\$ 120.657,0	\$ 10.859,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m³	1,08	\$ 22.131,0	\$ 23.901,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m³	0,18	\$ 144.847,0	\$ 26.072,0

<b>COSTO DIRECTO</b>				\$ 248.004,0
ADMINISTRACION	%	\$ 248.004,0	24	\$ 59.521,0
IMPREVISTOS	%	\$ 248.004,0	5	\$ 12.400,0
UTILIDADES	%	\$ 248.004,0	5	\$ 12.400,0
I.V.A.	%	\$ 12.400,0	19	\$ 2.356,0

**TOTAL AJU** \$ 86.677,0

MATERIALES	UND	CANT.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL

<b>SUMA MATERIALES</b>	\$ -
<b>VALOR TOTAL OBRAS</b>	\$ 334.681,0

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
<b>OBSERVACIONES</b>			
LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO			

Supervisor o Interventor del Contrato *[Firma]*

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".  
 EMPOCALDAS S A E S P, le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	0 MESES
--	---------

**OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)**  
 14 de Mayo 2019. Fallece el Sr. Juan B. Maldonado *Flores*

*Andreo Orozco Ramos*  
 Firma de quien realiza la visita  
*[Firma]*  
 Firma del Administrador

*Pauley Andrea Agudelo*  
 Firma Suscriptor o Usuario  
*[Firma]*



FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - fin)	8:30 AM a. m.	8:15AM
NOMBRE SUSCRIPTOR	CAROLINA JARAMILLO	CODIGO	1203	
DIRECCIÓN	ESCALAS JOSÉ RESTREPO - PISO 2	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

PRESUPUESTO DEFINITIVO:

CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>EXCAVACION</b>					
	En material común	m³	0,36	\$ 26.317,0	\$ 9.474,0
	En roca	m³	1,44	\$ 61.372,0	\$ 88.376,0
<b>ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO</b>					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	2,00	\$ 133.641,0	\$ 267.282,0
	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Instalación de silletas de 12"x6"	un	2,00	\$ 43.482,0	\$ 43.482,0
<b>LLENOS</b>					
	Arena para base y atraque	m³	0,12	\$ 120.657,0	\$ 14.479,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m³	1,44	\$ 22.131,0	\$ 31.869,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m³	0,24	\$ 144.847,0	\$ 34.763,0

COSTO DIRECTO

\$ 659.165,0

ADMINISTRACION	%	\$ 659.165,0	24	\$ 158.200,0
IMPREVISTOS	%	\$ 659.165,0	5	\$ 32.958,0
UTILIDADES	%	\$ 659.165,0	5	\$ 32.958,0
I.V.A.	%	\$ 32.958,0	19	\$ 6.262,0

TOTAL AIIU

\$ 230.378,0

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

SUMA MATERIALES

\$ -

VALOR TOTAL OBRAS

\$ 889.543,0

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?

SI

NO

X

OBSERVACIONES

LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO

Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".  
EMPICALDAS S.A. E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago

0 MESES

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Andrés Orozco Ramos

Firma de quien realizó la visita

Firma del Administrador

Paula Andrea Agualeto

Firma Suscriptor o Usuario

FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - Fin)	10:00 a. m.   10:15AM
NOMBRE SUScriptor	MARIA ARACELLY RÍOS	CODIGO	1774
DIRECCIÓN	CARRERA 5 CALLE 3 # 231	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CAIDAS

**CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**  
NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

**PRESUPUESTO DEFINITIVO:**

CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
EXCAVACION					
	En material común	m³	0,36	\$ 26.317,0	\$ 9.474,0
	En roca	m³	1,44	\$ 61.372,0	\$ 88.376,0
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO					
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	2,00	\$ 133.641,0	\$ 267.282,0
	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Instalación de silletas de 12"x6"	un	0,00	\$ 41.482,0	\$ -
LLENOS					
	Arena para base y atraque	m³	0,12	\$ 120.657,0	\$ 14.479,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m³	1,44	\$ 22.131,0	\$ 31.869,0
	Subbase para pavimentos y escalas	m³	0,24	\$ 144.847,0	\$ 34.763,0

<b>COSTO DIRECTO</b>				\$ 626.944,0
ADMINISTRACION	%	\$ 626.944,0	24	\$ 150.467,0
IMPREVISTOS	%	\$ 626.944,0	5	\$ 31.347,0
UTILIDADES	%	\$ 626.944,0	5	\$ 31.347,0
I.V.A.	%	\$ 31.347,0	19	\$ 5.956,0
<b>TOTAL IAU</b>				\$ 219.117,0
MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>SUMA MATERIALES</b>				\$ -
<b>VALOR TOTAL OBRAS</b>				\$ 846.061,0

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
<b>OBSERVACIONES</b>			
LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO			

Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario". EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	0 MESES
--	---------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)


Andrea Orozco Ramos

Firma de quien realiza la visita

Firma del Administrador

Maria Aracelly Ríos

Firma Suscriptor o Usuario

 F-AC-82 Versión 1 Mayo 2017		<b>EMPOCALDAS S.A.S.</b> <b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b> <b>ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA</b>	
FECHA DE VISITA	28/03/2019	HORA (Inicio - fin)	9.00 a. m. 9:15AM
NOMBRE SUSCRIPTOR	LUIS FERNANDO BERRIO - VERONICA LOPEZ	CODIGO	1225
DIRECCIÓN	CARRERA 3 - 3017	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS

**CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA**

NO TIENE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO - SE DEBE REALIZAR NUEVA COMPLETAMENTE

**PRESUPUESTO DEFINITIVO:**

CONTRATO:	ACTO 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	AC	AL	X
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSE RESTREPO Y CONSTRUCCION CAMARA PARA DESTAPONAR TUBERIA DE ALCANTARILLA DIAGONAL ESTACION DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
EXCAVACION		m <sup>3</sup>	0,27	\$ 26.317,0	\$ 7.106,0
	En material común	m <sup>3</sup>	1,08	\$ 61.372,0	\$ 66.282,0
	En roca				
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO		m <sup>l</sup>	1,50	\$ 133.641,0	\$ 200.462,0
	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	un	1,00	\$ 399.818,0	\$ 399.818,0
	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	0,00	\$ 43.487,0	\$ -
	Instalación de silleas de 12"x6"				
LLENOS		m <sup>3</sup>	0,09	\$ 120.657,0	\$ 10.859,0
	Arena para base y atraque	m <sup>3</sup>	1,08	\$ 22.131,0	\$ 23.901,0
	Lleno compactado con material de préstamo	m <sup>3</sup>	0,18	\$ 144.847,0	\$ 26.072,0
	Subbase para pavimentos y escalas				

<b>\$ 544.276,0</b>				
<b>COSTO DIRECTO</b>				
ADMINISTRACION	%	\$ 544.276,0	24	\$ 130.626,0
IMPREVISTOS	%	\$ 544.276,0	5	\$ 27.214,0
UTILIDADES	%	\$ 544.276,0	5	\$ 27.214,0
I.V.A.	%	\$ 27.214,0	19	\$ 5.171,0
<b>\$ 190.225,0</b>				
<b>TOTAL AIU</b>				
MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>\$ -</b>				
<b>\$ 734.501,0</b>				

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
<b>OBSERVACIONES</b>			
LA ACOMETIDA DOMICILIARIA NO GENERA COBRO			

Supervisor o Interventor del Contrato

*[Firma]*

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".

EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	0 MESES
--	---------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Andreo Orozco Ramos

Firma de quien realiza la visita

*[Firma]*

Firma del Administrador

Veronica Lopez Florz


Firma Suscriptor o Usuario




**ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

CONTRATO	EMERGENCIA –ACTO No. 002 DE FEBRERO 12 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCIÓN COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSÉ RESTREPO Y CONSTRUCCIÓN CÁMARAS PARA DESTAPONAR TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DIAGONAL ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.-
CONTRATISTA	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
NIT.	810. 002.768- 5
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO MAFLA GARCÍA
C.C.	10.011.673
MUNICIPIO	CORREGIMIENTO DE ARAUCA, CALDAS.-
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 38.746.389
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 9.299.133
IMPREVISTOS 5%	\$ 1.937.319
UTILIDAD 5 %	\$ 1.937.319
I.V.A. 19 %	\$ 368.091
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 52.288.252</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 52.081.929</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 206.323</b>
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
INTERVENTOR	INGENIERO ZONA
CDP	00132 DE ENERO 02 DE 2019
CDP	00305 DE FEBRERO 07 DE 2019
R.P.	00288 DE FEBRERO 12 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los Doce (12) días del mes de Abril de 2019 se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor MAURICIO MAFLA GARCÍA Representante Legal de LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL Según Contrato DE EMERGENCIA ACTO No. 002 DE FEBRERO 12 DE 2019.

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Oriente  
Interventor

  
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.  
R.L.: Mauricio Mafla Garcia.  
Contratista.



**EMPOCALDAS A.S. E.S.P.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**SECCIONAL- ARAUCA - CALDAS -**

CONTRATO No: DECLARATORIA DE EMERGENCIA- ACTO No. 002 DE FEBRERO 12 DE 2019 / ACTA No.: FINAL / FECHA CORTE: ABRIL 12 DE 2019 /  
 OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL / FECHA INICIACIÓN: FEBRERO 18 DE 2019 / FECHA VENCIMIENTO: MARZO 19 DE 2019  
 ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSÉ RESTREPO Y CONSTRUCCIÓN CÁMARA PARA DESTAPAR / VALOR CONTRATO: \$ 52.288.252,00 / NUEVA FECHA VENCIMIENTO: ABRIL 19 DE 2019  
 TUBERÍA DE ALCANTARILLA DIAGONAL A LA ESTACION DE SERVICIO ..... MPIO PALESTINA. / VALOR ADICION No. 1: /  
 CONTRATISTA: LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. / SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO / FECHA: MAYO 15 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR.PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL				
1	PRELIMINARES													
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	mts	66,00	5.214	0	0	57,52	299.909,0	57,52	299.909,0	87,15			
3	Cerramiento con tela verde y soportes de piedad cada 2 metros.	mts	144,00	13.608	0	0	80,22	1.091.634,0	80,22	1.091.634,0	55,71			
4	Señal preventiva y reglamentaria.	Und	2,00	155.348	0	0	4,00	631.396,0	4,00	631.396,0	200,00			
5	Instalación de Valla institucional 2 x 4	und	1,00	786.410	0	0	1,00	786.410,0	1,00	786.410,0	100,00			
6	DEMOLICIONES													
7	Cortes con disco abrasivo	m	80,00	7.630	0	0	32,33	246.678,0	32,33	246.678,0	40,41			
8	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, graderías y cañuelas.	m3	16,00	83.312	0	0	20,01	1.667.023,0	20,01	1.667.023,0	125,06			
9	EXCAVACIONES													
10	En material Común 0 a 2 m	m3	70,00	26.317	0	0	25,72	676.752,0	25,72	676.752,0	36,74			
11	En roca	m3	40,00	61.372	0	0	95,48	5.859.799,0	95,48	5.859.799,0	100,00			
12	Entibado horizontal tipo 1	ml	10,00	31.128	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Retiro de material sobrante en vehículo Automotor escombrera Manizales	ml	50,00	65.000	0	0	115,49	7.506.850,0	115,49	7.506.850,0	100,00			
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO													
15	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada DE 12"	ml	66,00	133.641	0	0	52,72	7.045.554,0	52,72	7.045.554,0	79,88			
16	Cámara de Calda De 1,2 Hcs 3,04 espesor de pared e=0,20 con colchon de piedra pegada e=40 cms. y boquilla.	ml	5,00	67.411	0	0	4,25	2.708.997,0	4,25	2.708.997,0	85,00			
17	Suministro e instalación de tapa con anillo de inspección de HF D= 60 cms tráfico pesado.	und	3,00	635.200	0	0	3,00	1.905.600,0	3,00	1.905.600,0	100,00			
18	Base y Cañuela	und	3,00	540.447	0	0	3,00	1.621.341,0	3,00	1.621.341,0	100,00			
19	Caja Cuadrada de 0,80 x 0,80 mts por H con Cañuela y tapa.	und	4,00	568.000	0	0	1,00	568.000,0	1,00	568.000,0	25,00			
20	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada DE 6" para domiciliarías	ml	14,00	41.645	0	0	20,00	832.900,0	20,00	832.900,0	142,86			
21	Caja de inspección 0,50 x 0,50 para domiciliarías, incluye tapa en concreto.	und	8,00	399.818	0	0	9,00	3.598.362,0	9,00	3.598.362,0	112,50			
22	Instalación de sillerías de 12 x 6"	und	8,00	43.482	0	0	7,00	304.374,0	7,00	304.374,0	87,50			
23	Empalme Cámaras	und	4,00	90.312	0	0	4,00	361.248,0	4,00	361.248,0	100,00			
24	LLENOS													
25	Arena para base y atraque	m3	12,00	120.657	0	0	13,23	1.596.292,0	13,23	1.596.292,0	110,25			
26	Lleno compactado con material de préstamo	m3	60,00	22.131	0	0	85,98	1.902.823,0	85,98	1.902.823,0	143,30			
27	Sub base para pavimento	m3	14,00	144.847	0	0	12,48	1.807.691,0	12,48	1.807.691,0	100,00			
28	CONCRETOS													
29	Concreto de 21 Mpa para graderías y andenes	m3	16,00	605.480	0	0	9,83	5.951.868,0	9,83	5.951.868,0	61,44			
30	Concreto para Pavimento 42 MPA hecho en obra	m3	0,50	822.268	0	0	1,05	863.381,0	1,05	863.381,0	210,00			
31	ACERO													
32	Acero refuerzo Graderías	kgs	36,00	5.922	0	0	98,60	583.909,0	98,60	583.909,0	273,89			
33	Acompañamiento social durante toda la obra.	mes	1,00	1.673.138	0	0	1,00	1.673.138,0	1,00	1.673.138,0	100,00			
<b>COSTO TOTAL</b>											<b>52.081.929</b>			

*APZ*



<b>CONTRATO No:</b> DECLARATORIA DE EMERGENCIA -ACTO No. 002 DE FEBRERO 12 DE 2019	<b>ACTA No.:</b> FINAL
<b>OBJETO:</b> REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS OSCAR ZAPATA Y JOSÉ RESTREPO Y CONSTRUCCIÓN CÁMARA PARA DESTAFONAR TUBERÍA DE ALCANTARILLA DIAGONAL A LA ESTACION DE SERVICIO ..... MPFO PALESTINA..	<b>FECHA INICIACION:</b> FEBRERO 18 DE 2019
<b>CONTRATISTA:</b> LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> MARZO 19 DE 2019
	<b>VALOR CONTRATO:</b> \$ 52.288.252,00
	<b>VALOR ADICION No. 1:</b>
	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> ABRIL 19 DE 2019
	<b>FECHA:</b> MAYO 15 DE 2019

<b>COSTO DIRECTO</b>	38.746.389	38.593.501
<b>ADMINISTRACION</b> %	9.299.133	9.262.440
<b>IMPREVISTOS</b> %	1.937.319	1.929.675
<b>UTILIDADES</b> %	1.937.319	1.929.675
<b>SUMA ANTES IVA</b>	51.920.161	51.715.291
<b>I. V. A.</b> %	366.091	366.638
<b>TOTAL ACTA FINAL - OBRAS</b>	52.286.252	52.081.929


SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$ 52.081.929,00) MCTE.


**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato	52.288.252
Valor Adición No. 01	0
Valor Acta PARCIAL No. 1 (Fecha: DE 2019)	0
Valor Acta FINAL (Fecha: MAYO 15 DE 2019)	52.081.929
<b>SUMA</b>	52.081.929
Saldo del Contrato	206.323
<b>SUMAS IGUALES</b>	52.286.252

**RESUMEN ANTICIPO:**

Valor Anticipo	0
Amortización Valor Acta (Fecha: DE 2019)	0
Amortización Valor Acta FINAL (Fecha: MAYO 15 DE 2018)	0
<b>SUMA</b>	0
Saldo Anticipo	0
<b>SUMAS IGUALES</b>	0

  
**R. J. MAURICIO MAFLA GARCIA**  
 Contratista.

  
**Abel Rojas Rubiano**  
 Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO  
 INGENIERO ZONA  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
