	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 011	Acta N°	01 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$	79.225.943,00
				2. VALOR ADICION	\$	-
CONTRATISTA	CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	79.225.943,00
NIT O CC:	901,483,663-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-
CDP (#, rubro y fecha)	20230297 DEL 27 DE ENERO DE 2023 Y 20230361 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	62.199.766,00
RP (#, rubro y fecha)	353 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	17.026.177,00
OBJETO DEL CONTRATO:	RECONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN, IMBORNAL DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 BARRIO LAS AMERICAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIE NTO				

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A
3- Pagos al FIC	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.	✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓
8- Ensayos de densidad.	N/A
9- Diseño de Mezclas.	N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	✓
15- Acta parcial o final del contrato.	✓
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	✓

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE CARGO	<u>[Firma]</u> FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
108900066003	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES ARTÍCULO 50
LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**, identificado con C.C. N° 75.064.769, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUCCION Y AMBIENTAL SAS** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **901486663-3**, certifico Bajo la Gravedad del Juramento que se han realizado los pagos de aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS Y, NO SE INCLUIRÁ LA EXPRESIÓN "BAJO JURAMENTO". CUANDO LA FIRME EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ CONTENER ESTA EXPRESIÓN.

Dada en MANIZALES, a los 30 días del mes de Marzo de 2023 ✓

SE FIRMA BAJO JURAMENTO DE GRAVEDAD


FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Representante legal

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

87222153

No. Autorización/CUS

1994928322

Fecha y Hora

29/03/2023

Número de Identificación

901483663 ✓

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

3

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Calle 45D No 9E 30

Localización

Nacional

Correo electrónico

construccionyambientalsas@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

NA

Nombre Obra

Reconstrucción cámara de inspe ✓

Fecha Terminación Obra

05/04/2023 ✓

Tipo FIC

Mensual ✓

Mes Periodo a Pagar

3 ✓

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S ✓

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,8763666

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

011 ✓

Fecha Inicio Obra

01/03/2023 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

Riosucio

Año Periodo a Pagar

2023 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

79225944.00

Número de Trabajadores en el Periodo

10 ✓

Aporte FIC

290000.00

Valor del Pago

290000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	87222153	1994928322	29/03/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901483663**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.251.197.236**

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado **\$ 290,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 290,000.00	COP\$ 290,000.00



CONSTRUCCION Y AMBIENTAL

Nit 901.483.663-3
CL 45D 9 E 30 BRR ALTOS DE CAPRI
TEL.: 8703666

Factura electrónica
de venta
No. FE150

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		29/03/2023	\$ 62.199.776,00
NI No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 23 75 82		-	
TELEFONO : 8867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Manizales PAIS : Colombia		28/04/2023	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41309502	ACTA PARCIAL 01 ACTO 011 2023 RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 A BARRIO LAS MARGARITAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLAD	1	\$ 59.457.309,14		\$ 59.457.309,14
2	41309501	Actividades conexas	1	\$ 2.304.594,00		\$ 2.304.594,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		2				

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 61.761.903,14	CxC # 1	Vence: 28/04/2023	\$ 62.199.776,00
IVA liquidado	\$ 2.304.594,00	19,00%	\$ 437.872,86			
VALOR TOTAL :			\$ 62.199.776,00			

VALOR (en letras) : SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESO

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL 01 ACTO 011 2023 RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 A BARRIO LAS MARGARITAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 28/04/2023.
RESOLUCION No 18764023710196 CONSECUTIVO FE-51 A 150 VIGENCIA 12 MESES 4/01/2022

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

f4afjiiHguZv1Poo+yCvXjAIGAUU4KHAptodrjsDdIMBbaUECYzhKrf69T5G1bK3hdYhZu8dafZxixpJgOZ7khuDuj6umkxVHV3qNCM9DWuwPskpCzMHpXaSJM1/9ZyMYsE9DNBTRPCYAanY24i6EWkHJEqQNG98DQ0O/JvH2P72sqZ9wzq+dXef5pFwVWdpHy2q86Ob67MycPL3gpFXIPvR81qDN2FM4N2WE/12HQs27z u0oqoMtiLP10YH0DXQyJBEsFrsAqdkObT87PTVLg4u5S1Tt8HdP/ia+2SUnnSOIfd6sr2D1bWYzzeUce9Xrlm3rtRTVe4s/20Lvcw==

CUFE: d9ff5f4a14f99bfd7712f92fcdcb33145fc818a9f7224e838ea07f09bcd68e9cc2638caff84b15003c42cf370b3c181e0

Fecha emisión: 2023-03-29 15:18:21

Fecha validación DIAN: 2023-03-29 15:18:24-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

INFORME 01 DE OBRA ACTO 2023

Número del contrato	Acto 011 de 2023
Objeto:	RECONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN, IMBORNAL DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 BARRIO LAS AMERICAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
Nombre Contratista:	CONSTRUCCION Y AMBIENTAL SAS
Fecha del contrato:	20-02-2023
Plazo de ejecución:	45 DIAS
Valor inicial:	\$ 79'225.943

OBRA 1: RECONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN, IMBORNAL DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 BARRIO LAS AMERICAS

Se realizan actividades cerramiento con yute, señalización e instalación de valla, demolición de pavimento, demolición de cámara en mal estado, demolición sumideros y reconstrucción, se hace la instalación de tubería y se procede a realizar los llenos compactados, reposición de pavimento, reconstrucción de cámara de inspección y construcción de una nueva.

BRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

Se realizan actividades de reposición de tubería de alcantarillado de 24", llenos con material afirmado compactado, reposición de pavimentos; para estas actividades la obra conto con el respectivo cerramiento, instalación de valla, señales informativas y preventivas.


REGISTRO FOTOGRAFICO




Instalación Valla, Cerramiento y Señalización



Demolición Pavimentos

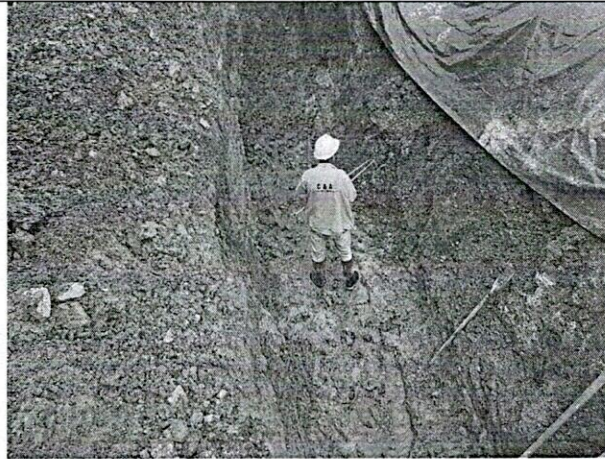

Excavaciones para instalación tubería

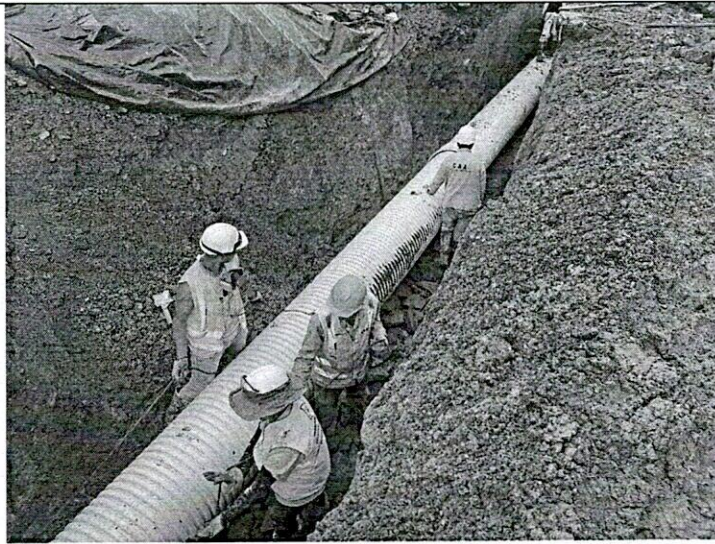


Instalación tubería




Instalación De tubería




Instalación tubería

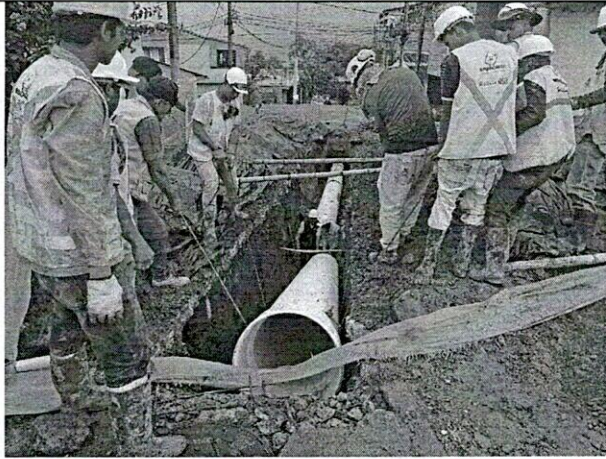


Instalación tubería

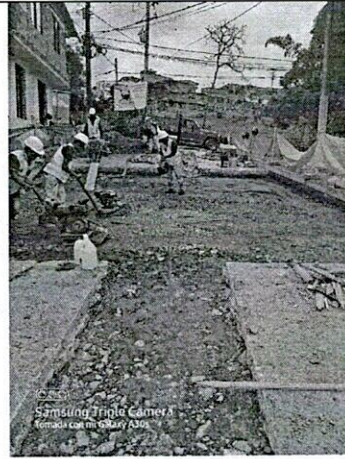



Llenos Compactados

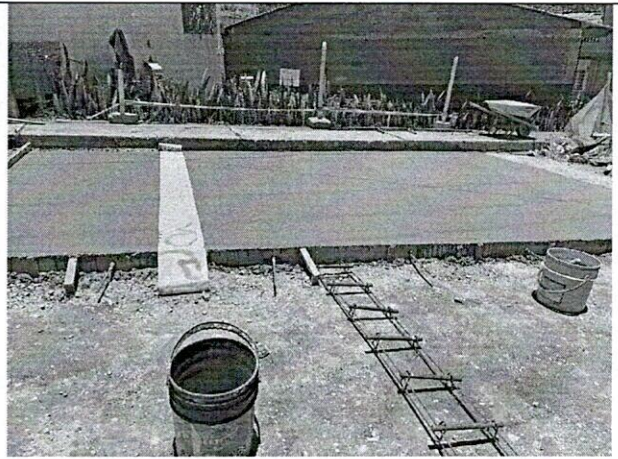


Vaciado de Concreto

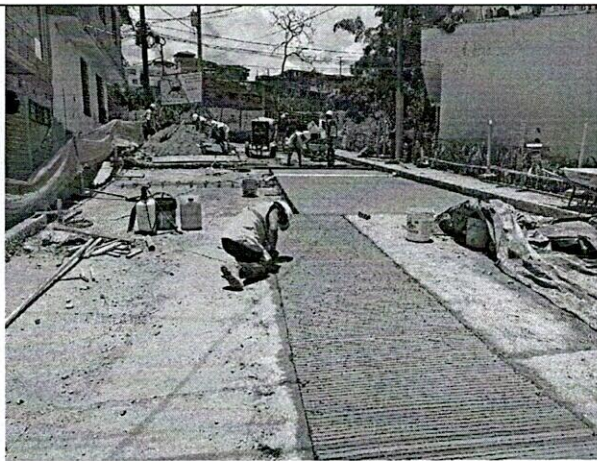

Vaciado de Concreto

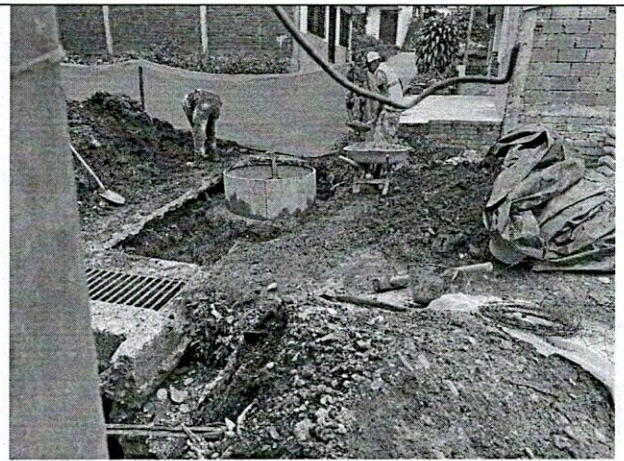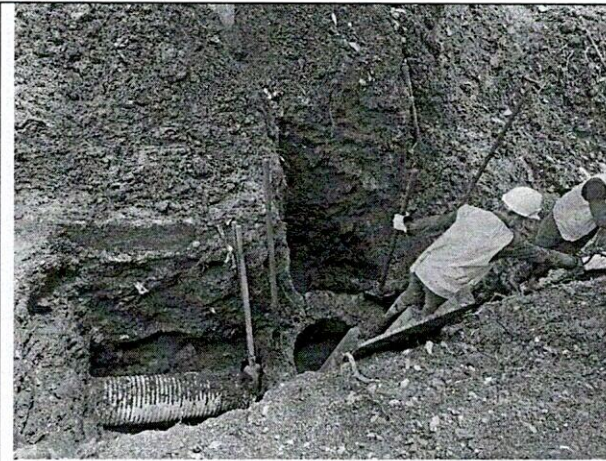

Vaciado camaras

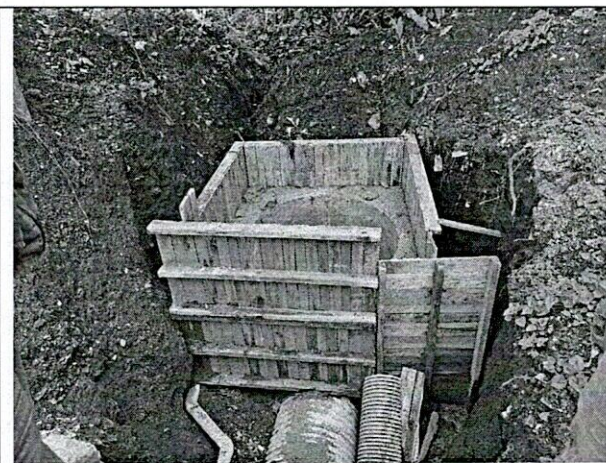

Vaciado camaras

ELABORO:

CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTAL SAS

7/22.
OK.

NÓMINA PERSONAL OBRAS REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONTRATO ACTO 011 DE 2022 PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023 PERSONAL RIO SUCCIO

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y AMBIENTAL SAS

C&A CONSTRUCCION Y AMBIENTAL SAS	NOMBRE	CEDULA	SALARIO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	ALICUOTO DE TRANSPORTE	NO CONSTITUTIVO DE SALARIO	HORAS EXTRAS	ALICUOTO DE ALIMENTACION	ESTADISTICA EMPLEADO			TOTAL A PAGAR	FIRMA Y CEDULA
										SALUD	PLUSON	ADELANTO SALARIO		
		4.8%	4.8%	4.8%										
	Enry Wilson Ruiz Cardenas	1.000.579.985	\$1.160.000	15	\$540.000	\$70.000			100.000	\$71.700	\$11.700		\$753.600	Viviana Floret C.
	Yenny Castillo	90.252.732	\$1.000.000	15	\$1.000.000	\$10.000	\$10.000		200.000	\$46.000	\$46.000		\$1.500.000	<i>[Signature]</i>
	Cesar Augusto Cardenas C.	97.383.817	\$1.000.000	15	\$750.000	\$70.000	\$70.000		200.000	\$80.000	\$80.000		\$1.200.000	Cesar Augusto
	Andres Cardenas C.	1.071.793.883	\$1.000.000	15	\$790.000	\$10.000			200.000	\$80.000	\$80.000		\$850.000	Andres Cardenas C.
	Harold Morales	1.053.820.753	\$1.160.000	15	\$540.000	\$70.000			200.000	\$80.000	\$80.000		\$603.600	Harold Morales
	Cristhan Danilo B.	1.007.213.284	\$1.160.000	15	\$540.000	\$70.000			200.000	\$80.000	\$80.000		\$700.000	Cristhan Danilo B.
	Ever Feaney Cruz	1.078.411.099	\$1.160.000	15	\$540.000	\$70.000			200.000	\$80.000	\$80.000		\$603.600	Ever Feaney Cruz
	Ever Feaney Cruz	15.616.115	\$1.160.000	15	\$540.000	\$70.000			200.000	\$80.000	\$80.000		\$603.600	EVER FEANEY CRUZ
	Ever Feaney Cruz	25.412.598	\$1.160.000	15	\$540.000	\$70.000			200.000	\$80.000	\$80.000		\$603.600	EVER FEANEY CRUZ
	Ever Feaney Cruz	1.053.846.647	\$1.160.000	15	\$540.000	\$70.000			200.000	\$80.000	\$80.000		\$603.600	Ever Feaney Cruz
SUMAS TOTALES					\$ 6.560.000			\$ -				\$ -	\$ 8.171.800	

[Signature]
Vobo EMPLEADOR

MÓMINA PERSONAL OBRAS REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONTRATO ACTO 011 DE 2023 PAGO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2023 PERSONAL BIOSUCIO

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y AMBIENTAL SAS

NOMBRE	CEDULA	SALARIO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	ALIBRO DE TRANSICION	NO CONTRIBUYO DE SALARIO	MONEDAS EXTRAS	ALIBRO DE ALIMENTACION	DESCUENTO A EMPLEADO			TOTAL A PAGAR	FIRMA Y CEDULA
									SALUD	PENSION	AGUANTO SALARIO		
Orlyvia Borez Corderos	1.960.955.795	\$1.360.000	15	\$580.000	\$70.000			100.000	4,0%	\$21.200	\$21.200	\$753.600	Viviana Floret C
Nelson Castillo	10.742.732	\$2.000.000	15	\$1.000.000	\$70.000	\$330.300		200.000	4,0%	\$40.000	\$40.000	\$1.500.000	<i>[Signature]</i>
Geisy Angelier Rodriguez Castillo	10.281.017	\$1.200.000	15	\$750.000	\$70.000	\$40.000		200.000	4,0%	\$20.000	\$20.000	\$1.200.000	Cesar Augusto
Archer Carolina Cuervo	1.051.793.481	\$1.300.000	15	\$750.000	\$70.000			90.000	4,0%	\$20.000	\$20.000	\$850.000	Andros Corderos C
Hector Alvarado Morales	1.053.820.793	\$1.400.000	15	\$480.000	\$70.000					\$23.200	\$23.200	\$603.600	Harold Morales
Chalán Camilo Riveros Galvez	1.027.213.263	\$1.100.000	14	\$543.333	\$65.311			96.400		\$23.651	\$23.651	\$659.791	Cristian Camilo Gostropo
Herrán Marco Méndez	1.015.431.019	\$1.300.000	15	\$580.000	\$70.000	115.114				\$21.200	\$21.200	\$738.934	<i>[Signature]</i>
Edwin Jesus Lopez Perez	15.916.515	\$1.300.000	15	\$580.000	\$70.000	113.998				\$23.200	\$23.200	\$777.598	Edwin Jesus Lopez P
Ever Henry Cruz Cuervo	15.923.194	\$1.100.000	15	\$460.000	\$70.000					\$23.200	\$23.200	\$603.600	EVER FERNANDEZ CRUZ
Denys Alexander Arango	1.053.848.667	\$1.300.000	15	\$580.000	\$70.000			100.000		\$23.200	\$23.200	\$703.600	Brahyan Arango
SUMAS TOTALES												\$ 8.390.693	

[Signature]
VIRBO EMPLEADOR



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	29 de Marzo 2023	Acta parcial	01	Acta final	
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	----	------------	--

Número del contrato	ACTO 011 de 2023
Objeto:	RECONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN, IMBORNAL DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 BARRIO LAS AMERICAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
Nombre Contratista:	CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTAL S.AS.
Fecha del contrato:	20 de febrero de 2023
Plazo de ejecución:	45 días Calendario
Valor inicial:	\$ 79225.943
Fecha de iniciación:	1 de marzo de 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	14 de Abril de 2023
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor:	JOHAN MANUEL SABOGAL

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	79%
Avance físico Acumulado	79%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

OBRA 1: RECONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN, IMBORNAL DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 BARRIO LAS AMERICAS

Se realizan actividades cerramiento con yute, señalización e instalación de valla, demolición de pavimento, demolición de cámara en mal estado, demolición sumideros y reconstrucción, se hace la instalación de tubería y se procede a realizar los llenos compactados, reposición de pavimento, reconstrucción de cámara de inspección y construcción de una nueva.

BRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

Se realizan actividades de reposición de tubería de alcantarillado de 24", llenos con material afirmado compactado, reposición de pavimentos; para estas actividades la obra conto con el respectivo cerramiento, instalación de valla, señales informativas y preventivas.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA TODOS LOS FRENTES		
SECCIONAL	SERVICIO	m
RIOSUCIO	Alcantarillado	28

1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45 DÍAS
Tiempo total transcurrido:	30 DÍAS
Avance Porcentual:	67%

1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

REGISTRO FOTOGRAFICO




Instalación Valla, Cerramiento y Señalización




Demolición Pavimentos




Excavaciones para instalación tubería

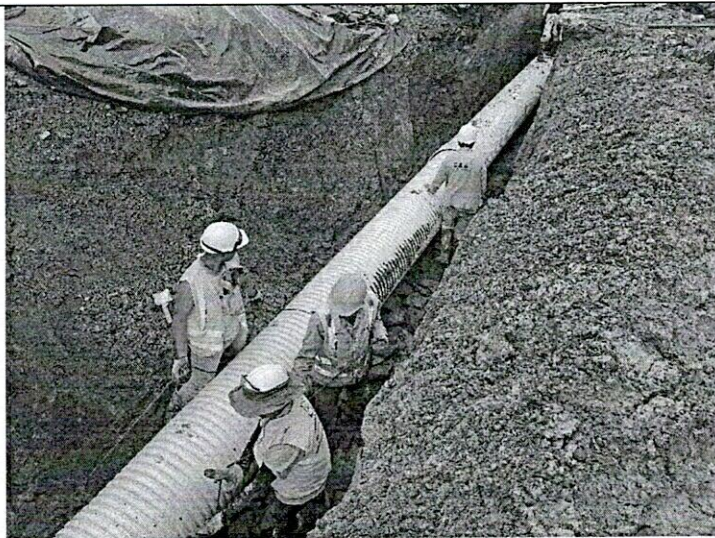


Instalación tubería

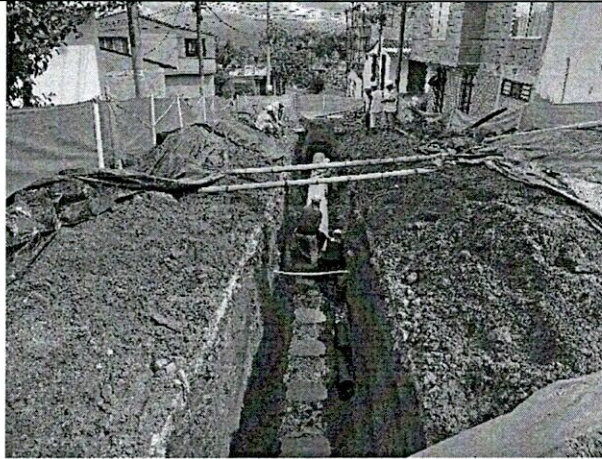

Instalación De tubería

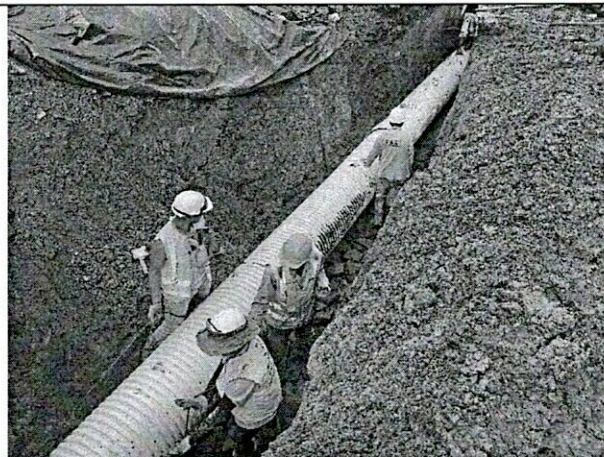


Instalación tubería

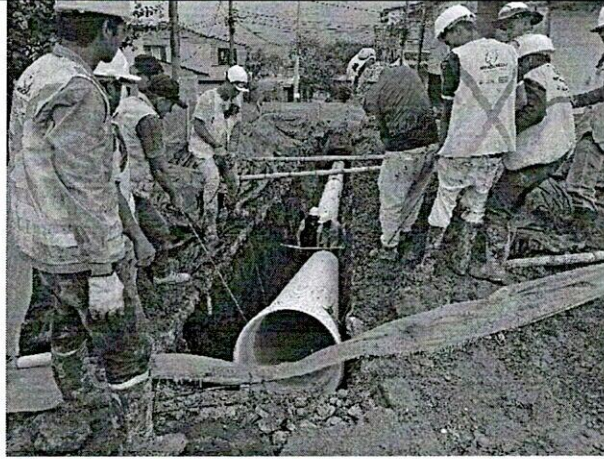



Instalación tubería




Llenos Compactados

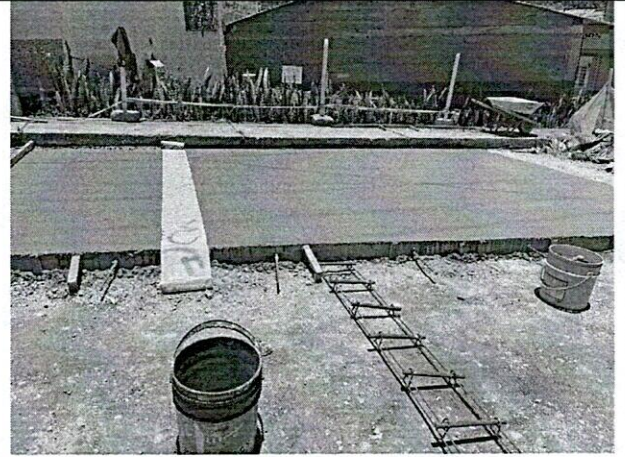


Vaciado de Concreto

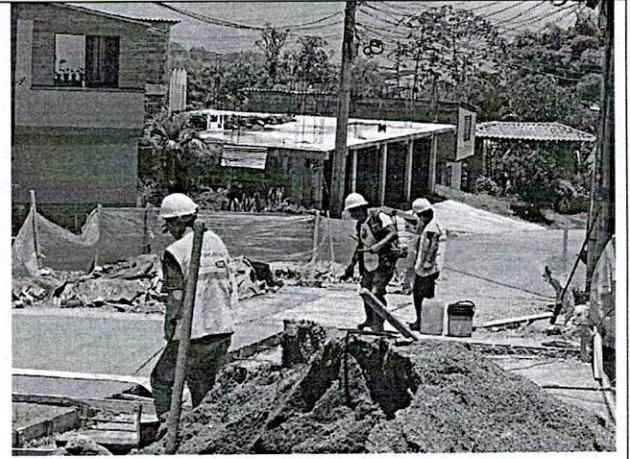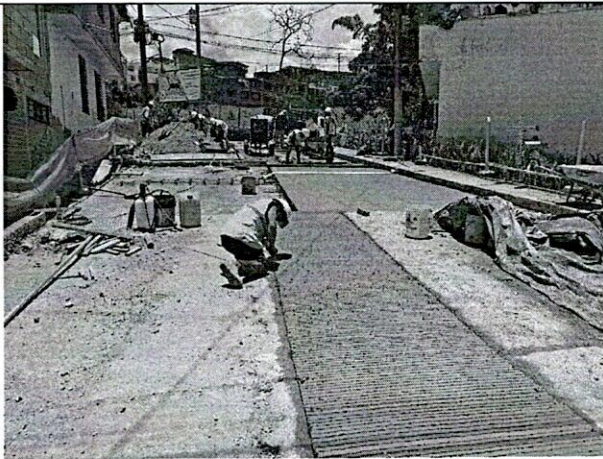

Vaciado de Concreto

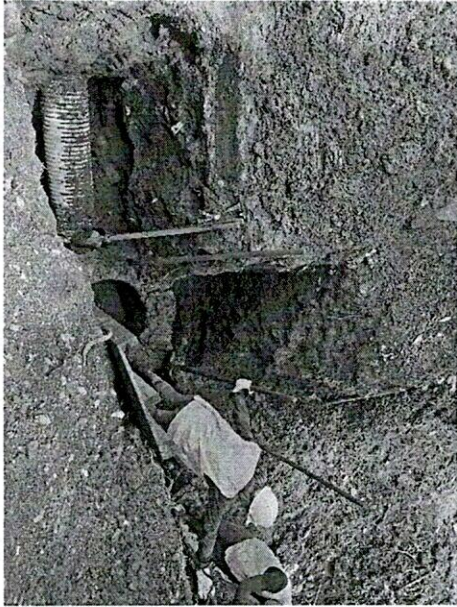

Vaciado camaras

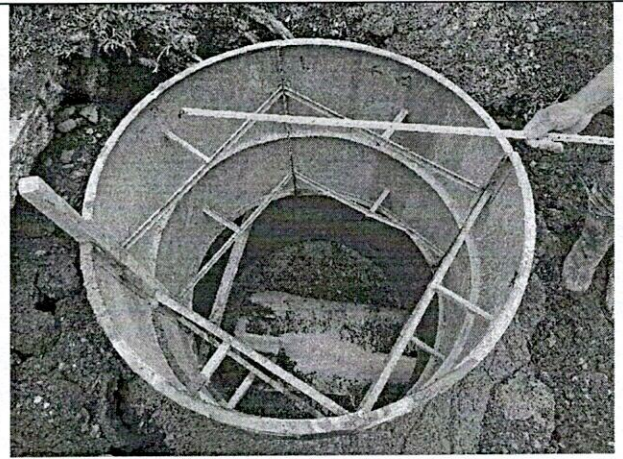

Vaciado camaras



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

OBRAS EJECUTADAS:

1.4. Problemáticas con la obra: Durante la ejecución de actividades se ha presentado como problemática principal las fuertes y prolongadas lluvias que han retrasado sustancialmente las obras en todos los frentes de trabajo.

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 79'225.943
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 62'199.766
Porcentaje ejecutado en el periodo:	79%
Inversión total ejecutada:	\$ 62'199.766
Porcentaje total ejecutado:	79%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODOS LOS TRABAJADORES	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	C A S C O	O V E R O L	G U A N T E S	B O T A S	C A R N E T	C H A L E C O	S E Ñ A L I Z A C I Ó N	CAPACITA CIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENT OS DE PROTECCI ÓN PERSONA L
Marzo 12 de 2023	A	N / A	A	A	N / A	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

- 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
- 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
- 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

NOMBRE DEL SUPERVISOR
JOHANNMANUEL SABOGAL

FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:		Acto 0111 DE 2023		01 y Parcial		FECHA CORTE:		MARZO 29 DE 2023	
OBJETO CONTRATO:		RECONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN, IMBORNAL DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 BARRIO LAS AMERICAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS		1 de Marzo de 2023		FECHA VENCIMIENTO:		5 de abril de 2023	
CONTRATISTA:		CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S.		INGENIERO DE ZONA		FECHA:		MARZO 30 DE 2023	
		OBRA 1 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 12C Y 13 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS		CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo de redes (Incl. levantamiento del sector y plano record)	mts	24,0	\$ 7.313	\$ 175.512	23,20	\$ 169.662	23,20	\$ 169.662,00
1.2	Cerramiento en polislombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y Cinta Plástica.	mls	78,0	\$ 19.519	\$ 1.522.482	72,00	\$ 1.405.368	72,00	\$ 1.405.368,00
1.3	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,0	\$ 910.500	\$ 910.500	1,00	\$ 910.500	1,00	\$ 910.500,00
1.4	Señalización reglamentaria Verticales en lamina soportada en base de concreto	und	2,0	\$ 222.750	\$ 445.500	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2	DEMOLICIONES VARIAS								
2.1	Demolición Hidráulico pavimentos, andenes y estructuras	m3	13,4	\$ 118.125	\$ 1.578.709	12,70	\$ 1.500.188	12,70	\$ 1.500.188,00
3	SOBRECARREOS								
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	45,9	\$ 45.000	\$ 2.063.413	88,14	\$ 3.966.300	88,14	\$ 3.966.300,00
4	EXCAVACIONES								
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	78,0	\$ 37.744	\$ 2.944.032	60,59	\$ 2.286.909	60,59	\$ 2.286.909,00
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	14,9	\$ 41.625	\$ 619.750	14,85	\$ 618.131	14,85	\$ 618.131,00
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	18,0	\$ 44.651	\$ 803.718	10,00	\$ 446.510	10,00	\$ 446.510,00
5	RELLENOS COMPACTADOS								
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	78,0	\$ 31.725	\$ 2.474.550	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera préstamo	m3	8,0	\$ 106.875	\$ 855.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS								
6.1	Suministro Transporte e Instalación de material sub base tipo Invias	m3	14,9	\$ 213.750	\$ 3.182.500	14,85	\$ 3.174.188	14,85	\$ 3.174.188,00
6.2	Sustitución en arena limpia para tuberías	m3	9,6	\$ 173.025	\$ 1.661.040	7,48	\$ 1.294.227	7,48	\$ 1.294.227,00
7	ALCANTARILLADOS								
7.1	Transporte e Instalación tubería corrugada PVC-S de 600 mm (24"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	24,0	\$ 95.000	\$ 2.280.000	22,00	\$ 2.090.000	22,00	\$ 2.090.000,00
7.2	Cámaras de Inspección D= 1.20.-Concreto 21 Mpa	ml	4,3	\$ 914.400	\$ 3.931.920	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.3	Base/ cañuela cámara D=1.20 m en concreto 3000 psi	Und	2,0	\$ 775.125	\$ 1.550.250	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.4	Suministro e Instalación Tapa D=0.60m en HF	Und	2,0	\$ 1.115.438	\$ 2.230.876	1,00	\$ 1.115.438	1,00	\$ 1.115.438,00
8	CONCRETO								
8.1	Losa en concreto reforzado de 1,60 x 1,60 x 0,20 acero de refuerzo, doble patillas N°4 cada 15 cms. Incluye antisol.	Und	2,0	\$ 1.327.500	\$ 2.655.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	und	13,4	\$ 1.168.437	\$ 15.615.840	11,88	\$ 13.881.027	11,88	\$ 13.881.027,00
8.3	Cortes y sellos pavimento	ml	48,0	\$ 13.500	\$ 648.000	46,72	\$ 630.720	46,72	\$ 630.720,00
9	ACERO DE REFUERZO								
9.1	Acero de Refuerzo dovelas y pasadores 7/8"	Und	40,0	\$ 16.500	\$ 660.000	27,96	\$ 461.340	27,96	\$ 461.340,00
9.2	Canastilla de apoyo dovelas acero perfil 5 mm	ml	15,0	\$ 26.500	\$ 397.500	7,00	\$ 185.500	7,00	\$ 185.500,00
10	Transporte de tubería desde Salamina a Riosucio	gl	1,0	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	1,00	\$ 1.200.000	1,00	\$ 1.200.000,00
COSTO DE OBRA					\$ 50.406.092		\$ 35.336.008		\$ 35.336.008,00

COSTO DIRECTO		\$ 37.351.680
ADMINISTRACION	\$ 10.831.987	
IMPREVISTOS	-	
UTILIDAD	\$ 1.867.584	
SUMAS ANTES DE IVA	\$ 50.051.251	
IVA Sobre utilidades	\$ 354.841	
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES	\$ 50.406.092	

\$ 26.184.519	\$ 26.184.519
\$ 7.593.510	\$ 7.593.510
\$ -	\$ -
\$ 1.309.226	\$ 1.309.226
\$ 35.087.255	\$ 35.087.255
\$ 248.753	\$ 248.753
\$ -	\$ -
\$ 35.336.008	\$ 35.336.008

OBRA 2 RECONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN, IMBORNAL DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 11 A BARRIO LAS MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA 01		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo de redes (Incl. levantamiento del sector y plano record)	mts	10,0	\$ 7.313	\$ 73.130	6,20	\$ 45.341	6,20	\$ 45.341,00
1.2	Cerramiento en polissombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y Cinta Plástica.	mts	46,0	\$ 19.519	\$ 897.874	20,00	\$ 390.380	20,00	\$ 390.380,00
1.3	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,0	\$ 910.500	\$ 910.500	1,00	\$ 910.500	1,00	\$ 910.500,00
1.4	Señalización reglamentaria Verticales en lamina soportada en base de concreto	und	2,0	\$ 222.750	\$ 445.500	2,00	\$ 445.500	2,00	\$ 445.500,00
2	DEMOLICIONES VARIAS								
2.1	Demolición Hidraulico pavimentos, andenes y estructuras	m3	3,8	\$ 118.125	\$ 451.710	7,17	\$ 847.429	7,17	\$ 847.429,00
3	SOBREACARREOS								
3.1	Retiro de sobrantes en vehiculo Automotor	m3	12,6	\$ 45.000	\$ 568.080	7,17	\$ 322.830	7,17	\$ 322.830,00
4	EXCAVACIONES								
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	16,0	\$ 37.744	\$ 603.904	20,42	\$ 770.732	20,42	\$ 770.732,00
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	1,6	\$ 41.625	\$ 66.600	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	10,0	\$ 44.651	\$ 446.510	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5	RELLENOS COMPACTADOS								
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado, de excavación	m3	12,0	\$ 31.725	\$ 380.700	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo	m3	4,0	\$ 106.875	\$ 427.500	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6	SUSTITUCIONES-BASES Y SUBBASES COMPACTOS								
6.1	Suministro Transporte e Instalación de material sub base tipo Inviadas	m3	0,3	\$ 213.750	\$ 61.560	0,96	\$ 205.200	0,96	\$ 205.200,00
6.2	Sustitución en arena limpia para tuberías	m3	3,2	\$ 173.025	\$ 553.680	1,32	\$ 228.393	1,32	\$ 228.393,00
7	ALCANTARILLADOS								
7.1	Transporte e Instalación tubería corrugada PVC-S de 600 mm (24"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	10,0	\$ 95.000	\$ 950.000	6,00	\$ 570.000	6,00	\$ 570.000,00
7.2	Cámaras de Inspección D= 1,20 -Concreto 21 Mpa	ml	2,2	\$ 914.400	\$ 2.011.680	4,28	\$ 3.913.632	4,28	\$ 3.913.632,00
7.3	Base/ cañuela cámara D=1,20 m en concreto 3000 psi	Und	1,0	\$ 775.125	\$ 775.125	3,00	\$ 2.325.375	3,00	\$ 2.325.375,00
7.4	Suministro e Instalación Tapa D=0,60m en HF	Und	2,0	\$ 1.115.438	\$ 2.230.876	3,00	\$ 3.346.314	3,00	\$ 3.346.314,00
8	CONCRETO								
8.1	Losa en concreto reforzado de 1,60 x 1,60 x 0,20 incluye acero de refuerzo, doble parrillas N#4 cada 15 cms. Incluye antisol.	Und	2,0	\$ 1.327.500	\$ 2.655.000	3,00	\$ 3.982.500	3,00	\$ 3.982.500,00
8.2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	und	3,8	\$ 1.168.437	\$ 4.468.102	0,82	\$ 958.118	0,82	\$ 958.118,00
8.3	Cortes y sellos pavimento	ml	32,8	\$ 13.500	\$ 442.800	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.4	Sumidero transversal de 0,5x0,5x0,5, incluye reparación de rejilla existente y conexiones a red de alcantarillado	ml	4,0	\$ 611.230	\$ 2.444.922	5,70	\$ 3.484.013	5,70	\$ 3.484.013,00
9	ACERO DE REFUERZO								
9.1	Acero de refuerzo	kg	55,0	\$ 7.945	\$ 436.975	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10	TRABAJO DE SOCIALIZACION								
10	Trabajador SISO solo durante 1 mes ambos tramos	mes	1,0	\$ 4.117.500	\$ 4.117.500	1,00	\$ 4.117.500	1,00	\$ 4.117.500,00
10.2	Trabajadora Social-todo el proceso y socialización de la obra contratada ambos tramos	GL	1,0	\$ 2.399.625	\$ 2.399.625	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				\$ 28.819.853			\$ 26.863.757		\$ 26.863.757,00

COSTO DE OBRA		COSTO DE OBRA	
COSTO DIRECTO	\$ 21.355.849	COSTO DIRECTO	\$ 19.906.452
ADMINISTRACION	\$ 6.193.225	ADMINISTRACION	\$ 5.772.871
IMPREVISTOS	\$ -	IMPREVISTOS	\$ -
UTILIDAD	\$ 1.067.797	UTILIDAD	\$ 995.323
SUMAS ANTES DE IVA	\$ 28.616.971	SUMAS ANTES DE IVA	\$ 26.674.646
IVA Sobre utilidades	\$ 202.881	IVA Sobre utilidades	\$ 189.111
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES	\$ 28.819.851	COSTO TOTAL OBRAS CIVILES	\$ 26.863.757
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES OBRA 1+OBRA2	\$ 79.225.943,00	COSTO TOTAL OBRAS CIVILES OBRA 1+OBRA2	\$ 62.199.765
COSTO DIRECTO OBRA 1+OBRA 2	\$ 58.707.627	COSTO DIRECTO OBRA 1+OBRA 2	\$ 46.090.971
ADMINISTRACION OBRA1+OBRA2	\$ 16.438.136	ADMINISTRACION OBRA1+OBRA2	\$ 12.905.472,00
IMPREVISTOS OBRA1+OBRA2	\$ 587.076	IMPREVISTOS OBRA1+OBRA2	\$ 460.910
UTILIDAD OBRA1+OBRA2	\$ 2.935.381	UTILIDAD OBRA1+OBRA2	\$ 2.304.549,00

SUMAS ANTES DE IVA
IVA Sobre utilidades 19%

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES OBRA 1 + OBRA 2

\$	78.668.220
\$	557.722

\$	79.225.943,00
----	---------------


\$	61.761.902
\$	437.864

\$	62.199.766
----	------------

\$	61.761.902,00
\$	437.864,00

\$	62.199.766
----	------------

SON: SON SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE



Vo. Bo. JOHAN MANUEL SABOGAL
ING. ZONA OCCIDENTE
SUPERVISOR



R.L.
Contratista

Prof.

Ítem:	5,2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo			Unidad:	m3	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
					-	0,00	
					-	0,00	
					-	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	6,1	Suministro Transporte e Instalación de material sub base tipo Invias			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud					
		7,12	8,17	0,20	11,63	11,63	
		8,40	1,20	0,20	2,02	13,65	
		5,00	1,20	0,20	1,20	14,85	
					0,00	14,85	
					0,00	14,85	
					0,00	14,85	
TOTAL PRE-ACTA						14,85	

Ítem:	6,2	Sustitucion en arena limpia para tuberías			Unidad:	0,00	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	m3/ml	altura			
		22,00	0,34		7,48	7,48	
					0,00	7,48	
					0,00	7,48	
					0,00	7,48	
					0,00	7,48	
					0,00	7,48	
					0,00	7,48	
					0,00	7,48	
TOTAL PRE-ACTA						7,48	

Ítem:	7,1	Transporte e Instalacion tubería corrugada PVC-S de 600 mm (24"), incluye manejo de aguas en zanja.			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud					
		22,00			22,00	22,00	
					0,00	22,00	
					0,00	22,00	
					0,00	22,00	
					0,00	22,00	
					0,00	22,00	
					0,00	22,00	
TOTAL PRE-ACTA						22,00	

Ítem:	7,2	Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	7,3	Base/ cañuela cámara D=1.20 m en concreto 3000 psi			Unidad:	gl	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Supervisor

Contratista

Ítem:	10	Trasporte de tubería desde Salamina a Riosucio			Unidad:	GI
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
				0,00	1,00	
				0,00	1,00	
				0,00	1,00	
					1,00	
		TOTAL PRE-ACTA			1,00	


Supervisor


Contratista

Redactar

Recibidos 4

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 27

Más

Etiquetas

Acuse recibidas Cartama

Cotizaciones

Documentos Inform Dia...

ESTADO DE CUENTA

Facturas Recibidas

Notes

Recibidos Dian y Camar...

Reclamo facturas carta...

Re: ACEPTACION DE BIEN O SERVICIO DE FACTURA ELECTRONICA

Recibidos x



Johann Manuel Sabogal Ramirez
para facturacionelectronica, mi

Cordial saludo revisado el valor de la factura corresponde al acta 01 parcial de la emergencia en Riosucio acto 011 de 2023 por favor aprobar la factura y pro

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

From: facturacionelectronica <facturacionelectronica@empocaldas.com.co>
Sent: Wednesday, March 29, 2023 3:23:36 PM
To: Johann Manuel Sabogal Ramirez <manuel.sabogal@empocaldas.com.co>
Subject: ACEPTACION DE BIEN O SERVICIO DE FACTURA ELECTRONICA

Buen día

Teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.1. y el artículo 1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de obligada a generar acuse de recibido de la mercancía o servicio, o rechazo o reclamo de la factura emitida por nuestros proveer documento en las próximas 24 horas de recibido este correo.

Por favor revisar el documento adjunto y dar respuesta a este mismo correo si la factura está acorde a lo contratado y/o solicitar

Cordial saludo,

Kelly Londoño Moncada
Contratista Contabilidad
facturacionelectronica@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Carrera 23 N.º 75 -82
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext. 151 - 152

Handwritten signature

Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

29-03-2023 29-03-2023 FE FE150 Factura electrónica 901483663 CONSTRUCCION Y A... 890803239 EMPOCALDAS S.A. E... Aprobado con notificación 562,199,776 Factura Electrónica
