



F-GC-22  
Versión 10  
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	085 de 2022	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	6.600.000
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL			3. VALOR TOTAL (1+2)	6.600.000
NIT O CC:	1.055.836.281			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000352 DEL 24 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.600.000
RP (#, rubro y fecha)	000346 DEL 28 DE ENERO DE 2022			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION MURAL AFECTADO POR REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO OBERNACION	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓ # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA
3- Pagos al FIC					✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					NA
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓
8- Ensayos de densidad.					NA
9- Diseño de Mezclas.					NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					✓
15- Acta parcial o final del contrato.					✓

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA CENTRO - NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
64328472935	CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Ido. Patty.  
28-03-2022  
12:25 PM

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		GESTION FINANCIERA	
		DMA	Nº
			1132

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 NIT: 890803239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	1.001	MANIZALES OPERACION Y MANTENIM
-----------	-----------	------------------	-------	--------------------------------

REGIMEN COMUN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEADOR  
 OFICINAS: CARRERA 23 NO. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566

RESOLUCION DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA: HASTA DMA50.000 Y GENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDADO Y FECHA:	MANIZALES 31 DE MARZO DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL		
CEDEULA O NIT:	1.055.836.281	TELEFONO	3175261333
DIRECCION:	AGUADAS CALDAS		

DESCRIPCION DE LA OPERACION	RECUPERACION MURAL AFECTADO POR REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.
	ACTA I Y FINAL CONTRATO 085 DE 2022

Nombre	GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL	SUBTOTAL:	\$ 6.650.000
Cedula	1.055.836.281	RETENCION RENTA:	
	FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR:	\$ 6.650.000

En mi calidad de Administrador de la Seccional CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el presente documento, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

*Guillermo Trujillo Candamil*

FIRMA





**LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA LUZ ADRIANA VALENCIA  
CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA 29.362.708 DE  
CALI CERTIFICA QUE**

De acuerdo con la resolucion 209 de 2020, Esquema de presunción de costos por actividades económicas, desarrollado por La UGPP, el Señor Guillermo Trujillo Candamil identificado con cedula de ciudadanía No.1.055.836.281 de Aguadas, en la ejecucion del contrato No.085 de Septiembre de 2022, tuvo unos costos presuntos en el ejercicio de su actividad economica de un 65.5% del valor total del contrato.

El valor del ingreso total percibido con relacion al contrato anteriormente mencionado, es de dos millones Doscientos Veintisiete mil pesos (\$2.277.000).

Se expide a solicitud del interesado a los veinticinco dias del mes de marzo de 2022

**Cordialmente,**

*Luz Adriana Valencia*

**Luz Adriana Valencia**

**Phone**

318 424 81 64

**Email**

luza0203@hotmail.com

**Address**


Calle 4B No. 95 200 H2

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**146822-T**  
 LUZ ADRIANA  
 VALENCIA CASTAÑO  
 C.C. 29362708  
 RESOLUCION INSCRIPCION 50      FECHA 11/02/2010  
 UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G.*  
 LEONARDO SANCHEZ GARRIDO      157602



*Luz Adriana Valencia*  
 71200

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E D C 9 7 6 F 7 7 2 4 7 F 9 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ ADRIANA VALENCIA CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29362708 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 146822-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado




**DECLARACION JURAMENTADA.**

YO, GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 1.055.836.281, EJECUTOR DEL CONTRATO 085-2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS SA ESP, ME PERMITO DECLARAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE ME ENCUETRO A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES, JUNTO CON LOS PARAFISCALES Y FIC EXIGIDOS POR LA LEY, POR TAL MOTIVO CERTIFICO ME ENCUENTRO AL DIA POR TODO CONCEPTO.

LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL DÍA 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2022

GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL  
CC. 1.055.836.281

 3163613123



artistatrujillo



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>	
TIPO IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania	NUMERO DE IDENTIFICACION: 1055838281	NUMERO PLANILLA: 4438983221	TIPO DE PLANILLA: 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GUILLELMO TRUJILLO CADIZAMA	DIRECCION: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALE 60 # 23A-29	PERIODO COTIZACION OTROS: 0	PERIODO COTIZACION SALUD: 0
CODIGO DE DEPARTAMENTO: 02	TELEFONO: 3007073	DIAS DE MORA: 0	NUMERO AUTORIZACION: 0
TIPO EMPRESA: 02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: 1	FECHA VIGOR (dd/mm/aaaa): 2022/03/08	
FORMA DE PRESENTACION: UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: 9999950979		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO			

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES	
CODIGO: 230301	NOMBRE: FORRENER	No. COTIZANTES: 1	COTIZACION: \$ 1,160,000	EMERGENCIAS: \$ 0	COTIZANTE: \$ 0	SOLIDARIDAD: \$ 0	FSP SUBSISTENCIA: \$ 0
SUBTOTALS:							

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES	
CODIGO: EFS002	NOMBRE: SALUD TOTAL	No. COTIZANTES AUTORIZACION: 1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR AUTORIZACION: \$ 0	LIBERACION MATERNIDAD VALOR AUTORIZACION: \$ 0	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR AUTORIZACION: \$ 0
SUBTOTALS:					

CODIGO: 1423	ADMINISTRADORA: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	No. COTIZANTES: 1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR AUTORIZACION: \$ 0	LIBERACION MATERNIDAD VALOR AUTORIZACION: \$ 0	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR AUTORIZACION: \$ 0
SUBTOTALS:					

DATOS DEL COTIZANTE		NOVEDADES		LIQUIDACION DE TALLADA APORTES		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		APR		PARAGUAYALES	
Nº DE IDENTIFICACION: 1055838281	TIPO DE COTIZANTE: 02 INDEPENDIENTE	SALARIO BASICO: \$ 1,160,000	ING: 30	ADMINISTRACION: ADMIN	INDICADOR TABIFAF: Normal	APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0	APORTES TABIFAF ESPECIAL: \$ 0	APORTES TABIFAF ESPECIAL: \$ 0	APORTES TABIFAF ESPECIAL: \$ 0	APORTES TABIFAF ESPECIAL: \$ 0	APORTES TABIFAF ESPECIAL: \$ 0	APORTES TABIFAF ESPECIAL: \$ 0	APORTES TABIFAF ESPECIAL: \$ 0
SUBTOTALS:													

TOTAL \$ 290,300

Planilla pagada



Aguadas (Caldas) Marzo 14 de 2022



CUENTA DE COBRO Nro 001

EMPOCALDAS S.A E.SP.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL AGUADAS - CALDAS

DEBE A

GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL  
C.C. 1.055.836.281

LA SUMA DE: SEIS MILLON ES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 6.600.000)

POR CONCEPTO: RECUPERACIÓN MURAL AFECTADO POR REPOSICIÓN DE  
REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA  
CALLE DE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

LUGAR Y FECHA: AGUADAS- CALDAS 14 DE MARZO DE 2022

GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL  
CC. 1.055.836.281  
ARTISTA



2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

14752914732



(415)7707212489984(8020) 000001475291473 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 5 5 8 3 6 2 8 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 5 5 8 3 6 2 8 1

27. Fecha expedición

2 0 1 3 0 5 0 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Caldas

1 7

30. Ciudad/Municipio

Aguadas

0 1 3

31. Primer apellido

TRUJILLO

32. Segundo apellido

CANDAMIL

33. Primer nombre

GUILLERMO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

41. Dirección principal

CL 60 23 A 29

42. Correo electrónico

guillermotk53@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 7 0 7 3 3 3 2

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

9 0 0 7

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 3 1 3

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN VALOR

Obligados aduaneros

**Exportadores**

54. Código  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 17 / 17 : 45: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO CANDAMIL GUILLERMO

985. Cargo CONTRIBUYENTE



<b>EMPOCALDAS S.A E.SP.</b>		
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>		
<b>SECCIONAL AGUADAS - CALDAS</b>		
<b>CONTRATO No.:</b> 085 de 2022	<b>INFORME DE OBRA</b> 1	<b>FECHA FINAL:</b> Febrero 28 de 2022
RECUPERACIÓN MURAL AFECTADO POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA CALLE DE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.		
<b>MUNICIPIO:</b> AGUADAS, CALDAS.	<b>VALOR:</b> \$ 6.600.000	
<b>CONTRATISTA:</b> GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL	<b>SUPERVISION:</b> ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	<b>FECHA:</b> FEBRERO 28 DE 2022

**INFORME DE OBRA:** detalle del plazo contractual y la fecha final de la obra:

- Fecha inicio de obra: 15 de Febrero de 2022
- Plazo contractual: 30 días calendario a partir de la fecha del acta de inicio
- Fecha de término de la obra: 28 de Febrero de 2022

**AVANCE DE OBRA**

Avance acumulado ejecutado a 28 de Febrero de 2021: 100%


**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**






**ACTIVIDADES:**

- **Calle 8 entre carreras 4 y 5, Calle de los Faroles, sector centro del municipio de Aguadas**
  - Reunión oficina de planeación definición iconos del mural y permisos de cierre e intervención sobre la peatonal
  - Limpieza y raspado de las superficie a intervenir
  - Lavado de las escalas
  - Disposición de escombros y basuras
  - Retiro de escombros y basuras
  - Marcado de siluetas de la obra en negro sobre las contrahuellas
  - Aplicación de pintura Koraza exteriores antihongos manualmente con brocha



---

**GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL**  
**C.C. 1.055.836.281 DE AGUADAS**



---

**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
**INGENIERO DE ZONA EMPOCALDAS**



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	14/03/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	085-2022
Objeto:	RECUPERACION MURAL AFECTADO POR REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCATARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA CALLE DE LAS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.
Nombre Contratista:	GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL
Fecha del contrato:	27-01-2022
Plazo de ejecución:	30 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 6.600.000
Fecha de iniciación:	15-02-2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	16-03-2022
Nueva fecha de terminación:	N.A.
Adición (en valor):	N.A.
Prórroga (en tiempo):	N.A.
Supervisor:	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

##### 1.2. Informe de actividades

- Reunión de socialización con la secretaria de planeación municipal donde se socializaron las imágenes a representar
- Limpieza de las escalinatas (277 escalinatas) mediante limpieza con cepillo de alambre y espátula y posterior barrido general de la peatonal.
- Elaboración del boceto con tiza y repinte en negro en línea gruesa para ir dando borde a las imágenes proyectadas
- Actividades de pintura tres manos con pintura Koraza con hidrorrepelente antihongos, colores surtidos para dar relleno conforme bocetos e imágenes definidas.



- Entrega y recorrido final


INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
AGUADAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0

### 1.3. Avance en tiempo


Plazo de ejecución:	30 DIAS
Tiempo total transcurrido:	15 DIAS
Avance Porcentual:	50 %

### 1.1. Registro fotográfico

RECUPERACION MURAL AFECTADO POR REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA CALLE DE LAS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

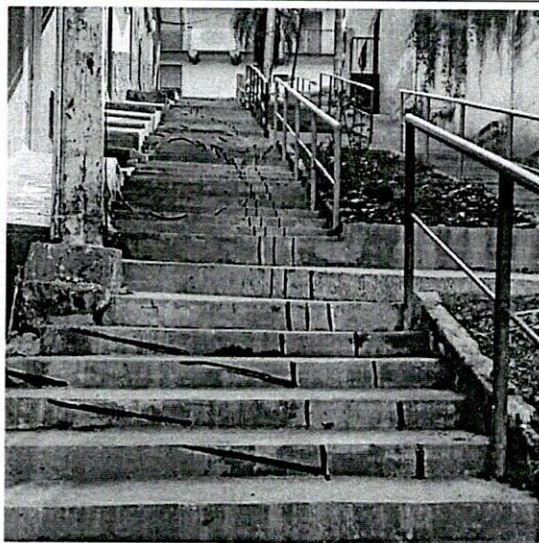

**FOTO 1.** Inicio de boceto con tiza y negro sobre las contrahuellas.

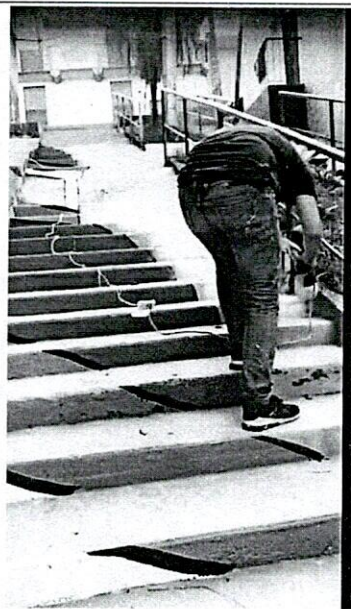


**FOTO 2.** Relleno a color 3 manos del boceto efectuado con tiza






**FOTO 3.** Técnica de pintura de la contrahuella manualmente una a una.

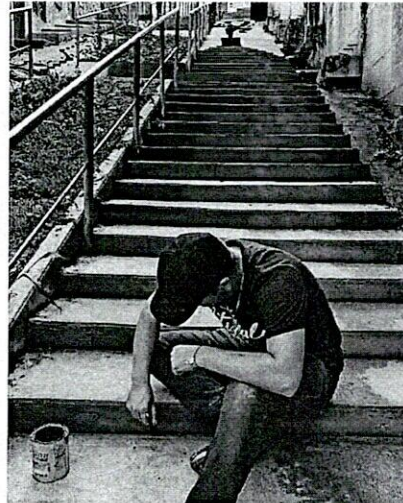

**FOTO 4.** Complemento de la anterior donde se representa el cerro Monserrate, emblema del municipio donde se ubica el Cacique Pipintá

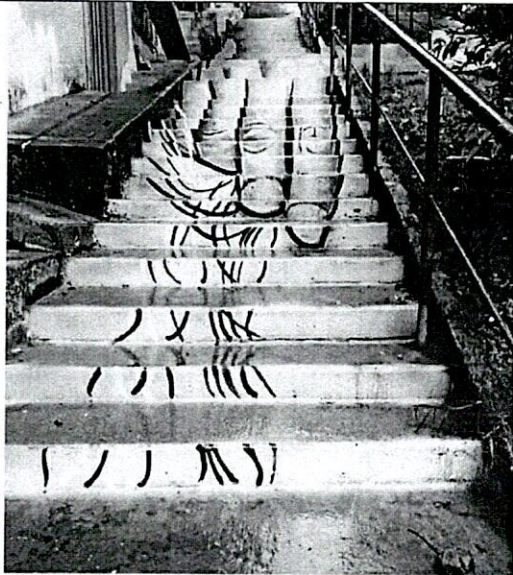


**FOTO 5.** Segundo Tramo de escalinatas donde se aprecian las manos que elaboran el sombrero tejido aguadeño




**FOTO 6.** Complemento con las escalas contiguas de la imagen anterior, complementando la hechura del elemento artesanal (mano izquierda, mano derecha)



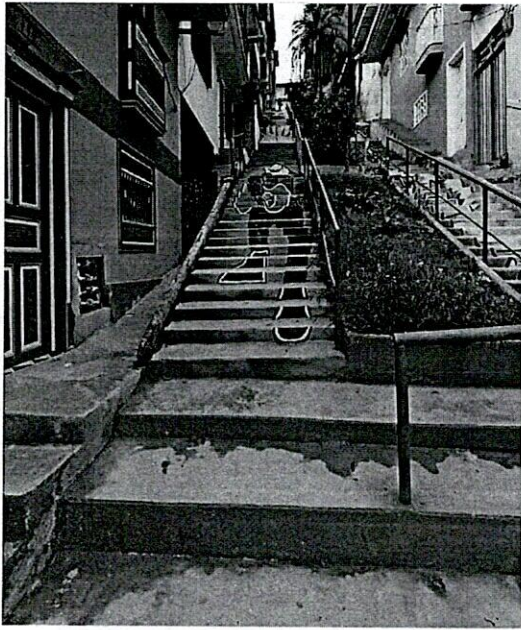

**FOTO 7.** Imagen de la base donde inician las escaleras, donde se representa la interpretación con tiple del pasillo colombiano, ya que Aguadas realiza anualmente el festival del pasillo colombiano.

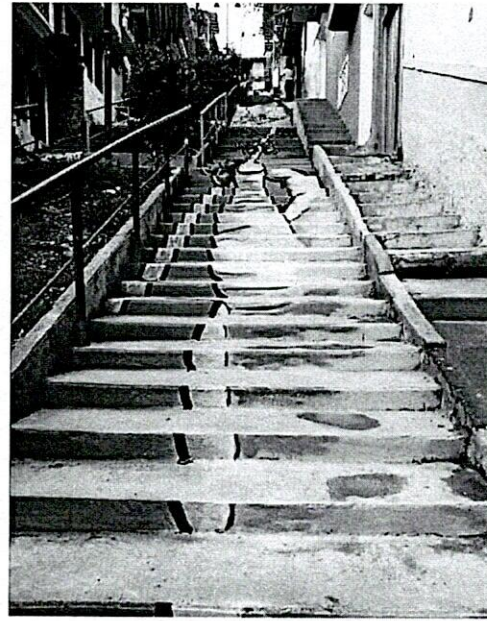

**FOTO 8.** Escaleras complementarias al tramo de la imagen anterior, donde se exaltan las manos trabajadoras recolectando café de la zona agrícola de Aguadas.

### 1.2. Actividades de la obra :

1. Fuertes y permanentes lluvias a lo largo de la ejecución de la obra
2. Lavado de algunos sectores por caída de aguas de techos
3. Suciedad de escorrentía con partículas en suspensión.

### 1.3. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 6.600.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 6.600.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %
Inversión total ejecutada:	\$ 6.600.000
Porcentaje total ejecutado:	100 %



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Se verifico el aporte y actualización de las pólizas solicitadas en la minuta del contrato.

#### 3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
contratista	X	X	X	X	

#### 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

El contratista aporta la declaración juramentada de paz y salvo y la planilla de pago de seguridad social del periodo de ejecución de la obra.

#### 5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

#### 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

El acta de obra parcial 01 en trámite, contiene como global el compendio de las actividades ejecutadas para la pintura sobre las escalinatas y la apreciación de la obra de mural desde la base de las mismas.

#### 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

##### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

No se contrataron personas ya que al tratarse de una obra de arte complementaria del murales que existía antes de la intervención para la reposición de redes de este sitio del municipio de Aguadas, el artista en su visión fue quien desarrollo todas las actividades.





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Habitantes y turistas del municipio de Aguadas, Caldas

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Informe de actividades o Bitácora	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar		

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

O.C.  
# O.C.

CONTRATO  
# CONTRATO  
Acta N°

085-2022  
1 y final

Pág. 2 De. 1

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13014 AGLIADAS COSTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	6 600.000	-	6 600.000	DISTRIBUIR	4.281.420	2.318.580	6.600.000
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-2


6 600.000	-	6 600.000	4.281.420	2.318.580	6 600.000
-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL FACTURA PAG-2

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
	
	FIRMA

Páginas

FIN 1



EMPOCALDAS A.S. E.SP.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
ZONA CENTRO NORTE

<b>CONTRATO No.:</b>	085 de 2022	<b>ACTA No.:</b>	Acta 01 y Final	<b>FECHA CORTE:</b>	Febrero 28 de 2022
<b>OBJETO CONTRATO:</b>	RECUPERACION MURAL AFECTADO POR REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA CALLE DE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.	<b>FECHA INICIACIÓN:</b>	15 de Febrero de 2022	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	16 de Marzo de 2022
<b>CONTRATISTA:</b>	GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL	<b>PRORROGA:</b>	NA	<b>VALOR ADICION:</b>	NA
		<b>SUPERVISOR:</b>	Ingeniero de Zona	<b>FECHA:</b>	Febrero 28 de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		CANT	VR. TOTAL	ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO			CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Recuperación mural afectado por reposición de redes de acueductos y alcantarillado en las escalas de la calle de los Faroles en el municipio de Aguadas, Caldas.	GL	1,00	\$ 6.600.000	1,0	\$ 6.600.000	1,00	\$ 6.600.000,00
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 6.600.000</b>		<b>\$ 6.600.000</b>		<b>\$ 6.600.000</b>
ADMINISTRACION		0%						
IMPREVISTOS		0%						
UTILIDADES		0%						
IVA SOBRE UTILIDADES		0%						
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 6.600.000</b>		<b>\$ 6.600.000</b>		<b>\$ 6.600.000</b>

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato	6.600.000
Valor Acta 1 y final	\$ 6.600.000
Saldo No ejecutado	\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 6.600.000</b>

*[Signature]*  
JUAN PABLO ZULUAGA GORREA  
ING. ZONA CENTRO NORTE  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
GUILLERMO TRUJILLO CANDAMIL  
CONTRATISTA
