	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	013 DE FEBRERO 24 DE 2023	Acta N°	1-PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	\$	164.063.909,00
				2. VALOR ADICION	\$	-
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	164.063.909,00
NIT O CC:	901.589.304-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-
CDP (#, rubro y fecha)	20230361 DE FEBRERO 17 DE 2023 20230368 DE FEBRERO 23 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	123.214.055,00
RP (#, rubro y fecha)	379 DE FEBRERO 24 DE 2023.			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	40.849.854,00
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		NA	
9- Diseño de Mezclas.		NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 02/05/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
108900240889	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 71 4 71		AMATIZALES-CALDAS		8902266		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	2023-03 / 2023-04		E		2023/04/04		2023/04/04		BANCO DAVIVIENDA		0		\$1.151,100	

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES														PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS		PARAFISCALES								
			ing	ret	lode	lae	lobp	lup	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	lwp				vrt	inf	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF	Dias		
1	CC	15958702																	25-14	16	EP5037	16	CCF11	16	14-11	16	16	SI		
2	CC	15957541																	25-14	1	EP5037	1	CCF11	1	14-11	1	1	SI		
3	CC	1059813025																	230301	16	EP5002	16	CCF11	16	14-11	16	16	SI		
4	CC	103765009																	231001	7	EP5002	7	CCF11	7	14-11	7	7	SI		
5	CC	15958169																	230301	16	EP5037	16	CCF11	16	14-11	16	16	SI		
6	CC	15957299																	25-14	11	EP5002	11	CCF11	11	14-11	11	11	SI		
7	CC	1059810385																	230301	16	EP5002	16	CCF11	16	14-11	16	16	SI		
8	CC	18608616																	230301	2	EP5037	2	CCF11	2	14-11	2	2	SI		
9	CC	24529560																	230301	7	EP5002	7	CCF11	7	14-11	7	7	SI		
10	CC	1059814720																	230301	2	EP5037	2	CCF11	2	14-11	2	2	SI		
11	CC	1115726391																	230301	2	EP5037	2	CCF11	2	14-11	2	2	SI		
Total Afiliados (11)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901589304	0	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Exonerado SENA e ICBF	SI	Exonerado SENA e ICBF	SI
Telefono	8902266	Telefono	8902266
Ciudad-Departamento	MANIZALES-CALDAS	Ciudad-Departamento	MANIZALES-CALDAS
Direccion	CALLE 71 4 71	Direccion	CALLE 71 4 71
Sucursal Principal	PRINCIPAL	Sucursal Principal	PRINCIPAL

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2023-03	2023-04	9449297407	E
Pago	Pago	Planilla	Planilla
2007317045	2007317045	9449297407	9449297407
Fecha	Limite	Pago	Pago
2023/04/04	2023/04/04	2023/04/04	2023/04/04
Banco	Banco	Dias Mora	Valor
BANCO DANVIENDA	BANCO DANVIENDA	0	\$1,151,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$594,300	\$0	\$0	\$594,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$173,300	\$0	\$0	\$43,400	\$173,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$377,600	\$0	\$0	\$377,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$258,800	\$0	\$0	\$258,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$149,000	\$0	\$0	\$149,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900	
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$58,900	\$0	\$0	\$58,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$77,600	\$0	\$0	\$77,600	
TOTAL				11	\$1,151,100	\$0	\$0	\$1,151,100	



RAZON SOCIAL :	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ ✓
IDENTIFICACION:	CC-16078315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-06
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02 ✓
PERIODO SALUD:	2023-02 ✓
NUMERO PLANILLA:	25577598
TOTAL COTIZANTES:	1 ✓
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25577598
TIPO DE PLANILLA:	I ✓

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 150.000	\$ 152.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500	\$ 192.000	\$ 195.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 83.600	\$ 85.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 7.900	\$ 425.600	\$ 433.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2023
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ ✓
IDENTIFICACION:	CC-16078315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-10
FECHA DE PAGO:	2023-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-03 ✓
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25948294
TOTAL COTIZANTES:	1 ✓
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25948294
TIPO DE PLANILLA:	I ✓

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 150.000	\$ 152.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 192.000	\$ 195.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 83.600	\$ 85.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 425.600	\$ 433.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2023
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053824831
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TATIANA OSORIO MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARULANDA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 5 # 5-48	TELÉFONO: 3116209
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7869848249	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1962682634

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 186.100
SUBTOTAL:			1	\$ 186.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 145.400
SUBTOTAL:			1	\$ 145.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 12.300
SUBTOTAL:			1	\$ 12.300

TOTAL PAGADO:	\$ 343.800
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053824831
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TATIANA OSORIO MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARULANDA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 5 # 5-48 TELÉFONO:	3116209
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7874033431	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2019785072

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600
SUBTOTAL:			1	\$ 185.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 12.200
SUBTOTAL:			1	\$ 12.200

TOTAL PAGADO:	\$ 342.800
----------------------	-------------------



CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.

NIT 901589304-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764039688830
Fecha 17/11/2022 - 17/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE50

Departamento	Fecha		
Caldas	02	05	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE2

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.	NIT: 890803239	Fecha de firmado: 02/05/2023 10:46:47
Dirección: CR 23 75 82	Departamento: Caldas	Teléfono: 6068867080
Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co	Forma de Pago: Contado	Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento: Mayo 02 del 2023	Hora emisión: 10:46:45	Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 02/05/2023		
Total de Lineas: 4		

	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	001	1,00	COSTO DIRECTO	WSD	\$91.303.487,00	\$91.303.487,00
2	Adm1	1,00	Administración 24%	EA	\$21.912.837,00	\$21.912.837,00
3	Imp1	1,00	Imprevistos 5%	EA	\$4.565.174,00	\$4.565.174,00
4	Uti1	1,00	Utilidad 5%	EA	\$4.565.174,00	\$4.565.174,00

SON: (CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS SEIS CENTAVOS)
CUFE: 883bae685a1aff098ec09a204f60063f24ddc61daa7ec690161715e93a7b5d875185b31f28951529fbeda77801c561a0

SUBTOTAL:	\$122.346.672,00
IVA	\$867.383,06
TOTAL:	\$123.214.055,06


NOTAS:

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
IVA	\$4.565.174,00	19,00%	\$867.383,06

Firma Digital: No6lqmaVazv1VHerx4FJAPrFdsa0Yk8cvQA5mJJTNhho2BnbCee0K7PR35f5ZKp +BHoL6hqLFuyJSESvCnox2GXKrBshJ6uWycpiupohWYy8qA74V /D3exymRYLaXjg +YV4f6K8gmkc2cEptA3IPokD05azxfBzr1TMNg8Uoa4d1SVBkkQT0j0RYBPix wPaXontZHFJJEbrdQeYx6KwFEyCsEFIq7Cs AprHJyYGmol89wupyrDY4uGoiWR mVNnFsp+4Sbtly+KhIVot3CkA2UIBXaKNWFQdtriBXjVof+tuTVgt9bGZEMqjexQ ikX691rtrbF58mZg5CH+/ ZQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





INFORME TÉCNICO DE OBRA

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el contrato de cambio de la red de alcantarillado en el municipio de Salamina - Caldas celebrado entre CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S y Empocaldas S.A.E.S.P Se desarrolla el proyecto **"REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS."**

En el presente informe se describen ítems desarrollados en el periodo de ejecución.

Las obras civiles contempladas dentro del presente contrato comprenden Localización y replanteo, demoliciones, movimientos de tierra, excavaciones, llenos, Concretos, instalación de tubería de alcantarillado en pvc, entre otros.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	013 DE FEBRERO 24 DE 2023.
Objeto:	"REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS"
Nombre Contratista:	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
Fecha del contrato:	FEBRERO 24 DE 2023.
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial Obra	\$ 164.063.909,00
Valor total:	\$ 164.063.909,00
Valor ejecutado:	\$ 123.214.055,00
Saldo contrato:	\$ 40.849.854,00
Fecha de Iniciación:	FEBRERO 24 DE 2023.
Fecha de Terminación contractual:	ABRIL 9 DE 2023
Supervisor:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA.



AVANCE DEL CONTRATO
AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo	75,37%
Avance físico Acumulado	75,37%

AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada: obra	164.063.909,00
Inversión ejecutada en el periodo:	123.214.055,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	75,37%
Inversión total ejecutada:	123.214.055,00
Porcentaje total ejecutado:	75,37%

AVANCE EN TIEMPO

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	34
Avance Porcentual:	75,37%

ANTECEDENTES:

La obra que se adelanta tiene un frente de obra ubicado en el municipio de Salamina donde se realiza reemplazo de alcantarillado existente mejorando su diámetro en la red principal y domiciliarias residenciales, esto acompañado de obras en concreto como pavimentos y cámaras.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Mediante el contrato No.013 del 2023, se realizan las obras de reposición de la tubería de alcantarillado calle 9a carreras 7 y 8 municipio de Salamina-Caldas por tubería pvc de 18" en una longitud de 106,0 m con los respectivos accesorios propios para este tipo de obra. También se realizan domiciliarias en tubería Novafort de 6". Adicional a ello se ejecutaran obras de concreto para reemplazar las que existían.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- Se realizan las obras de reposición de la tubería de alcantarillado en la CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS por tubería Novafort PVC DE 18" en una longitud total de 106,0 m.
 - Se realiza demolición de 106 metros de escalas en concreto reforzado.
 - Se realiza demolición y retiro de tubería en concreto de 12"
 - Se instala cama de arena para atraque de tubería Novafort PVC 18, respectivamente"
 - Se realiza cerramiento y señalización de la obra.
 - El concreto a instalar será concreto reforzado y acelerado a 7 con un espesor de 0,18 cms


- Se realizan llenos compactados mecánicamente con material seleccionado (afirmado) y subbase con el fin de reemplazar el que había que se encontraba saturado y descompuesto a causa de la infiltración de las aguas de alcantarillado.
- Se reconstruyen bases y cañuelas de cámaras de inicio y final
- Se instalada acero de refuerzo en los sitios donde se vaciara concreto reforzado.
- se realizaron empalmes entre cámaras de inspección tanto red principal como en los imbornales.
- Se realiza limpieza final de la obra transportando todo el material sobrante de la excavación, y demoliciones.

INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA



EXCAVACIONES

Excavación para instalación de tubería Novafort PVC 18"

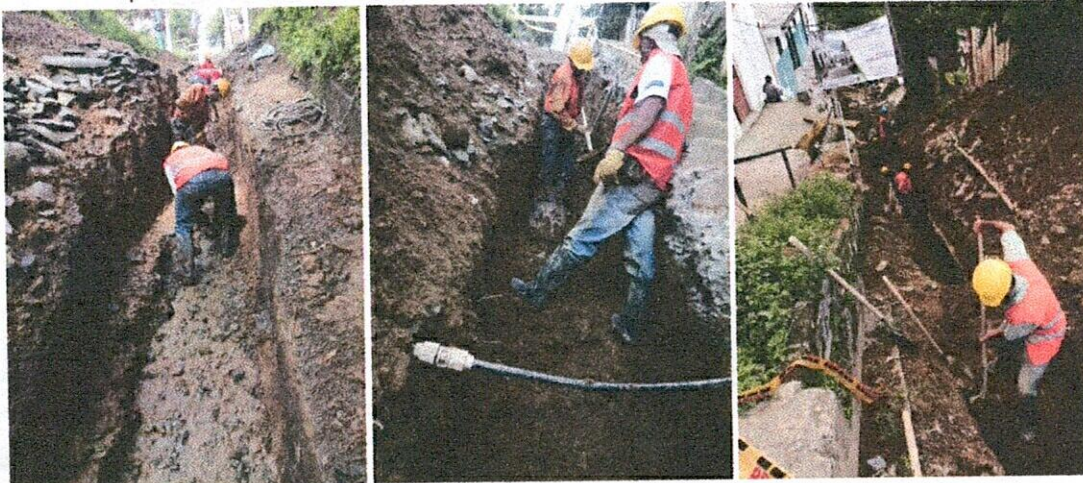

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Demolición de concreto reforzado- escalas existentes.



INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT PVC DE 18"

Se instalaron 106 ml de esta tubería Novafort de 18" la cual es el reemplazo de la existente que se encontraba en material de cemento que se encontraba de 12".



LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO




INSTALACION DE SILLETAS 18"X6"



CAJAS DE CONCRETO-DOMICILIARIAS



INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT PVC DE 6"-DOMICIALIARIAS

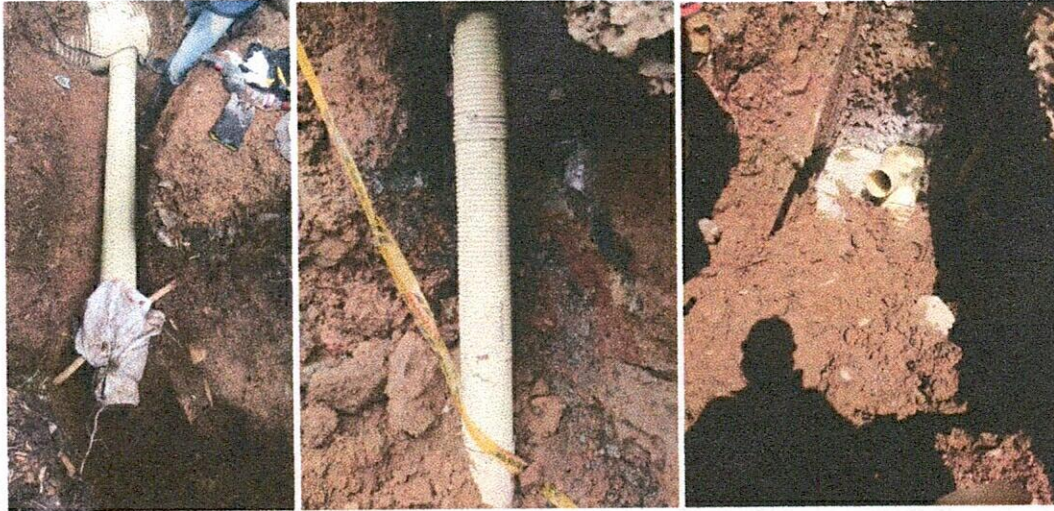

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.



Ing. CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES VALENCIA MONTES S.A.S
Contratista




NOMINA 1-03-2023 AL 30-03-2023

EMPLEADOR	CIUDAD/REGIO NAL/FRENTE	CARGO	CC	NOMBRES	Banco	Salario Básico Mensual	Horas Extras	Días laborados	Salario	Auxilio (horas extras)	Incapacidades	Auxilio de transporte	Subtotal 1	Deducciones				Monto por pagar en Blancos	Firma del empleado
														EPS (4%)	Pensión 4%	TOTAL DEDUCIDO			
1. CARLOS ALBERTO VALENZUELA MARDUEZ	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	10587712	ARIBS GONZALEZ LUIS ERNESTO	/	1.150.000		16	\$ 618.667	0	0	\$ 74.950	\$ 693.617	\$ 24.741	\$ 24.741	\$ 49.483	\$ 644.133	<i>[Signature]</i>	
2. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	10587541	BEDRYA TAMARES PREDDY	/	1.150.000		1	\$ 38.867	0	0	\$ 4.867	\$ 43.734	\$ 1.547	\$ 1.547	\$ 3.320	\$ 40.414	<i>[Signature]</i>	
3. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	105903026	GARCIA GALVIS ORLEY	/	1.150.000		16	\$ 618.667	0	0	\$ 74.950	\$ 693.617	\$ 24.741	\$ 24.741	\$ 49.483	\$ 644.133	<i>[Signature]</i>	
4. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	105376508	GBRALDO PEREZ DIEGO ALEXANDER	/	1.150.000		7	\$ 270.667	0	0	\$ 32.898	\$ 303.565	\$ 10.827	\$ 10.827	\$ 21.654	\$ 281.911	<i>[Signature]</i>	
5. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	10582189	GOMEZ GARCIA LUIS FERNANDO	/	1.150.000		16	\$ 618.667	0	0	\$ 74.950	\$ 693.617	\$ 24.741	\$ 24.741	\$ 49.483	\$ 644.133	<i>[Signature]</i>	
6. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	10587289	MOLINA HINCAPIE GERMAN	/	1.150.000		11	\$ 425.333	0	0	\$ 51.555	\$ 476.888	\$ 17.013	\$ 17.013	\$ 34.027	\$ 442.861	<i>[Signature]</i>	
7. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	105801086	MILGOS GIBALDO JOSE DAVID	/	1.150.000		16	\$ 618.667	0	0	\$ 74.950	\$ 693.617	\$ 24.741	\$ 24.741	\$ 49.483	\$ 644.133	<i>[Signature]</i>	
8. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	10586619	OSORIO RODRIGUEZ DIER ANTONIO	/	1.150.000		2	\$ 77.333	0	0	\$ 9.374	\$ 86.707	\$ 3.093	\$ 3.093	\$ 6.187	\$ 80.521	<i>[Signature]</i>	
9. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	24679560	SAURIGA LOPEZ LUZ AYEZE	/	1.150.000		7	\$ 270.667	0	0	\$ 32.898	\$ 303.565	\$ 10.827	\$ 10.827	\$ 21.654	\$ 281.911	<i>[Signature]</i>	
10. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	105904726	TAMAYO CIANO BRAYAN ALEXANDER	/	1.150.000		2	\$ 77.333	0	0	\$ 9.374	\$ 86.707	\$ 3.093	\$ 3.093	\$ 6.187	\$ 80.521	<i>[Signature]</i>	
11. CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S	SALAMBA EMERGENCIA	AYUDANTE	115120391	URIBE BARBOSA YEISON	/	1.150.000		7	\$ 270.667	0	0	\$ 32.898	\$ 303.565	\$ 10.827	\$ 10.827	\$ 21.654	\$ 281.911	<i>[Signature]</i>	

\$ 3.864.981

[Signature]

CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENZUELA MONTES S.A.S
 CARLOS ALBERTO VALENZUELA MARQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 18.078.315 de Minizulais
 Email: agarcia@valenzuelamontes.com
 Manizales - Cauca

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	Marzo 30 de 2023.	Acta Parcial	X	Acta final	
----------------	----	-------------------	-------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	013 DE FEBRERO 24 DE 2023.
Objeto:	"REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS"
Nombre Contratista:	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
Fecha del contrato:	FEBRERO 24 DE 2023.
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial Obra	\$ 164.063.909,00
Valor total:	\$ 164.063.909,00
Valor ejecutado:	\$ 123.214.055,00
Saldo contrato:	\$ 40.849.854,00
Fecha de Iniciación:	FEBRERO 24 DE 2023.
Fecha de Terminación contractual:	ABRIL 9 DE 2023
Supervisor:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA.

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	75,37%
Avance físico Acumulado	75,37%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SALAMINA	Reposición Alcantarillado D= 18" PVC	0,106Definitivo

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	34
Avance Porcentual:	75,37%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

La obra que se adelanta tiene un frente de obra ubicado en el municipio de Salamina donde se realiza reemplazo de alcantarillado existente mejorando su diámetro en la red principal y domiciliarias residenciales, esto acompañado de obras en concreto como pavimentos y cámaras.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.


- Se realizan las obras de reposición de la tubería de alcantarillado en la CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS por tubería Novafort PVC DE 18" en una longitud total de 106,0 m.
 - Se realiza demolición de 106 metros de escalas en concreto reforzado.
 - Se realiza demolición y retiro de tubería en concreto de 12"
 - Se instala cama de arena para atraque de tubería Novafort PVC 18, respectivamente"
 - Se realiza cerramiento y señalización de la obra.
 - El concreto a instalar será concreto reforzado y acelerado a 7 con un espesor de 0,18 cms
 - Se realizan llenos compactados mecánicamente con material seleccionado (afirmado) y subbase con el fin de reemplazar el que había que se encontraba saturado y descompuesto a causa de la infiltración de las aguas de alcantarillado.
 - Se reconstruyen bases y cañuelas de cámaras de inicio y final
 - Se instalada acero de refuerzo en los sitios donde se vaciara concreto reforzado.
 - se realizaron empalmes entre cámaras de inspección tanto red principal como en los imbornales.
 - Se realiza limpieza final de la obra transportando todo el material sobrante de la excavación, y demoliciones.

INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA




EXCAVACIONES

Excavación para instalación de tubería Novafort PVC 18"

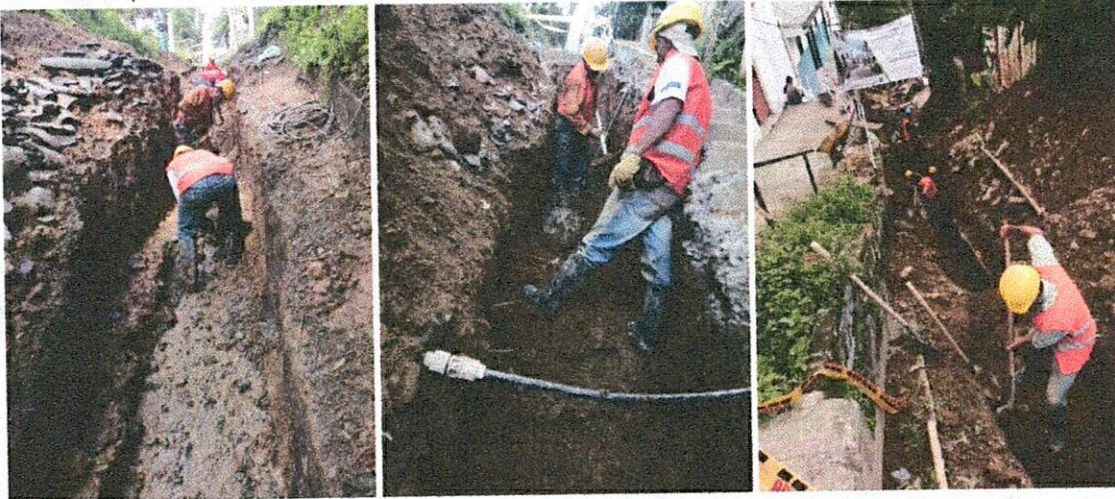

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Demolición de concreto reforzado- escalas existentes.

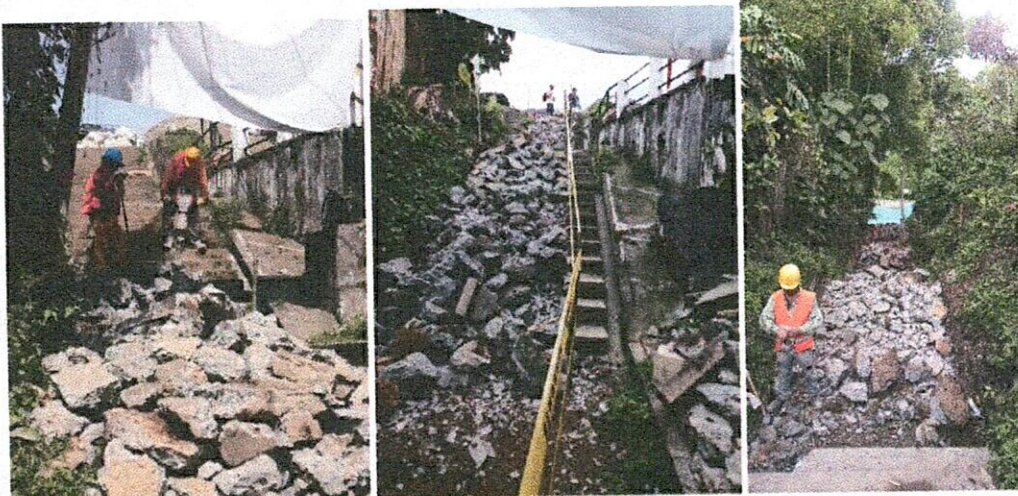

INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT PVC DE 18"


Se instalaron 106 ml de esta tubería Novafort de 18" la cual es el reemplazo de la existente que se encontraba en material de cemento que se encontraba de 12".




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

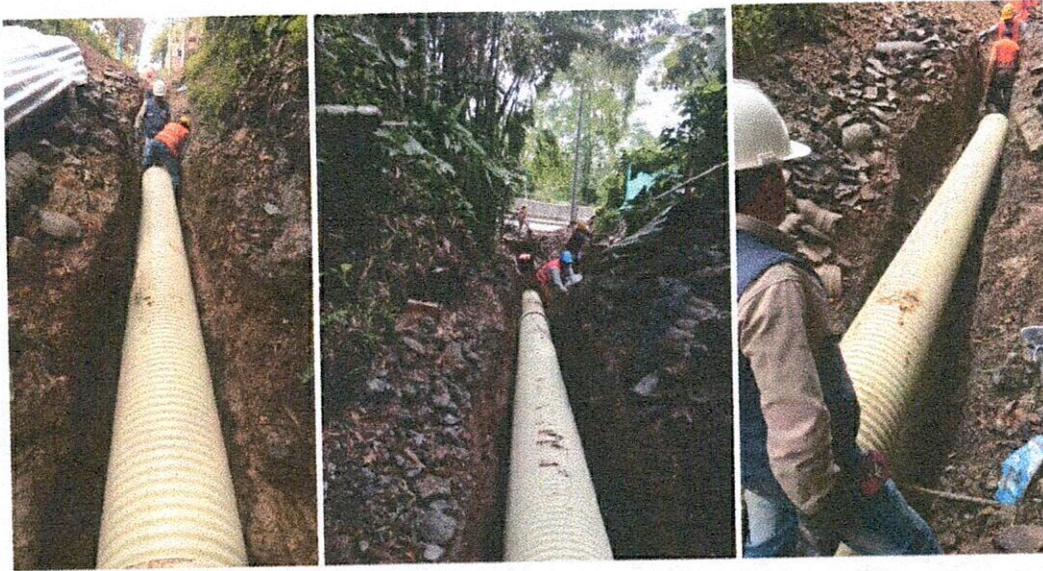

LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

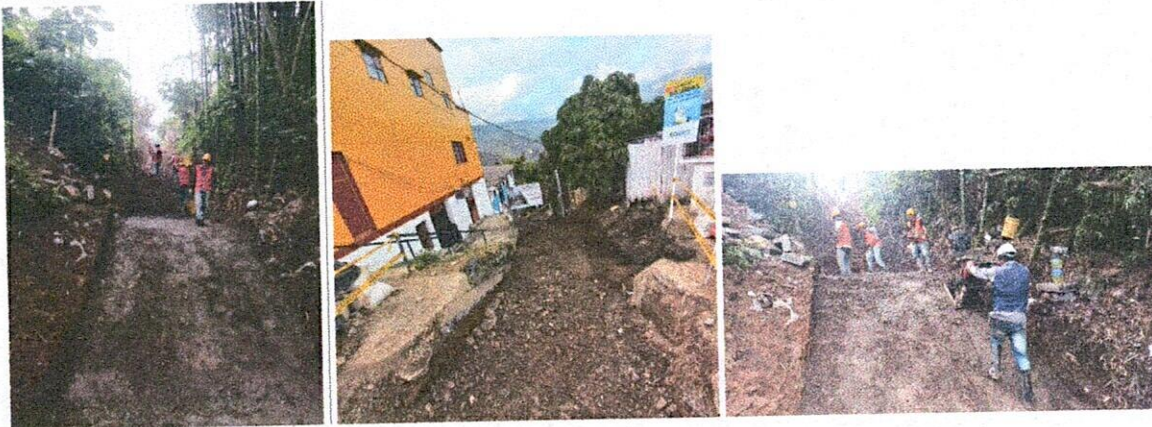

INSTALACION DE SILLETAS 18"X6"





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

CAJAS DE CONCRETO-DOMICILIARIAS



INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT PVC DE 6"-DOMICIALIARIAS



SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada: obra	164.063.909,00
Inversión ejecutada en el periodo:	123.214.055,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	75,37%
Inversión total ejecutada:	123.214.055,00
Porcentaje total ejecutado:	75,37%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	S. del estado	4245101055524	24/02/2023	10/07/2023	\$49.219.172,70
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	S. del estado	4245101055524	24/02/2023	10/04/2026	\$32.812.781,80
Estabilidad de Obra	S. del estado	4245101055524	24/02/2023	23/02/2028	\$32.812.781,80
Responsabilidad Civil	S. del estado	4240101042633	24/03/2023	10/07/2023	\$49.219.172,70

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	NA
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	x	x	x	x	NA
Ayudantes	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Jurídica)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

Para el presente periodo solo se presenta seguridad social del representante legal, profesional social y SST del mes de Febrero y Marzo y el pago de empleados operativos del mes de Marzo ya que se iniciaron labores de demolición en este mes y en el mes de febrero solo se realizaron actividades de carácter social.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Marzo 30 de 2023	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexan con el acta parcial en el paquete de cobro del acta parcial 01.

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	SI	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
TOTALES				

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

El personal que se utilizó en la ejecución de la obra en su mayoría residen en los municipios de Belalcazar y Viterbo Caldas, tanto calificado como no calificado, la profesional social si era externa.

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	


El pago del FIC no se efectúa para el presente periodo, el contratista tiene compromiso de cancelarlo para la liquidación del presente contrato.


Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

Ing. JUAN PABLO ZULUAGA
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO N°		013-2023		MUNICIPIO		SALAMINA	
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION
PRINCIPAL	COMBINADO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	ESTRUCTURA FINAL DE VERTIMIENTO	18	106.0	PVC	Instalación con apertura de zanja

CERTIFICACION DE TUBERIA	SI	NUMERO DE CERTIFICADO		ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	ICONTEC	# LOTE	04091	FABRICANTE	CUJRA448	NIT	80803315-6	FECHA DE INSTALACION	DD/MM/AAAA	07/03/2023	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	12	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	CEMENTO	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)	96
NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR		ING. JUAN PABLO ZULUAGA																		
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR																				
VISTO BIENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO																				

NOMBRE CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S																		
FIRMA CONTRATISTA	 Carlos Alberto Valencia Rep. Legal.																		



EMPICALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL NORTE

CONTRATO No. 013 DE FEBRERO 24 DEL 2023
 ACTA No.: 1-PARCIAL
 FECHA CORTE: MARZO 30 DE 2023

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
 MUNICIPIO: SALAMINA
 CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ

FECHA INICIACION: FEBRERO 24 DE 2023
 VALOR CONTRATO: \$ 164.063.999.00

FECHA VENCIMIENTO INICIAL: ABRIL 09 DE 2023
 VALOR INICIO:

FECHA: ABRIL 28 DE 2023
 SUPERVISOR: Ing. JUAN PABLO ZULIAGA

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACCION No.1			ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTA ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA	% OBRA EJECUTADA
			VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD				
OBRAS EN CONCRETO												
Concreto de 21Mpa para gradierias, andenes y sardinel incluye formaleta	M3	46,00	\$ 841.712,00	\$ 38.718.752,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	
Pavimento en Hido de 3000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	M3	0,00	\$ 1.143.082,00	\$ -				0,00	0,00	0,00	0,00%	
ACERO												
Acero de refuerzo para gradierias	KG	200,00	\$ 12.000,00	\$ 2.400.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	
RENDICIONES												
Trabajador SISO	MES	1,00	\$ 4.119.091,00	\$ 4.119.091,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trabajadora Social todo el proceso domiciliarias y socialización de la obra contratada	MES	1,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	
Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 400 mm (18"), incluye manejo	ML	48,00	\$ 51.200,00	\$ 2.457.600,00				0,00	2.457.600,00	48,00	100,00%	
Empalme e instalacion tuberia corrugada PVC-S de 400 mm (18"), incluye manejo de aguas en zanija.	ML	58,00	\$ 396.483,00	\$ 22.996.014,00				0,00	22.996.014,00	58,00	100,00%	
Suministro e instalacion de silla pte de 18 x 6"	UNID	12,00	\$ 211.805,00	\$ 2.541.660,00				0,00	2.541.660,00	12,00	100,00%	

CONDICIONES CONTRACTUALES		ACCION No.1	
VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO
\$ 121.573.849	\$ 29.177.724,00	0	0
	6.078.692,00	0	0
	6.078.692,00	0	0
	162.908.952,00	0	0
	1.154.952,00	0	0
	564.063.999	0	0
	564.063.999	0	0

COSTO DIRECTO		ADMINISTRACION		IMPUESTOS		UTILIDADES		SUMA ANTES IVA		I. V. A.		VALOR TOTAL OBRA		TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	
VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
\$ 91.303.487	\$ 21.912.837,00	\$ 4.565.174,00	\$ 4.565.174,00	\$ 4.565.174,00	\$ 4.565.174,00	\$ 122.346.672	\$ 867.383,00	\$ 123.214.055,00	\$ 123.214.055,00	\$ 123.214.055,00	\$ 123.214.055,00	\$ 123.214.055,00	\$ 123.214.055,00	\$ 123.214.055,00	\$ 123.214.055,00

SON: CIENTO VEINTITRES MILONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 123.214.055.000) m/cte.



CONTRATO No. 013 DE FEBRERO 24 DEL 2023		ACTA No. 1- PARCIAL		FECHA CORTE: MARZO 30 DE 2023	
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS		FECHA INICIACION: FEBRERO 24 DE 2023		FECHA VENCIMIENTO INICIAL: ABRIL 09 DE 2023	
MUNICIPIO: SALAMINA		VALOR CONTRATO: \$ 164.063.906,00		VALOR ADICION: \$	
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ		SUPERVISION: Ing. JUAN PABLO ZULUAGA		FECHA: ABRIL 28 DE 2023	

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		VALOR TOTAL	ADICION No.1		VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL	CANTIDAD		VALOR PARCIAL	PRESENTE ACTA	
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS														
EMPOCALDAS A.S. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL OCCIDENTE														
CONTRATO No. 013 DE FEBRERO 24 DEL 2023		ACTA No. 1- PARCIAL		FECHA CORTE: MARZO 30 DE 2023										
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS		FECHA INICIACION: FEBRERO 24 DE 2023		FECHA VENCIMIENTO INICIAL: ABRIL 09 DE 2023										
MUNICIPIO: BEALCAZAR Y VITERBO		VALOR CONTRATO: \$ 0		VALOR ADICION: \$										
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ		SUPERVISION: Ing. JUAN PABLO ZULUAGA		FECHA: ABRIL 28 DE 2023										

\$	164.063.906,00
\$	0,00
\$	123.214.055,00
\$	40.949.851,00
\$	164.063.906,00

\$	164.063.906,00
\$	0,00
\$	164.063.906,00
\$	164.063.906,00

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:
VALOR CONTRATO INICIAL
Valor Adicion No. 01
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: Mayo 2 de 2023)

Sello del Contrato
SUMAS IGUALES
Nombre: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
Contratista:

Nombre: Ing. JUAN PABLO ZULUAGA
INGENIERO SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS
SECCIONAL SALAMINA



ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

CONTRATO N°: 013 FEBRERO 24 DE 2023.

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ

OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS.

VALOR: \$ 164.063.909,00


RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiún (21) días del mes de Marzo de 2023 se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA como Supervisor EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Centro Norte y CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato 013 FEBRERO 24 DE 2023.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CORRUGADA PVC-S DE 400 MM (18"), INCLUYE MANEJO DE AGUAS EN ZANJA.	ML	\$ 396.483,00 ✓
NP2	INSTALACIÓN TUBERÍA CORRUGADA PVC-S DE 400 MM (18"), INCLUYE MANEJO DE AGUAS EN ZANJA.	ML	\$ 51.200,00 ✓
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE DE 18 X 6"	UN	\$ 211.805,00 ✓

Nota: LOS PRECIOS INCLUYEN AIU E IVA SOBRE UTILIDADES

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.





ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS


NP1	Suministro e Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 400 mm (18"), incluye manejo de aguas en zanja.		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0,50	\$ 8.000,00	\$ 4.000,00
	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC-S DE 400 MM (18")	Insumo	ML	1,00	\$ 281.400,00	\$ 281.400,00
	ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0,28	\$ 30.000,00	\$ 8.400,00
COSTO DIRECTO						\$ 293.800,00
				A	24,00%	\$ 70.512,00
				I	5,00%	\$ 14.690,00
				U	5,00%	\$ 14.690,00
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	\$ 2.791,00
COSTO TOTAL / UNIDAD						\$ 396.483,00

NP2	Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 400 mm (18"), incluye manejo de aguas en zanja.		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0,50	\$ 8.000,00	\$ 4.000,00
	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC-S DE 400 MM (18")	Insumo	ML	1,00	\$ 25.540,00	\$ 25.540,00
	ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0,28	\$ 30.000,00	\$ 8.400,00
COSTO DIRECTO						\$ 37.940,00
				A	24,00%	\$ 9.106,00
				I	5,00%	\$ 1.897,00
				U	5,00%	\$ 1.897,00
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	\$ 360,00
COSTO TOTAL / UNIDAD						\$ 51.200,00

NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE DE 18 X 6"		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0,50	\$ 8.000,00	\$ 4.000,00
	INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE 12" A 10"	Insumo	und	1,00	\$ 137.950,00	\$ 137.950,00
	ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0,50	\$ 30.000,00	\$ 15.000,00
COSTO DIRECTO						\$ 156.950,00
				A	24,00%	\$ 37.668,00
				I	5,00%	\$ 7.848,00
				U	5,00%	\$ 7.848,00
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	\$ 1.491,00
COSTO TOTAL / UNIDAD						\$ 211.805,00


CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
CONTRATISTA
REP. LEGAL CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ


Nombre: Ing. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA.
INGENIERO SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL RIOSUCIO- CALDAS				CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO						
CONTRATO No. 013 FEBRERO 24 DE 2023						PRE-ACTA: No 1- PARCIAL				
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ						FECHA INICIACIÓN: FEBRERO 24 DE 2023.				
SUPERVISOR: Ing. JUAN PABLO ZULUAGA						FECHA TERMINACIÓN: ABRIL 09 DE 2023				
ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor						ML	0	112,00	112,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
6	3							14,00	14,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
7	3							14,00	28,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
10	3							14,00	42,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
13	3							14,00	56,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
14	3							14,00	70,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
15	3							14,00	84,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
16	3							14,00	98,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
17	3							14,00	112,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
18	3							14,00	126,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
21	3							14,00	140,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
22	3							14,00	154,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
23	3							14,00	168,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
24	3							14,00	182,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
25	3							14,00	196,00	RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE ESCALAS EXISTENTES Y DE LA EXCAVACION PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	196,01
ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m						M3	0	254,40	254,40
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
6	3			106,00	1,20	2,00		254,40	254,40	EXCAVACION PARA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	254,40



CONTRATO No.	013 FEBRERO 24 DE 2023	PRE-ACTA:	No.1- PARCIAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	FECHA INICIACIÓN:	FEBRERO 24 DE 2023.
SUPERVISOR:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA	FECHA TERMINACIÓN:	ABRIL 09 DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Excavaciones en zanja - material Común 2 a 4 m	M3	0	101,76	101,76

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
6	3			106,00	1,20	0,80		101,76	101,76	EXCAVACION PARA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
CANTIDAD DE PAGO										101,76	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ML	0	212,00	212,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
6	3			106,00				106,00	106,00	ENTIBADO POR AMBAS MARGEN DERECHA PARA EXCAVACION EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
6	3			106,00				106,00	106,00	ENTIBADO POR AMBAS MARGEN IZQUIERDA PARA EXCAVACION EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE	
CANTIDAD DE PAGO										212,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	M3	0	0,00	0,00


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
17	3			106,00	1,20	0,75		95,40	95,40	LLENO DE EXCAVACION PARA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
CANTIDAD DE PAGO										95,40	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	M3	0	197,16	197,16

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
17	3			106,00	1,20	1,55		197,16	197,16	LLENO DE EXCAVACION PARA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
CANTIDAD DE PAGO										197,16	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Afirmado para andenes y zonas duras varias E=0,15 m compactos con rana	M3	0	222,60	222,60

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
27	3			106,00	3,50	0,60		222,60	222,60	LLENO EN AFIRMADO DE LA EXCAVACION PARA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
CANTIDAD DE PAGO										222,60	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL RIOSUCIO- CALDAS				CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO							
CONTRATO No. 013 FEBRERO 24 DE 2023						PRE-ACTA: No.1- PARCIAL					
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ						FECHA INICIACION: FEBRERO 24 DE 2023.					
SUPERVISOR: Ing. JUAN PABLO ZULUAGA						FECHA TERMINACION: ABRIL 09 DE 2023					
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Suministro e Instalacion tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja.							ML	0	3,00	3,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
7	3			3,00				3,00	3,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 7 # 9-33 COD SUSCRIPTOR 1331	
8	3			3,00				3,00	6,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 A # 7-15 COD SUSCRIPTOR 1329	
10	3			3,10				3,10	9,10	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 9-27 COD SUSCRIPTOR 1330	
11	3			2,90				2,90	12,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-17 APTO 1 USUARIO NUEVO	
13	3			3,25				3,25	15,25	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-17 APTO 2 COD SUSCRIPTOR 4138	
15	3			2,80				2,80	18,05	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-19 COD SUSCRIPTOR 4139	
16	3			2,50				2,50	20,55	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CALLE 9A # 7-16 COD SUSCRIPTOR 1333	
17	3			2,90				2,90	23,45	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CALLE 9 # 7-44 COD SUSCRIPTOR 1317	
21	3			3,05				3,05	26,50	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO CANCHA DE TEJO	
23	3			3,15				3,15	29,65	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO SIN IDENTIFICAR	
24	3			3,00				3,00	32,65	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN DERECHA	
25	3			3,00				2,80	35,45	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN IZQUIERDA	
									CANTIDAD DE PAGO	35,45	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Empalmes a Cámaras d=1.20 m							UN	0	4,00	4,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
17	3							1,00		EMPLAME EN CAMARAS EXISTENTE INICIO EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN IZQUIERDA	
18	3							2,00		EMPLAME EN CAMARAS EXISTENTE INTERMEDIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN IZQUIERDA	
21	3							1,00		EMPLAME EN CAMARAS EXISTENTE FINAL EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN IZQUIERDA	
									CANTIDAD DE PAGO	4,00	





CONTRATO No.	013 FEBRERO 24 DE 2023	PRE-ACTA:	No 1- PARCIAL
CONTRATISTA.	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	FECHA INICIACION:	FEBRERO 24 DE 2023.
SUPERVISOR:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA	FECHA TERMINACION:	ABRIL 09 DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada	UND	0	12,00	12,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
7	3							1,00	1,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 7 # 9-33 COD SUSCRIPTOR 1331
8	3							1,00	2,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-15 COD SUSCRIPTOR 1329
10	3							1,00	3,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 9-27 COD SUSCRIPTOR 1330
11	3							1,00	4,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-17 APTO 1 USUARIO NUEVO
13	3							1,00	5,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-17 APTO 2 COD SUSCRIPTOR 4338
15	3							1,00	6,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-19 COD SUSCRIPTOR 4339
16	3							1,00	7,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CALLE 9A # 7-16 COD SUSCRIPTOR 1333
17	3							1,00	8,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CALLE 9 # 7-44 COD SUSCRIPTOR 1317
21	3							1,00	9,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO CANCHA DE TEJO
23	3							1,00	10,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO SIN IDENTIFICAR
24	3							1,00	11,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN DERECHA
25	3							1,00	12,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN IZQUIERDA
									CANTIDAD DE PAGO	12,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Instalacion tubería corrugada PVC-5 de 400 mm (18"), incluye manejo de aguas en zanja.	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
17	3			48,00				48,00	48,00	INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	48,00

CONTRATO No.	013 FEBRERO 24 DE 2023	PRE-ACTA:	No.1- PARCIAL
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	FECHA INICIACION:	FEBRERO 24 DE 2023
SUPERVISOR:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA	FECHA TERMINACION:	ABRIL 09 DE 2023


ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
17	Suministro e Instalacion tubería corrugada PVC-5 de 400 mm (18"), incluye manejo de aguas en zanja.	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
24	3			58,00				58,00	58,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA DE 18" PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
CANTIDAD DE PAGO										58,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
18	Suministro e Instalacion de silla vee de 18 x 6"	UNIDAD	0	#(REFI)	#(REFI)


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
7	3							1,00	1,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 7 # 9-33 COD SUSCRIPTOR 1331	
8	3							1,00	2,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-15 COD SUSCRIPTOR 1329	
10	3							1,00	3,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 9-27 COD SUSCRIPTOR 1330	
11	3							1,00	4,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-17 APTO 1 USUARIO NUEVO	
13	3							1,00	5,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-17 APTO 2 COD SUSCRIPTOR 4138	
15	3							1,00	6,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CRA 9 # 7-19 COD SUSCRIPTOR 4139	
16	3							1,00	7,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CALLE 9A # 7-16 COD SUSCRIPTOR 1333	
17	3							1,00	8,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO LUZ MERY BOTERO CALLE 9 # 7-44 COD SUSCRIPTOR 1317	
21	3							1,00	9,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. USUARIO CANCHA DE TEJO	
23	3							1,00	10,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO SIN IDENTIFICAR	
24	3							1,00	11,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN DERECHA	
25	3							1,00	12,00	DOMICILIARIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS. PREDIO LOTE MARGEN DERECHA	
CANTIDAD DE PAGO										12,00	


FIRMA CONTRATISTA.
Ing. CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ


FIRMA SUPERVISOR
Ing. JUAN PABLO ZULUAGA

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

02-05-2023 02-05-2023 FE FE2 Fatura electrónica 901589304 890603239 EMPRESA DE OBRAS... Aprobado con notificación Fatura Electrónica \$123,214,055

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2022-08-03

# CONTRATO Y AÑO	013 DE FEBRERO 24 DE 2023	Acta N°	1-PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 164.063.909,00
				2. VALOR ADICION	\$ -
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 164.063.909,00
NIT O CC:	901.589.304-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ -
CDP (#, rubro y fecha)	20230361 DE FEBRERO 17 DE 2023 20230368 DE FEBRERO 23 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 123.214.055,00
RP (#, rubro y fecha)	379 DE FEBRERO 24 DE 2023.			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$ 40.849.854,00

OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	NA	
9- Diseño de Mezclas.	NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

02/05/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
108900240889	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten signature and date:
03-05-23
D. M.
