

# CONTRATO Y AÑO	0100/2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	197.191.207
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			3. VALOR TOTAL (1+2)	197.191.207
NIT.O CC.	10.280.643			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00247 01/22/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	159.933.491
RP (#, rubro y fecha)	000311 02/18/2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	37.257.716
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1. REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2. CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3. INSTALACIÓN, ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACIÓN DE REJAS EXISTENTES EN GENERA. LOCALIZACIÓN EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓
					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

23/08/2019
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86160012067	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
INGENIERO CIVIL U.N.

Manizales, Julio 09 de 2019

EL SUSCRITO INGENIERO:

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICA QUE

Que me encuentro a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses con el Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Fondo de Fomento a la Construcción FIC, CREE, por todo concepto con los aportes parafiscales de acuerdo a los requerimientos del Artículo 50 de la Ley 789 – 2002.


JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Ingeniero Civil
M. P. No. 17202 – 66562 CLD
C.C. No. 10.280.643 de Manizales



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-04-05, 10:40:17 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 39694913
 Período Cotización: marzo de 2019 Período Servicio: marzo de 2019

PAGADO 04/04/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER DE JESUS GARCIA P	Dirección	CALLE 64 A NO 21-50 OF 1507 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE
Documento	CC10280643	Teléfono	88614119
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CALDAS
Ciudad	MANIZALES	Identificación	POSITIVA DE SEGUROS
Representante Legal		ARP	
Total Afiliados	11		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Sitio Cotizante	Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-04-05, 10:29:40 AM

Periodo Cotización: marzo de 2019

Numéro Planilla: 39675528

Planilla: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Periodo Servicio: abril de 2019

PAGADO 05/04/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER DE JESUS GARCIA P	Nombre Sucursal	EMPOCALDAS C 100	Código Sucursal	99
Documento	NI10280643	Dirección	CL 64A N° 21 50 OF 1507 ED PORTAL DEL CA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8861419		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS		
Representante Legal	GARCIA PAREJA JAVIER DEJESUS	Identificación	CC 10280643		
Total Afiliados	117	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado		Novedades										Pensionales			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes CBF	Aportes EDAP	Aportes Mutibocación	Intermediciales Limpieza y Mantenimiento a Fines EPS	Intermediciales a Fines APP	SUBTOTAL DE INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINA
\$ 5.789.213	\$ 5.789.213	\$ 5.789.213	\$ 5.789.213	\$ 24.600	\$ 231.600	\$ 402.400	\$ 231.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.790.200	\$ 0	\$ 1.790.200

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #438722651-BANCO DAVIVIENDA

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com>

Mié 24/04/2019 10:39 AM

Para: javiergarciapareja@hotmail.com <javiergarciapareja@hotmail.com>

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 10280643

Primer Nombre ó Razón Social: JAVIER DE JESUS

Primer Apellido (si es Persona natural): GARCIA PAREJA

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica):

Naturaleza Jurídica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 64A 21 50 of 1507 edf portal del c

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8861419

Correo electrónico: javiergarciapareja@hotmail.com

Código SIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: N° 0100

Nombre Obra: REPOSICION Y OPTIMIZACION-ANCLA

Fecha Inicio Obra: 06/03/2019

Fecha Terminación Obra: 03/06/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: LA DORADA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: MARZO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$197,191,207.00

Costo Total Mano de Obra: \$5,769,200.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 17

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$351,949.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$351,949.00

Total Pagado: \$351,949.00

Número de Factura o Referencia de
Pago: 62516013

IP Origen: 172.31.31.0

Valor del Pago: \$351,949.00

Fecha de Creación: 24/04/2019 10:33:03 a.m.

24/4/2019

Correo: Javier de Jesús García Pareja - Outlook

Banco: **BANCO DAVIVIENDA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Número de Confirmación/CUS: **438722651**

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #450070801-BANCOLOMBIA

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com>

Vie 24/05/2019 10:55 AM

Para: javiergarciapareja@hotmail.com <javiergarciapareja@hotmail.com>

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 10280643

Primer Nombre ó Razón Social: JAVIER DE JESUS

Primer Apellido (si es Persona natural): GARCIA PAREJA

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica):

Naturaleza Jurídica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 64A 21 50 of 1507 edf portal del c

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8861419

Correo electrónico: javiergarciapareja@hotmail.com

Código SIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: N° 0100

Nombre Obra: REPOSICION Y OPTIMIZACION-ANCL

Fecha Inicio Obra: 06/03/2019

Fecha Terminación Obra: 03/06/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: LA DORADA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: ABRIL

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$197,191,207.00

Costo Total Mano de Obra: \$7,591,100.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 11

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$227,732.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$227,732.00

Total Pagado: \$227,732.00

Número de Factura o Referencia de
Pago: 62681976

IP Origen: 172.31.44.253

Valor del Pago: \$227,732.00

Fecha de Creación: 24/05/2019 10:55:22 a.m.

24/5/2019

Correo: Javier de Jesús García Pareja - Outlook

Banco: **BANCOLOMBIA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Número de Confirmación/CUS: **450070801**

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #455826412-BANCOLOMBIA

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com>

Lun 10/06/2019 10:22 AM

Para: javiergarciapareja@hotmail.com <javiergarciapareja@hotmail.com>

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 10280643

Primer Nombre ó Razón Social: JAVIER DE JESUS

Primer Apellido (si es Persona natural): GARCIA PAREJA

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica):

Naturaleza Juridica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 64A 21 50 of 1507 edf portal del c

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8861419

Correo electrónico: javiergarciapareja@hotmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: No.0100

Nombre Obra: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION-ANCLA

Fecha Inicio Obra: 06/03/2019

Fecha Terminación Obra: 03/06/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: LA DORADA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: MAYO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$197,191,207.00

Costo Total Mano de Obra: \$2,319,000.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 8

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$165,623.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$165,623.00

Total Pagado: \$165,623.00

Número de Factura o Referencia de
Pago: 62776255

IP Origen: 172.31.44.253

Valor del Pago: \$165.623,00

Fecha de Creación: 10/06/2019 10:21:39 a.m.

10/6/2019

Correo: Javier de Jesús García Pareja - Outlook

Banco: **BANCOLOMBIA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Número de Confirmación/CUS: **455826412**

Javier de Jesús García Pareja

Ingeniero Civil

NIT. 10.280.643-2 - RÉGIMEN COMÚN

Calle 64A Nº 21-50 Oficina 1507 Edificio Portal del Cable
 Telefax: 886 1419 - Cel: 310 455 8948 - Manizales
 e-mail: javiergarciapareja@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
15	8	2019

Nº **452**

Señor(es):	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
Dirección:	CARRERA 23 No. 75 -82 BARRIO MILAN		
Teléfono:	8867080	Nit.	890.803.239-9

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA DE OBRA Nº 01 Y FINAL AL CONTRATO DE OBRA No. 0100 CUYO OBJETO ES: "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA, CONSTRUCCION DE REJAS DE IMBORNALES VARIAS DIMENSIONES, INSTALACION ANCLAJES XE REJAS METALICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE IMBORNALES EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
COSTO SUMNIISTROS	7.310.000.00
COSTO DIRECTO	113.752.983.00
ADMINISTRACION 25%	28.438.246.00
IMPREVISTOS 2%	2.275.060.00
UTILIDAD 5%	5.687.649.00
SUBTOTAL \$	157.463.938.00
I.V.A. \$	2.469.553.00
TOTAL \$	159.933.491.00

Autorización de numeración para facturas de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT. 10.280.643-2 FECHA: ABRIL 15 DE 2019
 Resolución DIAN N° 718762014028767
 Rango de numeración para facturación: Rangos desde 448 hasta 1000.
 Vigencia: 24 meses

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Recibí, _____ Nombre: _____ Nit.: _____ Fecha de recibido: _____	_____ Firma
--	----------------

DOCUMENTO CREADO EN AUTORIZACIÓN DE CONFERENCIA PARA FACTURACIÓN AUTOMÁTICA
 EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT. 10.280.643-2 FECHA: ABRIL 15 DE 2019

CONTRATO 0100

INFORME DE GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0100 -2019

**CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**

OBJETO:

OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACION, ANCLAJES DE REJAS METALICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACION EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATISTA: INGENIERO JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 197.191.207,00 IVA INCLUIDO

PLAZO: 90 DIAS

INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

OBJETO: OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACION, ANCLAJES DE REJAS METALICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACION EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATISTA: INGENIERO JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 197.191.207,00 IVA INCLUIDO

PLAZO: 90 DIAS

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS DEL CONTRATISTA

Para el presente contrato y en todo el tiempo de ejecución se utilizó mano de obra no calificada de la región donde se encuentra ubicado el proyecto, empleando a más de 15 personas del municipio de la Dorada – Caldas.

Los horarios laborales para la ejecución de la obra fueron extendidos de acuerdo a las situaciones presentadas y al orden público.

RECURSOS			
Mano de obra			
Personal Operativo	Nº Trab	Personal Administrativo	Nº Emplead
Maestro de Obra	1	Ingeniero residente	1
Oficial	1	Ingeniero Auxiliar	0
Ayudante	15	Prof. SISO	1
Topógrafo	1	Prof. Trabajo Social	1
Equipos			
Equipos	Actividad en sitio		Cantidad
Volquetas	Disposición de escombros y suministro de materiales para los concretos		2
Mezcladora de 2 sacos	Elaboración de Concretos		1
Mezcladora de 1 saco	Elaboración de Concretos		1
Mezcladora de 1/2 saco	Elaboración de Concretos		1
Vibrador Eléctrico	Vibrado de concretos reforzados		3
Compactador tipo canguro	Compactar llenos con material de sitio		1
Compactador tipo rana	Compactar sub-bases de cantera		3
Cortadora de concretos	Cortes de pavimentos		1
Camioneta	Transportes de materiales		1
Taladros	Varios tipos de perforaciones		5
Pulidoras	Corte de aceros, y pavimentos		5

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Este contrato tiene como finalidad solucionar el problema con la red de alcantarillado de "CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA". Incluyendo las conexiones domiciliarias de cada vivienda, la adecuación de pozos y construcción de imbornales. Durante la ejecución de este contrato también hace énfasis en la restitución y/o reparación de rejas de imbornales localizados en todo el perímetro urbano del municipio de La Dorada.

El presente contrato tiene como objeto realizar OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACION, ANCLAJES DE REJAS METALICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACION EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA.

En el contrato de obra se van a ejecutar diferentes actividades de construcción excavaciones en zanja de 0 a 2 m, entibados necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra por el tipo de suelo arenoso encontrado en la zona, instalación de la tubería de alcantarillado con sus respectivas conexiones, acometidas o cajas, conexiones domiciliarias, conexión de imbornales, y reconstrucción de la carpeta de rodadura.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

POR PARTE DEL GRUPO DEL CONTRATISTA

Previamente al inicio de actividades en el sector se iniciaron las reuniones de socialización con la comunidad, dándoles a conocer que obra se realizaría; también se realizó la solicitud del permiso para la construcción e intervención de la vía pública al municipio y a la coordinación de movilidad.

Al tener socializado y con los permisos pertinentes se dio inicio a la obra con el respectivo cerramiento instalando las guadas y yute verde, dejando aislada la obra de las viviendas y andenes del sector. Al igual se instalaron señales preventivas al inicio y final de la obra con cerramiento.




Luego se continuó con el corte del pavimento, referenciando que en el trayecto de los pozos 14 al 214A y del 214A al 214, se acordó un ancho de 1m, debido a que el terreno es bastante arenoso y se debía entibar.



INSTALACION TUBERIA 14"



INSTALACION SILLETAS.

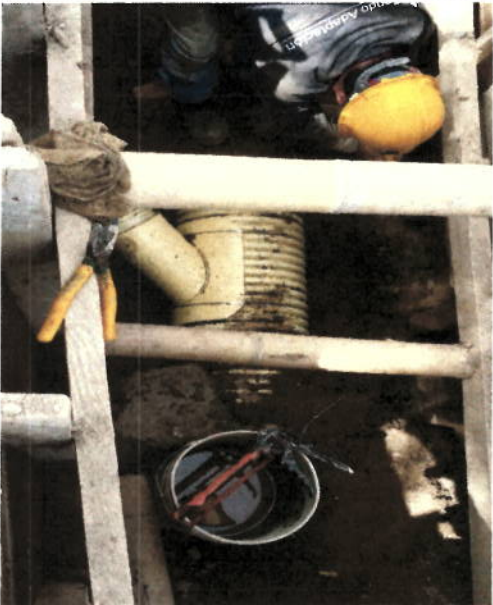

CONSTRUCCION DOMICILIARIAS.



CONSTRUCCION SUMIDEROS.



ENSAYOS DE LABORATORIO.
























RESTITUCION DE PAVIMENTO.



























LISTADO IMBORNALES Y TAPAS PARA CAMBIO

N°	DIRECCION	MEDIDAS O DIMENSIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES	REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES
1	Calle 19 Con Cra 3	0,72 x 0,72		
2	Calle 22 Con Cra 5	0,80 x 0,80		
3	Calle 20 # 5 -01	0,82 x 0,70		
4	Carrera 6A Con Calle 23 Caño Lavapatatas	0,90 x 0,90		IMBORNAL NUEVO
5	CARRERA 10 Con Calle 23	3,18 x 0,57		













6	Carrera 10 Con Calle 20 y 21	0,98 x 0,80		
7	Calle 14 Con Carrera 8	Cambio de Tapa De Trampa de Olores		
8	Cll 54 # 1A-03	0,86 x 0,67		
9	Cll 54A # 1B - 115	0,60 x 0,55		
10	Cll 52 # 1 - 38	1,54 x 0,48		
11	Cll 52 # 1A - 69	0,50 x 0,30		

12	CII 49 # 1-04	0,71 x 0,71		
13	CII 48A # 1-04	0,70 x 0,70		
14	CII 48A # 1-12	0,71 x 0,70		
15	CII 46 # 1-177	1,53 x 0,67		
16	CII 43A Con Cra 1 Cancha de Futbol	0,65 x 0,65		
17	Cra 2 # 47 - 05	0,90 x 0,60		

18	Cra 6 # 47 - 18	1,20 x 0,30		
19	Cll 47 # 6 - 03	1,20 x 0,30		
20	Cra 5B con Cll 45B	0,90 x 0,65 Tapa de Concreto		
21	Cll 47 Con Cr 7	0,62 x 0,50		
22	Cll 47 Con Cra 7A	0,72 x 0,56		
23	Cll 46 # 3 - 46	0,77 x 0,80 TAPA DE CONCRETO		

24	CRA 2C # 27 - 53	0,75 x 0,80 TAPA DE CONCRETO		
25	CLL 30 # 2 - 44	0,62 x 0,43		
26	CLL 10 # 2 - 32	0,84 x 0,45 TAPA TRAMPA DE OLOR		
27	CLL 21 CON CRA 1 PLAZA	0,53 x 0,77		
28	CLL 10 CON CRA 10	0,78 x 0,57		
29	CLL 12 COLEGIO NUEVO MUNDO	0,67 x 0,33		

30	CLL 10B CON CRA 14	IMBORNAL NUEVO		IMBORNAL NUEVO
31	CLL 10B CON CRA 15	IMBORNAL NUEVO		IMBORNAL NUEVO
32	CLL 9 CON CRA 4	1,16 x 0,38		
33	CLL 9 # 7 - 19	0,60 x 0,60		
34	PARQUE CONCORDIA FRENTE CASA COMUNAL	0,70 X 0,50		
35	CRA 9 CON CALLE 2	0,74 x 0,84 TAPA DE CONCRETO Y REJA		

36	CALLE 8 FRENTE CANCHA Y CLINICA ARMONY	0,70 x 0,70		
37	CARRERA 4 CON CALLE 4			
38	CALLE 47 # 8A - 48			
39	CALLE 42 CON CRA 5C			
40	CALLE 46 # 2B - 39			
41	CALLE 56 MZ J CS 11			

NOMINA ING. JAVIER DE J. GARCIA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

CONTRATO No. 100 OBRA 2: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE B CARRERAS 6 A B BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACIÓN, ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACION EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

NOMINA DE MARZO 01 AL 15 DE 2019

No	NOMBRE	CEDULA	SALARIO BASICO	VALOR QUINC.	INCA AUXILIO		TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
					TRANSP.	0						
1	GIL OCAMPO	16,546,568	828,116	15	414,058		462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Silberto G
2	MISAEL MOSQUERA ALVAREZ	1,054,560,386	828,116	10	276,039		308,383	11,042	11,042	22,084	286,299	MISAEL MOSQUERA
3	MARCOS TOVAR	10,169,738	828,116	10	276,039		308,383	11,042	11,042	22,084	286,299	MARCOS TOVAR
4	ALCIDES MANUEL BLANCO FLOREZ	77,143,400	828,116	10	276,039		308,383	11,042	11,042	22,084	286,299	ALCIDES MANUEL BLANCO FLOREZ
5	JOSE MIGUEL LEON MORALES	10,163,741	828,116	1	27,604		30,838	1,104	1,104	2,208	28,630	Miguel Leon
6	JOSE LEANDRO MOLINA URIBE	98,502,702	828,116	4	110,415		123,353	4,417	4,417	8,834	114,519	Jose Molina
7	WILLMAR URIEL VEGA OLIVOS	1,105,781,783	828,116	1	27,604		30,838	1,104	1,104	2,208	28,630	Willmar Uriel
8	JORGE ENRIQUE ORTIZ	10,171,451	828,116	1	27,604		30,838	1,104	1,104	2,208	28,630	Jorge Ortiz
9	JULIO CESAR TELLO QUINTERO	10,180,478	828,116	3	82,812		92,515	3,312	3,312	6,624	85,891	JULIO CESAR TELLO QUINTERO
10	LUIS ALBERTO SALDANA RODRIGUEZ	10,175,366	828,116	3	82,812		92,515	3,312	3,312	6,624	85,891	Luis Alberto Saldana
11	JORGE LOPEZ	10,171,289	828,116	1	27,604		30,838	1,104	1,104	2,208	28,630	Jorge Lopez
TOTALES				59	1,628,630	0	1,819,460	65,145	65,145	130,290	1,689,168	

TOTAL 1,689,168

NOMINA ING. JAVIER DE J. GARCIA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

NOMINA DE MARZO 16 AL 30 DE 2019

CONTRATO No. 100 OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACIÓN, ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

NO	NOMBRE	CEDULA	SALARIO		VALOR QUINC.	INCA	AUXILIO		TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
			BASICO	TOTAL			TRANSP.	DEDUC.						
1	GILBERTO GIL OCAMPO	16,546,568	828,116	15	414,058		48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	<i>Gilberto Gil</i>	
2	MARCOS TOVAR	10,169,738	828,116	15	414,058		48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	<i>Marcos Tovar</i>	
3	ALCIDES MANUEL BLANCO FLOREZ	77,143,400	828,116	15	414,058		48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	<i>Alcides Manuel Blanco</i>	
4	JOSE LEANDRO MOLINA URIBE	98,502,702	828,116	15	414,058		48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	<i>Jose Molina</i>	
5	JULIO CESAR TELLO QUINTERO	10,180,478	828,116	14	366,454		45,282	431,736	15,458	15,458	30,916	400,820	<i>Julio Cesar Tello</i>	
6	LUIS ALBERTO SALDAÑA RODRIGUEZ	10,175,366	828,116	15	414,058		48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	<i>Luis Alberto Saldaña</i>	
7	NILSON ARMANDO ALCALA	10,175,758	828,116	13	358,850		42,047	400,897	14,354	14,354	28,708	372,189	<i>Alcala</i>	
8	RODRIGO AMAYA SILVA	10,168,969	828,116	12	331,246		38,813	370,059	13,250	13,250	26,500	343,559	<i>Rodrigo Amaya</i>	
9	BRYAN CONTRERAS POSADA	1,005,776,797	828,116	9	248,435		29,110	277,545	9,937	9,937	19,874	257,671	<i>Bryan Contreras</i>	
10	JOSE BARNIELOPEZ GARAVITO	1,059,303,572	828,116	9	248,435		29,110	277,545	9,937	9,937	19,874	257,671	<i>Jose Barneilopez</i>	
11	CARLOS CAMILO MARROQUIN RAMIREZ	10,188,471	828,116	9	248,435		29,110	277,545	9,937	9,937	19,874	257,671	<i>Carlos Camilo Marroquin</i>	
12	JUAN DARIO MARROQUIN RAMIREZ	1,007,449,782	828,116	9	248,435		29,110	277,545	9,937	9,937	19,874	257,671	<i>Juan Dario Marroquin</i>	
			TOTALES	150	4,140,580	0	485,160	4,825,740	165,620	165,620	331,240	4,294,502		

TOTAL **4,294,502**

NOMINA ING. JAVIER DE J. GARCIA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

NOMINA DE ABRIL 01 AL 15 DE 2019

CONTRATO No. 100 OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A B. BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACIÓN, ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

No	NOMBRE	CEDULA	SALARIO BASICO	VALOR QUINC.	INCA	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME								
													TOTAL	TOTAL	TOTAL					
1	GILBERTO GIL OCAMPO	16,546,568	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Silberto Gil								
2	MARCOS TOVAR	10,169,738	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Marcos Tovar								
3	ALCIDES MANUEL BLANCO FLOREZ	77,143,400	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Alcides Manuel Blanco Florez								
4	JOSE LEANDRO MOLINA URIBE	98,502,702	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Jose Molina								
5	LUIS ALBERTO SALDAÑA RODRIGUEZ	10,175,366	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Luis A. Saldana								
6	NILSON ARMANDO ALCALA	10,175,758	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Alcala								
7	JOSE BARNEI LOPEZ GARAVITO	1,059,303,572	828,116	12	331,246	38,813	370,059	13,250	13,250	26,500	343,559	Jose Barnei Lopez								
8	CARLOS CAMILO MARROQUIN RAMIREZ	10,188,471	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Carlos Camilo Marroquin								
9	JUAN DARIO MARROQUIN RAMIREZ	1,007,449,782	828,116	12	331,246	38,813	370,059	13,250	13,250	26,500	343,559	Juan Dario Marroquin								
10	MILTON FRANCISCO ROMERO ATEHORTUA	10,179,692	828,116	12	331,246	38,813	370,059	13,250	13,250	26,500	343,559	Milton Romero								
11	UBER HERNANDO TABORDA ROJAS	98,681,958	828,116	14	386,454	45,282	431,736	15,458	15,458	30,916	400,820	Uber Taborda								
TOTALES											155	4,278,698	0	0	501,332	4,779,930	171,142	171,142	342,284	4,437,647

TOTAL 4,437,647

NOMINA INC. JAVIER DE J. GARCIA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

NOMINA DE ABRIL 16 AL 30 DE 2019

CONTRATO No. 100 OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE B CARRERAS 6 A. B BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACIÓN, ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACIÓN DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

No	NOMBRE	CEDULA	SALARIO BASICO	VALOR QUINC.	INCA	AUXILIO		TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TRANSP.	TRANS.						
1	GILBERTO GIL OCAMPO	16,546,568	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Gilberto Gil
2	MARCOS TOVAR	10,169,738	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Marcos Tovar
3	ALCIDES MANUEL BLANCO FLOREZ	77,143,400	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Alcides Manuel Blanco Florez
4	JOSE LEANDRO MOLINA URIBE	98,502,702	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Jose Molina
5	LUIS ALBERTO SALDANA RODRIGUEZ	10,175,366	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Luis A. Saldana
6	NILSON ARMANDO ALCALA	10,175,758	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Alcala
7	CARLOS CAMILO MARROQUIN RAMIREZ	10,188,471	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Carlos Camilo Marroquin
8	UBER HERNANDO TABORDA ROJAS	98,681,958	828,116	414,058		48,516	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Uber Taborda
TOTALES				120	3,312,464	0	388,128	3,700,592	132,496	132,496	264,992	3,435,600	

TOTAL 3,435,600

NOMINA ING. JAVIER DE J. GARCIA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

NOMINA DE MAYO 01 AL 15 DE 2019

CONTRATO No. 100 OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 2: CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRA 3: INSTALACION, ANCLAJES DE REJAS METALICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACION DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACION EN EL PERIMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

No	NOMBRE	CEDULA	SALARIO BASICO	VALOR QUINC.	INCA	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME						
													QUINC.	TRANSP.	DEVENG	DEDUC.	A PAGAR	
1	GILBERTO GIL OCAMPO	16,546,568	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Gilberto Gil						
2	MARCOS TOVAR	10,168,738	828,116	3	82,812	9,703	92,515	3,312	3,312	6,624	85,891	Alcides Manuel Blanco						
3	ALCIDES MANUEL BLANCO FLOREZ	77,143,400	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Alcides Manuel Blanco						
4	JOSÉ LEANDRO MOLINA URIBE	98,502,702	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Jose Molina						
5	LUIS ALBERTO SALDANA RODRIGUEZ	10,175,366	828,116	3	82,812	9,703	92,515	3,312	3,312	6,624	85,891	Luis Alberto S.						
6	NILSON ARMANDO ALCALA	10,175,758	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Alcala						
7	CARLOS CAMILO MARROQUIN RAMIREZ	10,188,471	828,116	3	82,812	9,703	92,515	3,312	3,312	6,624	85,891	Uber Taborda						
8	UBER HERNANDO TABORDA ROJAS	98,681,958	828,116	15	414,058	48,516	462,574	16,562	16,562	33,124	429,450	Uber Taborda						
TOTALES											84	2,318,726	0	271,690	2,590,416	92,746	165,492	2,404,923

TOTAL 2,404,923



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	14/08/2019	Acta parcial		Acta final	x
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0100/2019
Objeto:	Obra 1: reposición y optimización de alcantarillado en la calle 8 carreras 6 a8 barrio la magdalena en el municipio de la dorada. Obra 2: construcción suministro de rejas de imbornales varias dimensiones para localizarse en el perímetro urbano en el municipio de la dorada. Obra 3: instalación anclajes de rejas metálicas en imbornales y restauración de rejas existentes en general, localización en el perímetro urbano en el municipio de la dorada.
Nombre Contratista:	Javier de Jesús García Pareja
Fecha del contrato:	Febrero 13 de 2019
Plazo de ejecución:	90 días calendario
Valor inicial:	197.191.207
Fecha de iniciación:	6 de Marzo de 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	3 de Junio de 2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
La Dorada	Alcantarillado	150 mts

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	90 días
Tiempo total transcurrido:	90 días
Avance Porcentual:	100 %

NOTA: la obras se ejecuta en los 90 días calendario del contrato se pasan planillas únicamente hasta el 15 de mayo por que el contratista no tubo personal en los últimos 15 días debido a que se le estaba dando fraguado a las obras realizadas ✓

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

Se incluye informe

1.5. Problemáticas con la obra

La obra se desarrolla normalmente su ejecución se realiza en el tiempo dado

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	197.191.207
Inversión ejecutada en el periodo:	159.933.491
Porcentaje ejecutado en el periodo:	81 %
Inversión total ejecutada:	159.933.491
Porcentaje total ejecutado:	81 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	Confianza	16SP000853	06-03-2019	03-09-2019	59.157.362.10
Pago de salarios prestaciones sociales	Confianza	16SP000853	06-03-2019	03-06-2019	39.438.241.40
Calidad de suministros	Confianza	16SP000853	06-03-2019	03-06-2022	59.157.362.10
Estabilidad y calidad de la obra	Confianza	16SP000853	09-06-2019	03-06-2024	39.438.221.40
Responsabilidad civil extracontractual	Confianza	16RE002925	06-03-2019	03-09-2019	59.157.362.10



F-GC-20
Versión 3:
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Gilberto Gil Ocampo	X	X	X		X
Misael Mosquera Álvarez	X	X	X		X
Marcos Tovar	X	X	X		X
Alcides Manuel Blanco Flórez	X	X	X		X
José Miguel León Morales	X	X	X		X
José Leandro Molina Uribe	X	X	X		X
Wilmar Uriel Vega Olmos	X	X	X		X
Jorge Enrique Ortiz	X	X	X		X
Julio Cesar Tello Quintero	X	X	X		X
Luis Alberto Saldaña Rodríguez	X	X	X		X
Jorge López	X	X	X		X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
Se anexa

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
18/03/2019	A	N/U	A	A	N/U	N/U	A	A	
15/04/2019	A	N/U	A	A	N/U	N/U	A	A	
20/05/2019	A	N/U	A	A	N/U	N/U	A	A	

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexan cantidades de obra para el pago.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS:

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

En este proyecto se beneficia la población de la dorada en el barrio magdalena



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría	x	
Acta de convenio de precios	x	
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL
CC
OBJETO

0100 DE FEBRERO 13 DE 2019

SOLICITUD ÚNICA OFERTA
EMPOCALDAS S.A E.S.P
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
4.384.840 DE BELALCÁZAR

OBRA 1. REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. **OBRA 2.** CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES, VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

OBRA 3. INSTALACIÓN, ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACIÓN DE REJAS EXISTENTES EN GENERA, LOCALIZACIÓN EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATISTA
CC.
MUNICIPIO


JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
10.280.643
LA DORADA

COSTO DIRECTO	\$	148.617.817
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$	36.444.454
IMPREVISTOS 2 %	\$	2.915.556
UTILIDAD 5 %	\$	7.288.891
I.V.A. SOBRE UTILIDADES 19 %	\$	1.384.889
I.V.A. SUMINISTROS 19 %	\$	539.600
VALOR TOTAL OBRA	\$	197.191.207 INCLUIDO A.I.U. E IVA.
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	159.933.491
SALDO NO EJECUTADO	\$	37.257.716

RECURSOS
SUPERVISIÓN
PLAZO
CDP
RP

PROPIOS
INGENIERO ZONA
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
00247 DE ENERO 22 DE 2019
000311 DE FEBRERO 18 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los tres (03) días del mes de junio de 2019, se reunieron los señores **ARLEX QUINTERO VASQUEZ**, Ingeniero Supervisor y el señor **JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA**, Como Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 0100 DE 2019.


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA.
Contratista.

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONT #	0100 DE 2019	CONTRATISTA	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA					
OBJETO:								
OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A 8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.								
OBRA 2: CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.								
OBRA 3: INSTALACIÓN ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACIÓN DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.								
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		ACTA 1 YN FINAL		% EJECUT		
1	PRELIMINARES	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1,1	Localización y replanteo de redes (incluye levantamiento del sector y plano record)	m	150	5.700	855.000	150	855.000	100%
1,2	Cerramiento con polsombra yute verde H=2 m paralelos en guada y cinta plastica	m	315,8	9.300	2.936.940	315,8	2.936.940	100%
1,3	señalización vertical preventivas (desvío, hombres trabajando, via cerrada, barreras etc.)	UN	4	183.000	732.000	4	732.000	100%
1,4	Valla afusiva a la obra de 4 x 2	UN	1	530.000	530.000	1	530.000	100%
2	DEMOLICIONES VARIAS							
2,1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	43,9	106.000	4.653.400	34,5	3.657.000	79%
2,2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1	86.200	86.200	1	86.200	100%
2,3	Demoliciones de andenes y sardinel en concreto hidraulico	m3	6,87	81.000	556.470	-	-	0%
3	SOBREACARREOS							
3,1	Retiro de sobrantes en vehiculo automotor	m3	247,46	27.600	6.829.896	235,32	6.494.832	95%
4	EXCAVACIONES							
4,1	Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts	m3	358,01	22.700	8.126.827	283,34	6.431.818	79%
4,2	Excavaciones en material conglomerado	m3	65,85	27.000	1.777.950	39,89	1.077.138	61%
4,3	Entibado horizontal/ vertical tipo 2	m2	220	27.600	6.072.000	220	6.072.000	100%
5	RELLENOS COMPACTADOS							
5,1	Relleno compactado con material seleccionado de excavacion	m3	336,26	18.640	6.267.886	210,25	3.919.060	63%
5,2	Relleno compactado con material comun de cantera prestamo	m3	65,75	80.000	5.260.000	-	-	0%
6	SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTOS							
6,1	Suministro e instalacion de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	6,28	75.000	471.000	-	-	0%

6,2	Suministro e instalacion de sub base tipo INVIAS, E =0,20 incluye ensayos de densidad, proctor	m3	43,9	143.000	6.277.700	54,64	7.813.520	124%
6,3	Suministro e instalacion, sustitucion en arena para tubería y atraques	m3	79,76	75.800	6.045.808	27,004	2.046.903	34%
7	ALCANTARILLADOS							
7,1	instalacion de tubería corrugada PVC - 5 de 160 mm (6") incluye manejo de aguas en zanja	ml	141	11.000	1.551.000	92,8	1.020.800	66%
7,2	instalacion de tubería corrugada PVC - 5 de 335 mm (10") incluye manejo de aguas en zanja	ml	24,00	18.000	432.000	6,45	116.100	27%
7,3	instalacion de tubería corrugada PVC - 5 de 250 mm (14") incluye manejo de aguas en zanja	ml	149,9	21.000	3.147.900	149,9	3.147.900	100%
7,4	Empalmes a cámara d = 1,20 m concreto de 3000 PSI	un	4	78.000	312.000	10	780.000	250%
7,5	Empalmes a caja de inspeccion concreto 3000 PSI	un	10	52.000	520.000	14	728.000	140%
7,6	base/cañuela cámara D =1,20 m en concreto 3000 PSI	un	3	455.000	1.365.000	4	1.820.000	133%
7,7	Suministro e instalacion tapa D = 0,60 m en HF	un	2	432.000	864.000	1	432.000	50%
7,8	Cajas de inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80. incluye tapa reforzada	un	30	315.000	9.450.000	14	4.410.000	47%
7,9	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa tapa en HF acero de 1" separacion hierro 5 cm a ejes platina central de refuerzo según diseño establecido	un	4	1.410.000	5.640.000	3	4.230.000	75%
7,10	Losa en concreto reforzado de 1,60 x 1,60 x 0,18 m acero de refuerzo doble parrilla No 4 cada 15 cm incluye antisol y acelerante	un	2	586.000	1.172.000	2	1.172.000	100%
7,11	Instalacion de siyas yee de 14 x 6"	un	30	50.000	1.500.000	21	1.050.000	70%
8	OBRAS EN CONCRETO							
8,1	Corte mecanizado profundidad 0,07 m	ml	639,4	10.550	6.745.670	639,40	6.745.670	100%
8,2	pavimento en rigido de 4000 PSI de espesor 0,18 en obra incluye acelerante, antisol, ensayos de laboratorios	m3	39,51	838.000	33.109.380	19,48	16.327.760	49%
8,3	Adecuacion de andenes y rampas E = 0,08 m en concreto de 3000 PSI	m3	5,43	573.000	3.111.390	-	-	0%
8,4	Pavimento en rigido de 3000 PSI de E = 0,18 en obra incluye acelerante, antisol, ensayos de laboratorio	m3	6,28	688.000	4.320.640	-	-	0%
9	TRABAJO DE SOCIALIZACION							
9,1	Trabajadora social todo el proceso domiciliarias y socializacion de la obra contratada	Gbl	1,25	1.350.000	1.687.500	1,25	1.687.500	100%
	ITEM NUEVO							
	Mezcla densa en caliente incluye transporte	m3		945.200		16,00	15.123.200	

COSTO DIRECTO					132.407.557	101.443.341
ADMINISTRACION	%	25			33.101.889	25.360.835
IMPREVISTOS	%	2			2.648.151	2.028.867
UTILIDADES	%	5			6.620.378	5.072.167
IVA SOBRE UTILIDADES	%	19			1.257.872	963.712
COSTO TOTAL OBRA					176.035.847	134.868.922

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		176.035.847
VALOR ADICION		-
VALOR ACTA 1	134.868.922	
VALOR ACTAS	134.868.922	
SALDO NO EJECUTADO	41.166.925	
SUMAS IGUALES	176.035.847	176.035.847

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
SUPERVISOR
EMP/CALDAS S.A. E.S.P

JGH:
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
CONTRATISTA

CONT #		0100 DE 2019	EMPOCALDAS S.A.E.S.P		CONTRATISTA		JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	
OBJETO:		OBRAS 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 AS BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRAS 2: CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRAS 3: INSTALACIÓN ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACIÓN DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.						
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 Y FINAL			% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	REJAS PARA IMBORNALES							
1,1	Acero de 1" corrugada cada 5 cms entre varillas, refuerzo central en varilla N° 5 debidamente soldada; Angulo de 1/4" x 1 1/2", Anclajes en angulo de 1/8 x 1" colocadas en los 4 extremos soldados de 18 cms abierto en un extremo, con anticorrosivo, dimension de 0,63 x 0,33 - 0,59 x 0,38 - refuerzo a manera de riostra en el centro en platina 3/16 con visagras en angulo	und	3	176.000	528.000	5	880.000	167%
1,2	Acero de 1" corrugada cada 5 cms entre varillas, refuerzo central en varilla N° 5 debidamente soldada; Angulo de 1/4" x 1 1/2", Anclajes en angulo de 1/8 x 1" colocadas en los 4 extremos soldados de 18 cms abierto en un extremo, con anticorrosivo, dimension de 0,75 x 0,51 - 0,75 x 0,50 - refuerzo a manera de riostra en el centro en platina 3/16 con visagras en angulo	Und	2	205.000	410.000	7	1.435.000	350%
1,3	Acero de 1" corrugada cada 5 cms entre varillas, refuerzo central en varilla N° 5 debidamente soldada; Angulo de 1/4" x 1 1/2", Anclajes en angulo de 1/8 x 1" colocadas en los 4 extremos soldados de 18 cms abierto en un extremo, con anticorrosivo, dimension de 0,87 x 0,65 - 0,71 x 0,70 - 0,70 x 0,70 - refuerzo a manera de riostra en el centro en platina 3/16 con visagras en angulo	Und	4	232.000	928.000	9	2.088.000	225%
1,4	Acero de 1" corrugada cada 5 cms entre varillas, refuerzo central en varilla N° 5 debidamente soldada; Angulo de 1/4" x 1 1/2", Anclajes en angulo de 1/8 x 1" colocadas en los 4 extremos soldados de 18 cms abierto en un extremo, con anticorrosivo, dimension de 1,53 x 0,67 - refuerzo a manera de riostra en el centro en platina 3/16	Und	2	246.000	492.000	3	738.000	150%

1,5	Acero de 1" corrugada cada 5 cms entre varillas, refuerzo central en varilla N° 5 debidamente soldada; Angulo de 1/4" x 1 1/2", Anclajes en angulo de 1/8 x 1" colocadas en los 4 extremos soldados de .18 cms abierto en un extremo, con anticorrosivo, dimension de 1,20 x 0,30 - refuerzo a manera de riostra en el centro en platina 3/16.	Und	2	\$	241.000	\$	482.000	9	2.169.000	450%
	COSTO DIRECTO						2.840.000		7.310.000	
	IVA SOBRE UTILIDADES		19				539.600		1.388.900	
	COSTO TOTAL OBRA						3.379.600		8.698.900	

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	3.379.600
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	8.698.900
VALOR ACTAS	8.698.900
SALDO NO EJECUTADO	
SUMAS IGUALES	8.698.900

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX GARCÍA PAREJA
 SUPERVISOR
 EMPÓCALDAS S.A. E.S.P.

JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
 CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

CONT #		0100 DE 2019		CONTRATISTA		JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA		
OBJETO:		OBRAS 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8, CARRERAS 6 AB BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRAS 2: CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO DE REJAS DE IMBÓRÑALES VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. OBRAS 3: INSTALACIÓN ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNIALES Y RESTAURACIÓN DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL			ACTA 1 Y FINAL			
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	PRELIMINARES							
1.1	Señalización con yute o polisombra verde cinta plastica y bombones, fijados al suelo. Deben ser permanentes antes y despues de fraguados. Tres cintas plasticas horizontales, en todas las intervenciones	Und	70,00	\$ 9.300	\$ 651.000	70	\$ 651.000	100%
1.2	Señalización Vertical Preventivas, localizada en cada sitio a intervenir, rotarse cada frente de a dos por frente, deben ser permanentes (desvíos izquierda, derecha, hombres trabajando)	Und	12,00	\$ 170.000	\$ 2.040.000	0	\$ -	0%
1.3	DEMOLICIONES VARIAS							
2.1	Demoliciones de concreto en el perímetro del sumidero para adecuar la instalación de la reja nueva, altura a demoler 0.20m. incluye acelerante.	M3	2,00	\$ 98.500	\$ 197.000	5,37	\$ 529.240,5	269%
2.2	Instalación de rejas de diferentes dimensiones en concreto de 3000 psi en el perímetro del sumidero existente para las instalaciones de las rejas nuevas, altura a demoler 0.20m, incluye acelerante	M3	13,00	\$ 125.000	\$ 1.625.000	33	\$ 4.125.000	254%
2.3	Otras Demoliciones (andenes, mampostería, muros, etc).	M3	1,00	\$ 80.000	\$ 80.000	0	\$ -	0%
3.0	SOBREACARREOS							
3.1	Retiro de Escombros y sobrantes y Llevarlos a la escombrera debidamente autorizada por las autoridades ambientales	M3	7,00	\$ 25.000	\$ 175.000	5,37	\$ 134.325,0	77%
3.2	Movilización de materiales, rejas, etc a diferentes sectores para la ejecución de obras e instalación de rejas, incluye transporte en vehículo automotor de rejas materiales etc. Con punto de acopio en la planta de agua potable en la melisa	Glb	1,00	\$ 2.568.000	\$ 2.568.000	1,00	\$ 2.568.000	100%
4	EXCAVACIONES							
4.1	Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts	M3	5,65	\$ 17.400	\$ 98.310	0	\$ -	0%
5	ILLENOS COMPACTOS							
5.1	Illeos con material de préstamo cantera debidamente compactado	M3	1,00	\$ 53.000	\$ 53.000	0	\$ -	0%

ACTA 01 CONVENIO DE PRECIOS

CONTRATO N°:

0100 DE 2019 ✓

OBJETO:

OBRAS 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERAS 6 A8 BARRIO LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

OBRA 2: CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO DE REJAS DE IMBORNALES VARIAS DIMENSIONES PARA LOCALIZARSE EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

OBRA 3: INSTALACIÓN ANCLAJES DE REJAS METÁLICAS EN IMBORNALES Y RESTAURACIÓN DE REJAS EXISTENTES EN GENERAL, LOCALIZACIÓN EN EL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATISTA:

JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

NIT:

10,280,643

REPRESENTANTE LEGAL:

JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

MUNICIPIO:

LA DORADA CALDAS

COSTO CONTRATO:

197,191,207

SUPERVISOR:


ARLEX QUINTERO VASQUEZ


En la ciudad de Manizales a los 07 días del mes de Mayo de 2019, se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.A. E.S.P. **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** como supervisor del contrato y el señor **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA** como contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el contrato original


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP 1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	945.200


Los precios no incluyen A.I.U e IVA sobre utilidades

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron

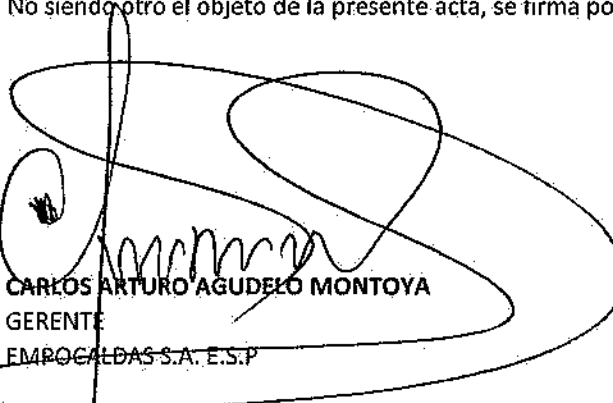
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Contratista


ARLEX QUINTERO
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

ITEM: NP	Mezcla Densa en Caliente MDC-19 (Incluye Transporte)				Unidad: M3
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. %	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MEZCLA ASFALTICA MDC-2 SUELTA	M3	1	0,3	485.800,00	631.540,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1		4.444,00	4.444,00
SUBTOTAL MATERIALES					635.984,00
MANO DE OBRA					
	Jornal	Prestac.	Jornal Tn	Rendim/Hr.	Valor-Unit.
M.O. AYUDANTE (4 ayudantes)	109.448,00	1,85	202.479,00	3,00	67.493,00
M.O. OFICIAL	121.000,00	1,85	223.850,00	3,00	74.617,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					142.110,00
EQUIPO					
VIBROCOMPACTADOR PEQUENO	Hr	4,00		40.000,00	160.000,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		142.110,00	7.106,00
SUBTOTAL EQUIPO					167.106,00
COSTO DIRECTO					945.200,00


JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
 INGENIERO CIVIL
 C.C. No. 10.280.643 DE MANIZALES
 M.P. No. 17202.- 66562 CALDAS
