



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	CONTRATO 122 DEL 2023		
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.	NIT O CC:	900,037,096-1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMINO A MACIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS		
DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.		X	
2- Paz y salvo oficina de trabajo.		X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X	
4- Pago FIC.		X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).		X	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).		X	
7- Original del Acta de Liquidación.		X	
8- Certificado de obra.		X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)		N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Andrés Felipe Giraldo R.

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Andrés G.

FIRMA

Fecha

31 DE MAYO DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACION ESTABILIDAD DE LA OBRA**



CONTRATO 122 DE 2023

OBJETO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMINO A MACIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN SAMANA - CALDAS
 VALOR \$310.039.902
 CONTRATISTA CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
 NIT 900037096-1

PLAZO HASTA EL 31/05/2023

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101055517

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	09-mar-23	06-sep-23	\$ 5.357.594,40
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	09-mar-23	06-jun-26	\$ 3.571.729,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	31-may-23	31-may-28	\$ 3.571.729,60

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 122 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

07/06/2023


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente


LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
 Secretaria General



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-10105517	ANEXO 4			
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS					
05	06	2023	09	03	2023	00:00	06	06	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.037.096-1
DIRECCIÓN: CL 58 A NRO. 24 - 28	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8914477

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8867080

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.122-2023 DE FECHA 27/02/2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMINO A MACIAS EN EL MUNICIPIO DE SAVANA, CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	09/03/2023	06/09/2023	\$93,011,970.60	\$93,011,970.60
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	09/03/2023	06/06/2026	\$62,007,980.40	\$62,007,980.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$62,007,980.40	\$62,007,980.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA EL ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, PROCEDIENDO AJUSTAR LA VIGENCIA CITADA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR UN TERMINO DE 5 AÑOS, QUEDANDO:

ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 31/05/2023 HASTA 31/05/2028

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****217,027,931.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-10105517

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

Datos de la póliza**Estado:**

Vigente

Número de póliza:

42-45-101055517

Número de anexo:

4

Fecha de expedición:

lunes, 5 de junio de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

Tomador:

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.

Inicio de vigencia:

jueves, 9 de marzo de 2023

Fin vigencia:

martes, 6 de junio de 2028

Valor total asegurado:

\$ 217.027.931

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email:
verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)– Email:
verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext
157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163) – Email:
verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email:
verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email:
operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

 Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**



MINISTERIO DEL TRABAJO

No. Radicado: 08SE2023741700100002216
 Fecha: 2023-05-08 01:14:39 pm
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
 Destinatario CONSTRUTOP INGENIERIA SAS
 Anexos: 0 Folios: 1

 08SE2023741700100002216

MINISTERIO DEL TRABAJO
 HACE CONSTAR
 A QUIEN PUEDA INTERESAR:



Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	08 DE MAYO
Nombre y/o Razón Social:	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Identificación:	900.037.096-1

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.

Dado en la ciudad de Manizales, el día 08 de mayo de 2023.


DARIO ESCEHOMO DIAZ
 Director Territorial


DARIO ESCEHOMO DIAZ Director Territorial

Elaboro: Luz M. Coral H.
 Revisó: D. Diaz

Sede Administrativa
 Dirección: Carrera 14 No. 99-33
 Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
 (601) 3779999
 Bogotá

Atención Presencial
 Con cita previa en cada
 Dirección Territorial o
 Inspección Municipal del
 Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
 018000 112518
Celular desde Bogotá: 120
 www.mintrabajo.gov.co



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

MAYO 2023

Los suscritos Representante Legal ALVARO CASTAÑO PINEDA y Contador Público JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA de la compañía CONSTRUTOP INGENIERIA SAS con nit 900037096


CERTIFICAMOS

Que durante el mes de abril de 2023 la compañía realizo el pago de los aportes correspondientes al mes de marzo de 2023 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Por tal motivo a 30 de marzo de 2023, CONSTRUTOP INGENIERIA SAS, se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar.

Para constancia se firma en Manizales a los 23 días del mes de mayo 2023.

ALVARO CASTAÑO PINEDA
Representante Legal



JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA
Contador Público T.P 218610-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16077152 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 218610-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005



Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Jhon Jamer Lizarralde Valencia

CONTADOR PÚBLICO

ASESORIAS CONTABLES, FISCALES Y EMPRESARIALES
CEL 3207200863
jamerlizarralde@gmail.com

TARJETA PROFESIONAL

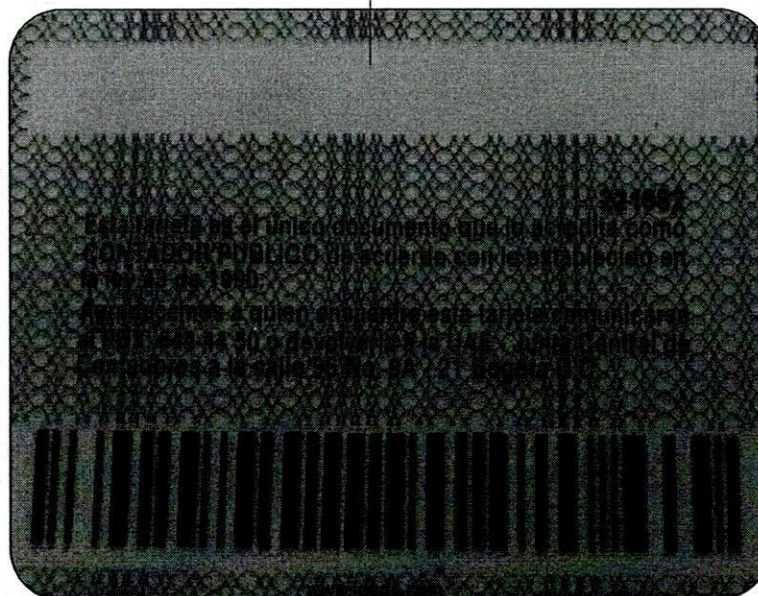

JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA


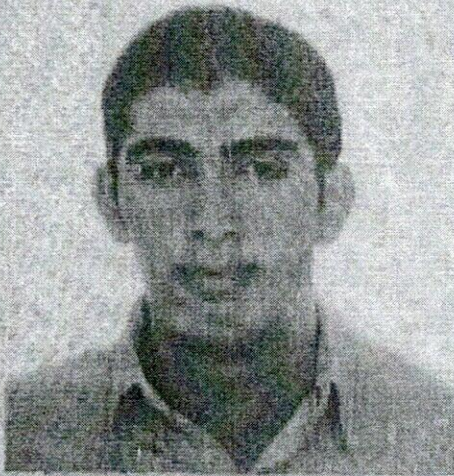
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16077152**

LIZARRALDE VALENCIA
APELLIDOS

JHON JAMER
NOMBRES

Jhon Jamer Lizarralde,
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-AGO-1983**


MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-OCT-2001 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0900100-35098371-M-0016077152-20020110 00982 02009B 02 108168513

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

90178391

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

2094998432

23/05/2023

Número de Identificación

900037096

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

1

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE

Localización

Nacional

Correo electrónico

construtopingenieria@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

122

Nombre Obra

SAMANÁ

Fecha Terminación Obra

21/05/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

5

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,312 7652283

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

122-2023 ✓

Fecha Inicio Obra

09/03/2023 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

900037096

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

13 ✓

Aporte FIC

377000.00

Valor del Pago

377000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	90178391	2094998432	23/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900037096**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.159.54.111**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 377,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 377,000.00	COP\$ 377,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

90177777

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

2094978278

23/05/2023

Número de Identificación

900037096

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE

Localización

Nacional

Correo electrónico

construtopingenieria@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

122

Nombre Obra

SAMANÁ

Fecha Terminación Obra

21/05/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,312 7652283

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

122 ✓

Fecha Inicio Obra

09/03/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

900037096

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

16 ✓

Aporte FIC

464000.00

Valor del Pago

464000.00 ✓

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	90177777	2094978278	23/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900037096**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.159.54.111**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 464,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 464,000.00	COP\$ 464,000.00

NIT
8999990341

Medio de Pago
BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción
87958651

No. Autorización/CUS
2021377646

Fecha y Hora
13/04/2023

Número de Identificación

900037096

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

1

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE

Localización

Nacional

Correo electrónico

construtopingeneria@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

SAMANA

Fecha Terminación Obra

07/06/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,312 7652283

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

122

Fecha Inicio Obra

09/03/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

900037096

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

13

Aporte FIC

377000.00

Valor del Pago

377000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	87958651	2021377646	13/04/2023

Razón Social: **SENA**



Usuario Pagador: **900037096**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.159.54.111**

Su transacción fue **APROBADA** por la **Total Pagado \$ 377,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 377,000.00	COP\$ 377,000.00

 F-GC-16 ✓ Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	900037096	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-06-06
NUMERO DE CONTRATO:	122/2023	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO		
CARGO:	Ingeniero Zona Oriente		
FIRMA:			


ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	No 122 DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMINO A MACIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS ✓
COSTO INICIAL	\$ 204.992.059
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 49.198.094
IMPREVISTOS 1 %	\$ 2.049.921
UTILIDAD 5 %	\$ 10.249.603
I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 1.947.425
VALOR INICIAL	\$ 268.437.101
ADICIÓN 1	\$ 41.602.801
VALOR TOTAL EJECUTADO OBRAS	\$ 301.684.110 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES.
SALDO NO EJECUTADO	\$ 8.355.792
RECURSOS	CONVENIO 248 DE 2022 M/PIO DE SAMANA
SUPERVISIÓN	INGENIERO OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	INGENIERO OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
PLAZO	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
CDP	20230348 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023
RP	RP (0381(27-02-23)

En la ciudad de Manizales a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2023 se reunieron, **OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**, Ingeniero Supervisor y el señor **ALVARO CASTAÑO PINEDA**, Contratista de Obra, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según **CONTRATO No 122 DEL 2023**



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
Ingeniero de Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ALVARO CASTAÑO PINEDA
Contratista

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	No 122 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMINO A MACIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS
COSTO DIRECTO INICIAL	\$ 204.992.059
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 49.198.094
IMPREVISTOS 1 %	\$ 2.049.921
UTILIDAD 5 %	\$ 10.249.603
I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 1.947.425
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 268.437.101 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDAD.
ADICION Nro. 1	\$ 41.602.801 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 301.684.110
SALDO NO EJECUTADO	\$ 8.355.792 ✓
RECURSOS	CONVENIO 248 DE 2022 M/PIO DE SAMANA
SUPERVISIÓN	INGENIERO OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	INGENIERO OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
PLAZO	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
CDP	20230348 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023
RP	RP (0381(27-02-23)

En la ciudad de Manizales a los **13-06-2023-1** reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO como SUPERVISOR Zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el Señor ALVARO CASTAÑO PINEDA., R/te legal de CONSTRUTOP INGENIERIA Contratista con el fin de Efectuar la entrega, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S. P de las obras realizadas en desarrollo del CONTRATO No 122 DEL 22 MARZO DE 2023.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por

circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL ACTO:

VALOR INICIAL		\$ 268.437.101
ADICIÓN No.1		\$ 41.602.801

Valor Total del Contrato		\$ 310.039.902	
Valor Acta 1		\$	\$ 169.927.040
Valor Acta 2 Y FINAL		\$	\$ 131.757.070
Saldo No ejecutado		\$ 8.355.792	
SUMAS IGUALES		\$ 301.684.110	\$ 301.684.110


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.




ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



ALVARO CASTAÑO PINEDA
Contratista.



VoBo OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO.
Ingeniero
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



VoBo JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Planeación y Proyectos (Encargado)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MANIZALES CALDAS EL INGENIERO DE ZONA CERTIFICA	
QUE CONSTRUTOP INGENIERIA SAS Identificado con el NIT 900.037.096-1 ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato 122/2023	

OBJETO:	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMINO A MACIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS		
Con las Sigüientes Condiciones:			
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO 122 DEL 2023		
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S		
C.C	900.037.096-1		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 268.437.101,26		
VALOR ADICIÓN	\$ 41.602.801,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 310.039.902		
VALOR EJECUTADO	\$ 301.684.110		
PLAZO EJECUCIÓN	90 DIAS		
FECHA INICIACIÓN	09 DE MARZO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN FINAL	31/05/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
REINICIO	N/A		
SUPERVISIÓN	OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO		
CANTIDADES EJECUTADAS FINALES. CONTRATO 122 DEL 2023			

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE PLANO RECORD	ml	407	380	2.525.059
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	un	4	4	792.800
1.3	Cerramiento en polsombra yute verde de H=2m, paralex en guadua y cinta plástica	ml	291	401	6.219.840
1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	m2	8	8	1.316.000
1.5	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	m2-mes	3	3	1.203.000
2	EXCAVACIONES				
2.1	EXCAVACION MECANICA EN ZANIA MATERIAL COMUN (RETROEXCAVADORA) 0.0 A 3.0 M.	m3	557	557	14.460.203
2.2	EXCAVACION MECANICA EN ZANIA EN CONGLOMERADO (RETROEXCAVADORA) 0.0 A 3.0 M.	m3	9	9	321.178
3	RETIRO DE MATERIAL SOBRAÑTE DE EXCAVACION				
3.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRAÑTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO A UNA DISTANCIA DE 10 KM	m3	170	220	11.539.557
4	RELLENO				
4.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	m3	515	515	15.317.903
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ml	371	311	2.630.316
4.3	Suministro, Transporte e Instalación Arena Gruesa para el atraque de tuberías	m3	69	69	6.573.887
5	ENTIBADO				
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL (EN MADERA) TIPO 1 (H DE 0,00 A 2,00m)	ml	224	224	7.653.276
6	DEMOLICIONES				
6.1	Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico	m3	0	0	30.400
6.2	Demolición de pavimento en concreto hidráulico	m3	37	18	2.026.570
7	INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO				
7.1	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 160 M.M. (6") PARA ALCANTARILLADO UNIÓN CAUCHO (SEGUN NORMA NTC 3722 Y NTEC 5055)	ml	60	90	1.584.000
7.2	NORMA NTC 3722 Y NTEC 5055, INCLUYE MANEJO DE AGUAS	ml	339	339	10.321.941
7.3	TRANSPORTE E INSTALACION KIT SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO (12") 315X160 MM	un	7	10	545.000
7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA ALCANTARILLADO DOMICILIARIO (0.6X0.6X0.8M) EN CONCRETO 3000 PSI	un	27	18	8.820.000
7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO DE 21 MPA	ml	33	33	21.664.625
7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSP. D=1.20 M EN CONCRETO DE 21 MPA	un	19	20	9.800.000
7.7	Instalación Aro Tapa HF D=0,68m para cámara de inspección	un	17	19	13.556.500
7.8	Empalme a cámara de inspección concreto 3000 psi	un	32	1	117.000
7.9	Empalme a caja de inspección domiciliaria concreto 3000 psi	un	17	-	-
8	AFIRMADO				
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO e=0,25 m	M3	48	100	10.988.325
9	OBRAS EN CONCRETO				
9.1	CORTE DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OTROS CONCRETOS (0.07 M.)	ml	241	346	3.387.174
9.2	SELLAMIENTO DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OTROS CONCRETOS (0.005 M)	ml	241	-	-
9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO MR 42 kg/cm2 (PARA PAVIMENTO)	M3	34	26	29.702.940
9.4	Acero de refuerzo Fy=60.000psi	kg	1.612	1.288	14.103.600
10	VIADUCTO EN CERCHA METALICO				
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	kg	800	364	8.841.560
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA PARA CIMENTACIÓN DE LA CERCHA METÁLICA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Fy=42 Mpa)	M3	3	2	1.886.000
11	TRABAJO SOCIAL PRELIMINAR SISO				
11.1	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	MES	2	2	4.050.000
11.2	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (SISO)	MES	3	3	8.100.000
NO PREVISTOS					
NP 1	EXCAVACION MECANICA EN ZANIA EN ROCA (RETROEXCAVADORA) 0.0 A 3.0 M.	m3	173	220	41.860.120
NP 2	SOBREACARRO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	m3/hm	46	56	5.694.926
NP 3	FILTRO EN PIEDRA INCLUYE TUBO DRENAJE 100mm Y GEOTEXTIL NT 1600	ml	143	143	14.700.411
NP 4	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC 3"	ml	-	-	-
NP 5	RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510	Hr	47	85	15.130.000
NP 6	INSTALACION TUBERIA A LL 500 MM (20") Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	MJE	36	36	3.420.000
NP 7	TRANSPORTE DE TUBERIA DE 20" Tipo Novafort DESDE EL MUNICIPIO DE LA DORADA HASTA EL MUNICIPIO DE SAMANA	VIAJE	2	2	800.000
COSTO TOTAL OBRA					301.684.110
	COSTO DIRECTO				230.381.146
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)	0	-	-	69.114.344
	ADMINISTRACIÓN	0	-	-	55.291.475
	IMPREVISTOS	0	-	-	2.303.812
	LITILIDAD	0	-	-	11.519.057
	IVA Sobre utilidades	0	-	-	2.188.621
	COSTO TOTAL OBRA	0	-	-	301.684.110

TOTAL OBRA	301.684.110
SON: TRESIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE	

Manizales:


 OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
 INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P
