

# CONTRATO Y AÑO	260-2016	Acta Nº	03 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2.040.207.328	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.040.207.328	
NIT O CC:	10,280,643 DE MANIZALES			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	815.242.459	
CDP (#, rubro y fecha)	00232 DEL 17 E ENERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	595.384.808	
RP (#, rubro y fecha)	000219 DEL 17 DE ENERO DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	629.580.061	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVA PATAS), FASE 2					
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO EMPOCALDAS - CORPOCALDAS - LA DORADA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					X	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					X	
9- Diseño de Mezclas.					X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					X	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28						X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51						X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)						X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Sudy González A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

03-08-2017
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta original	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Copia del Registro Presupuestal	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	

Fecha de presentación

02 DE OCTUBRE DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA	R.L. JOHN JAIRO SALAZAR GIRALDO	<i>[Firma]</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07000425080	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0260
Nombre Obra	CONST. INTERCEPTOR LA DORADA
Fecha Inicio Obra	14/02/2017
Fecha Terminación Obra	14/12/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	LA DORADA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$2,040,207,321.00
Costo Total Mano de Obra	\$42,749,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	59
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$1,088,133.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$1,088,133.00
Total Pagado	\$1,088,133.00
Valor del Pago	\$1.088.133,00
IP Origen	190.249.120.124
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60101906
Fecha de Creación	27/09/2017 10:43:28 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	284439978
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

**INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 05
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

CONTRATO DE OBRA N° 0260 -2016

**CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**

INTERVERTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

OBJETO:

**CONSTRUCCION INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO
DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION
ELEVADORA LAVA PATAS), FASE 2**

CONTRATISTA: INGENIERO JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 2.040.207.328,00 IVA INCLUIDO

PLAZO: 10 MESES

INGENIERO RESIDENTE: PEDRO LUIS CUSPOCA TOVAR


RECURSOS HUMANOS Y FISICOS DE LA OBRA

RECURSOS			
Mano de obra			
Personal Operativo	N° Trab	Personal Administrativo	N° Emplead
Maestro de Obra	1	Ingeniero residente	1
Oficial	8	Ingeniero Auxiliar	1
Ayudante	42	Prof. SISO	1
Topógrafo	1	Prof. Trabajo Social	
Equipos			
Equipos	Actividad en sitio		Cantidad
Retroexcavadora	Recolección Escombros		1
Volquetas	Disposición de escombros y suministro materiales concretos		3
Mezcladora de 2 sacos	Concretos		1
Mezcladora de 1 saco	Concretos		1
Mezcladora de 1/2 saco	Concretos		1
Vibrador Eléctrico	Vibrado de concretos		1
Compactador tipo canguro	Compactar llenos		1
Compactador tipo rana	Compactar sobases		3
Regla Vibratoria	Vibrado de concretos en pavimento		1
Vibrador Eléctrico	Vibrado de concretos		1
Cortadora de concretos	Cortes de pavimentos		1
Camioneta	Transportes de materiales		1
Taladros			3
Pulidoras			3

REGISTRO DE ESTADO DEL CLIMA

En este mes se reducen considerablemente las lluvias, presentándose lluvias leves en horas de las noches.

Se presenta a continuación el registro de lluvias día a día de la última semana del periodo.

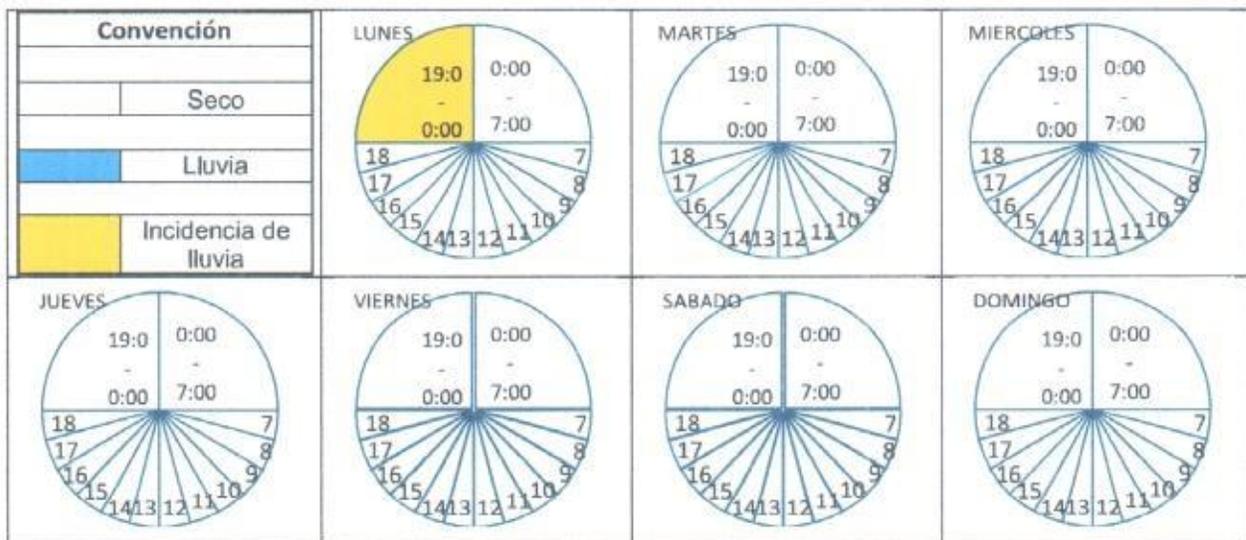

• **SEGUIMIENTO ECONOMICO A LA PROGRAMACION**

VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO
\$ 931.730.471	45,67%	\$ 1.230.610.154	60,31%

Al momento de realizar el corte de obra, se evidencia un avance por encima de lo ejecutado vs programado de un %14,64, lo cual fue superado el atraso de tiempo en la programación a principio del año a causa del invierno y por lo que fue necesario en su momento la suspensión de la obra.

• **ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.**

- Instalación de tubería de 48 pulgadas en su totalidad entre las cámaras:
Cámara No. 07 a Cámara No. 06
- Excavación mecánica y relleno
- Entibado metálico
- Pavimento en concreto hidráulico
- Corte y sello de Juntas
- Limpieza de tubería

Se han instalados aproximadamente 71,60 ml de tubería de diámetro de 48”.

Se prosiguió según los planos y diseños del proyecto que se está ejecutando, la instalación del tramo de la tubería de 48” que se encuentra entre la cámara 8 y la cámara 7 el cual se instaló ya en su totalidad y se llevan aproximadamente 42 ml de dicha tubería.

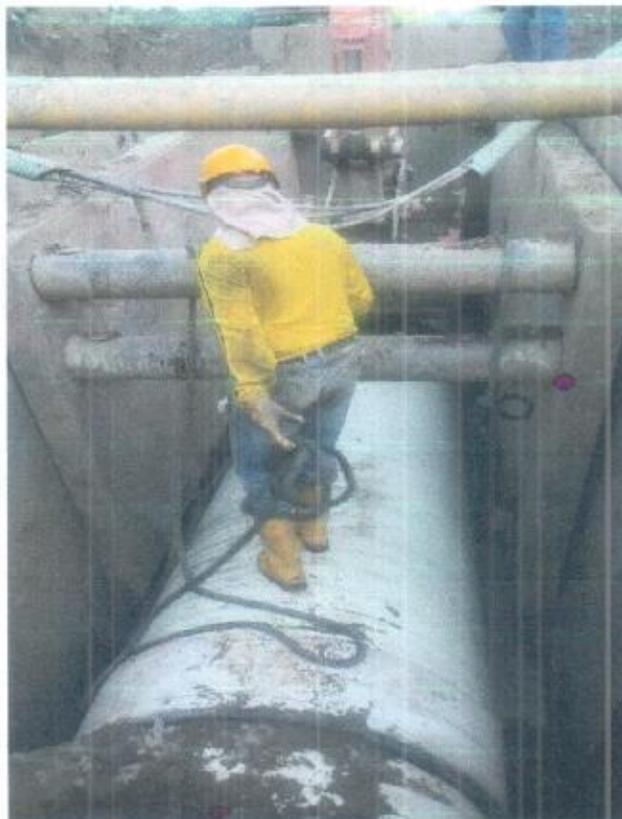


Foto 1. Instalación de tubería de 48 pulgadas.



Fotos 2 y 3. Excavaciones y entibados para la instalación de tubería.



Fotos 4 y 5. Instalación de tuberías de 51 Pulgadas



Fotos 6 y 7. Limpieza de Tuberías.



Foto 8. Armado acero de refuerzo y formaletas cámaras.



Fotos 9 y 10. Instalación de Formaletas para Fundir la cámara 7



Foto 11. Vaciado concreto cámara 7



Foto 15 y 16. Instalación de dovela para pavimento



Foto 17 Y 18. Vaciado de losas de pavimento.

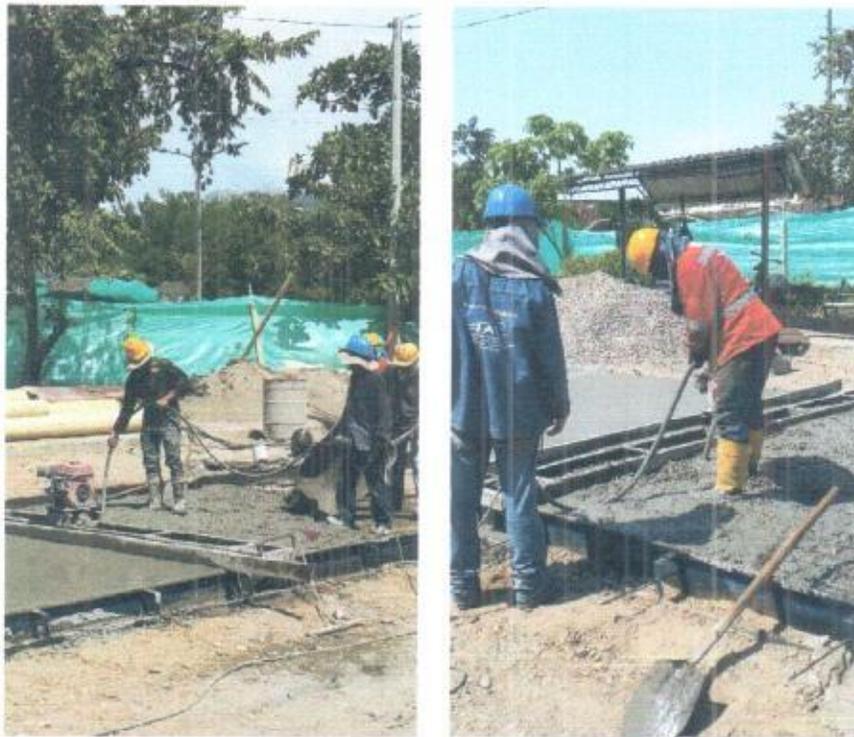


Foto 17 Y 18. Vibrado de la mezcla del pavimento de concreto.



Foto 19. Instalación de sellos en la juntas.



Foto 20, 21 y 22. Construcción de Sumideros



Foto 23 y 24. Toma de Viguetas para Ensayo de resistencia

CONTRATISTA: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

ING RESIDENTE: PEDRO LUIS CUSPOCA TOVAR
