



F-GC-22
Versión 8
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA ACTO No. 008 DE MARZO 28 DE 2019	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2.814.894 /
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JESÚS GERMAN VILLEGAS ESTRADA /			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.814.894 /
NIT O CC:	10.216.897 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00410 DE MARZO 15 DE 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.935.481 /
RP (#, rubro y fecha)	000458 DE MARZO 28 DE 2019 /			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	879.413 /
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR EL MORRO CALLE 7 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.- /				

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	/
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	/
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	/
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	/
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	/
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	/
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	/

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna Suarez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 07-06-2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA NORTE SUR	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Suavizada

PAZ Y SALVO PARAFISCALES

PERSONA NATURAL CON PERSONAL A CARGO


Yo, **GERMÁN VILLEGAS ESTRADA**, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de **PERSONA NATURAL**, bajo la gravedad del juramento **CERTIFICO** que :

1. No estoy reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.

2. He pagado mis obligaciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF) y al Sistemas de Seguridad Social Integral compuesto por Salud, pensiones y riesgos laborales de los empleados durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de esta invitación.

Para constancia se firma en Manizales, a los cuatro (04) días del mes de abril de 2019

Atentamente,



GERMÁN VILLEGAS ESTRADA
C.C. No. 10.216.897 De Manizales



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2019-06-07, 03:26:59 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 40251421

Período Cotización: 201904

Período Servicio: 201905

Cliente:

PAGADA 2019-05-24

Se certifica que en la fecha 24/05/2019, la empresa SAFER, con documento de identificación N1900751072, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN, con CC 10216897, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
AFP	N0000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP
EPS	N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS
CCF	N892400320	CCF64	CAJASAI
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF
MIN	N899999001	PAMIED	MINISTERIO DE EDUCACION
ESAP	N899999054	PAESAP	ESAP



BANCO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Conocimiento para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón


BANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 11-04-2019 10:45 Cobro: O.I.A
 Convenio 29232 - SENAFIC CENTRO DE BARRA
 Suc: 865 - EL CAÑO
 Ciudad: NANTIZALES
 Caj: 006 Rec: 853
 Valor Total: \$ 41.450.00
 Efectivo: \$ 41.450.00
 Pagador: 10216897
 Ref: 62456790

REFERENCIA		
62456790		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
08	04	2019
FECHA VENCIMIENTO		
13	04	2019

Nombre o Razón Social: GERMAN **Identificación:** 10216897
Dirección: CALLE 113 No. 25 - **Telefono:** 8722242

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$41,450.00
CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$41,450.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$41,450.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no pueda ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papetes químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)62456790(3900)041450(96)20190413


Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 62456790

Ciudad	Nit o Cedula	10216897	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: GERMAN			
CHEQUE No	CUENTA No	CONCEPTO	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES			EFFECTIVO
			CHEQUE
			TOTAL \$41.450.00

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.





Hoy es Lun, 8 Abr 2019

RE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10216897 ✓
Primer Nombre ó Razón Social	GERMAN ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	VILLEGAS ✓
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 113 No. 25 - 15
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8722242
Correo electrónico	gvillegastrada@yahoo.es ✓
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS ✓
Número Contrato de Obra	DEC.EMER.008 ✓
Nombre Obra	DECLARACION DE EMERGENCIA ✓
Fecha Inicio Obra	01/04/2019 ✓
Fecha Terminación Obra	02/04/2019 ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	PALESTINA ✓
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	ABRIL ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$41,406.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$41,406.00
Total Pagado	\$41,406.00
Valor Total	\$41,450.00
IP Origen	172.31.28.178
Nro. Transacción eCollect	62456790

GERMÁN VILLEGAS ESTRADA

INGENIERO CIVIL - MAT 744 CDS

Nit. 10.216.897- 4 Régimen Común

Carrera 21 No. 14 - 25 Manizales, Caldas Cel. 316 323 51 44

FACTURA DE VENTA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

N°	381
----	-----

SEÑOR: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NIT. _____

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA ACTO N° 008 DE MARZO 28 DE 2019 cuyo OBJETO ES: REPOSICION DE LICANTERILLAS EN EMERGENCIA SECTOR EL NUEVO CALLE 740 AL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS		1.434.221 =
	Costo Directo	24%	344.213 =
	ADMINISTRACION 24%	5%	71.711 =
	IMPUESTOS 5%	5%	71.711 =
	UTILIDADES 5%		
	TOTAL		1.921.856 =
		SUBTOTAL	1.921.856 =
		IVA 19 %	366.353 =
		TOTAL \$	2.288.209 =

RECIBI _____
10216897

RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762005598891
 FECHA: 2017/11/09
 HABILITA NUMERACIÓN DEL N° 301 AL N° 400

CONTINIOS: JUAN PINETEC VALCARRON NIT. 30.339.1059 TEL. 897 64 55 MANIZALES



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**MANIZALES,
CALDAS,
COLOMBIA,
A quién interese**

05/06/2019

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA** con **Cédula de Ciudadanía número 10216897**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550084300062985
Fecha de apertura	05/10/2017

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

**ACTO # 008 MARZO 28 DE 2019 DECLARACION DE EMERGENCIA
MUNICIPIO DE PALESTINA**

**OBJETO: CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO, EN
EL SECTOR EL MORRO CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.**

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SUPERVISOR: ABEL ROJAS RUBIANO

ABRIL 06 de 2019

INTRODUCCIÓN

El proyecto tiene por objeto el CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO, EN EL SECTOR EL MORRO CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.

Este proyecto se lleva a cabo con el fin de garantizar la prestación de los servicios básicos en materia de acueducto para la población, al igual que velar por ambientes sanos, salubres, el cual contempla la reposición de red de acueducto con el objeto de atender las necesidades administrativas y operativas de la Entidad para cumplir a cabalidad las funciones asignadas en la Constitución y la Ley 142 de 1994 y RAS 2000. Las obras se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programados y acorde a lo establecido en la normatividad cubriendo los gastos que garanticen la prestación de los servicios en forma adecuada y oportuna como son el mejoramiento de la infraestructura en servicios públicos, en cumplimiento de la misión de la Entidad.

En contexto con lo anterior, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se ve en la imperiosa necesidad de llevar a cabo la ejecución del contrato de obra, para dar cumplimiento a dicha obligación.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto Consiste en el CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO, EN EL SECTOR EL MORRO CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.

Este proyecto es contratado a precios unitarios. Las obras se adelantan a través de la resolución de obra número 008/19, a cargo de JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA. El control y vigilancia para garantizar la correcta ejecución y avance del proyecto se realiza a través del ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ABEL ROJAS RUBIANO

LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en el sector el morro calle 7, en el municipio de palestina.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA

La resolución de obra fue firmada el día 01 de Abril de 2019 entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA, el valor del contrato inicial es de Dos millones ochocientos catorce mil ochocientos noventa y cuatro Pesos M/Cte. (\$ 2.814.894); a esta resolución se le dio acta de inicio el día primero (01) de Abril del presente año.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

RESOLUCION DE OBRA	
Objeto:	CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO, EN EL SECTOR EL MORRO CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA ✓
Resolución de Obra No.:	008 de 2019
Contratista:	JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
Plazo Inicial:	5 (cinco) días
Fecha de Inicio:	01/04/2019
Fecha de Terminación:	05/04/2019
Valor Inicial de contrato:	\$ 2.814.893,71
Valor del final contrato:	\$ 1.935.481,00
Valor por pagar Acta final:	\$ 1.935.481,00 ✓
Saldo No ejecutado:	\$ 879.412,71
Nombre Interventor:	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO

OBRAS EJECUTADAS

Durante el desarrollo del presente contrato, se han realizado las siguientes actividades:

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS

Se realizó la demolición de pavimento en el sector el morro calle 7, en el municipio de palestina.

EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN de.0 A 2.0 M.

Se ejecutaron excavaciones manualmente para la construcción de las redes de Acueducto de acuerdo a las profundidades indicadas por el interventor.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 12"

Se realizó la instalación y entrega en perfecto estado de funcionamiento de la red Domiciliarias de Alcantarillado en Instalación de tubería PVC Corrugada de 12"

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO

Se realizó la disposición, conformación y compactación manual por capas en las zanjas donde se construyó la red de Alcantarillado en el sector el morro calle 7, en el municipio de palestina. .

Concreto para pavimento 42MR hecho en obra

Se realizó pavimentación en el sector el morro calle 7, en el municipio de palestina.

5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el desarrollo del contrato, se han ejecutado las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT REALIZADA	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	DEMOLICIONES				
2	Corte con disco abrasivo	ml	12,00	\$ 7.630	\$ 91.560
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	0,77	\$ 83.312	\$ 64.150
4	EXCAVACION				
5	En material común de 0 a 2m	m³	5,48	\$ 26.317	\$ 144.217
6	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	2,17	\$ 32.749	\$ 71.065
7	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
8	Instalación de tubería PVC Corrugada de 12"	ml	6,00	\$ 43.783	\$ 262.698
9	Caja de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	Un	1,00	\$ 399.818	\$ 399.818
10	Empalme a cámara	Un	1,00	\$ 90.312	\$ 90.312
11	LLENOS				
12	Lleno compactado con material de la obra	m³	3,64	\$ 22.131	\$ 80.557
13	Súb base para pavimento	m³	0,96	\$ 144.847	\$ 139.053
14	CONCRETOS				
15	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	0,72	\$ 822.268	\$ 592.033
Costo Total					\$ 1.935.481
Costo unitario					\$ 1.434.221
Administración				24%	\$ 344.213
Imprevistos				5%	\$ 71.711
Utilidad				5%	\$ 71.711
IVA sobre utilidad				19%	\$ 13.625
Costo Total					\$ 1.935.481



Handwritten signature or initials.

CONTROL DE CALIDAD

Durante el desarrollo del contrato, se garantizó que los recursos materiales utilizados para el desarrollo de las actividades cumplieran con las normas de calidad establecidas en la norma técnica colombiana.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ASPECTO LOGÍSTICO

5.1 RECURSO HUMANO

5.1.1 RECURSO HUMANO USADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El personal utilizado en Abril en la ejecución parcial del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

MES 1

CARGO	SEMANA 1
Oficial de Obra	1
Ayudante de Obra	1

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y JURÍDICOS

AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
Valor del Contrato	\$ 2.814.894
Obra Física Ejecutada (%)	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 1.935.481
Saldo No ejecutado:	\$ 879.413
Plazo Contractual en días	2
Plazo Transcurrido en días	2



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	DEMOLICIONES
	
<p>Descripción: Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas.</p>	



REGISTRO FOTOGRAFICO	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
	
<p>Descripción: Instalación de tubería PVC Corrugada de 12"</p>	



REGISTRO FOTOGRAFICO	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
	
<p>Descripción: Caja de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto</p>	



JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA NIT:10.216.897

Nomina # 1

PERIODO DE PAGO: ABRIL 01 AL 04 DE 2019


OBRA: PALESTINA

CONTRATANTE: EMPICALDAS S.A. E.S.P

CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA: jueves, 04 de abril de 2019

NOMBRE AFILIADO	CÉDULA	CARGO	DÍAS LABORADOS	SALARIO	SALARIO ANTERIOR	SALARIO TRANSICIÓN	TOTAL RETENCIÓN	IMPORTE DE LAS DIURNAS	IMPORTE DE LAS DIURNAS (L. 125)	IMPORTE DE LAS DIURNAS (L. 127)	DIFERENCIAS		TOTAL PAGAR	RECIBI
											TOTAL MANTENIMIENTO INCLUIDO EN OTROS	IMPORTE		
1 INOEL SOTO	10-700-938	OFICIAL	4	\$ 1,590,000	\$ 712,000	\$ 12,938	\$ 724,938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,938	\$ 8,480	\$ 208,000	x 10/17/19
2 CARLOS JULIO RODRIGUEZ MUÑOZ	4367892	AYUDANTE DE CONSERVACION	4	\$ 828,116	\$ 116,435	\$ 12,938	\$ 129,373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,353	\$ 4,417	\$ 115,000	6567952 Carlos Rochoy
TOTAL NOMINA													\$ 323,000	

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	Abril 04 de 2019 ✓	Acta parcial		Acta final	X ✓
----------------	----	-------------------	--------------------	--------------	--	------------	-----

Número del contrato	EMERGENCIA ACTO No. 008 DE MARZO 28 DE 2019 ✓
Objeto:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR EL MORRO CALLE 7 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS. ✓
Nombre Contratista:	JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA ✓
Fecha del contrato:	MARZO 28 DE 2019 ✓
Plazo de ejecución:	CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS ✓
Valor inicial:	\$ 2.814.894,00 ✓
Fecha de iniciación:	ABRIL 01 DE 2019 ✓
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	ABRIL 04 DE 2019 ✓
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	0
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO ✓

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	67.74%
Avance físico Acumulado	67.74%



1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Palestina	Reposición Alcantarillad D= 8"	0.006

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	5
Tiempo total transcurrido:	4
Avance Porcentual:	80%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

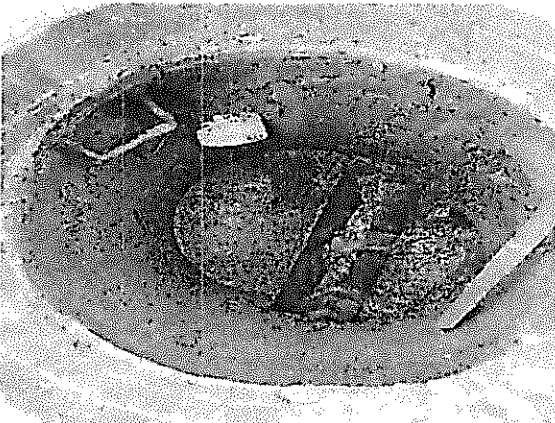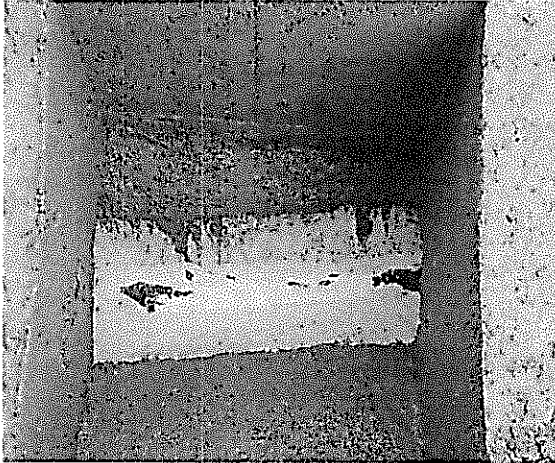

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

LA EMERGENCIA se presentó el día 28 de Marzo en el Sector EL MORRO calle 7 se presentó un Hundimiento que afectó la movilidad automotor y de Peatones lo que dio lugar a la Emergencia No. 008 de marzo 28 de 2019 lo que originó la Reposición de 6 metros en tubería novafort de 8".

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El procedimiento a seguir fue construir reponer un tramo de tubería de 8" de longitud 6 metros que se encontraba en malas condiciones hasta el punto que estaba saturando las masas de tierra y desestabilizando el pavimento de la Vía del Sector y el cual fue restituida en concreto MR 42.

ABP



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

-En el Procedimiento se construyo una caja de inspección de 0,50 x 0,50 con sus respectiva tapa en concreto reforzada.

El total de la inversión Final para la EMERGENCIA ACTO No. 008 DE MARZO 28 DE 2019 FUE DE \$ 1.906.797,00, EQUIVALENTE AL 67.74%.

La Obra según el Contratista la fecha terminación fue en Abril 4 de 2019.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	2.814.894
Inversión ejecutada en el periodo:	1.935.481
Porcentaje ejecutado en el periodo:	67.74%
Inversión total ejecutada:	1.935.481
Porcentaje total ejecutado:	67.74%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	x	x	x	x	x
Maestro de Obra	x	x	x	x	x
Oficial	x	x	x	x	x
Ayudantes	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Handwritten signature



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓ	CAPACITACIÓ N SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Abril 02 de 2019	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

Handwritten signature



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GF-32
 Versión 1
 Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTIÓN FINANCIERA
 DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C []

CONTRATO

E-008 DE 2019

FINAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
1409	PALESTINA.- CALDAS.-

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
13015130	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1.935.484
COSTO DIRECTO		1.921.858
A.I.U 19%		13.625
COSTO TOTAL		1.935.484

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

1.935.484

Fecha de presentación

Mayo 20 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	<i>ARojas</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	
