

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 017-2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$	11.943.075
				2. VALOR ADICION		
CONTRATISTA	ACIER INGENIERIA SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	11.943.075
NIT O CC:	901.376.143-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
CDP (#, rubro y fecha)	388, 2320101001030812, 28/02/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	11.943.075
RP (#, rubro y fecha)	494, 2320101001030812, 22/03/2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	-
OBJETO DEL CONTRATO:	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERÍA EN FORMA DE "H" EN LA VÍA A CHINCHINÁ-CÁLDAS.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 13/07/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO-NORTE	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00130537000100026932	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901376143	7	ACIER INGENIERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	Jurídica
MUN-DEP	17-1	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
		CALLE 24 22 02 OF 604 ED PLAZA CENTRO	3137-87715	COMPRAS.ACIERINGENIERIA@GMAIL.COM	\$	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	2023-06	FECHA PAGO	2023-06-14	DEPARTAMENTO	TOCOS	MUNICIPIO	TOCOS	VALOR PAGO	16.995.600	INTERES X MORA	20.560	ENTIDAD RECAUDO	BEVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	28	REF. DE PAGO (PIN)	2023-06-13	ESTADO PLANILLA	Pagada								

N.	D	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE PAGAMENTO	NOVEDADES												DIAS			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF			SENA			ICBF			ESAP			Min	Cot.	Cot.	Total	Empleo de Parafiscales	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39							40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	90856335	2114625526	02/06/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901376143**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.28.114.7**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 87,100.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 87,100.00	COP\$ 87,100.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

90856335

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

2114625526

02/06/2023

Número de Identificación

901376143

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

7

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 24 # 22 - 02

Localización

Nacional

Correo electrónico

2020.acieringenieria@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

017 declaratori emergen

Nombre Obra

901376143

Fecha Terminación Obra

30/04/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

2985768.00

Valor Intereses Moratorios

100.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ACIER INGENIERIA SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,320 6258574

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

declaratoria emergencia

Fecha Inicio Obra

01/04/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

Chinchina

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

11943075.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

87000.00

Valor del Pago

87000.00



ACIER INGENIERIA S.A.S

NIT 901.376.143-7 REGIMEN COMUN

CL 24 22 02 OF 604 ED PLAZA CENTRO MANIZALES, CALDAS
CEL 313 7187215 - 320 6258574

Regimen Ordinario -

Retencion en la fuente a titulo de renta -

Responsable de IVA, no somos Grandes Contribuyentes

**Factura
electrónica de
venta
No. AI379**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NI No. : 890803239-9 DIRECCION : CRA 23 # 75 - 82 TELEFONO : CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia	07/07/2023	\$ 11.943.075,00
VENDEDOR		
-		
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
15/07/2023		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
5001	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	1 GLB	\$ 8.850.000,00		\$ 8.850.000,00
5011	ADMINISTRACION	1 UN	\$ 2.566.500,00		\$ 2.566.500,00
5013	UTILIDAD	1 UN	\$ 442.500,00		\$ 442.500,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 11.859.000,00	CxC # 1	Vence: 15/07/2023	\$ 11.943.075,00
IVA liquidado	\$ 442.500,00	19,00%	\$ 84.075,00			
VALOR TOTAL :			\$ 11.943.075,00			

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESO

OBSERVACIONES

ACTA FINAL, ESPERCIFICADO EN ACTO # 17

Resolución DIAN: 18764036268921. Prefijo: AI. Rango: 242 al 500. Vigencia: 16/09/2022 hasta 16/09/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 15/07/2023.

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA:

BANCO BBVA COLOMBIA CORRIENTE N. 00130537000100026932 A NOMBRE DE ACIER INGENIERIA SAS.

BANCO BANCOLOMBIA CORRIENTE N. 37300000586 A NOMBRE DE ACIER INGENIERIA SAS.

BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE N. 084169989906 A NOMBRE DE ACIER INGENIERIA SAS.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

PF19qN2Uj5X9MAhB+gN5o3De6U+QgK376+IRtzO0TtUVI+c7bKzS8ceb515sBGha9n+4fxwTB!KaTjpRf70PvaYajVWWTgh/8srj4TuMQMjmRAp0y6p+lj8j9zjTDA6DwGDI8pu8jaq1k/QanRmWF5bVfEixcRNV+eV9ds4war8MAJ7trg5C4s7rixKGIJAGlzSpKZU+N8lcr6NGmMSgw113UimY55ex0vLuwZDZ1CLp8nnqxcGT81r/N7Tlwq3YIZLomCCvcaFWPKKO+9HciyhalUsZn1/t+0WXHlx40ululNANT6Yag7v8F0QrSI5jL/exefB2F8kEsOO7Q==

CUFE: 2d426e08cfe7c07df9a5a2583faf7a79ecd220b6b6df5560528f5942a6c83be1d9c970fa4711f484dcac6d533a907fd8

Fecha emisión: 2023-07-10 17:18:24

Fecha validación DIAN: 2023-07-10 17:18:29-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Manizales, 01 de junio de 2023

SEÑORES:


EMPOCALDAS

Attn. Ing. Juan Pablo Zuluaga

Ref: Bitácora H's soporte tubería Vía Santa Rosa


Jueves, 23 de marzo de 2023

Se envían planos a Empocaldas para revisión y aprobación

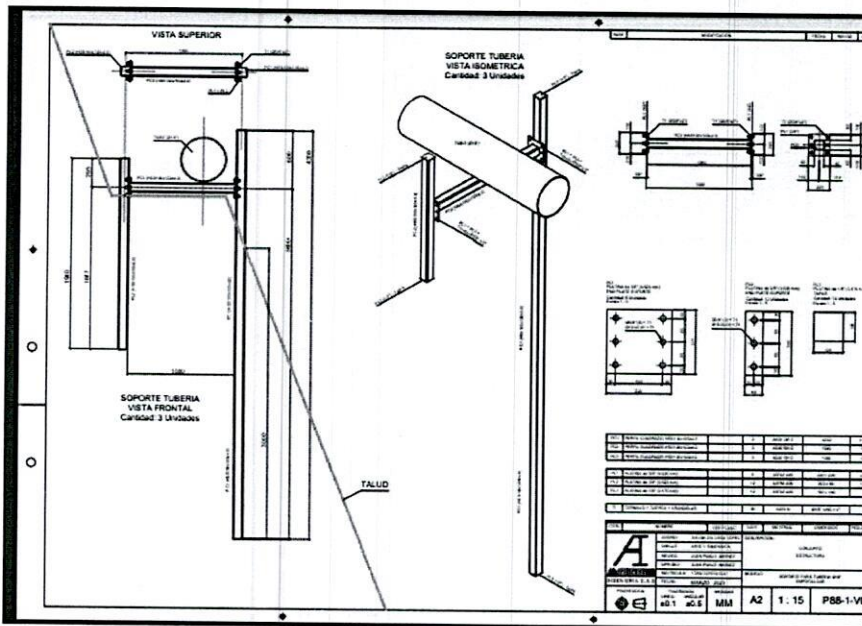

Miércoles, 29 de marzo de 2023

Se envía estructura a la obra y se da instrucción al conductor del camión para descargar la estructura en la vía señalada con la cinta amarilla

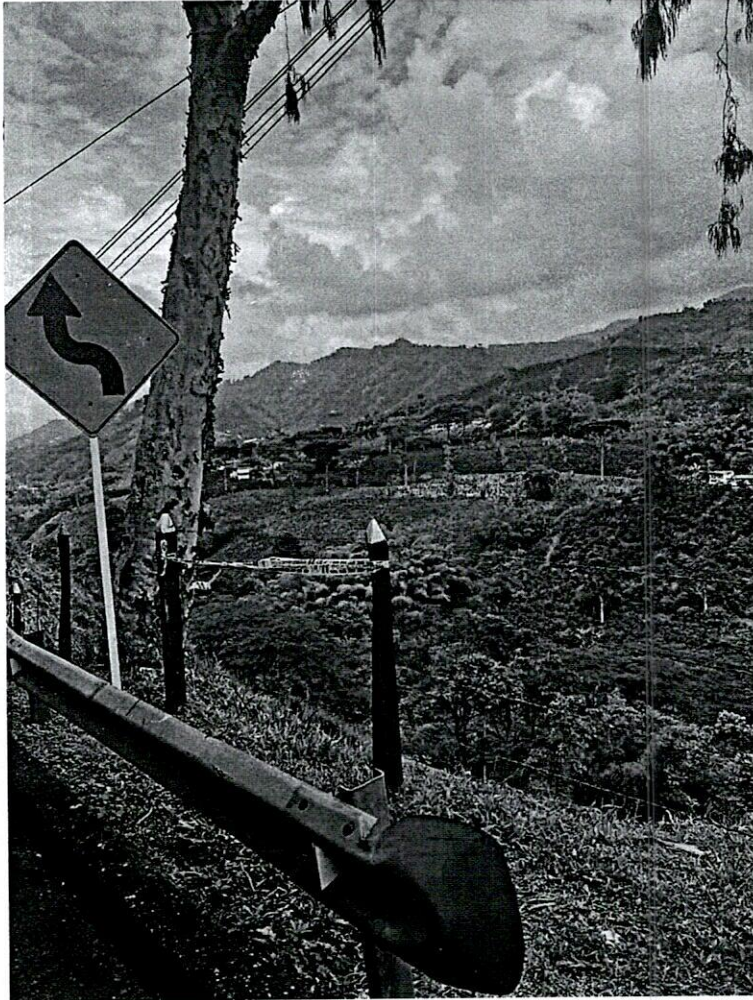

Jueves, 30 de marzo de 2023

Se inicia excavación para anclar las patas de las H's



Viernes, 31 de marzo de 2023

Se continúa con la excavación para el anclaje de las patas, se encuentra demasiada roca y retrasa las labores



Lunes, 3 de abril de 2023

Se inicia la instalación de vigas para soporte de tubería




Martes, 4 de abril de 2023

Se continúa armado de las H's y se inicia relleno de huecos donde se instalaron las columnas



Miércoles, 5 de abril de 2023

Se realiza apisonado y limpieza obra. Se terminan las labores

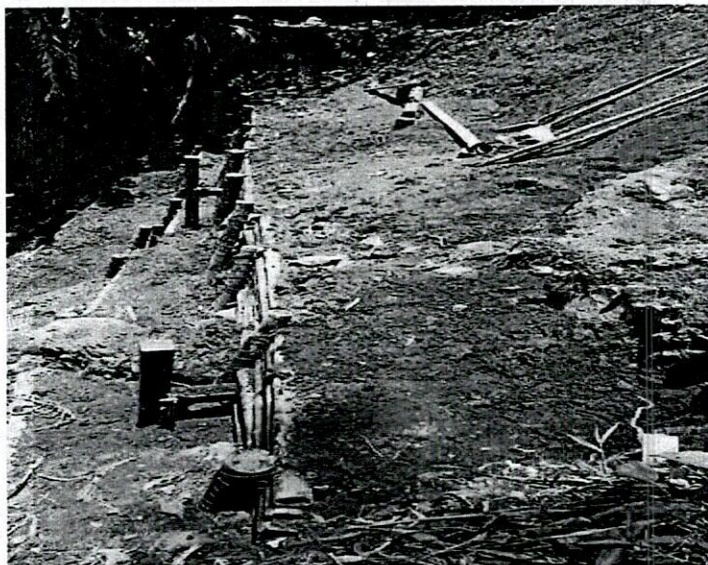

Atentamente,

JUAN PABLO JIMENEZ B

ACIER INGENIERIA S.A.S

TELEFONO: 313 7187215

e-mail: juanpjimenezb@gmail.com

ACIER INGENIERIA S.A.S

NIT 901.376.143-7 REGIMEN COMUN

CL 24 22 02 OF 604 ED PLAZA CENTRO MANIZALES, CALDAS
CEL 3137187215**Documento soporte de pago de
nómina electrónica
No. RNE280****NOMBRE:** ISLENDER ARIAS FRANCO
CC: 75049515-6
DIRECCION: CR 33 100 B 22
CIUDAD: MANIZALES**TIPO CONTRATO:** Contrato de obra o labor
NÚMERO CONTRATO: CT2023-12
TIPO TRABAJADOR: Dependiente**MES REPORTADO:** abril/2023**DEVENGADOS**

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 1.160.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 140.606,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 46.400,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 46.400,00

FORMA DE PAGO**MÉTODO:** Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:**TOTALES****DEVENGADOS:** \$ 1.300.606,00
DEDUCCIONES: \$ 92.800,00
TOTAL PAGADO: \$ 1.207.806,00**CUNE:** 454f3e566694dfbd91b1f7a10940832739c6797b9a762c79be4299ba547e43262572ed0fb0ecc1407a775308bf543e0b**Fecha emisión:** 2023-05-12 20:51:20**Fecha validación DIAN:** 2023-05-12 20:51:26-05:00**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-620V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

ACIER INGENIERIA S.A.S

NIT 901.376.143-7 REGIMEN COMUN

CL 24 22 02 OF 604 ED PLAZA CENTRO MANIZALES, CALDAS
CEL 3137187215**Documento soporte de pago de
nómina electrónica
No. RNE273****NOMBRE:** JOSE DUVAN GAVIRIA OSORIO
NI: 75066760-6
DIRECCION: CL 67D # 41-27 MALABAR
CIUDAD: MANIZALES**TIPO CONTRATO:** Contrato de obra o labor
NÚMERO CONTRATO: CT2023-04
TIPO TRABAJADOR: Dependiente**MES REPORTADO:** abril/2023**DEVENGADOS**

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 1.972.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 140.606,00
Auxilio extralegal transport e						\$ 74.900,00
Auxilio extralegal transport e						\$ 70.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 78.880,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 78.880,00

FORMA DE PAGO**MÉTODO:** Contado
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: Cuenta de ahorro
NÚMERO DE CUENTA: 03123097278**TOTALES****DEVENGADOS:** \$ 2.257.506,00
DEDUCCIONES: \$ 157.760,00
TOTAL PAGADO: \$ 2.099.746,00**CUNE:** a49d0c72758ffec1552ba13ce62beb644d8c797c2dfcfa353df397bb6c3bbd96e65d379102b473153781540137e955f9**Fecha emisión:** 2023-05-12 20:42:18**Fecha validación DIAN:** 2023-05-12 20:42:23-05:00**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-620V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

ACIER INGENIERIA S.A.S

NIT 901.376.143-7 REGIMEN COMUN
CL 24 22 02 OF 604 ED PLAZA CENTRO MANIZALES, CALDAS
CEL 3137187215

**Documento soporte de pago de
nómina electrónica
No. RNE284**

NOMBRE: ARLES DE JESUS MORALES GIRALDO
CC: 98702940-8
DIRECCION: CALLE 2A # 9 -09
CIUDAD: VILLAMARÍA

TIPO CONTRATO: Contrato de obra o labor
NÚMERO CONTRATO: CT2023-18
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

MES REPORTADO: abril/2023

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 1.798.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 140.606,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 71.920,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 71.920,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: Cuenta de ahorro
NÚMERO DE CUENTA: 3126090034

TOTALES

DEVENGADOS: \$ 1.938.606,00
DEDUCCIONES: \$ 143.840,00
TOTAL PAGADO: \$ 1.794.766,00



CUNE: 8a307653a9273460bb7345b0f8b3628c2e5a0894bd7c7a638924486215b441a1eb68a2d468c7885fb9eb39155656abb5
Fecha emisión: 2023-05-12 20:57:14
Fecha validación DIAN: 2023-05-12 20:57:19-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	13-06-2023	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	ACTO 017-2023
Objeto:	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERÍA EN FORMA DE "H" EN LA VÍA A CHINCHINÁ-CALDAS.
Nombre Contratista:	ACIER INGENIERÍA SAS
Representante Legal	JUAN PABLO JIMENEZ BERNAL
Fecha del contrato:	22-03-2023
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	\$ 11.943.075
Fecha de iniciación:	22 de marzo de 2023
Fecha de terminación:	10 de abril de 2023
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %



1.2. Informe de actividades


INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA		
SECCIONAL	SERVICIO	CANTIDAD (unidades)
SALAMINA	ACUEDUCTO	3


1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20 días
Tiempo total transcurrido:	20 días
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico

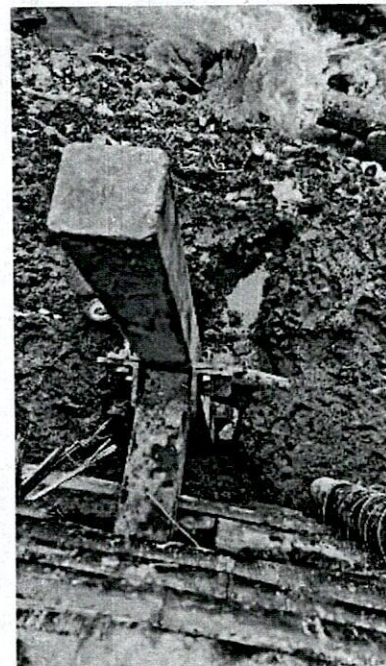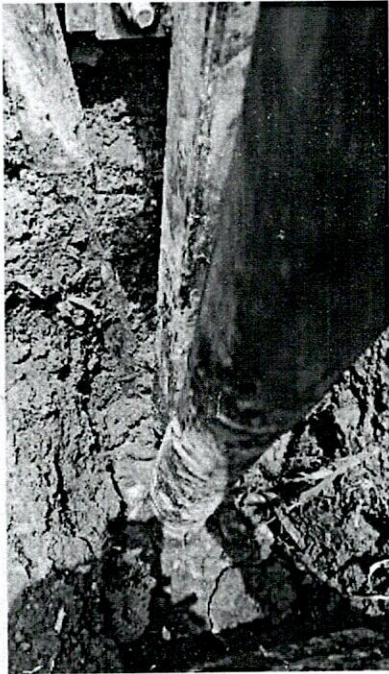

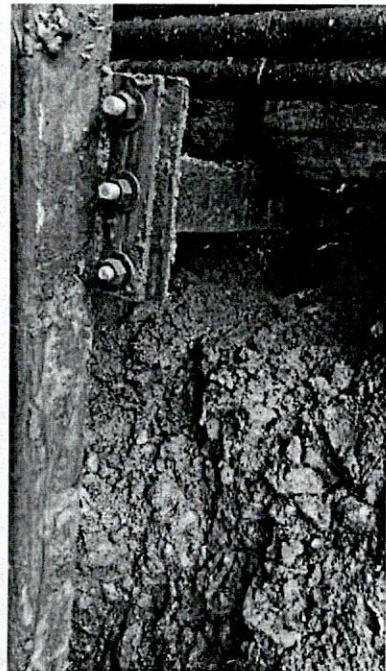

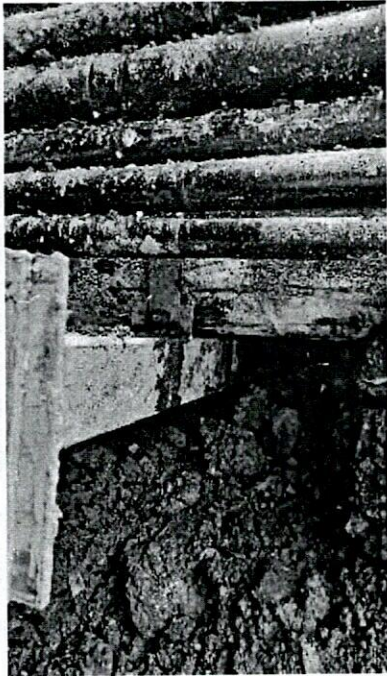

1.5. Problemáticas con la obra

Las fuertes lluvias y el invierno aumentaron la inestabilidad del terreno, sin embargo, se logró atender la contingencia sin ningún contratiempo.

Que mediante "memorando e informe de fecha 24 de enero de 2023 enviado por la señora administradora de la seccional Salamina, Caldas, Claudia Janneth Olarte Gómez donde informa que Salamina se presenta un Bajo caudal después de que se ha despegado una T que se encuentra termofusionada a una tubería de 10" de polietileno perteneciente a la conducción principal que viene de la bocatoma de chaqualito en el sector La Quiebra, por tal motivo trabajadores de mantenimiento, se dirigen inmediatamente a verificar conducción en la cual se encontró salida en gran cantidad de agua por donde pasa un tubo de polietileno de 10", razón por la cual el caudal que llega a la planta viene mermando paulatinamente Se solicita se solicite se realice DECLARATORIA DE EMERGENCIA para subsanar dicho situación" lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 11.943.075
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 11.943.075
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 11.943.075
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
ISLENDER ARIAS FRANCO	X	X	X	X	X
JOSE DUVAN GAVIRIA OSORIO	X	X	X	X	X
ARLES DE JESUS MORALES GIRALDO	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

- Certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo, mes de ABRIL de 2023.
- Pago del FIC
- Nomina empleados

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
30-03-2023	CASCO	A
30-03-2023	OVEROL	NU
30-03-2023	GUANTES	NU
30-03-2023	BOTAS	A
30-03-2023	CARNE	NU
30-03-2023	CHALECO	A
30-03-2023	SEÑALIZACION	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
1	FABRICACION E INSTALACION ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERIA EN FORMA DE H, EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE 100X100X4mm	3	3	\$ 2,950,000	\$ 8,850,000	3	\$ 8,850,000	3	\$ 8,850,000
COSTO TOTAL DIRECTO					\$ 8,850,000	\$ 8,850,000	\$ 8,850,000	\$ 8,850,000	
ADMINISTRACION		25%		\$ 2,566,500		\$ 2,566,500	\$ 2,566,500	\$ 2,566,500	
IMPREVISTOS		0%		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
UTILIDADES		5%		\$ 442,500		\$ 442,500	\$ 442,500	\$ 442,500	
IVA SOBRE UTILIDADES		19%		\$ 84,075		\$ 84,075	\$ 84,075	\$ 84,075	
COSTO TOTAL					\$ 11,943,075	\$ 11,943,075	\$ 11,943,075	\$ 11,943,075	

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

3 empleos directos X 20 días calendario

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA


Usuarios y suscriptores del servicio de acueducto en el Municipio de Chinchiná, Caldas

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Bitácora de la obra	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 09
2023-01-16

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra ACTO 017-2023
Acta Número

Pág. 1 De. 1

CENTROS DE COSTOS		CODIG O		PROCEDIMIENTO		VALOR ANTES DE IVA		IVA		TOTAL		UNIDAD DE SERVICIO		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	
206002	Chinchiná Acueducto	✓	1301022	Captación - Aducción - Conductión	11,859,000	84,075,00	11,943,075,00	11,943,075,00	ACUEDUCTO	11,943,075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1						11,859,000.00	84,075.00	11,943,075.00											
TOTAL FACTURA						11,859,000.00	84,075.00	11,943,075.00											

Fecha de Presentación _____ Páginas 1 Fin

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA NOMBRE	INGENIERO DE ZONA CENTRO-NORTE CARGO
DATOS DEL SUPERVISOR	
FIRMA	

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA CENTRO NORTE

CONTRATO No.:	Acto 017 del 22 de marzo de 2023	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	10 de abril de 2023
OBJETO CONTRATO:	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERÍA EN FORMA DE "H" EN LA VÍA A CHINCHINÁ-CALDAS.	FECHA INICIACIÓN:	22 de marzo de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	10 de abril de 2023
CONTRATISTA:	ACIER INGENIERIA SAS	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	13 de junio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL		
1	FABRICACION E INSTALACION ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERIA EN FORMA DE H, EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE 100X100X4mm	3	3	\$ 2,950,000	\$ 8,850,000	3	\$ 8,850,000	3	\$ 8,850,000		\$ 8,850,000
	COSTO TOTAL DIRECTO				\$ 8,850,000				\$ 8,850,000		\$ 8,850,000
	ADMINISTRACION	29%			\$ 2,566,500				\$ 2,566,500		\$ 2,566,500
	IMPREVISTOS	0%			\$ -				\$ -		\$ -
	UTILIDADES	5%			\$ 442,500				\$ 442,500		\$ 442,500
	IVA SOBRE UTILIDADES	19%			\$ 84,075				\$ 84,075		\$ 84,075
	COSTO TOTAL				\$ 11,943,075				\$ 11,943,075		\$ 11,943,075

SON: MIL PESOS MCTE \$ 11,859,000

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	\$ 11,943,075
Valor Acta 1 y final	\$ -
Saldo No ejecutado	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 11,943,075 \$ 11,943,075


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE
 SUPERVISOR



JUAN PABLO JIMÉNEZ BERNAL
 Representante legal Contratista

Buen día, envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

10-07-2023 10-07-2023 AI A1379 Factura electrónica 901376143 ACIER INGENIERIA S.... 690603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación 511,943,075 Factura Electrónica

U

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 017-2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$	11.943.075
CONTRATISTA	ACIER INGENIERIA SAS			2. VALOR ADICION		
NIT O CC:	901.376.143-7			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	11.943.075
CDP (#, rubro y fecha)	388, 2320101001030812, 28/02/2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
RP (#, rubro y fecha)	494, 2320101001030812, 22/03/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	11.943.075
OBJETO DEL CONTRATO:	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERÍA EN FORMA DE "H" EN LA VÍA A CHINCHINÁ-CÁLDAS.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	-
DOCUMENTO VERIFICADOS						<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).						X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.						N/A
3- Pagos al FIC						X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).						X
5- Informe de actividades o Bitácora.						X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.						X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20						X
8- Ensayos de densidad.						N/A
9- Diseño de Mezclas.						N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.						N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)						N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51						N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)						N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)						X
15- Acta parcial o final del contrato.						X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor						X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

13/07/23

Rto. PATTY
14-07-2023
1070cm

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO-NORTE	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00130537000100026932	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
