

# CONTRATO Y AÑO	Resolución 00136 de 2018 y 00195 de pago de 2018	Acta N°	01 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	5.107.382
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	5.107.382
CDP (#, rubro y fecha)	0418 del 13 de marzo de 2018			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000488 del 12 de abril de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.057.102
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	50.280

OBJETO DEL CONTRATO: Arreglo por emergencia de tubería conducción La Palma sector el basurero en el municipio de Riosucio Caldas

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	✓	1
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	X
3- Pagos al FIC	✓	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.	N/A	X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓	✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓	✓
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Rudy Gonzalez A
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18/06/18
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta original	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Copia del Registro Presupuestal	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	

Fecha de presentación Junio 14 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	Ingeniero de Zona	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70-55618386-7	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00136 DEL 12 DE ABRIL DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura N°. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00136 del 12 de abril del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el Municipio de Riosucio, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de Riosucio, fueron sustentadas mediante " oficio No. RS-016 e informe de fecha 12 de abril del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional de Riosucio, solicita se declare la situación de emergencia, debido a que se presentó daño el día 12 de abril del 2018 en la conducción de la bocatoma la palma – en el sector el Basurero, en donde se presentó desplazamiento y de terreno afectando un tramo de 42 mts de tubería de 6" PVC. Así mismo dicho daño afecta la cantidad de agua que llega a la bocatoma La Robada y por ende a la planta de tratamiento que abastece a todo el municipio de Riosucio, Caldas. Por lo anterior solicito se declare la emergencia para su respectiva reposición y reubicación".


EMPOCALDAS SA ESP, no cuenta con el equipo para realizar la termo fusión, por lo anterior es necesario contratar a un tercero para que realice la reparación de la tubería de polietileno de alta densidad.

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio". (Artículo 46).

Que el daño en la conducción, fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al Municipio de Riosucio, Caldas.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesario la contratación del señor Hernando Antonio Vallejo Herrera.

17 8 MAY 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1

000195



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00136 DEL 12 DE ABRIL DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el **Municipio de Riosucio, Caldas**, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 12 de abril del 2018.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió en el Arreglo por emergencia de tubería conducción La Palma sector el basurero en el municipio de **Riosucio Caldas**.

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000488 por un valor de \$5.107.382.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de **CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS (\$5.057.102)**.

A continuación se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

ESPACIO EN BLANCO

18 MAY 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

500195



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00136 DEL 12 DE ABRIL DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

Table with columns for contract details, location, and a large grid of data. Includes fields for 'CONTRATO No.', 'FECHA DE EMISION', 'LUGAR DE EJECUCION', and a grid with columns for 'ITEM', 'DESCRIPCION', 'UNIDAD', 'CANTIDAD', 'VALOR UNITARIO', 'VALOR TOTAL', 'FECHA DE INICIO', 'FECHA DE TERMINACION', 'ESTADO', 'OBSERVACIONES'.


RECAUDOS OBLIGADOS A PAGAR:
COMUNICACION: 20
IMPRESION: 20
TOTAL: 40
VALOR: 1.000.000
TOTAL A PAGAR: 1.000.000

Handwritten signature and stamp of the official.

18 MAY 2018



Carra 23 # 75-82, Manzales, Caldas
PBX :(+576) 888 7080
NIT: 890.803.239-9
empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



00195



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00136 DEL 12 DE ABRIL DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, contratista, por un valor de CINCO MIILONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS (\$5.057.102).

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de CINCO MIILONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS (\$5.057.102), previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de CINCO MIILONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS (\$5.057.102), Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOHERA PROAÑOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

18 MAY 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 888 7080
NIT: 890.803.239-9
empoc@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



OP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-05-10, 10:36:24 AM Tipo Planilla: E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS
 Número Planilla: 36678688
 Período Cotización: abril de 2018 Período Servicio: mayo de 2018

Factografía - Impresión - Copiar - etc.

PAGADO 10/05/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Documento	CC-4413512
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	CHIRICHINA
Representante Legal	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO
Dirección	CRA 10 No 2 -13
Teléfono	8501947
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	CC-4413512

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado

Novedades		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Operación	Fecha	Valor	Beneficio	Valor	Valor	Beneficio	Valor	Valor	Beneficio	Valor	Beneficio	Valor	Beneficio	Valor	Beneficio	Valor	Beneficio		
BO CAJAS																			
BO CAJAS																			
BO CAJAS																			
BO CAJAS																			
BO CAJAS																			

III. TOTALES

| BO CAJAS | |
|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| BO CAJAS | |



ENLACE OPERATIVO, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 2444 - Bogotá: 483 4485 - Cali: 485 9444 - Medellín: 504 2727 - Otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
 Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SEGURO SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 1661

(Mayo 10 de 2011)

Por la cual se resuelve una solicitud de Reliquidación.

EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL CALDAS
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, Y

CONSIDERANDO

El día 28 de junio de 2005, presentó solicitud de prestación económica por vejez el asegurado HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, identificado con c.c. N° 4.413.512, Afiliación N° 904413512 de la Seccional Caldas.

Que mediante Resoluciones No. 8872 del 05 de diciembre de 2008 y No. 2548 del 07 de julio de 2010, se concedió pensión de jubilación al asegurado HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, a partir del 01 de julio de 2010, por valor de \$897.400, la liquidación se baso en 1358 semanas cotizadas con un ingreso base de liquidación de \$1.277.256 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 70.26%.

Que la Resolución en comento fue notificada en debida forma y contra esta se interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, solicitando en síntesis que cuenta con más semanas de cotización.

Que para resolver la solicitud se estudio nuevamente el expediente y las normas aplicables al caso concreto, encontrándose:

Que para la liquidación de la pensión y así determinar el Ingreso Base de Liquidación, se procede a realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la Circular No. 588 del 26 de Febrero de 2004 de la Dirección Jurídica Nacional donde se establece: "(...) Para los que les faltare mas de 10 años, el IBL será calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir, el promedio devengado durante los últimos 10 años o el de toda la vida si tuviere 1250 semanas o mas cotizadas actualizado anualmente con base en la variación del Índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE (...)"

"... Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos..."

Que conforme a lo preceptuado el asegurado(a) le asiste el derecho a que se le re liquide su prestación teniendo en cuenta todas las cotizaciones durante su vida laboral; liquidación basada en 1860 semanas, con un Ingreso Base de Liquidación de \$ 1.227.656, cifra a la cual se le aplica el monto que le corresponde según la norma aplicable, en este caso el 79.31 %, dando así una mesada de \$ 973.654 para el año 2010.

Que mediante resolución No 1140 del 29 de marzo de 2011 se ingreso la solicitud en la nomina, pero la prestación se encuentra sujeta a una serie de controles y medidas para evitar la indebida utilización de los dineros integrantes del fondo común, cuyo objeto es el

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	00136 - 2018
Nombre Obra	RIO SUCIO
Fecha Inicio Obra	09/04/2018
Fecha Terminación Obra	15/04/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIO SUCIO
Tipo FIC	Costo Total de Obra
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$500,000.00
Costo Total Mano de Obra	\$500,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$1,250.00
Aporte SENA	\$2,500.00
Valor del Pago	\$3,750.00
Total Pagado	\$3,750.00
Valor del Pago	\$3,750.00
IP Origen	190.67.190.96
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61076071
Fecha de Creación	14/06/2018 03:19:47 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	344679858
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	00136-2018
Nombre Obra	RIOSUCIO
Fecha Inicio Obra	16/04/2018
Fecha Terminación Obra	22/04/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIOSUCIO
Tipo FIC	Costo Total de Obra
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$5,057,102.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,057,102.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$12,643.00
Aporte SENA	\$25,286.00
Valor del Pago	\$37,929.00
Total Pagado	\$37,929.00
Valor del Pago	\$37.929,00
IP Origen	186.119.85.211
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61024909
Fecha de Creación	01/06/2018 10:54:43 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	341381035
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 7

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES JUNIO 1 DEL 2018

NOMBRES Y APELLIDOS:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

CEDULA O NIT:

4413512

DIRECCION:

CARRERA 10 NO. 2-13 CHINCHINA CALDAS

TEL: 3148446597

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

RESOLUCION NO.136 DECLARATORIA DECLARACION EMERGENCIA Y RESOLUCION PAGO NO. 0195
EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO ARREGLO POR EMERGENCIA DE TUBERIA CONDUCCION
LA PALMA SECTOR EL BASURERO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

SUBTOTAL:

5.057.102

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ():

\$

TOTAL A PAGAR:

\$

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 4413512

Emergencia 0136/2018

PLANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

Pagos de 13 de abril al 20 de abril del 2018. Semana del 16 de abril al 22 de abril del 2018

Nº	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR	Sub Transp	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		L	M	J	V	S	D	ISS							OTRAS	PIRMA		CEDULA DE C.	
1	Jose Luis Zepeda	X	X	X	X	X	-	5	26050	130250	-	-	130250	18666	-	111584			
2	Jose Paulo Obando	X	X	X	X	X	-	5	26050	130250	-	-	130250	18666	-	111584			

Firmado por: *[Signature]*
 Responsable de la partida: *[Signature]*

Emergencia 0136/2018

Correspondiente Semanas del 9 de abril al 15 de abril del 2018

PLANILLA DE JORNALISTAS

Pagos del 13 de abril of. 3 de abril de 2018

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Dias	Valor Diario	Sub Trasp	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME FIRMA	CEDULA DE 'C
		M	M	J	J	V	S	D						ISS	OTRAS			
1	Jose Luis Erazo	-	-	-	X	X	X	3	26.050	78.150	-	78.150	11.200	-	66.950	[Signature]	9045371	
2	Jose Danilo Obando	-	-	-	X	X	X	3	26.050	78.150	-	78.150	11.200	-	66.950	[Signature]	9045371	

 F-GC-20 ✓ Versión 2 Octubre 2016 ✓	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1 ✓	Fecha del informe	Mayo 30 de 2018	Acta parcial		Acta final	X ✓
----------------	-----	-------------------	-----------------	--------------	--	------------	-----

Número del contrato	Resolución 0136-2018
Objeto:	Arreglo por emergencia de tubería conducción La Palma sector el basurero en el municipio de Riosucio Caldas
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	12 de Abril de 2018
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor inicial:	\$ 5.107.382
Fecha de iniciación:	13 de abril de 2018
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	22 de abril de 2018 ✓
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ ✓

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

El día 12 de abril se reporta daño en la conducción de la bocatoma la robada y por ende en la planta de tratamiento que abastece todo el municipio de Riosucio Caldas; este mismo día se declara la emergencia por el gerente y se contrata la reposición de la tubería mediante el cambio de 42 ml de tubería de pvc a tubería de polietileno; esto debido a que en el sitio se evidencia un proceso de inestabilidad que está generando esfuerzos a la tubería situación que genero el daño en la misma; con la instalación de esta tubería se considera que se mitigará el riesgo a nuevos daños en el sitio por el desplazamiento del terreno. El contratista realiza la atención de la emergencia sin contratiempos.

1.2. Avance en tiempo

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Plazo de ejecución:	10 días
Tiempo total transcurrido:	10 días
Avance Porcentual:	100%

1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)





Daño de la tubería de OVC



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

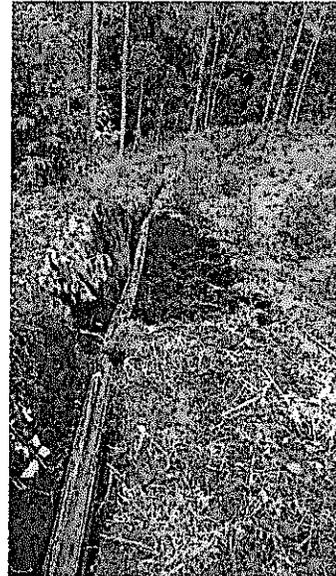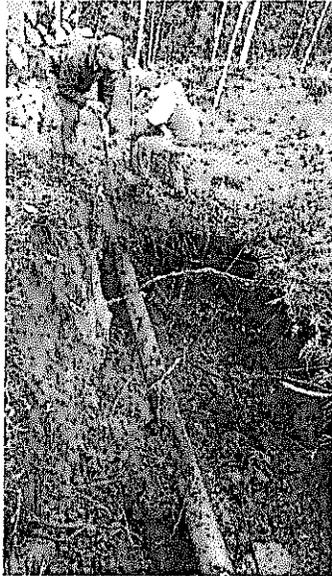

REPARACIÓN CON TERMOFUSIÓN





REPARACIÓN CON TERMOFUSIÓN





F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

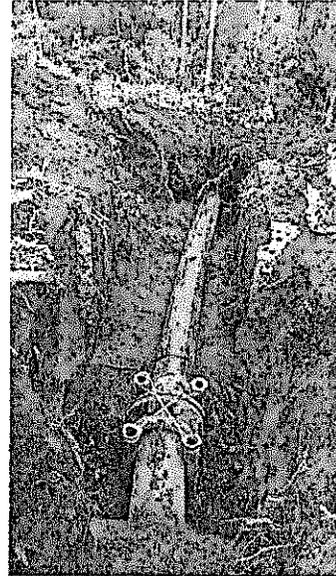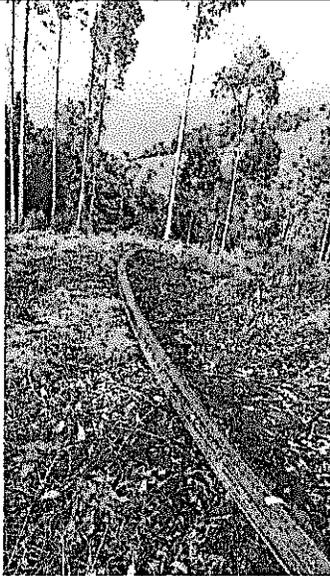

REPARACIÓN CON TERMOFUSIÓN

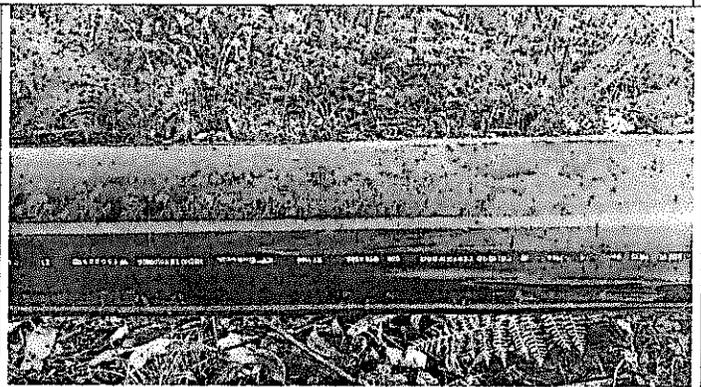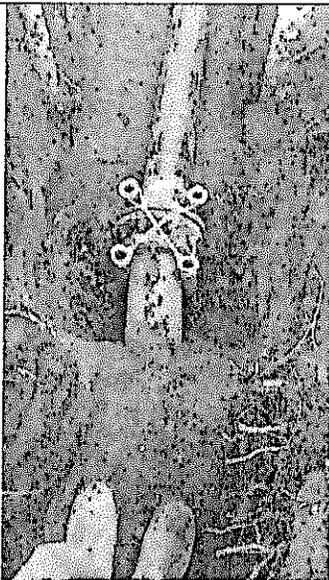

REPARACIÓN CON TERMOFUSIÓN

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Descripción de la obra: .- Los trabajos se ejecutaron de forma normal, no se presentaron dificultades o imprevistos relevantes que impidieran la normal ejecución de las obras de ahí que se ejecutan dentro del plazo contractual.

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 5.107.382
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 5.057.102
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 5.057.102
Porcentaje total ejecutado:	99%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) No se requieren pólizas por ser monto inferior a 10 SMMLV.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ABRIL 19 DE 2018	A	A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA No 1 RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO N°: Resolución 00136-2018 /
 MODALIDAD DE: DIRECTA /
 CONTRATACION: /
 CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. /
 REPRESENTANTE LEGAL: /
 OBJETO: Arreglo por emergencia de tubería conducción La Palma sector el basurero en el municipio de Riosucio Caldas /
 CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA /
 MUNICIPIO: RIOSUCIO CALDAS /
 COSTO DIRECTO: \$ 3.890.078 /
 Administración 20% \$ 778.016 /
 Imprevistos : 5% \$ 194.504 /
 Utilidad: 5% \$ 194.504 /
 TOTAL: \$ 5.057.102 /
 RECURSOS: PROPIOS /
 INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ /

En la ciudad de Manizales a los 22 días del mes de abril de 2018, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ Ingeniero de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No Resolución 00136 de 2018

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	ml	42,00	\$ 4.843	\$ 203.406
3	EXCAVACIÓN	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0
4	En material común de 0 a 2m	m3	30,16	\$ 24.440	\$ 737.110
5	Dispersión de material sobrante en el sitio	m3	0,84	\$ 30.415	\$ 25.549
6	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0
7	Instalación de tubería de polietileno de 6" PN 16	ml	42,00	\$ 30.000	\$ 1.260.000
8	Termo fusión potafanche	un	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000
9	Empalme a tubería existente PVC	un	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000
10	Empalme a tubería existente polietileno incluye tornillos y empaque	un	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000
11	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos metálicos de 1.5m c/u y alambre galvanizado	un	1,00	\$ 325.000	\$ 325.000
12	Transporte de tubería desde Chinchiná hasta el sitio	gl	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000
13	LLENOS				
14	Lleno compactado con material de la obra	m3	29,00	\$ 20.553	\$ 596.037
15	Sellado de grietas	ml	27,00	\$ 30.000	\$ 810.000
COSTO DIRECTO					\$ 3.890.078
ADMINISTRACION 20%					\$ 778.016
IMPREVISTO 5%					\$ 194.504
UTILIDAD 5%					\$ 194.504
VALOR					\$ 5.057.102

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Ingeniero Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista

EMPOCALDAS A.S.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS CIVILES Y DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:		00136/2018		ACTA No.:		7		FECHA CORTE:		ABRIL 22 DE 2018		PORCENTAJE	
OBJETO CONTRATO:		Asignó por emergencia de tubería conurbación La Palmar de la zona en el municipio de Nariño, Caldas		FECHA INICIACION:		ABRIL 13 DE 2018		FECHA VENCIMIENTO:		ABRIL 22 DE 2018		TOTAL EJECUTADO	
CONTRATISTA:		HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA		SUPERVISOR:		LOIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		VALOR ADICIONAL:		-		99%	

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CONTRATUAL	VAL. TOTAL	% DE OBRAS	ACUMULADO ANTERIOR	VAL. UNITARIO	CANTIDAD	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA	% EJECUT.
1	PELLETERIAS												
2	Locacion y traslado	m2	41.00	4.41	201.446	1.81%	0.00	41.00	41.00	41.00	201.446	201.446	100%
3	EXCAVACION	m3	25.00	24.40	610.000	5.37%	0.00	25.00	25.00	25.00	610.000	610.000	100%
4	Extracción de material labrado en el sitio	m3	6.00	32.415	194.490	1.72%	0.00	6.00	6.00	6.00	194.490	194.490	100%
5	ESTRUCTURAS SUBGRUPO	m2	41.00	157.700	647.820	5.67%	0.00	41.00	41.00	41.00	647.820	647.820	100%
6	Instalación de tubería de polietileno de 8" x 1.18	m	1.00	328.000	328.000	2.87%	0.00	1.00	1.00	1.00	328.000	328.000	100%
7	Extracción de tubería de polietileno de 8" x 1.18	m	1.00	328.000	328.000	2.87%	0.00	1.00	1.00	1.00	328.000	328.000	100%
8	Extracción de tubería de polietileno de 8" x 1.18	m	1.00	328.000	328.000	2.87%	0.00	1.00	1.00	1.00	328.000	328.000	100%
9	Extracción de tubería de polietileno de 8" x 1.18	m	1.00	328.000	328.000	2.87%	0.00	1.00	1.00	1.00	328.000	328.000	100%
10	Extracción de tubería de polietileno de 8" x 1.18	m	1.00	328.000	328.000	2.87%	0.00	1.00	1.00	1.00	328.000	328.000	100%
11	Extracción de tubería de polietileno de 8" x 1.18	m	1.00	328.000	328.000	2.87%	0.00	1.00	1.00	1.00	328.000	328.000	100%
12	Extracción de tubería de polietileno de 8" x 1.18	m	1.00	328.000	328.000	2.87%	0.00	1.00	1.00	1.00	328.000	328.000	100%
13	EXTRAS												
14	Items contratados por material de obra	m3	22.00	20.43	451.466	3.95%	0.00	22.00	22.00	22.00	451.466	451.466	100%
15	Trabajo de pintura	m2	30.00	30.000	900.000	7.89%	0.00	30.00	30.00	30.00	900.000	900.000	100%
COSTO TOTAL													5,107,382


TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01 Y FINAL	3 890 078
ADMINISTRACION	778 016
IMPREVISTOS	194 504
UTILIDAD	194 504
SUMA	5 057 102
TOTAL ACTA 01 Y FINAL	5 057 102
AMORTIZACION ANTICIPA	0
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	5 057 102

SON: CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:
Valor del Contrato (Fecha) Febrero 24 DE 2018
Valor Acta No. 01 Y FINAL
Saldo del Contrato

5 107 382
50 280
5 107 382

5 107 102
50 280
5 107 382


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista


V. B. LOIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
ING ZONA OCCIDENTE
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES Arreglo por emergencia de tubería conducción La Palma sector el basurero en el municipio de Riosucio Caldas

Item:	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE PLANO RECORD			Unidad:	ml	
No.	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud					
		42,00			42,00	42,00	
		TOTAL PRE-ACTA				42,00	

Item:	4	En material común de 0 a 2m			Unidad:	m3	
No.	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Alto			
		42,00	0,60	0,80	20,16	20,16	Instalación tubería
		1,00	2,50	2,00	5,00	25,16	En sitio de empalme
		1,00	2,50	2,00	5,00	30,16	En sitio de empalme
		TOTAL PRE-ACTA				30,16	

Item:	5	Dispersión de material sobrante en el sitio			Unidad:	m3	
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		longitud	Area				
		42,00	0,02	0,84	0,84	Volumen tubería	
		TOTAL PRE-ACTA				0,84	

Item:	7	Instalación de tubería de polietileno de 6" PN 16			Unidad:	ml	
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Cantidad					
		42,00		42,00	42,00	Instalación tubería	
		TOTAL PRE-ACTA				42,00	

Item:	8	Termo fusión pota/anche			Unidad:	un	
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Cantidad					
		1,00		1,00	1,00		
		TOTAL PRE-ACTA				1,00	

Item:	9	Empalme a tubería existente PVC			Unidad:	un
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				

		1,00	1,00	1,00	
		TOTAL PRE-ACTA		1,00	

Item:	10	Empalme a tubería existente polietileno incluye tornillos y empaque			Unidad:	un
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
		TOTAL PRE-ACTA			1,00	

Item:	11	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos metálicos de 1.5m c/u y alambre galvanizado			Unidad:	un
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
		TOTAL PRE-ACTA			1,00	

Item:	12	Transporte de tubería desde Chinchiná hasta le sitio			Unidad:	gl
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
		TOTAL PRE-ACTA			1,00	

Item:	14	Lleno compactado con material de la obra			Unidad:	gl
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		30,16		30,16	30,16	Excavaciones
		-0,84		-0,84	29,32	Menos material sobrante
		TOTAL PRE-ACTA			29,00	

Item:	15	Sellado de grietas			Unidad:	gl
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud				
		27,00		27,00	27,00	Excavaciones
				0,00	27,00	Menos material sobrante
		TOTAL PRE-ACTA			27,00	
