


# CONTRATO Y AÑO	00106 DE 2017	Acta N°	02 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AU e IVA)	65.209.557
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	ARMANDO HENAO BURGOS			3. VALOR TOTAL (1+2)	65.209.557
NIT O CC:	10.232.795			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	14.411.886
CDP (#, rubro y fecha)	00343 Y 0347 DE FEBRERO 24 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	16.091.446
RP (#, rubro y fecha)	000486 Y 485 DE MARZO 28 DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 + 4 - 5)	34.706.225
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 29 AL FONDO CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEG0 (No. 28- 13) BARRIO LAS COLINAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS - OBRA 2: OBRAS CIVILES Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO A MANERA DE SERVIDUMBRE Y QUE PASA POR EL INTERIOR DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE ALINCEP SEPULVEDA EN LA CARRERA 5 No. 6- 32 MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.- OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJON DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. -				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		
3- Pagos al FIC	X	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	✓
7- Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	✓
8- Ensayos de densidad.		
9- Diseño de Mezclas.		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28	X	✓
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


14-05-17  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR	
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE
NOMBRE	CARGO

  
 FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7068495100	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Tesorero

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN:**

Razón social: HENAO BURGOS ARMANDO  
 Identificación: CC-10232796  
 Código dependencia o sucursal: 0  
 Nombre dependencia o sucursal: 0  
 Fecha de generación del reporte: 2017-06-08  
 Fecha límite de pago: 2017-06-05  
 Fecha de pago: 2017-06-05  
 Pagada por: Banco Occidente

Pagada

Periodo pensión: 2017-05  
 Periodo salud: 2017-05  
 Referencia de pago (PIN): 8606190558  
 Tipo de planilla: 1  
 Clase de planilla: Normal  
 Número de la planilla: 8681226870

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	<u>SELECCIONAR TODOS</u> <u>SELECCIONAR NINGUNO</u>
230201	800229739	PROTECCION (ING-PROTECCION)	1	\$1,400	\$118,100	\$119,500	
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$1,100	\$92,300	\$93,400	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$2,500	\$210,400	\$212,900	

**PERSONAS NATURALES**  
**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y**  
**APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Manizales, junio 8 de 2017

Señores  
**EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
Manizales

Yo, **ARMANDO HENAO BURGOS**, identificado con C.C. No.: 10.232.796 de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Manizales a los (8) días del mes de junio de 2017

FIRMA





PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 8680763455  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8687792433  
 Fecha Pago Planilla: 2017-06-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	ARMANDO HENAO BURGOS	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10232796	D.V.	6
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 104B 29 40	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ahenaob2796@yahoo.com
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			Empleador
			TELÉFONO
			8740315
			0
			Empleador
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10232796	PRIMER APELLIDO	HENAO
PRIMER NOMBRE	ARMANDO	SEGUNDO APELLIDO	BURGOS
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		
Año: 2017	Mes: 05	Año: 2017	Mes: 06
Nro. DE TRABAJADORES	Vlf. TOTAL NÓMINA		
19	\$1		
			FORMA DE PRESENTACIÓN
			Único
			Nro. DE RADICACIÓN
			8680763455

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cat	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico	
CC-75056369	1	No	No	No	17	272	Salario	AGUDELO GALVIS JOHN JAIRO				\$737,717	
CC-16186681	1	No	No	No	17	380	Salario	ARAMBO PALOMO JUAN CARLOS				\$737,717	
CC-16110690	1	No	No	No	17	1	Salario	BAUTISTA MUÑOZ GONZALO				\$737,717	
CC-75085081	1	No	No	No	17	1	Salario	CAJON LONDOÑO CESAR AUGUSTO				\$737,717	
CC-5928410	1	No	No	No	17	1	Salario	GALLEGO MORALES JOSE JAVIER				\$737,717	
CC-10172868	1	No	No	No	17	380	Salario	GARCIA RAMIREZ CARLOS EDGAR				\$737,717	
CC-10180583	1	No	No	No	17	1	Salario	JIMENEZ JOSE JESUS				\$737,717	
CC-75089149	1	No	No	No	17	1	Salario	LUNA DANIEL MAURICIO				\$737,717	
CC-1057305215	1	No	No	No	17	272	Salario	MARIN MORALES JOHAN ALBERTO				\$737,717	
CC-10174534	1	No	No	No	17	380	Salario	MARTINEZ CHIGUYTO HERRANDO				\$737,717	
CC-75083548	1	No	No	No	17	1	Salario	MONTOYA NICAN HECTOR ALIDER				\$737,717	
CC-4418352	1	No	No	No	17	1	Salario	RAMIREZ RESTREPO FELIX				\$737,717	
CC-3133968	1	No	No	No	17	380	Salario	RODRIGUEZ GALINDO EDIER				\$737,717	
CC-4567952	1	No	No	No	17	1	Salario	RODRIGUEZ MUÑOZ CARLOS JULIO				\$737,717	
CC-10240928	1	No	No	No	17	1	Salario	BOTO NOEL				\$737,717	
CC-1054550346	1	No	No	No	17	380	Salario	VALENCIA BALLESTEROS LUIS ENRIQUE				\$737,717	
CC-1057305610	1	No	No	No	17	272	Salario	VALENCIA MURILLO MAURICIO				\$737,717	
CC-4419396	1	No	No	No	17	272	Salario	VALENCIA SEPULVEDA JOSE ORLANDO				\$737,717	
CC-10040076	1	No	No	No	17	1	Salario	VILLEGAS ABELARDO				\$737,717	

NOVEDADES																								
Identificación	I Fecha Ing	R Fecha Ret	T T D A S E	T T V D A S E	Fecha Mov Vsp	V V S T S L E T W	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha V A C Inicio	Fecha V A C Fin	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	Fecha A V P Inicio	Fecha A V P Fin	Fecha Ixp Inicio	Fecha Ixp Fin	
CC - 75056369	X 2017-05-18																							
CC - 16186681	X 2017-09-09																							
CC - 16186681	X 2017-05-12																							
CC - 16110690	X 2017-05-12																							
CC - 75085081	X 2017-05-03																							
CC - 5928410	X 2017-05-13																							
CC - 5928410	X 2017-05-09																							
CC - 10172868	X 2017-05-15																							
CC - 10172868	X 2017-05-15																							
CC - 10180583	X 2017-03-04																							



NOVIEMBRE

Identificación	I M G	Fecha Ing	R E T	Fecha Mat	T D E	T A D E	T V A S P P	Fecha Nov Vyp	V T S I L E T W	Fecha Slu Inicio	Fecha Slu Fin	I G E I n i c i o	I G E F i n	L M A	Fecha L e s A i n i c i o	Fecha L e s F i n	V A C I n i c i o	V A C F i n	Fecha V o t I n i c i o	Fecha V o t F i n	A V C P T	Fecha V a c I n i c i o	Fecha V a c F i n	I M L	Fecha I r p I n i c i o	Fecha I r p F i n			
																											X	X	X
CC - 10180583			X	2017-09-05																									
CC - 75089149			X	2017-09-05																									
CC - 75089149			X	2017-09-04																									
CC - 1057305215			X	2017-09-10																									
CC - 1057305215			X	2017-09-12																									
CC - 10174534			X	2017-09-16																									
CC - 10174534			X	2017-09-03																									
CC - 75083548			X	2017-09-03																									
CC - 75083548			X	2017-09-08																									
CC - 4418352			X	2017-09-09																									
CC - 4418352			X	2017-09-05																									
CC - 3133968			X	2017-09-10																									
CC - 4567952			X	2017-09-10																									
CC - 10240928			X	2017-09-08																									
CC - 1054550346			X	2017-09-09																									
CC - 1054550346			X	2017-09-10																									
CC - 1057305610			X	2017-09-09																									
CC - 1057305610			X	2017-09-10																									
CC - 4419396			X	2017-09-08																									
CC - 4419396			X	2017-09-10																									
CC - 10040076			X	2017-09-01																									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Apart	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vir no ret
CC - 75056369	PORVENIR	15	\$369,859	0.1600000	\$59,100	\$0	\$0	\$59,100	\$0	\$0	\$0
CC - 16186681	COLPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 16186681	COLPENSIONES	3	\$73,772	0.1600000	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	\$0	\$0	\$0
CC - 16110690	COLPENSIONES	19	\$467,221	0.1600000	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800	\$0	\$0	\$0
CC - 75085081	PORVENIR	28	\$688,536	0.1600000	\$110,200	\$0	\$0	\$110,200	\$0	\$0	\$0
CC - 5928410	COLPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 5928410	COLPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10172868	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10172868	PORVENIR	6	\$147,544	0.1600000	\$23,700	\$0	\$0	\$23,700	\$0	\$0	\$0



SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencial	Vlr no ret
CC - 10180583	COLPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10180583	COLPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75089149	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75089149	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305215	PORVENIR	2	\$49,182	0.1600000	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305215	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10174534	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10174534	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75083548	PROTECCION	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75083548	PROTECCION	2	\$49,182	0.1600000	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	\$0	\$0	\$0
CC - 4418352	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 4418352	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 3133968	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4567952	PORVENIR	30	\$737,717	0.1600000	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	\$0	\$0	\$0
CC - 10240928	COLPENSIONES	30	\$737,717	0.1600000	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1054550346	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054550346	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305610	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305610	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4419396	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4419396	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10040076	COLPENSIONES	28	\$688,536	0.1600000	\$110,200	\$0	\$0	\$110,200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 75056369	BUENA E.P.S. S.A.	15	\$368,859	0.0400000	\$14,800	\$0		\$0		\$0	15	\$368,859	5	0.0696000	\$25,700
CC - 16186681	COOMEVA EPS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 16186681	COOMEVA EPS	3	\$73,772	0.0400000	\$3,000	\$0		\$0		\$0	3	\$73,772	5	0.0696000	\$5,200
CC - 16110690	SALUD TOTAL	19	\$467,221	0.0400000	\$18,700	\$0		\$0		\$0	19	\$467,221	5	0.0696000	\$32,600
CC - 75085081	BUENA E.P.S. S.A.	28	\$688,536	0.0400000	\$27,600	\$0		\$0		\$0	28	\$688,536	5	0.0696000	\$48,000



SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5928410	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 5928410	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 10172868	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 10172868	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$147,544	0.0400000	\$6,000	\$0		\$0		\$0	6	\$147,544	5	0.0696000	\$10,300
CC - 10180583	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 10180583	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 75089149	EPS SURA	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 75089149	EPS SURA	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 1057305215	EPS- EPSC CAFESALUD	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 1057305215	EPS- EPSC CAFESALUD	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	\$0		\$0		\$0	2	\$49,182	5	0.0696000	\$3,500
CC - 10174534	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 10174534	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 75083548	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 75083548	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	\$0		\$0		\$0	2	\$49,182	5	0.0696000	\$3,500
CC - 4418352	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 4418352	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	\$0		\$0		\$0	2	\$49,182	5	0.0696000	\$3,500
CC - 3133968	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 4567952	EPSC SALUDVIDA	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	\$0		\$0		\$0	30	\$737,717	5	0.0696000	\$51,400
CC - 10240928	SALUD TOTAL	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	\$0		\$0		\$0	30	\$737,717	5	0.0696000	\$51,400
CC - 1054550346	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 1054550346	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800



SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Ant EG	Valor EG	Núm Ant Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057305610	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 1057305610	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 4419396	EPS- EPSC CAFESALUD	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 4419396	EPS- EPSC CAFESALUD	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 10040076	CAFESALUD	28	\$688,536	0.0400000	\$27,600	\$0		\$0		\$0	28	\$688,536	5	0.0696000	\$48,000

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	OCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SEMA	Aporte SEMA	Tarifa ICSF	Aporte ICSF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-75056369	CCF DE CALDAS	15	\$368,859	0.0400000	\$14,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-16186681	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-16186681	CCF DE CALDAS	3	\$73,772	0.0400000	\$3,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-16110690	CCF DE CALDAS	19	\$467,221	0.0400000	\$18,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75085091	CCF DE CALDAS	28	\$688,536	0.0400000	\$27,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-5928410	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-5928410	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10172868	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10172868	CCF DE CALDAS	6	\$147,544	0.0400000	\$6,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10190583	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10190583	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75089149	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75089149	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1057305215	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1057305215	CCF DE CALDAS	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10174534	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10174534	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75083548	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75083548	CCF DE CALDAS	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-4418352	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-4418352	CCF DE CALDAS	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	



APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-3133968	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4567952	CCF DE CALDAS	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10240928	CCF DE CALDAS	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054550346	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054550346	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057305610	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057305610	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4419396	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4419396	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10040076	CCF DE CALDAS	28	\$688,536	0.0400000	\$27,500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2017 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFPP	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
COLPENSIONES	6	\$335,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$335,000
COLPONDOS	2	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$16,000
PORTVENIR	9	\$355,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$355,000
PROTECCION	1	\$11,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$11,900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IMA	VLR NETO APORTE \$ DE COT	DÍAS APORTE MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S COT	RADICACIÓN AUTOLIT O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO O ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD
EPSC SALUDVIDA	1	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600	0	\$0	\$0	\$29,600	\$0	0	\$0	\$0	\$29,600	\$0	\$11,300
EPSC CAFESALUD	2	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000	0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$1,900
NUOVA S.P.S. S.A.	11	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	0	\$0	\$0	\$66,400	\$0	0	\$0	\$0	\$66,400	\$0	\$24,800



**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Conocimiento para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 899990034-1

**¡IMPORTANTE!** El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón.

REFERENCIA		
23195496		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
13	06	2017
FECHA VENCIMIENTO		
18	06	2017

<b>Primer Nombre ó Razón Social :</b> ARMANDO	<b>Identificación :</b> 10232796
<b>Primer Apellido :</b> HENAO BURGOS	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$73,800.00
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	<b>SUBTOTAL</b>	\$73,800.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> →	\$73,800.00

**Observaciones**  
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.  
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).  
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).  
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.  
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de estas.



(415)7707012100010(8020)23195496(3900)073800(96)20170618

BANCOLOMBIA  
 RECIBIDO Fecha: 13/06/2017  
 Códig: 29232 - SENAFIC  
 Suc: 949 - CENTRO DE PAGOS AUTIZADOS  
 Ciudad: MANIZALES  
 Cx: 045 Suc: 405  
 Valor Total: \$ 73,800.00  
 Form. de Pago Efectivo: 10032796  
 Ref: 23195496



CONVENIO No 29232

**REFERENCIA No. 23195496**

Ciudad	Nº Cédula	10232796	Teléfono
--------	-----------	----------	----------

Nombre del Pagador /Cliente: **ARMANDO**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$73,800.00</b>

RECIBIDO Fecha: 13/06/2017  
 Códig: 29232 - SENAFIC  
 Suc: 949 - CENTRO DE PAGOS AUTIZADOS  
 Ciudad: MANIZALES  
 Cx: 045 Suc: 405  
 Valor Total: \$ 73,800.00  
 Form. de Pago Efectivo: 10032796  
 Ref: 23195496

## CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10232796
Primer Nombre ó Razón Social	ARMANDO
Primer Apellido (si es Persona natural)	HENAO BURGOS
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 8 11 02
Ciudad de Domicilio	CHINCHINA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8501947
Correo electrónico	paolacachetes@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	NRO 0106
Nombre Obra	DORADA ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	01/05/2017
Fecha Terminación Obra	31/05/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA - CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
<b>Aporte FIC</b>	<b>\$73,772.00</b>
<b>Aporte SENA</b>	<b>\$0.00</b>
Valor del Pago	<b>\$73,772.00</b>
Total Pagado	<b>\$73,772.00</b>
Valor Total	<b>\$73.800,00</b>
IP Origen	190.70.76.44
Nro. Transacción eCollect	23195496
Fecha Proceso	13/06/2017 08:12:37 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO





F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No.

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566  
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

Manizales, junio 13 de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

ARMANDO HENAO BURGOS

CEDULA O NIT:

10.232.796

DIRECCION:

CALLE 104B No. 29- 40 MANIZALES TEL: 314 402 9026

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 - CONTRATO No. 0106 DE 2017.

SUBTOTAL:	\$	16.091.446,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ( ):	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	16.091.446,00

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
cc. 10' 232 796

## BITÁCORA

CONTRATO: N° 0106 DE 2017.

CONTRATANTE: EMP CALDAS.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS.

OBJETO: OBRA 3 CONSTRUCCIÓN ALCAÑTARILLADO  
CALLETON DE LA CALLE 12A ENTRE CALLES 20Y21  
DE LA DORADA CALDAS.

MAYO 09 DE 2017.

se hace visita al sitio de la obra con el  
acompañamiento del interventor el contratista el  
Maestro de la obra y la Trabajadora social.

MAYO 10 DE 2017.

se inician trabajos de localización y replanteo  
se coloca la Malla informativa y se hace la  
señalización respectiva.  
se hace el cerramiento.

MAYO 12 DE 2017.

se inicia el corte en la calle 12 para hacer cuadradas  
en la vía, se inician las señalizaciones y se inicia  
la excavación.

MAYO 15 DE 2017.

se terminan las excavaciones y se identifican las  
domiciliarias que se encuentran descolando por las  
calles y se autoriza por parte de la interventoria  
el cambio de domiciliarias para que se cambien por  
las domiciliarias nuevas.



De un DERRUMBE Que se ocasiono por la alta Inercia  
Que hubo la noche Anterior.

MAYO 22 DE 2017.

se termina de instalar la tubería. De la Red p/Plat.  
y se prosede A instalar las pilletas para la conexión de  
las domiciliadas.

MAYO 25 DE 2017.

Terminada la instalación de las domiciliadas se  
inician los Memos

MAYO 28 DE 2017.

se terminan los Memos y se inician los vacíos del  
concreto tanto de pavimento como de Andenes.

MAYO 30 DE 2017.

se hace el retiro del material sobrante y se continúa  
con el Arco general para así dar por terminada la obra













NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 1



OBRA: REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON DE LA CALLE 12 A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN  
 EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS CALDAS  
 FECHA DE PAGO: MAYO 20 DE 2017  
 CONTRATANTE: EMPOCALDAS  
 CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
 FECHA: 09 AL 21 DE MAYO DE 2017

No CAR	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIF	VRJ DIA	VEX 7360	TD 12	T/E	VEX 4688	TRAVIS	DED	T/A PAGAR	FRAMA
1	OF CARLOS EDGAR	GARCIA RAMIREZ	10.172.868	70.000	7360	12		4688	31080	67200	804.000	Carl
2	AY LUIS ENRIQUE	VALENCIA VALLESTROS	1.054.550.348	30.000	4688	12		4688	31080	28800	362.000	Carlos Garcia
3	AY EDIER	RODRIGUEZ GALINDO	3.133.968	30.000	4688	10		4688	23900	24000	302.000	Luis Enrrique
4	OF NOEL	SOTO	10.240.928	70.000	4688	12		4688	31080	67200	804.000	Edier Rodriguez
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA											\$	



NOMINA PARA PAGO DE SUEROS Nro. 2



OBRA: REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON DE LA CALLE 12 A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN  
 EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS CALDAS  
 FECHA DE PAGO: MAYO 29 DE 2017  
 CONTRATANTE: EMPOCALDAS  
 CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
 FECHA: 22 AL 30 DE MAYO DE 2017

No	CAR	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIF	VRU DIA	V/EX 7360	T/D 9	T/E	V/EX 4988	TRANS	DED	T/A PAGAR	FIRMA
1	OF	CARLOS EDGAR	GARCIA RAMIREZ	10.172.868	70.000	7360	9			23310	50400	603.000	Carlos E Garcia
2	AY	LUIS ENRRIQUE	VALENCIA VALLESTEROS	1.054.590.346	30.000	4988	9			23310	21600	272.000	Luis Enrique
3	AY	EDIER	RODRIGUEZ GALINDO	3.133.968	30.000	4988	9			23310	21600	272.000	Edier Rodry
4	OF	NOEL	SOTO	10.240.926	70.000	4988	9			23310	50400	603.000	Noel Soto

TOTAL A PAGAR. PRESENTE NOMINA \$



7. Categoría: 0 - 2 Actualización

8. Base de datos: 00000000000000000000

4. Número del formulario:

14393132620



14393132620

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 2 3 2 7 9 6 - 8

6. Of. 12. Dirección: 12. Dirección:

12. Dirección: Manizales

14. Buzón electrónico:

1 0

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión líquida

25. Tipo de documento:

2. Cédula de ciudadanía

IDENTIFICACION

26. Número de identificación:

1 3 1 0 2 3 2 7 9 6

27. Facto extendido:

1 9 7 0 0 1 1 7

Lugar de expedición:

COLOMBIA

28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

1 6 9 Caldas

1 7

30. Ciudad/Municipio:

Manizales

0 0 1

31. Primer apellido:

HENAO

32. Segundo apellido:

BURGOS

33. Primer nombre:

ARMANDO

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Siglo:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9 Caldas

40. Ciudad/Municipio:

1 7 Manizales

0 0 1

41. Dirección principal:

CL 104 B 29 40 BRR LA ENEA

42. Correo electrónico:

ahenao2796@yahoo.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1:

8 7 4 0 3 1 5

45. Teléfono 2:

3 1 4 4 0 2 9 0 2 6

CLASIFICACION

Actividad principal

46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 4 2 9 0 2 0 1 2 0 2 2 9

Actividad económica

48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 7 1 1 0 2 0 1 2 0 2 2 9

Otras actividades

50. Código: 1 2 4 2 1 0 4 1 1 2

Duración

51. Código:

52. Número establecimiento:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 1 2 5

## 12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CIP			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Aprobado: SI  NO

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2 0 1 6 1 0 1 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia, corresponde, management o lo contrario, cualquier falsedad o inexactitud en sus datos podrá ser sancionada.

Artículo 18 (Decreto 2493) de Noviembre de 2013

Firma del solicitante

5. Responsable de verificaciones de la DIAN nacional

Firma autorizada

62. Apellido: CARDONA CARDONA WILSON

63. Cargo: Gestor III





F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	Junio 2 de 2017.	Acta parcial	02	Acta final	
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	----	------------	--

Número del contrato	0106 DE 2017
Objeto:	OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 28 AL FONDO CASA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 28- 13) BARRIO LAS COLINAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.- OBRA No. 2: OBRAS CIVILES Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO A MANERA DE SERVIDUMBRE REPOSICIÓN DE Y QUE PASA POR EL INTERIOR D ELA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ ALINCER SEPÚLVEDA No. 6- 32, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.- OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO , LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZÁLEZ.-
Nombre Contratista:	ARMANDO HENAO BURGOS.
Fecha del contrato:	MARZO 23 DE 2017
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45)DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 65.209.557,00
Fecha de iniciación:	ABRIL 10 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MAYO 24 DE 2017
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

**1. AVANCE DEL CONTRATO**

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	23.11%
Avance físico Acumulado	46.78%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	40
Avance Porcentual:	88.89%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)  
SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRAFICO

1.5. Problemáticas con la obra

**ANTECEDENTES:**

-**OBRA No. 1:**- La problemática que dio origen a la ejecución del Contrato No. 00106 de 2016, fue generada por infiltraciones de Aguas negras y otras aguas que brotaban en el Interior de la Vivienda de señor JONIER GALLEGO Propagando en el ambiente tanto interior como exterior malos Olores perjudiciales para la Salud de los moradores del sector denominado La Comunidad del Chavo.

-La situación se propago hasta el punto que se presento hundimiento en el único sendero de acceso al sector creando peligro para todo tipo de ser Viviente y humano que transitara, dando lugar a la intervención de una forma inmediata.

-**OBRA No.2:**- La Red de Alcantarillado Existente Es una SERVIDUMBRE que viene de la Carrera 4 con carrera 6 y 7 y que recorre los patios de algunas viviendas y descola en la Carrera 4 No. 6-32 donde existe una Cámara de Inspección de Diámetros 1,20 m Frente a la Residencia y Local Comercial donde reside el señor ALINCER SEPÚLVEDA. -

-Se ha presentado socavones y fallas en algunos sectores del Interior de la Vivienda, donde se ha afectados Accesos de circulación interna y en especial la escalera interna y lleva al patio interior; La conducción existente es en cemento de 8" y según parece presenta aplastamiento, saturamiento, y represamiento con afloramientos en el interior del área que comprende la Vivienda, provocando inestabilidad zonas de circulación Interna.

-**OBRA No. 3:** En el sector de la Calle 12A Entre calles 20 y 21 del Municipio de LA DORADA, el Callejón no Presenta Red de Alcantarillado y sus aguas residuales en total de Cinco (5) usuarios vierten sus aguas a la Carrera 12 pasando por el Interior de la Residencia de la Señora LUZ MARINA GONZÁLEZ Y Otras por el Callejón en tuberías de gres superficialmente sin rumbo establecido, creándole malestar y perjuicio a las personas residentes del callejón y aledaños.

**DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

-El Objetivo del presente contrato No. 0106 de 2017, es Captar, Empalmar y Descolar las Aguas subterráneas, Aguas Residuales existente en cada unos de Sectores a





intervenir en las Obras No. 1,2,3 Vertidas por las fallas que presenta las tuberías existentes.

#### **OBRA No. 1**

-Se corrigió y cambio la red principal en Cemento de 6" por 8" en PVC-S tipo Novafor corrigiendo el alineamiento mediante la Construcción de Cajas de 0,80 x 0,80 en concreto y con base y cañuelas bien definidas para una mejor y pronta evacuación.

-El sendero fue pavimentado en su totalidad para que por este medio se encauce mejor las aguas lluvias y evitar las posibles infiltraciones hacia el interior de los taludes adyacentes y que posiblemente provoque deslizamiento.

-Las Obras Ejecutadas en Marquetalia, se terminaron y en la actualidad se encuentra funcionando, cumpliéndose con el fin propuesto como fue la Captación de todas las aguas existente en el sub-suelo y las aguas residuales del sector.

-Se corrigieron un total de 6 domiciliarias aunque su tubería se encontraba en buen estado se hizo el correspondiente cambio a Tubería ondulada PVC-S Tipo Novafort de 6" empalmada a la red Principal cambiada en su totalidad.

#### **OBRA No. 2**

-Los Señores LUIS ALINCER SEPÚLVEDA Y WILSON MONTES CASTRILLÓN, Propietarios y socios del Inmueble y Local Comercial, determinaron no estar de acuerdo con la Construcción de la Reposición de la red de Alcantarillado, condicionando la Ejecución de la Reposición a pretensiones de Carácter Monetario, manifestado en el Derecho de Petición No. 2017- ei-00001431.

-Estas pretensiones fue manifestadas a última hora, cuando se tenía todo Claro para dar Inicio de trabajos, Manifestando que con la ejecución de las obras dejarían de percibir ganancias por ventas y pagos a empleados los cuales estos dos Parámetros deberían ser cubiertos y asumidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pretensiones que se rechazo.

-En vista al inconveniente presentado, se determina no ejecutar los trabajos contratados según Contrato No. 0106 de 2017, y se espera una contestación al oficio CO-2017-EI-00004041, DE ACEPTACIÓN.

#### **OBRA No. 3**

-Con la Construcción del sistema de ALCANTARILLADO del callejón, se erradica la SERVIDUMBRE presentada en la residencia de la señora LUZ MARINA GONZÁLEZ, sonde el perjuicio era inmenso y perjudicial para la salud de los habitantes de dicha Vivienda.

-El Objeto principal de la obras No. 3 es la Construcción de la Red de Alcantarillado del Callejón con descole a la Red Existente sobre la Calle 20, donde se Construyo una



Cámara de Inspección de diámetro 1,20 metros e Integrar el nuevo alcantarillado a la Red Principal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

-La red de Alcantarillado quedo construida en tubería PVC-S tipo NOVAFOR DE 10" con domiciliarias en tubería PVC- S 6" tipo NOVAFOR con sus respectivos accesorios.

-Como las Cinco (5) domiciliarias Construidas todas estaban en Buen estado de funcionamiento y en tubería PVC en menor diámetro pero en con conexión a tuberías en gres o cemento.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	65.209.557,00
Inversión ejecutada en el periodo:	16.091.446,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	28.94%
Inversión total ejecutada:	30.503.332,00
Porcentaje total ejecutado:	51.05%

2.1.-CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros el Estado S.A.	42-44-101098864	27/03/2017	11/05/2020	\$ 13.041.911,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado S.A.	42-44-101098864	Cinco Años	0 meses y 0 días	\$ 13.041.911,40
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A.	42-44-101098864	27/03/2017	11/08/2017	\$ 19.562.867,10
Responsabilidad Civil	Seguros del Estado S.A.	42-40-101023587	27/03/2017	11/08/2017	\$ 19.562.867,10

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	x	X	X	X	X

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)  
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

*Handwritten signature/initials*



4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MAYO 22 DE 2107	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1      4

ABEL ROJAS RUBIANO  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 2B AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLUBAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-  
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
CONTRATO: 00106 DE 2017  
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



AH



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 2B AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLIBAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-  
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
CONTRATO: 00106 DE 2017  
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



HH

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 2B AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLIBAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-  
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
CONTRATO: 00106 DE 2017  
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



Handwritten signature or initials.



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 2B AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGÓ (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLIBAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-  
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
CONTRATO: 00106 DE 2017  
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.  
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
CONTRATO: 00106 DE 2017  
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



APP



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.  
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
CONTRATO: 00106 DE 2017  
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



ABP

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -


REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS

CONTRATO: 00106 DE 2017

FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017

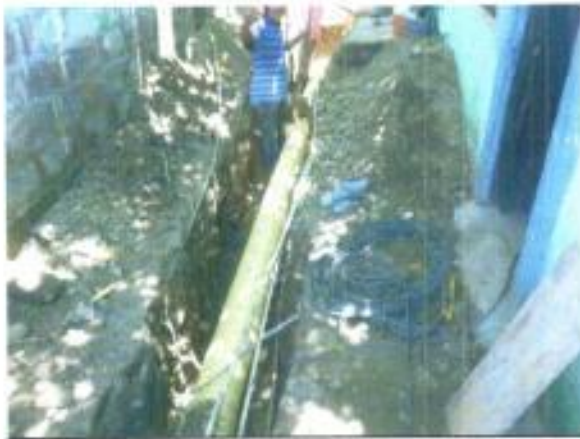



ABT



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.  
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS  
CONTRATO: 00106 DE 2017  
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



APT

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS

CONTRATO: 00106 DE 2017

FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



ABF



 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>	
	<b>TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS</b>	

FECHA	10/05/2017
NOMBRE DEL PROVEEDOR	ALMACEN PARIS
NIT O CEDULA	890807213-6

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	
----------	--	-----------------	--

<b>Certificación de la tubería</b>	
<b>Numero de certificado</b>	
<b>Organismo de certificación</b>	ICONTEC
<b>Numero de Lote</b>	12681170322-2
<b>Fabricante de la tubería:</b>	PAVCO
<b>NIT-DV:</b>	890.807.213-6

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
_____ NOMBRE	 _____ FIRMA
