






F-GC-11  
Versión 6  
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	129 de 2022		
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ V.	NIT O CC:	75.106.064
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS		
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.			X
2. Paz y salvo oficina de trabajo.			X
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.			X
4- Pago FIC.			X
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).			N/A.
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).			X
7- Original del Acta de Liquidación.			X
8- Certificado de obra.			X
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)			N/A.
<p><b>Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.</b></p> <p><b>Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.</b></p>			
 NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA		 FIRMA	
Fecha		13 de diciembre de 2022	
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>			
OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE		
NOMBRE	CARGO		FIRMA

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO  
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO**

CONTRATO 129 DE 2022

OBJETO REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN SAMANÁ, CALDAS  
 VALOR \$59.638.148  
 CONTRATISTA CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA  
 CEDULA 75.106.064

PLAZO 60 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.  
 PÓLIZA DE RCE No.

COMPañIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	1-ago-22	31-dic-22	\$ 19.711.655,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	1-ago-22	30-sep-25	\$ 13.141.103,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	13-dic-22	13-dic-27	\$ 13.141.103,00

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 129 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

29-12-2022



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
Gerente



Elaboró: SUSANA GOMEZ OSORIO



BERTHA LUCÍA GÚZMAN DÍAZ  
Secretaría General





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101052729		ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	
14 12 2022			01 08 2022			00:00		30 09 2027			23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA												

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL HERNANDEZ VALENCIA, CARLOS EDUARDO								IDENTIFICACIÓN CC: 75.106.064			
DIRECCIÓN: CRA 22 NRO 47-15 APTO 1002						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3136762238		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 129 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, RELACIONADO CON RESPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	01/08/2022	31/12/2022	\$19,711,655.00	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/08/2022	30/09/2025	\$13,141,103.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/09/2022	30/09/2027	\$13,141,103.00	

**ACLARACIONES**

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, AL CONTRATO DE OBRA-129 DE 2022, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO ASI:  
AMPARO : ESTABILIDAD DE LA OBRA  
VIGENCIA DESDE : 13-12-2022 HASTA EL 13-12-2027  
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****45,993,861.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101052729

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaramé B. - Secretaría General

FIRMA TOMADOR



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**  
**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101052729		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
14	12	2022	01	08	2022	00:00	30	09	2027	23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA

<b>DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO</b>											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HERNANDEZ VALENCIA, CARLOS EDUARDO										IDENTIFICACIÓN CC: 75.106.064	
DIRECCIÓN: CRA 22 NRO 47-15 APTO 1002						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3136762238		

<b>DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO</b>											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P										IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*[Firma Autorizada]*

42-45-101052729  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

*[Firma Tomador]*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





# MINISTERIO DEL TRABAJO

## MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

No. Radicado: 08SE2022741700100004021  
 Fecha: 2022-10-21 02:32:04 pm  
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS  
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL  
 Destinatario CARLOS EDUARDO  
 Anexos: 0 Folios: 1  
 08SE2022741700100004021

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,



### HACE CONSTAR A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	21 de octubre
Nombre y/o Razón Social:	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA
Identificación:	75.106.064

### NO REGISTRA SANCIONES

**ADVERTENCIA:** El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

### ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES


Dado en la ciudad de Manizales, el día 21 de octubre de 2022.

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
 Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfono PBX:**  
 (601) 3779999  
 Bogotá

**Atención Presencial**  
 Con cita previa en cada  
 Dirección Territorial o  
 Inspección Municipal del  
 Trabajo.

**Línea nacional gratuita,**  
**desde teléfono fijo:**  
 018000 112518  
**Celular desde Bogotá:**120  
 www.mintrabajo.gov.co

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.





## MINISTERIO DEL TRABAJO

RICARDO ANDRES RINCON  
MONTOKA  
Director Territorial (E)

Transcriptor: Luz Marina Coral H  
Elaboró: Luz Marina Coral H  
Revisó/Aprobó: R. Rincón

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfono PBX:**  
(601) 3779999  
Bogotá

**Atención Presencial**  
Con cita previa en cada  
Dirección Territorial o  
Inspección Municipal del  
Trabajo.

**Línea nacional gratuita,**  
**desde teléfono fijo:**  
018000 112518  
**Celular desde Bogotá:**120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003  
(PERSONAS NATURALES)**

**EL INGENIERO CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA CERTIFICA QUE:**

El Ingeniero **CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA** identificado con C.C. 75.106.064 de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de los aportes y/o el de los empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), correspondientes a los aportes y/o al de los empleados, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

Dada en Manizales a los 13 días del mes de diciembre de 2022

FIRMA



---

**CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA**  
C.C. 75.106.064 de Manizales  
T.P. 17202140892 CLD  
INGENIERO CIVIL



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 75106064		HERNANDEZ VALENCIA CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	Exonerado SENA e ICBF
8650144		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Ciudad-Departamento	Valor
2022-09	1702428160	MANIZALES-CALDAS	\$989,700
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Salud	Ciudad-Departamento	Valor
2022-09	1702428160	MANIZALES-CALDAS	\$989,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Situación: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)																							
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)																							
1	CC 75106064	HERNANDEZ CARLOS	15-14	30	\$2,790,511	\$446,500	EP010	30	\$2,790,511	\$446,500	0	0	\$2,790,511	\$446,500	14-11	30	\$2,790,511	\$446,500	0	0	\$2,790,511	\$446,500	
<b>Total Afiliados( 1)</b>																							



Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 7510606-4		HERNANDEZ VALENCIA CARLOS EDUARDO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CRA 22 # 47-15		MANIZALES-CALDAS		8858 144		SI	

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	2022-09	1702428160	9441340520	1	Planilla	2022/10/18	2022/10/12	Banco	Valor
								BANCOLOMBIA	\$989,700

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$194,300	\$0	\$0	\$194,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SURA (ANTES SÚSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$348,900	\$0	\$0	\$348,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$989,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$989,700</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucesal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF		
Identificación	dv	Razon Social			PRINCIPAL		CRA 22 N 47-15		MANIZALES-CALDAS		8859432		SI	
MIT 75106064	0	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor		
Período	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Dias Mora	Valor			
2022-09	2022-10	1710499153	9441435223	E		2022/10/18	BANCOLOMBIA		0		\$823,600			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	ing	rec	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas
		Centro de Trabajo: REPOSICIONALCANTARRILLO SAMANA (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: REPOSICIONALCANTARRILLO SAMANA (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: REPOSICIONALCANTARRILLO SAMANA (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: REPOSICIONALCANTARRILLO SAMANA (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: REPOSICIONALCANTARRILLO SAMANA (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: REPOSICIONALCANTARRILLO SAMANA (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: REPOSICIONALCANTARRILLO SAMANA (6 Afiliados)	
		Ciudad: SAMANA Depto: CALDAS (6 Afiliados)		Ciudad: SAMANA Depto: CALDAS (6 Afiliados)		Ciudad: SAMANA Depto: CALDAS (6 Afiliados)		Ciudad: SAMANA Depto: CALDAS (6 Afiliados)		Ciudad: SAMANA Depto: CALDAS (6 Afiliados)		Ciudad: SAMANA Depto: CALDAS (6 Afiliados)		Ciudad: SAMANA Depto: CALDAS (6 Afiliados)	
1	EC 14119379	MUNOZ DIEGO	X												
2	EC 4597851	BURQUE LUIS	X												
3	EC 1149452499	HERNANDEZ GILBERTO	X												
4	EC 16114285	MUNOZ LUIS	X												
5	EC 1061656598	QUINTERO CRISTIAN	X												
6	CC 1053848764	ZAVATA CRISTIAN	X												
<b>Total Afiliados(6)</b>															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucesal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF		
Identificación	dv	Razon Social			PRINCIPAL		CRA 22 N 47-15		MANIZALES-CALDAS		8859432		SI	
MIT 75106064	0	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Período	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Dias Mora	Valor		
2022-09	2022-10	1710499153	9441435223	E		2022/10/18	BANCOLOMBIA		0		\$823,600		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
								SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	6	\$425.300	\$0	\$0	\$425.300	\$425.300
PORVENIR	230301	800.224.808	8	2	\$198.500	\$0	\$0	\$198.500	\$198.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	4	\$226.800	\$0	\$0	\$226.800	\$226.800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.490	5	6	\$185.300	\$0	\$0	\$185.300	\$185.300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900.935.126	7	6	\$185.300	\$0	\$0	\$185.300	\$185.300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	6	\$106.500	\$0	\$0	\$106.500	\$106.500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	6	\$106.500	\$0	\$0	\$106.500	\$106.500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	6	\$106.500	\$0	\$0	\$106.500	\$106.500
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>\$823,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$823,600</b>	<b>\$823,600</b>



BANCOLOMBIA  
COMPROBANTE DE PAGO  
ID GRUPO: 05430005145531 FECHA: 2022/10/21 HORA: 14:55:3  
CONVENIO: 29232 - SEÑA FIC CODIGO DE BARRAS  
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 452  
TOTAL EFE: \$ 150,000.00  
TOTAL CHG: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 150,000.00  
NRO. FACTURA  
7194444

VALOR FACTURA  
\$ 150,000.00

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE DE GERENCIA**


Servicio Nacional De Aprendizaje  
Ministerio de Trabajo  
www.sena.edu.co NIT 899999034-1\*

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

**REFERENCIA**  
No. 78706292

**FECHA DE EXPEDICIÓN**  
19 10 2022  
**FECHA VENCIMIENTO**  
24 10 2022

**Nombre Pagador** CARLOS EDUARDO NIT o c.c. 751060640  
**Dirección** CALLE 46 2525 Teléfono +57,313

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Caldas		
	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 150,000.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL FACTURA</b> 	\$ 150,000.00

**Observaciones**

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.  
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.  
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certleportes@sena.edu.co  
Términos y condiciones podrá encontrarlos en [www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 06430005145754 FECHA: 2022/10/21 HORA: 14:57:5

CONVENIO: 29232 - SENAFIC CODIGO DE BARRAS

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 458

TOTAL EFE: \$ 125,000.00

TOTAL CHQ: \$ 0.00

TOTAL: \$ 125,000.00

NRO. FACTURA

7194447

VALOR FACTURA

\$ 125,000.00

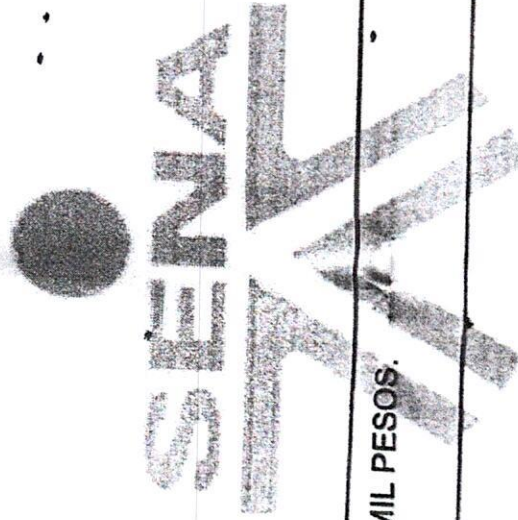

# UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Ministerio de Trabajo  
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

**IMPORTANTE:** El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

<b>REFERENCIA</b>	<b>No. 78706690</b>
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	19 10 2022
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	24 10 2022

**Nombre Pagador** CARLOS EDUARDO  
**Dirección** CALLE 46.2525  
 MIT o c.c. 751060640  
 Teléfono +57,313

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		
3-2-07-1-02-1-04-43		
Caldas		
		
<b>CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS.</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 125.000.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL FACTURA</b> 	\$ 125.000.00

**Observaciones**  
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
 La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
 Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.  
 Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).  
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.  
 Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co  
 Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	No. 129 DE 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
NIT	890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
<b>OBJETO</b>	<b>REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS</b>
CONTRATISTA/ REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA
C.C.	75.106.064 DE MANIZALES
MUNICIPIO	SAMANÁ – CALDAS
VALOR INICIAL	\$ 65.705.515
ADICIÓN	\$ 0
VALOR TOTAL OBRA	\$ 59.638.148 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 59.638.148
SALDO NO EJECUTADO	\$ 6.067.367
RECURSOS	OBRAS POIR
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA No. 1	0
FECHA DE FINALIZACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CDP:	00607 DEL 20 DE MAYO DE 2022
RP:	000850 DEL 28 DE JUNIO DE 2022.

29 - 12 - 2022 - 3

En la ciudad de Manizales a los \_\_\_\_\_, se reunieron los señores: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO como Ingeniero de Zona Supervisor de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Ingeniero CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA, con el fin de realizar el ACTA DE CUMPLIMIENTO del contrato de obra No. 129 DE 2022.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las actividades realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado del presente contrato.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**


**PRIMERO  
LA GENTE**


Empocaldas empocaldas\_oficial


empo@empocaldas.com.co


www.empocaldas.com.co

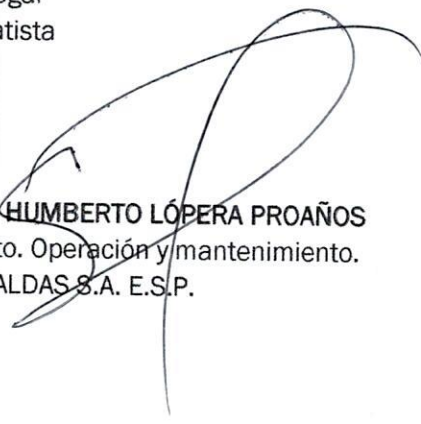
No siendo pto el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


  
**OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO**  
Ingeniero de zona  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
V. Bo. **BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**  
Secretaria General  
EMPOCALDAS S.A E.S. P

**29 = 12 - 2022 -**  
  
**CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA**  
Rep. Legal  
Contratista


  
VoBo.  
**SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS**  
Jefe Dpto. Operación y mantenimiento.  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.




EMPICALDAS S.A.S E.S.P		EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS REGIONAL SAMANA - CALDAS			
CONTRATO No: 129 DE 2022		ACTA No.: 3 y FINAL		FECHA CONTE: 01 DE OCTUBRE DE 2022	
OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS		FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 1 DE 2022 ; FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022		FECHA VENCIMIENTO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
MUNICIPIOS: SAMANA, CALDAS		VALOR OBRA: \$ 65.705.515		VALOR ADICIÓN: NA	
REPRESENTANTE LEGAL:		SUPERVISOR: OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO		FECHA: NOVIEMBRE 22 DE 2022	
CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA					

OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUM PRESENTE ACTA		% OBRA		
			CANTIDAD	VR UNITARIO	CANT	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	% ACUM	CANT		VR TOTAL	HECUTADO
<b>PRELIMINARES</b>													
1.1	Bodega para campamento (incluye adecuaciones)	mes	2,00	\$ 391.910	783.820	2,00	783.820,00	0,00	0,00	0%	2,00	783.820	100%
1.2	Localización y replanteo de redes, incluye plano récord	m2	92,00	\$ 6.452	593.584	92,00	593.584,00	0,00	0,00	0%	92,00	593.584	100%
1.3	Bocaniza y limpieza	m2	18,00	\$ 2.738	49.284	18,00	49.284,00	0,00	0,00	0%	18,00	49.284	100%
1.4	Cerramiento en polibotarras verde de 14-2m, paralelas en guadua y cinta plástica	ml	196,00	\$ 15.162	2.971.752	100,00	1.516.200,00	0,00	0,00	0%	100,00	1.516.200	51%
1.5	Puente peatonal provisional en madera (ancho=1,40 m)	ml	8,40	\$ 45.990	388.316	1,00	45.990,00	0,00	0,00	0%	1,00	45.990	12%
1.6	Suministro, transporte e instalación señales preventivas, reglamentarias e informativas	und	2,00	\$ 193.342	386.684	2,00	386.684,00	0,00	0,00	0%	2,00	386.684	100%
1.7	Emplazamiento de valla institucional según diseño empocaldas 2x4 mt	und	1,00	\$ 646.651	646.651	1,00	646.651,00	0,00	0,00	0%	1,00	646.651	100%
<b>DEMOLICIONES</b>													
2.1	Demolición de andenes y sardines en concreto hidráulico	m3	9,20	\$ 92.764	853.428	9,31	863.778,00	0,00	0,00	0%	9,31	863.776	101%
2.2	Demolición de pavimento en concreto hidráulico	m3	1,10	\$ 108.064	118.870	0,88	95.575,68	0,00	0,00	0%	0,88	95.530	80%
2.3	Corte mecanizado de pavimento 0,07m	m2	1,26	\$ 9.686	1.220.436	196,11	1.899.521,00	0,00	0,00	0%	196,11	1.899.521	166%
<b>EXCAVACIONES</b>													
3.1	Excavación en zanja - Material común 0,0 a 2,0 bits	m3	95,80	\$ 33.509	3.210.162	35,33	1.183.911,00	0,00	0,00	0%	35,33	1.183.911	37%
3.2	Excavación en zanja - Conglomerado 0,0 a 2,0 bits	m3	63,90	\$ 45.552	2.806.281	81,24	3.700.746,00	0,00	0,00	0%	81,24	3.700.746	127%
<b>REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO</b>													
4.1	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada Ø=160 mm (6") para alcantarillado	ml	24,00	\$ 23.368	560.832	38,70	927.710,00	0,00	0,00	0%	38,70	927.710	160%
4.2	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada Ø=250 mm (10") para alcantarillado, incluye manejo de aguas	ml	6,00	\$ 31.572	189.432	6,00	189.432,00	0,00	0,00	0%	6,00	189.432	100%
4.3	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada Ø=315 mm (12") para alcantarillado, incluye manejo de aguas	ml	14,00	\$ 35.988	503.832	11,35	408.464,00	0,85	23.392,00	5%	12,00	431.856	86%
4.4	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada Ø=400 mm (16") para alcantarillado, incluye manejo de aguas	ml	72,00	\$ 53.145	3.826.440	62,00	3.294.960,00	7,00	372.016,00	10%	69,00	3.667.005	96%
4.5	Transporte e instalación empalme para PVC corrugada de 400 x 160 mm para domiciliar de alcantarillado (incluye acondicionador y adhesivo)	und	4,00	\$ 206.383	827.932	4,00	827.932,00	0,00	0,00	0%	4,00	827.932	100%
4.6	Cámara de inspección/cámbi D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi	ml	8,00	\$ 692.172	5.537.376	4,36	3.010.948,00	0,00	0,00	0%	4,36	3.010.948	54%
4.7	Base cañalera para cámara de inspección/cámbi D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi	und	5,00	\$ 641.158	3.205.790	5,00	3.205.790,00	0,00	0,00	0%	5,00	3.205.790	100%
4.8	Suministro e instalación Arca Tapa HF D=0,60m para cámara de inspección	und	5,00	\$ 696.066	3.480.330	1,00	696.066,00	2,00	1.392.132,00	40%	3,00	2.088.198	60%
4.9	Caja de inspección domiciliar de 0,60m x 0,60m en concreto 3000 psi (incluye base y cañalera)	und	4,00	\$ 477.851	1.911.404	6,50	3.106.032,00	0,00	0,00	0%	6,50	3.106.032	163%
4.10	Empalme a cámara de inspección concreto 3000 psi	und	5,00	\$ 114.079	570.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%
4.11	Empalme a caja de inspección domiciliar concreto 3000 psi	und	1,00	\$ 82.439	82.439	4,00	329.756,00	0,00	0,00	0%	4,00	329.756	400%
<b>ENTIBADOS</b>													
5.1	Entibado horizontal/vertical tipo 1	ml	30,00	\$ 47.830	1.434.900	30,00	1.434.900,00	0,00	0,00	0%	30,00	1.434.900	100%
<b>RELLENOS</b>													
6.1	Rebosen compactados con material de la obra	m3	95,80	\$ 29.052	2.783.182	92,46	2.698.072,00	0,00	0,00	0%	92,46	2.698.072	97%
6.2	Rebosen compactados con material de cantera de préstamo	m3	63,90	\$ 46.714	2.966.353	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%
<b>SUSTITUCIÓN SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS</b>													
7.1	Suministro, transporte e instalación subbase para pavimento	m3	1,40	\$ 141.892	198.648	0,20	36.948,00	0,00	0,00	0%	0,20	36.948	19%
7.2	Suministro, transporte e instalación afirmado compactado	m3	11,10	\$ 107.017	1.187.893	9,35	1.000.573,00	0,00	0,00	0%	9,35	1.000.573	84%
7.3	Sustitución en arena limpia para subbases	m3	17,70	\$ 93.511	1.655.146	23,11	2.160.805,00	0,00	0,00	0%	23,11	2.160.805	131%
<b>EVACUACIÓN DE ESCOMBROS</b>													
8.1	Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor	m3	74,10	\$ 51.151	3.790.289	68,34	3.383.482,00	0,00	0,00	0%	68,34	3.383.482	80%
<b>OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO</b>													
9.1	Concreto para pavimento M42 para vías producidas en obra	m3	1,60	\$ 1.012.304	1.619.688	0,87	883.640,00	0,00	0,00	0%	0,87	883.640	50%
9.2	Concreto de 21 Mpa para andenes y/o estructuras	m3	8,90	\$ 842.369	7.497.084	7,88	6.725.308,00	1,49	1.264.591,00	17%	9,47	7.979.897	106%
<b>ACERO DE REFUERZO</b>													
10.1	Acero de refuerzo fy=60.000psi	kg	70,40	\$ 9.658	680.523	71,04	616.064,00	214,08	1.853.505,00	304%	285,12	2.469.568	405%
<b>TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO</b>													
11.1	Trabajo Social	mes	1,00	\$ 2.680.975	2.680.975	1,00	2.680.975,00	1,00	2.680.975,00	100%	2,00	5.361.950	200%
11.2	Profesional SISO	mes	1,00	\$ 2.680.975	2.680.975	1,00	2.680.975,00	0,00	0,00	0%	1,00	2.680.975	100%
11.3	Compromisos al protocolo de Bioseguridad según facturas	gl	1,00	\$ 487.450	487.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>													
12													

COSTO TOTAL OBRA (INCLUYE IAI)	\$ 65.705.515	\$ 52.061.538	\$ 7.576.610	\$ 59.638.148
COSTO DIRECTO	\$ 48.688.785	\$ 38.578.390	\$ 5.614.383	\$ 44.192.773
ADMINISTRACION %		\$ 10.001.949	\$ 1.572.027	\$ 12.373.977
IMPREVISTOS %		\$ 485.888	\$ 385.784	\$ 441.928
UTILIDADES %		\$ 2.434.439	\$ 1.928.920	\$ 2.209.639
SUMA ANTES IVA	\$ 65.242.972	\$ 53.695.043	\$ 7.523.273	\$ 59.218.316
I.V.A. %	\$ 462.543	\$ 366.495	\$ 53.337	\$ 419.831
VALOR TOTAL OBRA	\$ 65.705.515	\$ 52.061.538	\$ 7.576.610	\$ 59.638.148
TOTAL A PAGAR OBRA			\$ 7.576.610	


  
**CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA**  
 CONTRATISTA

  
**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
 INGENIERO DE ZONA ORIENTE  
 EMPICALDAS S.A. E.S.P.

### ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 129 DE 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
<b>OBJETO</b>	<b>REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS</b>
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA
NIT No.	75.106.064 DE MANIZALES
MUNICIPIO	SAMANÁ - CALDAS.
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 65.705.515</b>
<b>VALOR ADICION 01</b>	<b>0</b>
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 59.638.148</b> INCLUIDO A.I.U. E I.V.A SOBRE UTILIDADES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 59.638.148</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 6.067.367</b>
RECURSOS	OBRAS POIR.
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO INICIAL	60 DIAS CALENDARIO
PRORROGA 01	0
PLAZO TOTAL	60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE RECIBO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CDP CONTRATO	00607 DE MAYO DE 2022
CDP ADICION	0
R.P. CONTRATO	000850
R.P. ADICION	0

En el municipio de Samaná, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron los señores **OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**, Ingeniero Supervisor y el señor **CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA**, como Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO FINAL, Según Contrato de obra No 129 de 2022.



**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
VALENCIA Ingeniero Zona  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ**  
Contratista.





f Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

EL SUSCRITO INGENIERO DE ZONA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO 129 DEL 2022  
OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO

**CERTIFICA**

Que el contratista CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA, con cédula de ciudadanía No. 75.106.064 de Manizales, ejecutó para EMPOCALDAS S.A E.S.P el siguiente contrato de obra:

CONTRATO N°:	129 DE 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA DE OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA
CC	75.106.064
MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	SAMANÁ - CALDAS
COSTO INICIAL	\$ 65.705.515
ADICIÓN	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 59.638.148
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 6.067.367
COSTO CONTRATO	\$ 59.638.148
RECURSOS	OBRAS POIR
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE RECIBO FINAL	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Así mismo certifico que las cantidades ejecutadas son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1,1	Bodega para campamento (incluye adecuaciones)	mes	2,00
1,2	Localización y replanteo de redes, incluye pano récord	ml	92,00
1,3	Rocería y limpieza	m2	18,00
1,4	Cerramiento en polisombra yute verde de H=2m, parales en guadua y cinta plástica	ml	100,00
1,5	Puente peatonal provisional en madera (ancho=1,40 m)	ml	1,00
1,6	Suministro, transporte e instalación señales preventivas, reglamentarias e informativas	und	2,00
1,7	Instalacion de valla institucional según diseño empocaldas 2x4 mt	und	1,00
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
2,1	Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico	m3	9,31
2,2	Demolición de pavimento en concreto hidráulico	m3	0,88
2,3	Corte mecanizado de pavimento 0,07m	ml	196,11
<b>3</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
3,1	Excavacion en zanja - Material comun 0,0 a 2,0 Mts	m3	35,33
3,2	Excavacion en zanja - Conglomerado 0,0 a 2,0 Mts	m3	81,24
<b>4</b>	<b>REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO</b>		
4,1	Transporte e instalacion de tubería PVC corrugada $\Phi=160$ mm (6") para alcantarillado	ml	39,70
4,2	Transporte e instalacion de tubería PVC corrugada $\Phi=250$ mm (10") para alcantarillado, incluye manejo de aguas	ml	6,00
4,3	Transporte e instalacion de tubería PVC corrugada $\Phi=315$ mm (12") para alcantarillado, incluye manejo de aguas	ml	12,00
4,4	Transporte e instalacion de tubería PVC corrugada $\Phi=400$ mm (16") para alcantarillado, incluye manejo de aguas	ml	69,00
4,5	Transporte e instalacion empalme para PVC corrugada de 400 x 160 mm para domiciliaria de alcantarillado (incluye acondicionador y adhesivo)	und	4,00
4,6	Cámara de inspección/caída D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi	ml	4,35
4,7	Base cañuela para cámara de inspección/caída D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi	und	5,00
4,8	Suministro e instalación Aro Tapa HF D=0,68m para cámara de inspección	und	3,00





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empocaldas@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

4,9	Caja de inspección domiciliaria de 0,60m x 0,60m en concreto 3000 psi (incluye base y cañuela)	und	6,50
4,10	Empalme a cámara de inspección concreto 3000 psi	und	0,00
4,11	Empalme a caja de inspección domiciliaria concreto 3000 psi	und	4,00
<b>5</b>	<b>ENTIBADOS</b>		
5,1	Entibado horizontal/vertical tipo 1	ml	30,00
<b>6</b>	<b>RELLENOS</b>		
6,1	Rellenos compactados con material de la obra	m3	92,46
6,2	Rellenos compactados con material de cantera de préstamo	m3	0,00
<b>7</b>	<b>SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS</b>		
7,1	Suministro, transporte e instalacion subbase para pavimento	m3	0,26
7,2	Suministro, transporte e instalacion afirmado compactado	m3	9,35
7,3	Sustitucion en arena limpia para tuberías	m3	23,11
<b>8</b>	<b>EVACUACION DE ESCOMBROS</b>		
8,1	Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor	m3	66,34
<b>9</b>	<b>OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO</b>		
9,1	Concreto para pavimento MR 42 para vías producido en obra	m3	0,87
9,2	Concreto de 21 Mpa para andenes y/o estructuras	m3	9,47
<b>10</b>	<b>ACERO DE REFUERZO</b>		
10,1	Acero de refuerzo Fy=60.000psi	kg	285,12
<b>11</b>	<b>TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO</b>		
11,1	Trabajo Social	mes	2,00
11,2	Profesional SISO	mes	1,00
11,3	Cumplimientos al protocolo de Bioseguridad según facturas	GI	0,00

Manizales 13 de diciembre de 2022

**OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO**  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9
