



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

F-GC-22
Versión 12
2024-06-01

# CONTRATO Y AÑO	142-2024	Acta N°	01 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	135,522,314	
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO			2. VALOR ADICION		
NIT O CC:	75.084.213			3. VALOR TOTAL (1+2)	135,522,314	
CDP (#, rubro y fecha)	2024424 DEL 19 DE ABRIL DE 2024 - 2024414 DEL 13 DE MAYO DE 2024			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
RP (#, rubro y fecha)	2024414 DEL 13 DE MARZO DE 2024 - 2024502 DEL 29 DE ABRIL DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	54,211,629	
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	81,310,685	
VALOR A LIBERAR (Aplica para el acta final)						
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE ALCANARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS <input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/>	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
# CONVENIO	005 MUNICIPIO CHINCHINA					
DOCUMENTO VERIFICADOS					<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	2
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					X	1
3- Pagos al FIC					X	1
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	9
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	1
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	8
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Actas de visita de acometidas. Formato F-GS-08.					N/A	
12- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-GS-09. (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
13- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X	1
14- Acta parcial o final del contrato.					X	3
15- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X	3
16- Firma de la Jefe de Presupuesto como constancia de liberación de saldos _____					N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación

05/07/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME MALDONADO MORA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
4.88412E+11	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENAE	
Identificación	DV	GARCIA GIRALDO JOHN ALEXANDER		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CHINCHINA EMPROCALDAS		CRA 26 13 44		CHINCHINA-CALDAS		9902256		CIBF SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	Salud	731478648	E	9669169367	2024/07/04	2024/06/26	BANCO PARIQUENSA	0	\$2,719,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$1,405,100	\$0	\$0	\$1,405,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,405,100	\$0	\$0	\$1,405,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$611,700	\$0	\$0	\$611,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	\$611,700	\$0	\$0	\$611,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$351,500	\$0	\$0	\$351,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$351,500	\$0	\$0	\$351,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$351,500	\$0	\$0	\$351,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$24,300	\$0	\$0	\$24,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$102,400	\$0	\$0	\$102,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$172,800	\$0	\$0	\$172,800
TOTAL				10	\$2,719,800	\$0	\$0	\$2,719,800



RAZÓN SOCIAL :	JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-75084213
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-04
FECHA DE PAGO:	2024-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30045414
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30045414
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 13.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384.100	\$ 384.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/08/2024
----------------------------------	------------

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

112159465

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

731517587

26/06/2024

Número de Identificación

75084213

Primer Nombre ó Razón Social

JOHN ALEXANDER

Primer Apellido (si es Persona natural)

GARCIA GIRALDO

Tipo de documento

03

Dígito de Verificación (Si es persona**Naturaleza Juridica**

03

Departamento

CALDAS

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio

CRA. 17A 71-55

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Localización

Nacional

Teléfono de Contacto

+57,311 3404944

Correo electrónico

jagarciag0611@gmail.com

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional

Caldas

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra

142 de 2024

Número Contrato de Obra

142 de 2024

Nombre Obra

REPOSICION DE ALC. OMAIRA CAST

Fecha Inicio Obra

06/06/2024

Fecha Terminación Obra

06/08/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

CHINCHINA

Tipo FIC

Mensual

Año Periodo a Pagar

2024

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total de Obra a Todo Costo

135522314.00

Costo Total Mano de Obra

25300000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

9

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

292500.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

292500.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	112159465	731517587	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **75084213**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.251.207.219**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 292,500.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 292,500.00	COP\$ 292,500.00

Manizales, Junio 28 de 2024

Señores:
Secretaría Jurídica y Financiera de Empocaldas S.A. ESP.
Manizales


Referencia: Contrato de Obra No 142 de 2024.
Asunto: Discriminación de imputación de pagos por cada RP del contrato.

En atención a la ejecución debida del contrato de obra No 142 de 2024 y a los respectivos pagos de ejecución parcial y teniendo en cuenta que la imputación de recursos se hizo por dos fuentes, me permito señalarles como se discrimina el valor parcial por cada una.

Fuente RP:	2024502
Valor Total:	\$39.999.843,00
Valor pago Parcial 1.:	\$16.000.735,28

Fuente RP:	2024412
Valor Total:	\$95.522.471,00
Valor pago Parcial 1.:	\$38.210.894,00

Sin otro particular,



ING. JAIME MALDONADO MORA
Ing. Zona Centro Norte.

JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO

NIT 75.084.213-5
CARRERA 17 A # 71-55
Tel: (036) 3113404944
Manizales - Colombia
jagarciag0611@gmail.com

John Garcia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 62

RES.DIAN No. Número Autorización
Electrónica 18764063902847 aprobado en
20240116 prefijo FE desde el número 59 al
200 Vigencia: 6 Meses

Fecha y hora Factura
Generación: 04/07/2024,
14:18
Expedición: 04/07/2024, 14:19

Nombre del Cliente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Nit ó C.C.
890.803.239-9

Fecha de Vencimiento
--

Razón Social
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Dirección
CARRERA 23 # 75-82

Teléfono
(036) 8867080 - Ext. 000

Correo
facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Vendedor
JOHN ALEXANDER GARCÍA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, DEL CONTRATO No. 142 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.	40,456,439.76

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 488412160126.

Valor en Letras:

Cincuenta y cuatro millones doscientos once mil seiscientos veintinueve pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 54,211,629.28

Total Bruto	40,456,439.76
Administración 29.00%	11,732,367.53
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	2,022,821.99
Total a Pagar	54,211,629.28

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

e24ac957943a13dbe5f2f1a4ea65afef9c581f0ba2a86ad9856583ad804a686e5a8437e9446d6e55b15a539da48770c1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INGENIERO CIVIL
John Garcia
Administración | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
 NIT 75.084.213-5
 CARRERA 17 A 7155
 Tel: (036) 3113404944
 Manizales - Colombia



**Nota Crédito
 No. 2 - 7**

Señores	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 23 # 75-82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-07-04
Factura de Venta	FE-61
Generación	04/07/2024, 14:51
Expedición	04/07/2024, 14:51
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO No. 142 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.	1.00	40,456,439.76

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y cuatro millones doscientos once mil seiscientos veintinueve pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 54,211,629.28

Observaciones:

Se realiza la nota credito, puesto que la factura no fue aprobada en el mes de junio y no cumple con requisitos de fecha en tesorería.

Total Bruto	40,456,439.76
Administración 29.00%	11,732,367.53
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	2,022,821.99
Total	54,211,629.28

CUDE: 6a7b0d6096c3905caaba05d70f8292b8767d2127a171cc10e5480e6524ceabada81e22e41b01d8856ee84ff36bd2d61e
CUFE factura: 965af46611ade40fee0a16bf74a691503516089021836a1b986775a3c3c5834a7dd08dcdcd34b478da3a3748e2b72ac

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INGENIERO CIVIL
John Garcia
Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

**PERIODO:
06 DE JUNIO AL 25 DE JUNI DE 2024**

CONTRATO No. 142 de 2024

INGENIERO CIVIL

OBJETO:

“REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.”

CONTRATISTA: JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO

**SUPERVISOR:
Ing. JAIME MALDONADO MORA**

25 DE JUNIO DE 2024



jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com



Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros



+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES



IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	“REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.”
Contrato de Obra No:	142 de 2024
Contratista:	JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
Plazo Inicial:	Sesenta (60) Días
Fecha de Inicio:	06 de junio de 2024
Fecha de Terminación:	04 de agosto de 2024
Valor Inicial:	\$ 135.522.314
Valor pagado:	\$ 0,00
Valor por pagar:	\$ 54.211.629
Nombre Supervisor:	Ing. JAIME MALDONADO MORA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONTRATO

Durante el tiempo de ejecución del contrato, se ha ejercido el control administrativo y financiero mediante la solicitud y diligenciamiento de los diferentes documentos requeridos para tal fin, así mismo se ha realizado el seguimiento de las actividades programadas como lo son:

- Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.
- Instalación de valla institucional 2x4.
- Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas.
- Excavaciones en los predios de la señora ALICIA PELAEZ VALENCIA, el señor JOSE GUSTAVO HERRERA MORALES y la señora OMAIRA CASTAÑO QUINTERO.
- En material común de 0 a 2m.
- En material común de 2,1 a 4m.
- En material común de 4 a 6m.
- Retiro de material sobrante en vehículo automotor.
- Sobreacarreo en vehículo no automotor al hombro en fuerte pendiente y/o escalas en costales de material contaminado.





- Suministro, transporte e instalación techado provisional en guadua y plástico.
- Limpieza de agua residual empozada con motobomba sumergible eléctrica.
- Suministro, transporte e instalación trinchos provisionales en tablero.

Insumos:

- Registro fotográfico, registrando la secuencia del proceso de construcción del proyecto
- Se han realizado sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato de Obra.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101059852	06-06-2024	06/11/2024	\$40.656.694,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101059852	06-06-2024	06/08/2027	\$27.104.462,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101059852	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS		\$27.104.462,80
PREDIOS Y LABORES OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40-101046158	06-06-2024	06/11/2024	\$40.656.694,20


PERSONAL EN OBRA

		NOMBRE DEL TRABAJADOR	C.C. No.	ARP	EPS	AFP
1	Ofic.	JOSE IVAN MONTES VILLADA	10.258.481	X	X	X
2	Ayud.	SANTIAGO ALBERTO LOPEZ HENAO	1.053.800.873	X	X	X
3	Ayud.	JUAN ESTEBAN PIEDRAHITA GONZALEZ	1.054.989.238	X	X	X
4	Ayud.	JHONATAN ESTID SALAZAR MARIN	1.054.990.809	X	X	X
5	Ayud.	KEVIN ANDRES MEDINA CANO	1.053.777.118	X	X	X
6	Ayud.	CRISTIAN CAMILO AGUIRRE PINEDA	1.054.994.167	X	X	X
7	Ayud.	CARLOS ALFREDO MARIN GARCIA	1.054.995.564	X	X	X
8	Ayud.	ELVIS JHOAN PEREZ HEREIRA	1.083.555.394	X	X	X
9	Ayud.	JONATAN SALAZAR MORALES	1.007.736.652	X	X	X
10	Ayud.	CESAR AUGUSTO RAMIREZ MARIN	1.054.995.156	X	X	X
11	Soci.	ELSA MILENA AGUIRRE LONDOÑO	30.395.630	X	X	X
12	SISO	ANALIDA PATRICIA SALGADO MORALES	1.061.624.635	X	X	X



ASPECTOS PRESUPUESTALES Y JURÍDICOS

AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
Valor del Contrato	\$ 135.522.314
Obra Física Ejecutada (%)	40,00%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 54.211.629
Plazo Contractual en días	60
Plazo Transcurrido en días	19
Porcentaje Transcurrido en días	32%

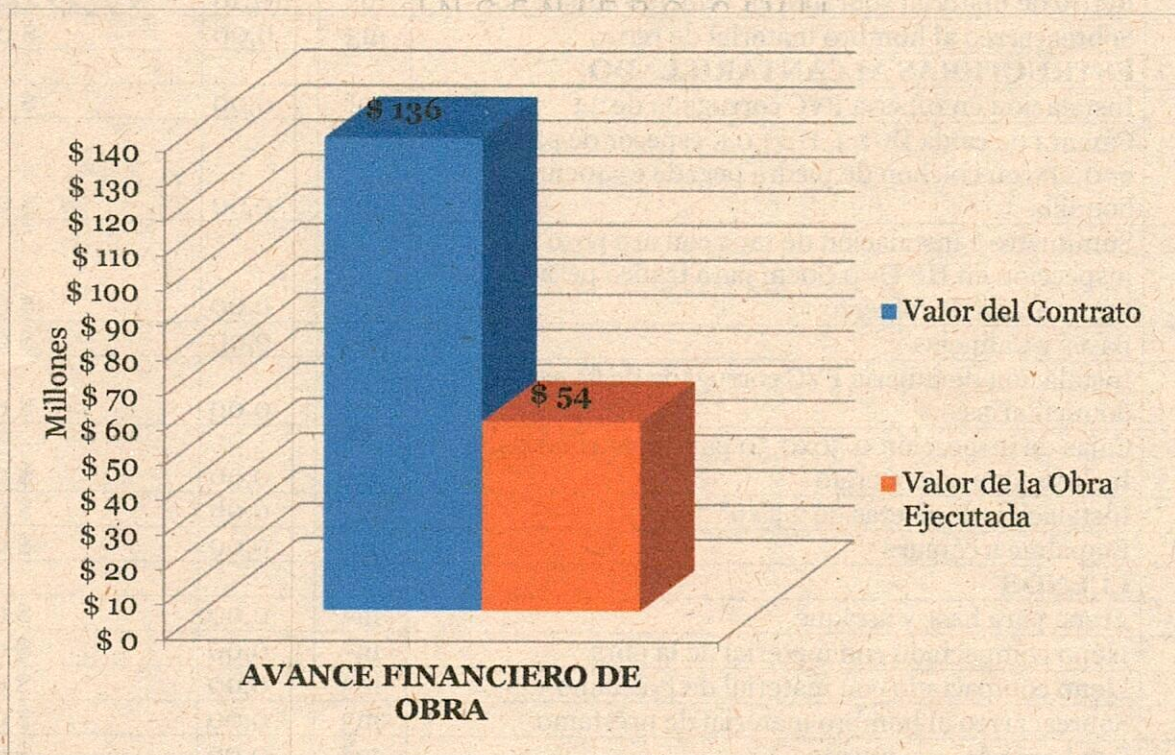



INGENIERO CIVIL

John Garcia
Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES			
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	0,00	\$ 0
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	16,00	\$ 321.024
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	0,00	\$ 0
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	\$ 1.183.485
6	DEMOLICIONES			
7	Corte con disco abrasivo	ml	0,00	\$ 0
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m ³	1,20	\$ 160.560
9	EXCAVACION			
10	En material común de 0 a 2m	m ³	179,94	\$ 8.114.574
11	En material común de 2,1 a 4m	m ³	59,50	\$ 3.709.944
12	En material común de 4 a 6m	m ³	10,56	\$ 1.174.409
13	En conglomerado	m ³	0,00	\$ 0
14	Entibado horizontal Tipo II	m ²	0,00	\$ 0
15	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m ³	181,10	\$ 9.528.214
16	Sobrecarreo al hombro material de retiro	m ³	0,00	\$ 0
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO			
18	Instalación en tubería PVC corrugada de 24"	ml	0,00	\$ 0
19	Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	0,00	\$ 0
20	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm para tráfico pesado con logo y araña de refuerzo	Un	0,00	\$ 0
21	Bases y Cañuelas	Un	0,00	\$ 0
22	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	0,00	\$ 0
23	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	0,00	\$ 0
24	Instalación de silletas de 24"x6"	und	0,00	\$ 0
25	Empalme a cámara	und	0,00	\$ 0
26	LLENOS			
27	Arena para base y atraque	m ³	0,00	\$ 0
28	Lleno compactado con material de la obra	m ³	0,00	\$ 0
29	Lleno compactado con material de Préstamo	m ³	0,00	\$ 0
30	Sobrecarreo al hombro material de préstamo	m ³	0,00	\$ 0
31	Sub base para pavimento	m ³	0,00	\$ 0
32	CONCRETOS			
33	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ³	0,00	\$ 0
34	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m ³	0,00	\$ 0
35	Reparación fachada primer piso, resane grietas y pintura	m ²	0,00	\$ 0
36	ACERO			
37	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	0,00	\$ 0
38	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	0,00	\$ 0

jagarcia0611@gmail.com
jagarcia11@hotmail.comCarrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

+57 311 340 49 44




INGENIERO CIVIL



John Garcia
Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

39	Trabajador Siso	mes	0,00	\$ 0
ITEMS NO PREVISTOS				
NP 40	Sobrecarreo en vehículo no automotor al hombro en fuerte pendiente y/o escalas en costales de material contaminado	m3	181,14	\$ 21.130.257
NP 41	Suministro, transporte e instalación techado provisional en guadua y plástico	m2	159,50	\$ 3.519.064
NP 42	Limpieza de agua residual empozada con motobomba sumergible eléctrica	DIA	16,00	\$ 3.883.041
NP 43	Suministro, transporte e instalación trinchos provisionales en tablero	m2	21,60	\$ 1.487.056
COSTO TOTAL				\$ 54.211.629
COSTO DIRECTO				\$ 40.456.440
ADMINISTRACION		29 %		\$ 11.732.368
IMPREVISTO		0 %		\$ 0
UTILIDADES		5 %		\$ 2.022.822
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES				\$ 54.211.629

INGENIERO CIVIL


JOHN ALEXANDER GARCÍA GIRALDO
C.C. 75.084.213 de Manizales

Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

 jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros +57 311 340 49 44INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.



Descripción: Rocería y limpieza de patios interiores.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.



Descripción: Cámara taponada JOSE GUSTAVO HERRERA MORALES.



jagarcia0611@gmail.com
jagarcia11@hotmail.com



Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros



+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES



INGENIERO CIVIL

John Garcia
Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.



Descripción: Excavación JOSE GUSTAVO HERRERA MORALES.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.



Descripción: Excavación JOSE GUSTAVO HERRERA MORALES.



jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com



Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros



+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIROS.



Descripción: Excavación ALICIA PELAEZ VALENCIA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIROS.



Descripción: Excavación OMAIRA CASTAÑO QUINTERO.





INGENIERO CIVIL

John Garcia
Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.



Descripción: Trinchos de contención y extracción de lodos JOSE GUSTAVO HERRERA MORALES.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.

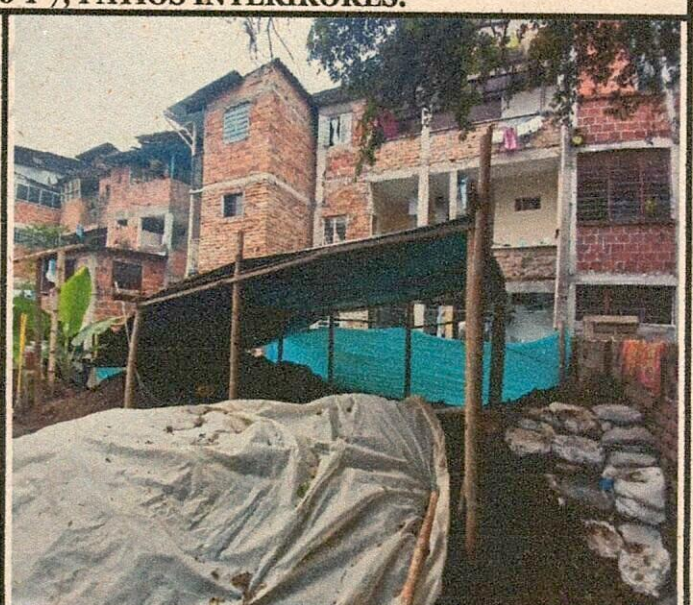

Descripción: Techado provisional.



jagarcia0611@gmail.com
jagarcia11@hotmail.com



Carrera 17A N° 71-55
Barrio Coleseguros



+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES



INGENIERO CIVIL

John Garcia
Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.



Descripción: Pasos en costales de suelo para tránsito entre patios internos.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES.

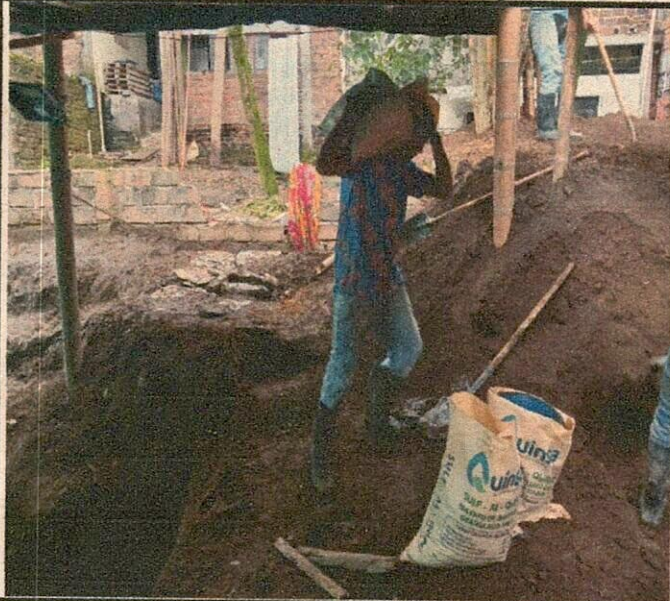

Descripción: Sobreacarreo al hombro en costales, de material contaminado.


 jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com

 Carrera 17A N° 71-55
Barrio Coleseguros

 +57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES



JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA ONAIRA CASTAÑO QUIRTERO MUNICIPIO DE CHIMCHINA CALDAS
 Periodo: 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024

	Nombre del Empleado	Cedula	DEVENGADO										DEDUCCIONES				Total a Pagar	Firmas
			Salario Basico	Dias Trab	Sueldo devengado	Auxilio de Transp.	Incapacidad	Extras	Total Devengado	Descuento Pension	Descuento Salud	PRIMA						
OFICIAL	JOSE IVAN MONTES	10.258.481	\$ 1.500.000	15	\$ 750.000	\$ 70.303					\$ 820.303	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 152.350	\$ 912.653	<i>Jose Ivan Montes</i>		
AYUDANTE	SANTIAGO ALBERTO LOPEZ HENAO	1.053.800.873	\$ 1.300.000	15	\$ 650.000	\$ 70.303					\$ 720.303	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 134.017	\$ 802.320	<i>Santiago Henao</i>		
AYUDANTE	CRISTIAN CAMILO AGUIRRE PINEDA	1.054.984.167	\$ 1.300.000	15	\$ 650.000	\$ 70.303					\$ 720.303	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 134.017	\$ 802.320	<i>Cristian Aguirre</i>		
AYUDANTE	JUAN ESTEBAN PIEDRAHITA GONZALEZ	1.054.989.238	\$ 1.300.000	5	\$ 216.657	\$ 23.434					\$ 240.101	\$ 8.657	\$ 8.657	\$ 81.222	\$ 303.990	<i>Juan Esteban Salazar</i>		
AYUDANTE	JHONATAN ESTIBO SALAZAR MARIN	1.054.990.609	\$ 1.300.000	5	\$ 216.657	\$ 23.434					\$ 240.101	\$ 8.657	\$ 8.657	\$ 81.222	\$ 303.990	<i>Jhonatan Salazar</i>		
AYUDANTE	ELVIS JOHAN PEREZ HEPEIRA	1.083.555.394	\$ 1.300.000	5	\$ 216.657	\$ 23.434					\$ 240.101	\$ 8.657	\$ 8.657	\$ 81.222	\$ 303.990	<i>Elvis Perez</i>		
AYUDANTE	CARLOS ALFREDO MARIN GARCIA	1.064.956.564	\$ 1.300.000	4	\$ 173.333	\$ 18.747					\$ 192.081	\$ 6.933	\$ 6.933	\$ 77.161	\$ 255.375	<i>Carlos Marin</i>		
	TOTALES		\$ 9.300.000		\$ 2.873.333	\$ 299.959					\$ 3.173.293	\$ 114.933	\$ 114.933	\$ 741.211	\$ 3.894.637			

[Handwritten signature]



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	25/06/2024	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	142 de 2024
Objeto:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.
Nombre Contratista:	JHON ALEXANDER GARCIA GIRALDO
Fecha del contrato:	25 DE ABRIL DE 2024
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial:	\$ 135.522.314 MCTE INCLUIDO AU.
Fecha de iniciación:	06 DE JUNIIO DE 2024
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	04 DE AGOSTO DE 2024
Nueva fecha de terminación:	N.A.
Adición (en valor):	N.A.
Prórroga (en tiempo):	N.A.
Supervisor:	Ing. JAIME MALDONADO MORA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	40,00%
Avance físico Acumulado	40,00%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
N.A.	N.A.	N.A.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60 días
Tiempo total transcurrido:	19 días
Avance Porcentual:	32%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5. Problemáticas con la obra

- El primer problema que se tuvo, fue para dar inicio al contrato, puesto que el único acceso al sitio de intervención era por la propiedad de la señora OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, quien se opuso en a dar permiso de intervención en tres ocasiones que se realizaron visitas previas describiendo las actividades a realizar bajo el contrato de obra número 142 de 2024.
- Sólo hasta el 24 de mayo se obtuvieron los permisos de intervención de los patios interiores de la señora ALICIA PELAEZ VALENCIA y el señor JOSE GUSTAVO HERRERA MORALES; la señora OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, no autorizó la intervención de su predio, solo autorizo el tránsito de personal.
- A la fecha se han realizado excavaciones en el predio de la señora ALICIA PELAEZ VALENCIA y el señor JOSE GUSTAVO HERRERA MORALES, explorando si se encuentran fugas en la red de aguas residuales; cabe aclarar que la red principal de agua residual se encuentra a una profundidad mayor a 5,5 metros.
- El pasado jueves 20 de junio, la señora OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, autorizó la intervención de su predio permitiendo realizar un apique de en aras de inspeccionar la presencia de un agua al parecer de escorrentía en su predio.
- Adicional a lo anterior, se han realizado las siguientes actividades:
 - Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.
 - Rocería y limpieza.
 - Demolición de estructuras.
 - Excavaciones en material común de 0 a 2m, en material común de 2,1 a 4m y n material común de 4 a 6m.
 - Retiro de material sobrante en vehículo automotor.
 - Acompañamiento social durante toda la obra.
 - Trabajador Siso
 - Sobreacarreo en vehículo no automotor al hombro en fuerte pendiente y/o escalas en costales de material contaminado.
 - Suministro, transporte e instalación techado provisional en guadua y plástico.
 - Limpieza de agua residual empozada con motobomba sumergible eléctrica.
 - Suministro, transporte e instalación trinchos provisionales en tablero.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$135.522.314
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 54.211.629,28
Porcentaje ejecutado en el periodo:	40,00%
Inversión total ejecutada:	\$ 54.211.629,28
Porcentaje total ejecutado:	\$ 54.211.629,28

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101059852	06-06-2024	06/11/2024	\$40.656.694,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101059852	06-06-2024	06/08/2027	\$27.104.462,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101059852	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS		\$27.104.462,80
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40-101046158	06-06-2024	06/11/2024	\$40.656.694,20

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	C.C. No.	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JOSE IVAN MONTES VILLADA	10.258.481	X	X	X	X	X
ELSA MILENA AGUIRRE LONDOÑO	30.395.630	X	X	X	X	X
SANTIAGO ALBERTO LOPEZ HENAO	1.053.800.873	X	X	X	X	X
JUAN ESTEBAN PIEDRAHITA GONZALEZ	1.054.989.238	X	X	X	X	X
JHONATAN ESTID SALAZAR MARIN	1.054.990.809	X	X	X	X	X
CRISTIAN CAMILO AGUIRRE PINEDA	1.054.994.167	X	X	X	X	X
CARLOS ALFREDO MARIN GARCIA	1.054.995.564	X	X	X	X	X
ANALIDA PATRICIA SALGADO MORALES	1.061.624.635	X	X	X	X	X
ELVIS JHOAN PEREZ HEREIRA	1.083.555.394	X	X	X	X	X
JONATAN SALAZAR MORALES	1.007.736.652	X	X	X	X	X
CESAR AUGUSTO RAMIREZ MARIN	1.054.995.156	X	X	X	X	X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

PERIODO DE PAGO	No. DE PLANILLA	RAZÓN SOCIAL
JUNIO DE 2024	30045414	JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
18 DE JUNIO DE 2024	A	A	A	A	N/A	N/A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				EJECUTADO	
		UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	50,00	\$ 8.274	\$ 413.700	0,00	\$ 0
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	80,00	\$ 20.064	\$ 1.605.120	16,00	\$ 321.024
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	0,00	\$ 249.590	\$ 0	0,00	\$ 0
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	\$ 1.183.485	\$ 1.183.485	1,00	\$ 1.183.485
6	DEMOLICIONES						
7	Corte con disco abrasivo	ml	0,00	\$ 12.257	\$ 0	0,00	\$ 0
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m ³	2,00	\$ 133.800	\$ 267.600	1,20	\$ 160.560
9	EXCAVACION						



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

10	En material común de 0 a 2m	m ³	98,00	\$ 45.096	\$ 4.419.408	179,94	\$ 8.114.574
11	En material común de 2,1 a 4m	m ³	98,00	\$ 62.352	\$ 6.110.496	59,50	\$ 3.709.944
12	En material común de 4 a 6m	m ³	122,00	\$ 111.213	\$ 13.567.986	10,56	\$ 1.174.409
13	En conglomerado	m ³	0,00	\$ 89.820	\$ 0	0,00	\$ 0
14	Entibado horizontal Tipo II	m ²	410,00	\$ 30.550	\$ 12.525.500	0,00	\$ 0
15	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m ³	127,2	\$ 52.613	\$ 6.692.374	181,10	\$ 9.528.214
16	Sobreacarreo al hombro material de retiro	m ³	127,20	\$ 34.647	\$ 4.407.098	0,00	\$ 0
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO						
18	Instalación en tubería PVC corrugada de 24"	ml	30,00	\$ 84.990	\$ 2.549.700	0,00	\$ 0
19	Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	12,00	\$ 893.887	\$ 10.726.644	0,00	\$ 0
20	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm para trafico pesado con logo y araña de refuerzo	Un	2	\$ 1.121.200	\$ 2.242.400	0,00	\$ 0
21	Bases y Cañuelas	Un	2,00	\$ 868.300	\$ 1.736.600	0,00	\$ 0
22	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	30,00	\$ 22.170	\$ 665.100	0,00	\$ 0
23	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	4,00	\$ 642.000	\$ 2.568.000	0,00	\$ 0
24	Instalación de silletas de 24"x6"	und	4,00	\$ 69.800	\$ 279.200	0,00	\$ 0
25	Empalme a cámara	und	4,00	\$ 145.100	\$ 580.400	0,00	\$ 0
26	LLENOS						
27	Arena para base y atraque	m ³	34,87	\$ 193.800	\$ 6.757.806	0,00	\$ 0
28	Lleno compactado con material de la obra	m ³	95,40	\$ 36.043	\$ 3.438.502	0,00	\$ 0
29	Lleno compactado con material de Prestamo	m ³	222,60	\$ 119.000	\$ 26.489.400	0,00	\$ 0
30	Sobreacarreo al hombro material de prestamo	m ³	260,00	\$ 34.647	\$ 9.008.220	0,00	\$ 0
31	Sub base para pavimento	m ³	1,25	\$ 232.700	\$ 290.875	0,00	\$ 0
32	CONCRETOS						
33	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ³	2,00	\$ 972.800	\$ 1.945.600	0,00	\$ 0
34	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m ³	2,00	\$ 1.321.100	\$ 2.642.200	0,00	\$ 0
35	Reparacion fachada primer piso, resane grietas y pintura	m ²	16,00	\$ 25.000	\$ 400.000	0,00	\$ 0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

36	ACERO						
37	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	10,00	\$ 9.400	\$ 94.000	0,00	\$ 0
38	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1,00	\$ 2.688.140	\$ 2.688.140	0,00	\$ 0
39	Trabajador Siso	mes	2,00	\$ 4.613.380	\$ 9.226.760	0,00	\$ 0
ITEMS NO PREVISTOS							
NP 40	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS EN COSTALES DE MATERIAL CONTAMINADO	m3		\$ 116.652		181,14	\$ 21.130.257
NP 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	m2		\$ 22.063		159,50	\$ 3.519.064
NP 42	LIMPIEZA DE AGUA RESIDUAL EMPOZADA COM MOTOBOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA	DIA		\$ 242.690		16,00	\$ 3.883.041
NP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN TABLERO	m2		\$ 68.845		21,60	\$ 1.487.056
COSTO TOTAL					\$ 135.522.314		\$ 54.211.629
COSTO DIRECTO					\$ 101.136.055		\$ 40.456.440
ADMINISTRACION							
		%	29	\$ 101.136.055	\$ 29.329.456		\$ 11.732.368
IMPREVISTO							
		%	0	\$ 101.136.055	\$ 0		\$ 0
UTILIDADES							
		%	5	\$ 101.136.055	\$ 5.056.803		\$ 2.022.822
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES					\$ 135.522.314		\$ 54.211.629

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	1	1
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES		0	1	1

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA


La población beneficiada del área de influencia directa son aproximadamente 30 personas que viven en los tres predios donde se está realizando la intervención.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

JAIME MALDONADO MORA


FIRMA DEL SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rocería y limpieza de patios interiores.



Excavación patios interiores.



Excavación patios interiores.



Excavación patios interiores.



Excavación patios interiores.



Entibados y extracción de lodos.



Techado provisional.



Adecuación patios interiores.



Sobreacarreo al hombro en costales.

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 01


CONTRATO N°: 142 de 2024
CONTRATISTA: JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
OBJETO: Reposición de alcantarillado Calle11 entre Carreras 6 y 7, Patios interiores Tutela Omaira Castaño Quintero Municipio de Chinchiná Caldas
RECURSOS: PROPIOS
 - C.I. 005 DE 20224 MUNICIPIO DE CHINCHINA


En la ciudad de Manizales, Caldas a los veintiún (21) días del mes de junio de 2024, se reunieron los señores, CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.A. E.S.P., JAIME MALDONADO MORA como supervisor del contrato y el señor JHON ALEXANDER GARCIA GIRALDO, contratista, con el fin de convenir acta de convenio de precios No. 01 al contrato 142 de 2024.


ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UN
NP 40	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS EN COSTALES DE MATERIAL CONTAMINADO	\$ 116.652	m3
NP 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	\$ 22.063	m2
NP 42	LIMPIEZA DE AGUA RESIDUAL EMPOZADA COM MOTOBOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA	\$ 242.690	DIA
NP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN TABLERO	\$ 68.845	M2



Nota 1: Los precios incluyen A.I.U e IVA sobre utilidades.

Sin ningún otro motivo de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.


CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
 GERENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.




JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
 CONTRATISTA


JAIME MALDONADO MORA
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE – EMPOCALDAS.

			
ITEM NP 40		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
CONTRATO N° 142 de 2024 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRE EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS EN COSTALES DE MATERIAL CONTAMINADO	
UNIDAD: m3			
I. EQUIPO			
Descripción		Tipo	Precio-Unit
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)		Herramienta	\$ 3.311
			Rendimiento 4,800
			Valor-Unit. \$ 15.893
			\$ 15.892,80
II. INSUMOS			
Descripción		Unidad	Precio-Unit.
COSTAL		Unidad	\$ 1.000
			Cantidad 51,000
			Valor-Unit. \$ 51.000
			Sub-Total \$ 51.000,00
IV. PERSONAL PROFESIONAL			
Trabajador	Valor Hora	Factor	Salario hora
CUADRILLA A TIPO 1 (2 AYUDANTES) (Albañilería)	\$ 11.017	1,83	\$ 20.161
			Tiempo contrato días
			Cantidad 1
			Valor-Unit. \$ 20.161
			Sub-Total \$ 20.161,00
			Total Costo Directo \$ 87.034,00
			Total Costo Directo \$ 116.652



JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
CONTRATISTA

JAIME MALDONADO MORA
SUPERVISOR
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

			
ITEM NP 41		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
CONTRATO N° 142 de 2024 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	
UNIDAD: m2			
I. EQUIPO			
Descripción		Tipo	Precio-Unit
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)		EQUIPOS	\$ 3.311
EQUIPO DE TRANSPORTE		HERRAMIENTA	\$ 171.308
			Rendimiento 0,200000
			Valor-Unit. \$ 662
			\$ 178
			\$ 840,36
II. INSUMOS			
Descripción		Unidad	Precio-Unit.
PLÁSTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6		INSUMO	\$ 3.368
ESTRUCTURA EN GUADUA		INSUMO	\$ 2.995
ACARREO INTERNO		INSUMO	\$ 1.733
			Cantidad 1,400
			Valor-Unit. \$ 4.715
			\$ 4.193
			\$ 369
			Sub-Total \$ 9.277,33
IV. PERSONAL PROFESIONAL			
Trabajador	Salario Hora	Factor	Valor Hora
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 A)	\$ 23.121	1,83	\$ 42.311
			Rendimiento 0,15000
			Cantidad 1
			Valor-Unit. \$ 6.347
			Sub-Total \$ 6.347,00
			Total Costo Directo \$ 15.465,00
			Total Costo Directo \$ 22.063



JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
CONTRATISTA

JAIME MALDONADO MORA
SUPERVISOR
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

						
ITEM NP 42		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.				
CONTRATO N° 142 de 2024 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		LIMPIEZA DE AGUA RESIDUAL EMPOZADA COM MOTOBOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA				
UNIDAD: DIA						
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Precio-Unit	Rendimiento	Valor-Unit.		
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	HERRAMIENTA	\$ 3.311	0,200	\$ 662		
MOTOBOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA DE 2"	EQUIPO	\$ 83.300	1,000	\$ 83.300		
MANGUERA DE SUCCION PARA MOTOBOMBA	EQUIPO	\$ 17.850	1,000	\$ 17.850		
				\$ 101.812,20		
II. INSUMOS						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
				\$ 0		
Sub-Total				\$ -		
IV. PERSONAL PROFESIONAL						
Trabajador	Valor día	Factor	Salario Mensual	Tiempo contrato días	Cantidad	Valor-Unit.
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 A)	\$ 43.333	1,83	\$ 79.300	1,00000	1	\$ 79.300
						\$ 0
Sub-Total						\$ 79.300,00
Total Costo Directo				\$ 181.112,00		
Total Costo Directo				\$ 262.690		

JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
CONTRATISTA

JAIME MALDONADO MORA
SUPERVISOR
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

						
ITEM NP 43		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.				
CONTRATO N° 142 de 2024 OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN TABLERO				
UNIDAD: m2						
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Precio-Unit	Rendimiento	Valor-Unit.		
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	EQUIPOS	\$ 3.311	0,600	\$ 1.987		
EQUIPO DE TRANSPORTE	HERRAMIENTA	\$ 171.308	0,002	\$ 377		
ACARREO INTERNO	Insumo	\$ 1.733	0,3625	\$ 628		
				\$ 2.991,69		
II. INSUMOS						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TABLERO 1,40 X 0,70	EQUIPOS	\$ 9.123	0,980	\$ 8.941		
PUNTILLA CON CABEZA 3"	Insumo	\$ 4.680	0,500	\$ 2.340		
GUADUA CEPA DE 5 VARAS	Insumo	\$ 9.128	0,800	\$ 7.302		
Sub-Total				\$ 18.582,94		
IV. PERSONAL PROFESIONAL						
Trabajador	Valor Hora	Factor	Salario Hora	Tiempo contrato días	Cantidad	Valor-Unit.
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañilería)	\$ 18.095	1,83	\$ 33.113		0,9	\$ 29.802
Sub-Total						\$ 29.802,00
Total Costo Directo				\$ 51.377,00		
Total Costo Directo				\$ 68.543		

JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
CONTRATISTA

JAIME MALDONADO MORA
SUPERVISOR
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1


CONTRATO No.	142 de 2024
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, PATIOS INTERIORES TUTELA OMAIRA CASTAÑO QUINTERO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.
CONTRATISTA:	JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
SUPERVISOR:	JAIME MALDONADO MORA
FECHA:	25 DE JUNIO DE 2024

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		EJECUTADO		% EJECUT
		UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	
1	TRABAJOS PRELIMINARES									
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	50,00	\$ 8.274	\$ 413.700	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	80,00	\$ 20.064	\$ 1.605.120	16,00	\$ 321.024	16,00	\$ 321.024	20,00%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	0,00	\$ 249.590	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	\$ 1.183.485	\$ 1.183.485	1,00	\$ 1.183.485	1,00	\$ 1.183.485	100,00%
6	DEMOLICIONES									
7	Corte con disco abrasivo	ml	0,00	\$ 12.257	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	2,00	\$ 133.800	\$ 267.600	1,20	\$ 160.560	1,20	\$ 160.560	60,00%
9	EXCAVACION									
10	En material común de 0 a 2m	m³	98,00	\$ 45.098	\$ 4.419.408	179,94	\$ 8.114.574	179,94	\$ 8.114.574	183,61%
11	En material común de 2,1 a 4m	m³	98,00	\$ 62.357	\$ 6.110.496	59,50	\$ 3.709.944	59,50	\$ 3.709.944	60,71%
12	En material común de 4 a 6m	m³	122,00	\$ 111.219	\$ 13.567.986	10,56	\$ 1.174.409	10,56	\$ 1.174.409	8,66%
13	En conglomerado	m³	0,00	\$ 89.820	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
14	Entibado horizontal Tipo II	m2	410,00	\$ 30.550	\$ 12.525.500	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
15	Retiro de material sobrante en vehiculo	m³	127,7	\$ 52.619	\$ 6.692.374	181,10	\$ 9.528.214	181,10	\$ 9.528.214	142,37%
16	Sobreacarreo al hombro material de retiro	m3	127,20	\$ 34.647	\$ 4.407.098	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO									
18	Instalación en tubería PVC corrugada de 24"	ml	30,00	\$ 84.990	\$ 2.549.700	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
19	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	12,00	\$ 893.887	\$ 10.726.644	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
20	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm para trafico pesado con logo y araña de refuerzo	Un	2	\$ 1.121.200	\$ 2.242.400	0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
21	Bases y Cañuelas	Un	2,00	\$ 868.300	\$ 1.736.600	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
22	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	30,00	\$ 22.170	\$ 665.100	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
23	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	4,00	\$ 642.000	\$ 2.568.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
24	Instalación de silletas de 24"x6"	und	4,00	\$ 69.800	\$ 279.200	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
25	Empalme a cámara	und	4,00	\$ 145.100	\$ 580.400	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
26	LLENOS									
27	Arena para base y atraque	m³	34,87	\$ 193.800	\$ 6.757.806	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
28	Lleno compactado con material de la obra	m³	95,40	\$ 36.048	\$ 3.438.502	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
29	Lleno compactado con material de Prestamo	m3	222,60	\$ 119.000	\$ 26.489.400	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
30	Sobreacarreo al hombro material de	m3	260,00	\$ 34.647	\$ 9.008.220	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
31	Sub base para pavimento	m³	1,27	\$ 232.700	\$ 290.875	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
32	CONCRETOS									
33	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	2,00	\$ 972.800	\$ 1.945.600	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
34	Concreto para pavimento 42MR hecho en	m³	2,00	\$ 1.321.100	\$ 2.642.200	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
35	Reparacion fachada primer piso, resane grietas y pintura	m2	16,00	\$ 25.000	\$ 400.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
36	ACERO									
37	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	10,00	\$ 9.400	\$ 94.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
38	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1,00	\$ 2.688.140	\$ 2.688.140	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
39	Trabajador Siso	mes	2,00	\$ 4.613.380	\$ 9.226.760	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS									
NP 40	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS EN COSTALES DE MATERIAL CONTAMINADO	m3		\$ 116.652		181,14	\$ 21.130.257	181,14	\$ 21.130.257	
NP 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	m2		\$ 22.063		159,50	\$ 3.519.064	159,50	\$ 3.519.064	

NP 42	LIMPIEZA DE AGUA RESIDUAL EMPOZADA COM MOTOBOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA	DIA		\$ 242.690		16,00	\$ 3.883.041	16,00	\$ 3.883.041	
NP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN TABLERO	m2		\$ 68.849		21,60	\$ 1.487.056	21,60	\$ 1.487.056	
COSTO TOTAL					\$ 135.522.314		\$ 54.211.629		\$ 54.211.629	
COSTO DIRECTO					\$ 101.136.055		\$ 40.456.440		\$ 40.456.440	
ADMINISTRACION				%	29		\$ 101.136.055	\$ 29.329.456	\$ 11.732.368	\$ 11.732.368
IMPREVISTO				%	0		\$ 101.136.055	\$ 0	\$ 0	\$ 0
UTILIDADES				%	5		\$ 101.136.055	\$ 5.056.803	\$ 2.022.822	\$ 2.022.822
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES							\$ 135.522.314		\$ 54.211.629	\$ 54.211.629

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 135.522.314
VALOR ADICION		
VALOR ACTA 1	\$ 54.211.629	
VALOR ACTA 2	\$ 0	
VALOR ACTA 3 Y FINAL	\$ 0	
VALOR ACTAS	\$ 54.211.629	
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 81.310.685	
SUMAS IGUALES	\$ 135.522.314	\$ 135.522.314

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	


JAIME MALDONADO MORA
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
 CONTRATISTA

NP 40	SOBRECARGO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS EN COSTALES DE MATERIAL CONTAMINADO										VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	m³	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
	4.4	0.5	1.00	-	2.20	-	-	2.2	-	CÁMARA PEQUEÑA ALICIA PELAEZ		
	1.0	0.8	0.50	-	0.4	-	-	0.4	-	CÁMARA PEQUEÑA ALICIA PELAEZ		
	3.2	1.2	2.00	-	7.7	-	-	7.7	-	CÁMARA GRANDE ALICIA PELAEZ		
	1.8	1.1	2.00	-	3.8	-	-	3.8	-	CÁMARA GRANDE ALICIA PELAEZ		
	3.8	2.0	1.08	-	8.2	-	-	8.2	-	CÁMARA GRANDE ALICIA PELAEZ		
	1.2	0.7	0.80	-	0.7	-	-	0.7	-	CÁMARA GRANDE ALICIA PELAEZ		
	2.0	0.9	1.00	-	1.8	-	-	1.8	-	CÁMARA GRANDE ALICIA PELAEZ		
	4.1	3.2	2.00	-	26.2	-	-	26.2	-	CÁMARA GUSTAVO HERRERA		
	2.4	1.5	1.10	-	4.0	-	-	4.0	-	CÁMARA GUSTAVO HERRERA		
	1.3	1.7	0.80	-	1.7	-	-	1.7	-	CÁMARA GUSTAVO HERRERA		
	3.1	2.2	2.00	-	13.3	-	-	13.3	-	CÁMARA GUSTAVO HERRERA		
	2.45	3.05	2.00	-	14.9	-	-	14.9	-	ZANIA RED DESCOLE CÁMARA		
	1.3	2.3	2.00	-	6.0	-	-	6.0	-	ZANIA RED DESCOLE CÁMARA		
	2.1	1.0	0.65	-	1.3	-	-	1.3	-	ZANIA RED DESCOLE CÁMARA		
	2.2	1.3	2.00	-	5.6	-	-	5.6	-	ZANIA RED DESCOLE CÁMARA		
	4.0	3.5	2.00	-	28.0	-	-	28.0	-	OMAIRA CASTAÑO		
	4.0	0.2	1.50	-	1.2	-	-	1.2	-	DEMOLICIÓN MURO OMAIRA CASTAÑO		
	3.0	7.0	2.0	-	42.0	-	-	42.0	-	OMAIRA CASTAÑO		
	6.0	2.0	1.00	-	12.0	-	-	12.0	-	GUSTAVO HERRERA		
ACTA 1	181.1	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-			

NP 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO										VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	m²	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
	6.60	5.80	-	38.28	-	-	-	38.28	-	ALICIA PELAEZ		
	6.20	5.30	-	32.86	-	-	-	32.86	-	ALICIA PELAEZ		
	5.80	6.10	-	35.38	-	-	-	35.38	-	GUSTAVO HERRERA		
	4.70	6.10	-	28.67	-	-	-	28.67	-	GUSTAVO HERRERA		
	5.4	4.5	-	24.3	-	-	-	24.3	-	OMAIRA CASTAÑO		
ACTA 1	189.3	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-			

NP 42	LIMPIEZA DE AGUA RESIDUAL EMPAZADA CON MOTOBOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA										VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	DIA	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
15,000	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-		
ACTA 1	16,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-			

NP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN TABLERO										VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	m²	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
8,00	1.4	0.7	-	7,84	-	-	-	7,84	-	-		
14,00	1.4	0.7	-	13,72	-	-	-	13,72	-	-		
ACTA 1	21,60	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063902847



(415)7707212489984(8020) 001876406390284 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 5 0 8 4 2 1 3	5	GARCIA	GIRALDO	JOHN	ALEXANDER
11. Razón social					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales					
24. Dirección CR 17 A 71 55					Cód. 1 0
25. País Colombia		26. Departamento Caldas		27. Municipio Manizales	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GARCIA GIRALDO JOHN ALEXANDER
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 75084213 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación
 1006. Organización GARCIA GIRALDO JOHN ALEXANDER

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 4-0 1-1 7/1 6:3 8:0 4

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

04-07-2024 04-07-2024 FE FE62 Factura electrónica 75084213 JOHN ALEXANDER C... EMPOCALDAS S.A. E.... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$54,211,629
