


# CONTRATO Y AÑO	0102 DE 2020	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	63.351.397
				2 VALOR ADICION	
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN			3 VALOR TOTAL (1+2)	63.351.397
METROES	78.749.731			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
COPIA # Copia y fecha.	00276 DEL 10/02/2020			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	52.795.585
ACTA # Copia y fecha.	000426 DEL 28/04/2020			6 VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	10.555.812
OBJETO DEL CONTRATO.	CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VIA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
2- Pagos SENA o ICBF, cuando aplique	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Regimen Comun) o Factura equivalente (regimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	X	
14- Distribucion por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeacion y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANA GONZALEZ OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribucion por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
002-491768-58	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN

INGENIERO CIVIL

NIT: 78.749.731-5

Calle 31 N° 7 - 65

Tel: 3002308977

FACTURA DE VENTA

001

VENTAS REGIMEN COMUN
Resolución de la DIAN N° 18764002445924

Fecha 2020/08/18

Rango del 1 al 10 Autorizado

Señor (es):

EMPOCALDAS S.A E.S.P N.I.T 890.803.239-9

Remisiones		O. De Compra N°			
Fecha Factura		Fecha Vencimiento		Forma de Pago	
28	9	2020			

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
	ACTA FINAL DE OBRAS CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VIA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		
	COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES		40.317.362,00
	ADMINISTRACIÓN 24%		9.676.167,00
	IMPREVISTOS 1%		403.174,00
	UTILIDAD 5%		2.015.868,00
	TOTAL ACTA		52.412.570,00

SON:	TOTAL	\$	52.412.570,00
	IVA	\$	383.015,00
	TOTAL	\$	52.795.585,00

Las partes acuerdan que el presente documento en su original y copia presentan merito ejecutivo y para todos los efectos legales, el cliente reconoce como valida la firma de quien recibe la mercancia. Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio segun el articulo 774 del Codigo de Comercio.

ACEPTADA:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO CC O NIT

CONTRATO No. 0102 DE 2020		EMPICALDAS S.A.E.S.P				ACTA No. 1 y FINAL		FECHA CORTE: 16 DE JULIO DEL 2020	
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VIA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		FECHA INICIACION: 17 DE JUNIO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 16 DE JULIO DEL 2020					
MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS		VALOR CONTRATO: 5.63.351.397		VALOR CONTRATO + ADICION:					
CONTRATISTA: ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN		VALOR OBRA: 5		SUPERVISION: ALEX QUINTERO VASQUEZ					
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO CARLOS GONZALES V		FECHA: 22 DE JULIO DEL 2020							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	CONTRACTUAL		ACTA 1 y FINAL		% EJECUT	
				VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	PRELIMINARES								
2	Localizacion y replanteo	ml	120	5.800	696.000	120,00	696.000	100%	
3	Cerramiento en tela verde y soporte de guarda cada 2 mts	ml	252	11.200	2.822.400	-	-	-	
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	172.500	345.000	2,00	345.000	100%	
5	Instalacion de valla institucional de 2 x 4	und	1	885.000	885.000	1,00	885.000	100%	
6	DEMOLICIONES								
7	Corte con disco abrasivo	ml	10	8.700	87.000	-	-	-	
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes gradaderas y cañuelas	m3	1	93.000	93.000	-	-	0%	
9	EXCAVACION								
10	En material comun de 0 a 2mts	m3	224	22.500	5.040.000	180,20	4.054.500	80%	
11	En conglomerado	m3	22	31.500	693.000	-	-	0%	
12	Entubado horizontal tipo 1	ml	10	34.400	344.000	-	-	0%	
13	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	64	28.700	1.836.800	28,00	803.600	44%	
14	ESTRUCTURA ALCANTARILLADO								
15	Suministro instalacion de tuberia PVC corrugada de 12"	ml	120	90.596	10.871.574	120,00	10.871.574	100%	
16	Suministro instalacion red de acueducto en 3" PVC RDE 21 union mecanica	ml	102	32.500	3.315.000	-	-	0%	
17	Cámara de caída D = 1,2 mts hs 3,04 espesor de pared E = 0,20 mts con colchon de piedra pegada e = 0,40 mts y boquilla	ml	6,60	580.000	3.828.000	6,45	3.741.000	98%	
18	Suministro instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion en HD D= 0,60 mts para trafico pesado	und	4	650.000	2.600.000	4,00	2.600.000	100%	
19	Bases y cañuelas	und	4	485.000	1.940.000	4,00	1.940.000	100%	
20	Suministro e instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliaria	ml	48	48.700	2.337.600	32,00	1.558.400	67%	
21	Cajas de inspeccion de 50 x 50 para domiciliarias incluye tapa en concreto	und	6	315.870	1.895.220	5,00	1.579.350	83%	
22	Suministro e instalacion de silleas de 12" x 6" incluye adhesivo	und	6	240.200	1.441.200	5,00	1.201.000	83%	
23	Empalme a cámara	und	1	100.500	100.500	1,00	100.500	100%	
24	LEENOS								
25	Arena para base y atraque	m3	16	78.400	1.254.400	11,26	883.098	70%	
26	Lleno compactado con material de obra	m3	152	12.500	1.900.000	152,20	1.902.500	100%	

27	Afirmado compactado	m3	24	75.000	1.800.000	-	-	0%
28	CONCRETOS							
29	Concreto de 21 mpa para gradiería y ardenes	m3	0,50	537.800	328.900	-	-	0%
30	Concreto para pavimento de 42 MR echo en obra	m3	0,50	930.500	465.250	-	-	0%
31	ACERO							
32	Acero de refuerzo para gradierías	kilo	60	5.200	312.000	200,00	1.040.000	333%
33	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	100%
	 NUEVOS ITEM							
1	Profesional en salud ocupacional o profesional en áreas afines con especialización en salud ocupacional (salario 2.200.000 factor prestacional de 1,72 * 600.000 manutención) Incluye la elaboración del protocolo de seguridad, permanencia 100 % en la obra	mes		4.384.000	-	1,0	4.384.000	0%
2	Instalación tubería PVC de 3"	ml		5.796	-	40,0	231.840	0%
	COSTO DIRECTO				48.731.844		40.317.362	
	ADMINISTRACION	%	24		11.695.643		9.676.167	
	IMPREVISTOS	%	1		487.318		403.174	
	UTILIDADES	%	5		2.436.592		2.015.868	
	SUMA ANTES DE IVA						52.412.570	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19				383.015	
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				63.351.397		52.795.585	
RESUMEN DEL CONTRATO								
	VALOR DEL CONTRATO						63.351.397	
	VALOR ADICION						-	
	VALOR ACTA 1 Y FINAL				52.795.585		-	
	VALOR ACTAS				52.795.585		-	
	SALDO NO EJECUTADO				10.555.812		-	
	SUMAS IGUALES				63.351.397		63.351.397	

RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

AR. ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
SUPERVISOR
P. POCALDAS S.A. E.S.P


ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	No. 0102 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD UNICA DE OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
CC	78.749.731
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
NIT.	78.749.731
MUNICIPIO	VICTORIA CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 48.731.844
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 11.695.642
IMPREVISTOS 1 %	\$ 487.318
UTILIDAD 5 %	\$ 2.436.592
VALOR TOTAL OBRA	\$ 63.351.397 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 52.412.570
SALDO NO EJECUTADO	\$ 10.938.827
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
CDP	00276 DEL 10/02/2020
RP	000426 DEL 28/04/2020

En la ciudad de Manizales a los dieciséis días (16) del mes de julio de 2020, se reunieron los señores, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Ingeniero Supervisor de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y el señor (a) **ALFONSO CARLOS GONZALES VELLEJIN**, en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato de obra No. 0102 DE 2020.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ALFONSO CARLOS GONZALES V
Contratista

	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0102 DE 2020	Acta N°	1 Y FINAL	1 VALOR INICIAL (incluido AII e IVA)	63.351.397
				2 VALOR ADICION	
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN			3 VALOR TOTAL (1+2)	63.351.397
RECURSOS	78.749.731			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
Acta # (Inicio Acta)	00276 DEL 10/02/2020			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	52.795.585
Acta # (Cierre Acta)	000426 DEL 28/04/2020			6 VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	10.555.812
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VIA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
2- Pagos SENA o ICBF, cuando aplique	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Regimen Común) o Factura equivalente (regimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Gomez Osorio NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
002-491768-58	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


EMPOCALDAS S.A.S.S.P


CONTRATO No: 0102 DE 2020	ACTA No: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: 16 DE JULIO DEL 2020
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	FECHA INICIACION: 17 DE JUNIO DEL 2020	FECHA VENCIMIENTO: 16 DE JULIO DEL 2020
MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 63.351.397	VALOR CONTRATO + ADICION:
CONTRATISTA: ALFONSO CARLOS GONZALES VELLONIN	VALOR OBRA: \$	
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO CARLOS GONZALES V	SUPERVISOR: ARLEX QUINTERO VASQUEZ	FECHA: 22 DE JULIO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES							
2	Localización y replanteo	ml	120	5.800	696.000	120,00	696.000	100%
3	Cerramiento en tela verde y soporte de guardas cada 2 mts	ml	252	11.200	2.822.400	-	-	-
4	Señal preventiva y replantemaria	und	2	172.500	345.000	2,00	345.000	100%
5	Instalación de valla institucional de 2 x 4	und	1	885.000	885.000	1,00	885.000	100%
6	DEMOLICIONES							
7	Corte con disco abrasivo	ml	10	8.700	87.000	-	-	-
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes gradaderas y cunetas	m3	1	93.000	93.000	-	-	0%
9	EXCAVACION							
10	En material común de 0 a 2mts	m3	224	22.500	5.040.000	180,20	4.054.500	80%
11	En conglomerado	m3	22	31.500	693.000	-	-	0%
12	Entibado horizontal tipo 1	ml	10	34.400	344.000	-	-	0%
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	64	28.700	1.836.800	28,00	803.600	44%
14	ESTRUCTURA ALCANTARILLADO							
15	Suministro instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	120	90.596	10.871.574	120,00	10.871.574	100%
16	Suministro instalación red de acueducto en 3" PVC RDE 21 unión mecánica	ml	102	32.500	3.315.000	-	-	0%
17	Cámara de caída D = 1,2 mts hs 3,04 espesor de pared E = 0,20 mts con colchón de piedra pagada e = 0,40 mts y boquilla	ml	6,60	580.000	3.828.000	6,45	3.741.000	98%
18	Suministro instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D= 0,60 mts para tráfico pesado	und	4	650.000	2.600.000	4,00	2.600.000	100%
19	Bases y cunetas	und	4	485.000	1.940.000	4,00	1.940.000	100%
20	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliaria	ml	48	48.700	2.337.600	32,00	1.558.400	67%
21	Cajas de inspección de 50 x 50 para domiciliares incluye tapa en concreto	und	6	315.870	1.895.220	5,00	1.579.350	83%
22	Suministro e instalación de sillerías de 12" x 6" incluye adhesivo	und	6	240.200	1.441.200	5,00	1.201.000	83%
23	Empalme a cámara	und	1	100.500	100.500	1,00	100.500	100%
24	LEÑOS							
25	Arena para base y atrique	m3	16	78.400	1.254.400	11,26	883.098	70%
26	Lleno compactado con material de obra	m3	152	12.500	1.900.000	152,20	1.902.500	100%

27	Afirmado compactado	m3	24	75,000	1,800,000	-	-	0%
28	CONCRETOS							
29	Concreto de 21 mpa para gradería y andenes	m3	0,50	657,800	328,900	-	-	0%
30	Concreto para pavimento de 42 MR echo en obra	m3	0,50	930,500	465,250	-	-	0%
31	ACERO							
32	Acero de refuerzo para graderías	kilo	60	5,200	312,000	200,00	1,040,000	333%
33	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1	1,500,000	1,500,000	1,00	1,500,000	100%
	NUEVOS ITEM							
1	Profesional en salud ocupacional o profesional en áreas afines con especialización en salud ocupacional (salario 2.200,000 factor prestacional de 1,72 * 600,000 mantención) incluye la elaboración del protocolo de seguridad, permanencia 100% en la obra	mes		4.384,000	-	1,0	4.384,000	0%
2	Instalación tubería PVC de 3"	ml		5,736	-	40,0	231,840	0%
	COSTO DIRECTO				48.731.844		40.317.362	
	ADMINISTRACION	%	24		11.695.643		9.676.167	
	IMPREVISTOS	%	1		487.318		403.174	
	UTILIDADES	%	5		2.436.592		2.015.868	
	SUMA ANTES DE IVA						52.412.570	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19				383,015	
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				63.351.397		52.795.585	
RESUMEN DEL CONTRATO								
	VALOR DEL CONTRATO						63.351.397	
	VALOR ADICION						-	
	VALOR ACTA 1 Y FINAL				52.795.585		-	
	VALOR ACTAS				52.795.585		-	
	Saldo no ejecutado				10.555.812		-	
	SUMAS IGUALES				63.351.397		63.351.397	

RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO


 ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
 SUPERVISOR
 F. POCCALDAS S.A. E.S.P



 ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
 CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL


CONTRATO	No. 0102 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD UNICA DE OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
CC	78.749.731
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
NIT.	78.749.731
MUNICIPIO	VICTORIA CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 48.731.844
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 11.695.642
IMPREVISTOS 1 %	\$ 487.318
UTILIDAD 5 %	\$ 2.436.592
VALOR TOTAL OBRA	\$ 63.351.397 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 52.412.570
SALDO NO EJECUTADO	\$ 10.938.827
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
CDP	00276 DEL 10/02/2020
RP	000426 DEL 28/04/2020

En la ciudad de Manizales a los dieciséis días (16) del mes de julio de 2020, se reunieron los señores, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Ingeniero Supervisor de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y el señor (a) **ALFONSO CARLÓS GONZALES VELLEJIN**, en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato de obra No. 0102 DE 2020.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ALFONSO CARLÓS GONZALES V
Contratista



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	78749731
Primer Nombre ó Razón Social	ALFONSO CARLOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GONZALEZ VELLOJIN
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad Capital	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio	Calle 31 No. 7-65
Ciudad de Domicilio	Montería
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3002308977
Correo electrónico	carlosalfonsogonzalezvellojin1@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Número Contrato de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Nombre Obra	EMPOCALDAS_VICT_0102_2020
Fecha Inicio Obra	01/06/2020
Fecha Terminación Obra	30/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	VICTORIA -CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$219,451.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Total Pagado	\$219,451.00
Valor Total	\$219,500.00
Nro. Transacción eCollect	67483131
Fecha Proceso	17/09/2020 11:10:12 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA
Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.	

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Compromiso para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 86969034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es el de
máxima hasta el quinto día de trabajo generado en
su contrato debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET		
67483236		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	09	2020
FECHA VENCIMIENTO		
22	09	2020

Nombre ó Razón Social : ALFONSO CARLOS Identificación : 78749731
Dirección : Calle 31 No. 7- Telefono : 3002308977

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$175,600.00
	IVA	
	TOTAL	\$175,600.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente.
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiada)
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6779327(3900)00000175600(96)20200922



CONVENIO No 29232

TICKET No. 67483236


Ciudad: Nit o Cedula: 78749731 Telefono:

Nombre del Pagador / Cliente: ALFONSO CARLOS

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
TOTAL		



ÁREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:


Número de Identificación	78749731
Primer Nombre ó Razón Social	ALFONSO CARLOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GONZALEZ VELLOJIN
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad Capital	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio	Calle 31 No. 7-65
Ciudad de Domicilio	Montería
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3002308977
Correo electrónico	carlosalfonsogonzalezvellojin1@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Número Contrato de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Nombre Obra	EMPOCALDAS_VICT_0102_2020
Fecha Inicio Obra	01/07/2020
Fecha Terminación Obra	31/07/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	VICTORIA-CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$175,561.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$175,561.00
Total Pagado	\$175,561.00
Valor Total	\$175,600.00
Nro. Transacción eCollect	67483236
Fecha Proceso	17/09/2020 11:15:39 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA
Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.	

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1	Fecha del informe	22/07/2020	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0102/2020
Objeto:	construcción red de acueducto y alcantarillado en la vía a la planta de tratamiento en el municipio de victoria caldas
Nombre Contratista:	Alfonso Carlos Gonzales vellojin
Representante legal:	Alfonso Carlos Gonzales vellojin
Fecha del contrato:	11 de marzo del 2020
Plazo de ejecución:	30 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 63.351.397
Fecha de iniciación:	17 de junio del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	16 de julio del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %


1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Victoria	alcantarillado	0.12

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	30
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

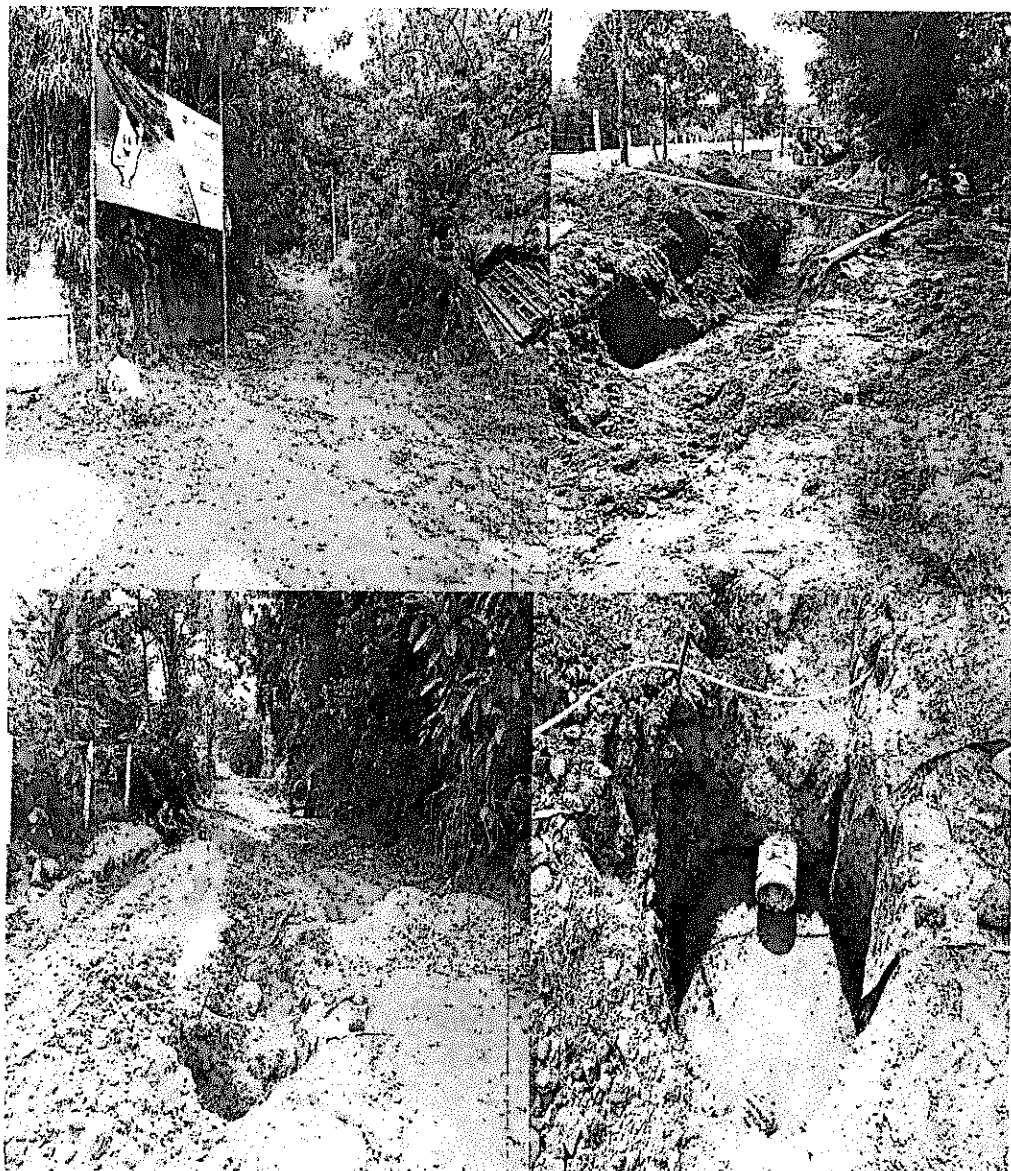





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

La obra se ejecuto en su totalidad no se presentaron problemáticas.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 63.351.397
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 52.795.585
Porcentaje ejecutado en el periodo:	83 %
Inversión total ejecutada:	\$ 52.795.585
Porcentaje total ejecutado:	83 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	53-45-101003300	17/06/2020	17/10/2020	\$ 19.005.419.10
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s.a	53-45-101003300	17/06/2020	18/07/2023	\$ 12.670.279.40
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s.a	53-45-101003300	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 12.670.279.40
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s.a	53-40-101004076	11/03/2020	11/07/2020	\$ 19.005.419.10



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)


NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Jhawin Benavides	X	X	X	X	X
Antonio Cortez c	X	X	X	X	X
Yoel padilla	X	X	X	X	X
Gersain Fernández	X	X	X	X	X
Wison cortes	X	X	X	X	X
Weimar botero	X	X	X	X	X
Daniel Arango	X	X	X	X	X
Tatiana Fernández	X	X	X	X	X
Maricela Cardona	X	X	X	X	X
María cristina Betancur	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
18/06/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra


	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del en el Municipio de Victoria Caldas

 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	


8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 78749731	5	ALFONSO GONZALEZ	A- 200 O MAS COLTANTES	ALFONSO GONZALEZ	c.d. 31 No. 7-65	MONTERIA-CORDOBA	7823039	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	692760051	E	940859267	2020/08/11	2020/07/27	BANCOLOMBIA	0	\$593,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$301,400	\$0	\$0	\$301,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$32,800	\$0	\$0	\$32,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$81,400	\$0	\$0	\$81,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$65,600	\$0	\$0	\$65,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$121,600	\$0	\$0	\$121,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$131,400	\$0	\$0	\$131,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	\$131,400	\$0	\$0	\$131,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$75,400	\$0	\$0	\$75,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$75,400	\$0	\$0	\$75,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$75,400	\$0	\$0	\$75,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$59,000	\$0	\$0	\$59,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200
TOTAL				8	\$593,600	\$0	\$0	\$593,600



DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF
RIT 78749731	5	ALFONSO GONZALEZ	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALFONSO GONZALEZ	C.I. Nro. 7-65	MONTERIA-CORDOBA	7823079	\$1


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	697230790	940893511	E	2020/07/08	2020/07/08	BANCOLOMBIA	19	\$2,061,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIF	DV	VALORES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$1,064,700	\$0	\$0	\$1,064,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$271,900	\$0	\$0	\$271,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$215,400	\$0	\$0	\$215,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$436,900	\$0	\$0	\$436,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$463,500	\$0	\$0	\$463,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	\$463,500	\$0	\$0	\$463,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$266,700	\$0	\$0	\$266,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$266,700	\$0	\$0	\$266,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$266,700	\$0	\$0	\$266,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$204,500	\$0	\$0	\$204,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$27,000	\$0	\$0	\$27,000
TOTAL				10	\$2,061,600	\$0	\$0	\$2,061,600







ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN

**CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
VICTORIA CALDAS**

CONTRATO DE OBRA No. 0102 DEL 2020



INFORME No. 1 Y FINAL DE CONTRATISTA

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	Día	Mes	Año
	18	08	2020

PERÍODO REPORTADO:



Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año
	17	06	2020		16	07	2020

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y crecimiento de una ciudad es medido en gran parte por el impacto que generan sus obras de infraestructura. La infraestructura vial comprende un aspecto fundamental con la pavimentación y mejoramiento de las vías de tráfico en una ciudad. El municipio de Victoria ha experimentado un crecimiento urbanístico en los últimos años, lo que ha generado la expansión y mejoramiento de la malla vial urbana; teniendo en cuenta esta necesidad, la empresa prestadora del servicio Empocaldas debió suscribir el contrato No 0102 del 2020 que tiene como objeto, **CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS**

Este informe contiene información referente al Contrato de Obra No 0102 del 2020, que se viene adelantando en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas. La descripción detallada de todas las actividades realizada por el Contratista, información sobre avances de obra, equipos, materiales y mano de obra utilizada, así como aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto.

 <p>empocaldas CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO</p>	<p>ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN</p> <p>INFORME No.1</p> <p>CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS</p>	
--	---	---

2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

Contrato de obra No. 0102 DEL 2020

Contratante EMPOCALDAS.

Contratista ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN



Objeto: CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA
DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
VICTORIA CALDAS

Representante legal ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN

Valor contrato \$ 63.351.397

Fecha de inicio junio 17 de 2020

Fecha de final julio 16 de 2020

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS”, consiste en la construcción de acueducto y alcantarillado en la vía urbana de la ciudad de Victoria, departamento de Caldas, distribuidos de la siguiente manera.

Nomenclatura	Longitud (m)
CALLE EMPOCALDAS	160

Tabla 1. Localización vía a ejecutar

3.1. Localización del Proyecto

Victoria es un municipio colombiano ubicado en el oriente del departamento de Caldas, en la región conocida como Magdalena Medio. Se halla este municipio entre el piedemonte Oriental de la Cordillera Central y el Valle interandino del río Magdalena, cuenta con una temperatura media de 32 °C y su altura sobre el nivel del mar es de 750 m. El municipio está situado a 137 km de la capital del departamento, Manizales. Su población actual (2015) es de aproximadamente 8.415 habitantes, con una densidad poblacional de 16,6 Hab/km².

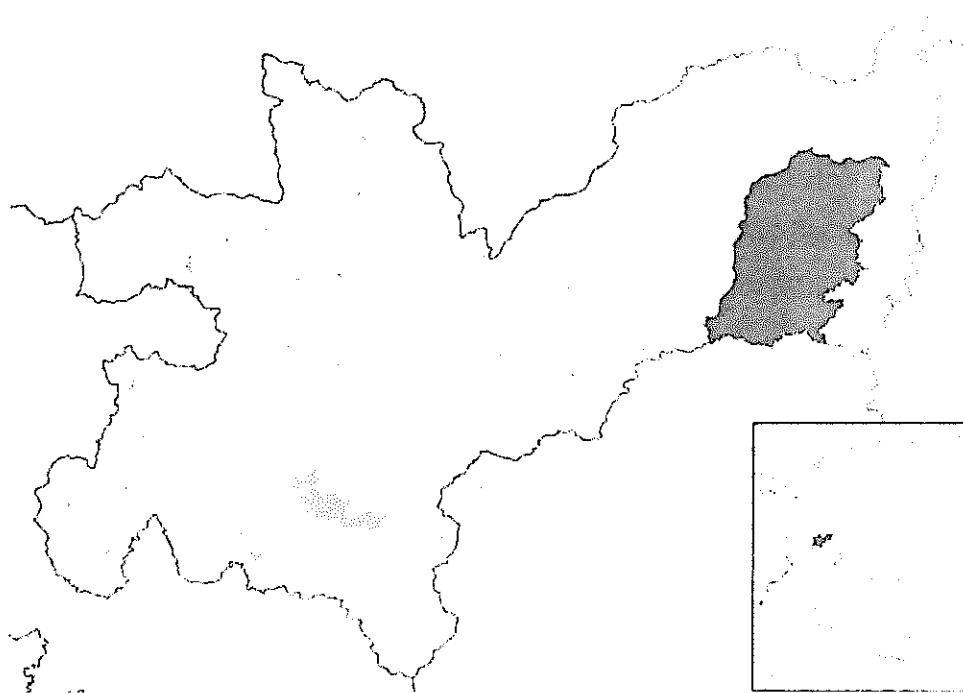


Figura 1. Localización del municipio de Victoria.

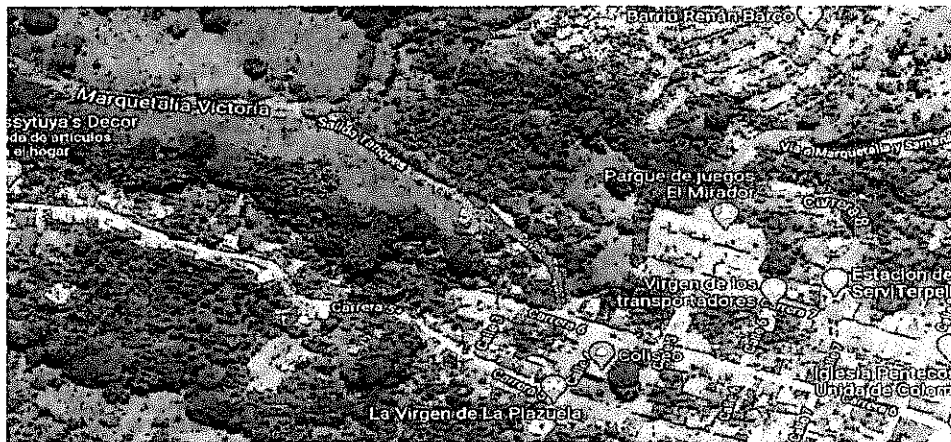




Figura 2. Localización de calle a intervenir

Calle 31 #7-65 Br la Ceiba – Montería – Córdoba

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	
---	--	---

4.0 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

En el período de reporte del presente informe, el contratista realizó las siguientes actividades:

PRELIMINARES

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.
- CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y SOPORTE DE GUADUAS CADA 2 MTS.
- SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA.
- INSTALACIÓN DE VALLA INSTITUCIONAL DE 2 * 4.

DEMOLICIONES



- CORTE CON DISCO ABRASIBO.
- DEMOLICIÓN DE EXSTRUCTURAS EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE ANDENES, GRADERIAS Y CAÑUELAS.

EXCAVACION

- EN MATERIAL COMÚN DE 0 A 2 MTS.
- EN CONGLOMERADOS.
- ESTIBADO HORIZONTAL TIPO 1.
- RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE EN VEHICULO AUTOMOTOR.

ESTRUCTURA ALCANTARILLADO

- SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12".

	<p style="text-align: center;">ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN</p> <p style="text-align: center;">INFORME No.1</p> <p style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS</p>	
---	---	---



- SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN 3" PVC RDE 21 UNIÓN MECÁNICA.
- CÁMARA DE CAÍDA D= 1.2 MTS hs 3.04 ESPESOR DE PARED E= 0.20 MTS CON COLCHÓN DE PIEDRA PEGADA e: 0.40 MTS Y BOQUILLA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CON ARO POZO DE INSPECCIÓN EN HD D= 0.60MTS PARA TRÁFICO PESADO.
- BASES Y CAÑUELAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6" PARA DOMICILIARIA.
- CAJAS DE INSPECCIÓN DE 50 * 50 PARA DOMICILIARIAS INCLUYE TAPA EN CONCRETO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETAS DE 12" * 6" INCLUYE ADHESIVO.
- EMPALME A CÁMARA.

LLENOS

- ARENA PARA BASE Y ATRAQUE
- LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA.
- AFIRMADO COMPACTADO.

CONCRETOS

- CONCRETO DE 21 MPA PARA GRADERIA Y ANDENES.
- CONCRETO PARA PAVIMENTO DE 42 MR ECHO EN OBRA.

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

ACERO

- ACERO DE REFUERZO PARA GRADERÍAS.
- ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DURANTE TODA LA OBRA.

NUEVOS ITEM

- PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O PROFESIONAL EN ÁREAS A FINES CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL (SALARIO 2.200.000 FACTOR PRESTACIONAL DE 1.72 * 600.000 MANUTENCIÓN) INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD, PERMANENCIA 100% EN LA OBRA.
- INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE 3".

5.0 DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.



UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	ml	120	120


- CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y SOPORTE DE GUADUAS CADA 2 MTS.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	ml	252	0

- SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA.


UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	und	2	2

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	
---	--	---

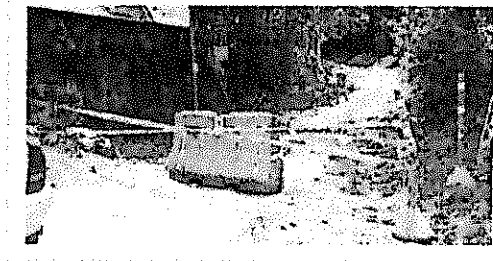



➤ **INSTALACIÓN DE VALLA INSTITUCIONAL DE 2 * 4.**

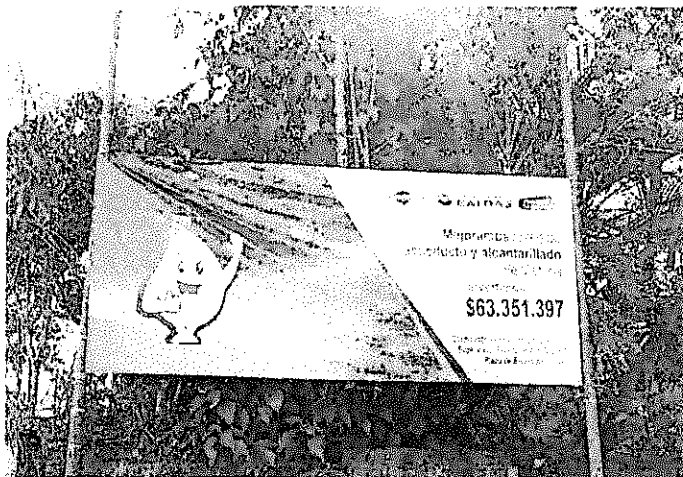UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPICALDAS	und	1	1



➤ **CORTE CON DISCO ABRASIVO**

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPICALDAS	ml	10	0

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

- DEMOLICIÓN DE EXSTRUCTURAS EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE ANDENES, GRADERIAS Y CAÑUELAS.



UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	1	0

- EN MATERIAL COMÚN DE 0 A 2 MTS.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	224	180



- EN CONGLOMERADOS.

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	22	0

➤ ESTIBADO HORIZONTAL TIPO 1.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	MI	10	0



➤ RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE EN VEHICULO AUTOMOTOR.


UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	64	28



➤ SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12".

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	MI	120	120

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

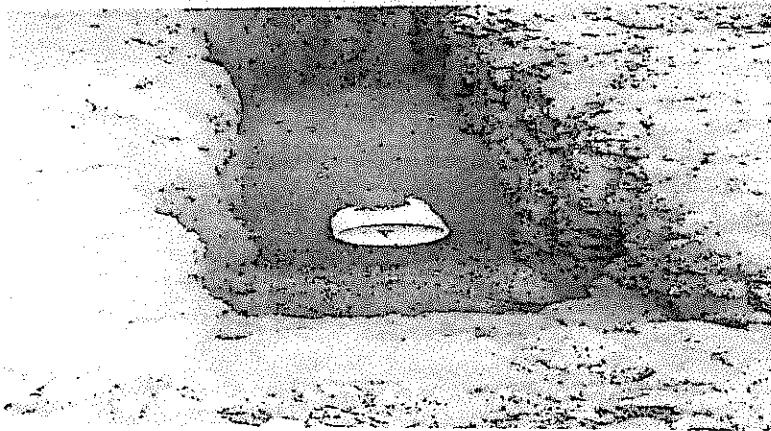

- SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN 3" PVC RDE 21 UNIÓN MECÁNICA.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	MI	102	0

- CÁMARA DE CAÍDA D= 1.2 MTS hs 3.04 ESPESOR DE PARED E= 0.20 MTS CON COLCHÓN DE PIEDRA PEGADA e: 0.40 MTS Y BOQUILLA.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	MI	660	645





ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN

INFORME No.1



**CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA
CALDAS**

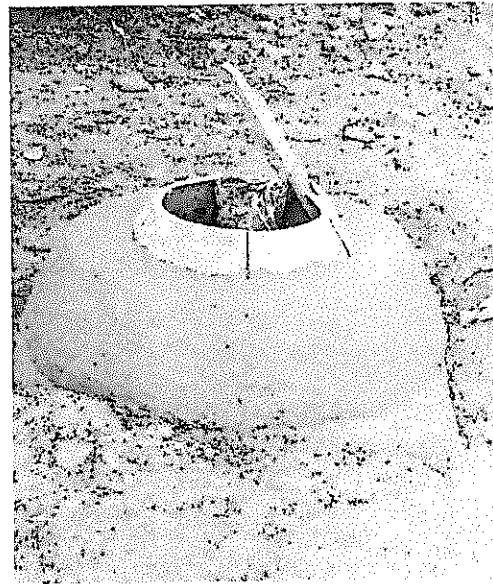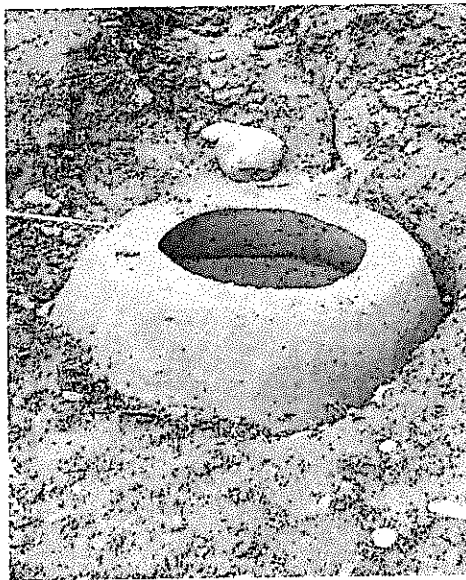AGV




- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CON ARO POZO DE INSPECCIÓN EN HD D= 0.60MTS PARA TRÁFICO PESADO.

Calle 31 #7-65 Br la Ceiba – Montería – Córdoba



	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

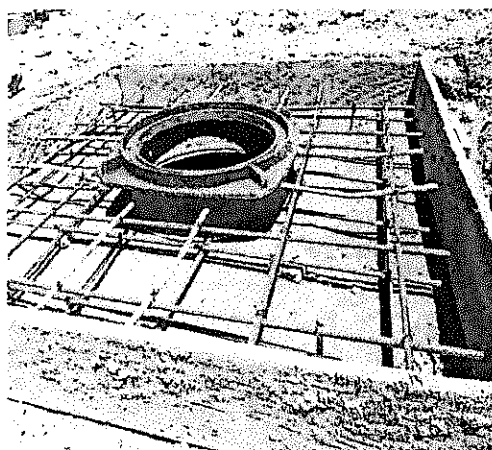

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	und	4	4



➤ BASES Y CAÑUELAS.

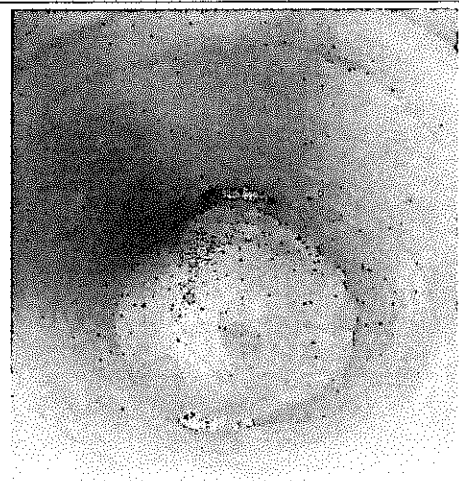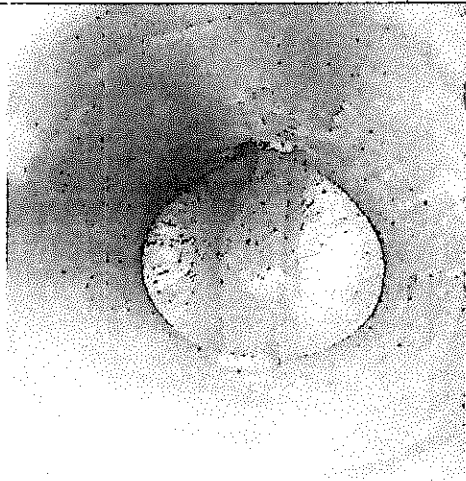
UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	und	4	4



	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	


- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6" PARA DOMICILIARIA.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	ml	48	32

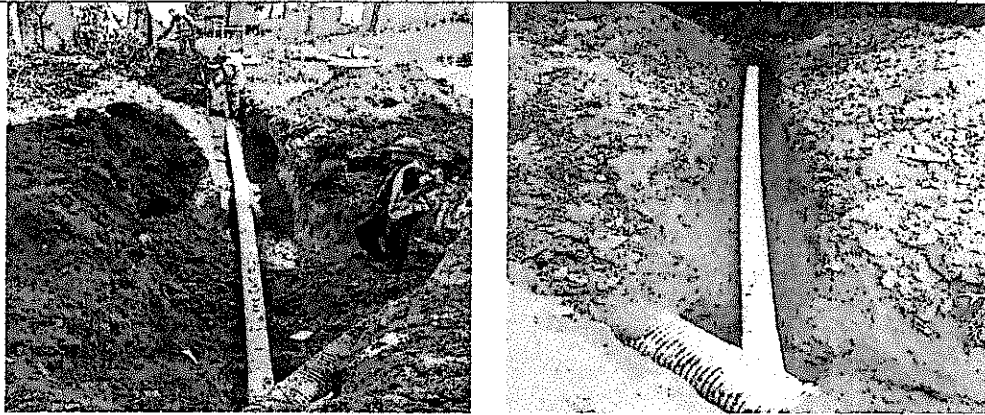



- CAJAS DE INSPECCIÓN DE 50 * 50 PARA DOMICILIARIAS INCLUYE TAPA EN CONCRETO.

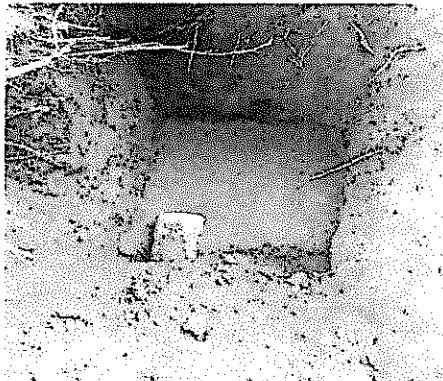UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	und	6	5





Calle 31 #7-65 Br la Ceiba – Montería – Córdoba

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETAS DE 12" * 6" INCLUYE ADHESIVO.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	und	6	5

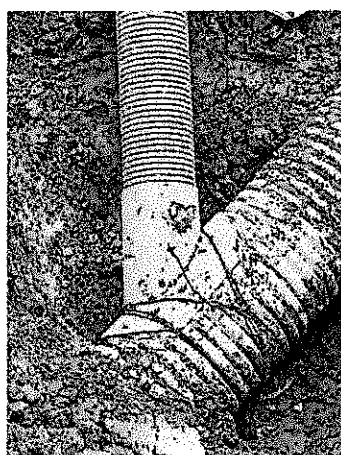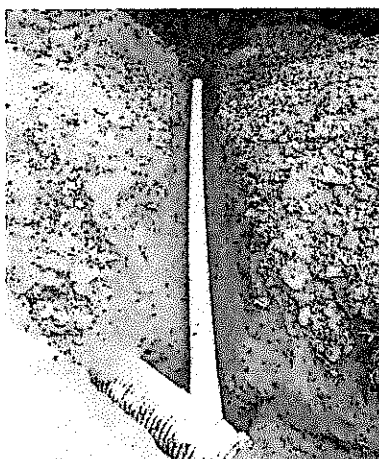



- EMPALME A CÁMARA.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	und	1	1

- ARENA PARA BASE Y ATRAQUE


UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	16	11.26

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	





➤ LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA.

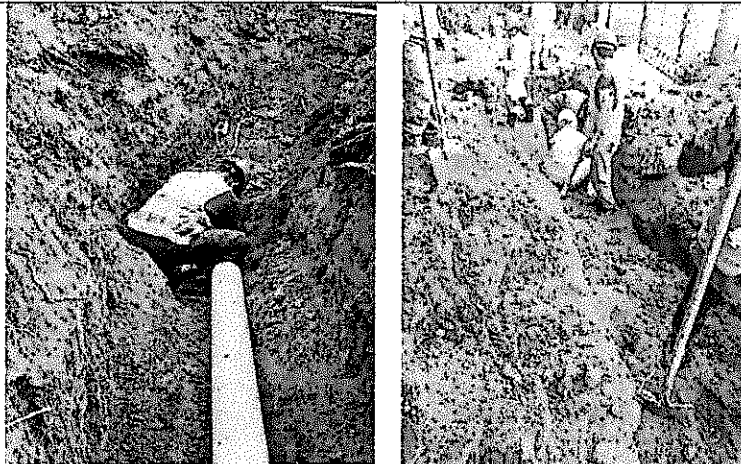UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	152	152.20



➤ AFIRMADO COMPACTADO.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	24	0

	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN	
	INFORME No.1 CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	

- CONCRETO DE 21 MPA PARA GRADERIA Y ANDENES.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	0.50	0

- CONCRETO PARA PAVIMENTO DE 42 MR ECHO EN OBRA.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	M3	0.50	0

- ACERO DE REFUERZO PARA GRADERÍAS.



UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	KILO	60	200


- ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DURANTE TODA LA OBRA.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	MES	1	1

- PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O PROFESIONAL EN ÁREAS A FINES CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL (SALARIO 2.200.000 FACTOR PRESTACIONAL DE 1.72 * 600.000 MANUTENCIÓN) INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD, PERMANENCIA 100% EN LA OBRA.

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	MES	0	1

 <p>empocaldas Cuidando juntos tu bienestar</p>	<p>ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN</p> <p>INFORME No.1</p> <p>CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS</p>	
---	---	---

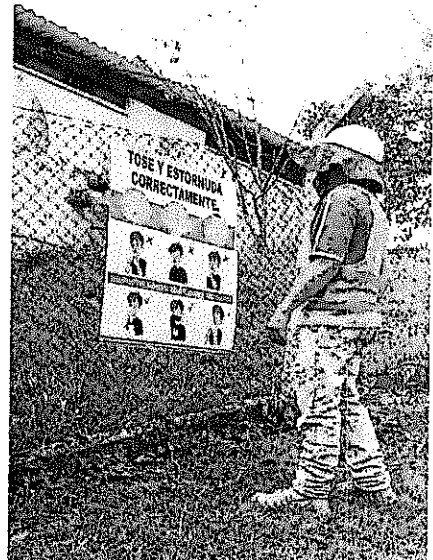

➤ **INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE 3”.**

UBICACIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA
CALLE EMPOCALDAS	ML	0	40

Calle 31 #7-65 Br la Ceiba – Montería – Córdoba




ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJÍN

INFORME No.1

**CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA
CALDAS**

AGV

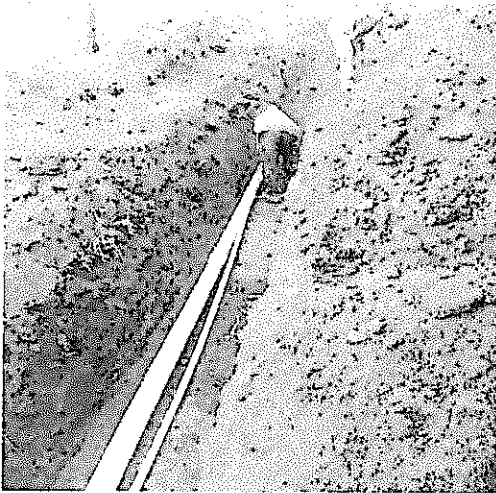

6.0. MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD
Retrocargador	1
Vibrocompactador	1
Volquetas	3

ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJÍN

Contratista.

CONTRATO No: 0102 DE 2020		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		ACTA No: 1 y FINAL		FECHA CORTE: 16 DE JULIO DEL 2020		
CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		FECHA INICIACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 16 DE JULIO DEL 2020				
MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 63.351.397		VALOR CONTRATO + ADICION:				
CONTRATISTA: ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN		VALOR OBRA: \$		FECHA: 22 DE JULIO DEL 2020				
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO CARLOS GONZALES V		SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ						
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES							
2	Localización y replanteo	ml	120	5.800	696.000	120,00	696.000	100%
3	Cerramiento en tela verde y soporte de guadua cada 2 mts	ml	252	11.200	2.822.400	-	-	
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	172.500	345.000	2,00	345.000	100%
5	Instalación de valla institucional de 2 x 4	und	1	885.000	885.000	1,00	885.000	100%
6	DEMOLICIONES							
7	Corte con disco abrasivo	ml	10	8.700	87.000	-	-	
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes graderías y cañuelas	m3	1	93.000	93.000	-	-	0%
9	EXCAVACION							
10	En material común de 0 a 2mts	m3	224	22.500	5.040.000	180,20	4.054.500	80%
11	En conglomerado	m3	22	31.500	693.000	-	-	0%
12	Entibado horizontal tipo 1	ml	10	34.400	344.000	-	-	0%
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	64	28.700	1.836.800	28,00	803.600	44%
14	ESTRUCTURA ALCANTARILLADO							
15	Suministro instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	120	90.596	10.871.574	120,00	10.871.574	100%
16	Suministro instalación red de acueducto en 3" PVC RDE 21 unión mecánica	ml	102	32.500	3.315.000	-	-	0%
17	Cámara de caída D = 1.2 mts hs 3.04 espesor de pared E = 0.20 mts con colchón de piedra pegada e = 0.40 mts y boquilla	ml	6,60	580.000	3.828.000	6,45	3.741.000	98%
18	Suministro instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D= 0.60 mts para tráfico pesado	und	4	650.000	2.600.000	4,00	2.600.000	100%
19	Bases y cañuelas	und	4	485.000	1.940.000	4,00	1.940.000	100%
20	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliaria	ml	48	48.700	2.337.600	32,00	1.558.400	67%
21	Cajas de inspección de 50 x 50 para domiciliaria incluye tapa en concreto	und	6	315.870	1.895.220	5,00	1.579.350	83%
22	Suministro e instalación de silletas de 12" x 6" incluye adhesivo	und	6	240.200	1.441.200	5,00	1.201.000	83%
23	Empalme a cámara	und	1	100.500	100.500	1,00	100.500	100%





EMPCCALDAS S.A.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 TRAZADO DE TUBERIAS - ALCANTARILLADO

CONTRATO No. 0122 DE 2020

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		315 mm	120	PVC corrugado	Instalacion con apertura de 40%	SI	12681.200315.3	GERFOR	17681.200315.3	GERFOR	8609215091	24/06/2020	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		160 mm	32	PVC corrugado	Instalacion con apertura de 40%	SI	12681.200316.2	GERFOR	12681.200316.2	GERFOR	8609215091	02/07/2020	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MUNICIPIO: VICIDIVA

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: ALEX QUINTERO VASQUEZ

FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: 

NOMBRE CONTRATISTA: ALFONSO GONZALEZ VELLOZIN

FIRMA CONTRATISTA: 

VISTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION GOBIERNO REGIONAL

