

ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 176-2023

CONVENIO	176-2023	
OBJETO	EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 9 A ENTRE CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA	
VALOR	\$ 65.367.331	
APORTES		
MUNICIPIO SALAMINA	\$ 65.367.331	
RECIBO TESORERIA No. 185 del 15/07/2023 aporte municipio de Salamina		\$ 65.367.331
ADICION N°1	\$ 32.683.665	
RECIBO TESORERIA No. 196 del 21/07/2023 aporte municipio de Salamina		\$ 32.683.665
TOTAL	\$ 98.050.996	\$ 98.050.996
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/05/2023	
ACTA DE INICIACIÓN	13/06/2023	
VENCE	31/08/2023	

20-05-24

En la ciudad de Manizales a los ----- se reunieron los señores **CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO**, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.053.816.510** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A E.S.P**, con **NIT 890.803.239-9** en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000425 de la Junta Directiva del 15 de enero de 2024, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, por otra parte **MANUEL FERMÍN GIRALDO GUTIÉRREZ** Alcalde Municipal de **Salamina**, Caldas, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.059.810.357 expedida en Salamina, Caldas en su calidad de Alcalde Municipal, con acta de posesión del 31 Diciembre del 2023, de la Notaría Única de Salamina, Caldas, quien obra en representación legal del Municipio de Salamina, y para los mismos efectos se denominará **EL MUNICIPIO DE SALAMINA**, con el fin de liquidar el presente convenio interadministrativo, según la siguiente relación.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
193-2023	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S	EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	\$65.367.331	\$98.043.901
ADICION N°1	\$32.683.665			
TOTAL			\$98.050.996	\$98.043.901
VALOR CONVENIO	\$98.050.996			
EJECUTADO		\$98.043.901		
SALDO		\$7.095		
VALOR POR REINTEGRAR A SALAMINA	\$7.095			
SUMAS IGUALES	\$98.050.996	\$98.050.996		

La sección de tesorería deberá reintegrar al municipio los rendimientos financieros generados
 Se anexa acta de valoración de bienes y servicios.



MANUEL FERMÍN GIRALDO GUTIÉRREZ
 Alcalde Municipal Salamina




CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
 Gerente EMPOCALDAS S.A E.S. P




JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ
 Secretario de Planeación
 Municipio de Salamina



JAIME MALDONADO MORA
 Ingeniero de Zona Supervisor
 EMPOCALDAS S.A E.S.P



TANIA ECHEVERRI RIVERA
 Secretaria General
 EMPOCALDAS S.A E.S.P



DIANA LORENA ARDILA MORA
 Jefe departamento de Planeación y proyectos
 EMPOCALDAS S.A E.S.P



LOS SUSCRITOS INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 176-2023, CUYO OBJETO ES: "EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 9 A ENTRE CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA".

CERTIFICAN:

Por parte de la Alcaldía de Salamina y EMPOCALDAS S.A.E.S.P. recibieron a entera satisfacción las obras complementarias a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 9 a entre carreras 7 y 8 municipio de Salamina.

Por parte de los supervisores nombrados para el convenio 176-2023; se hace constar que EMPOCALDAS S.A.E.S.P. se encuentra a paz y salvo por cualquier otro concepto relacionado con el presente convenio.

Para la constancia se firman a los: 20-05-24

MANUEL FERMIN GIRALDO GUTIÉRREZ
Alcalde Municipal Salamina

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente EMPOCALDAS S.A.E.S.P

JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ
Secretario de Planeación
Municipio de Salamina

JAIME MALDONADO MORA
Ingeniero de Zona Supervisor
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

TANIA ECHEVERRI RIVERA
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

DIANA LORENA ARDILA MORA
Jefe departamento de Planeación y proyectos
EMPOCALDAS S.A.E.S.P



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE SALAMINA CALDAS
ACTA DE POSESIÓN NÚMERO 003**

Salamina, Caldas, treinta y uno (31) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

POSESIONADO.....: MANUEL FERMIN GIRALDO GUTIERREZ
CARGOALCALDE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS
CARÁCTER:POR ELECCIÓN POPULAR

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO SALAMINA CALDAS. A los treinta y un (31) días del mes de diciembre del dos mil veintitrés (2023). En la fecha y siendo la una pm. (13:00) pm., en la zona urbana del Municipio de Salamina Caldas, se desplaza el titular de este despacho a las instalaciones de la Basílica menor del Municipio de Salamina Caldas para proceder, en presencia del señor **MANUEL FERMIN GIRALDO GUTIERREZ**, persona mayor de edad, vecino de esta población, de estado civil soltero con unión marital de hecho, a tomarle posesión del cargo de **ALCALDE** de esta localidad, para el período constitucional comprendido entre el primero (1º) de enero de dos mil veinticuatro (2024) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintisiete (2027), de conformidad con lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 136 de 1994, Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia y demás disposiciones jurídicas y vigentes y cargo para el cual fue elegido mediante votación popular el día veintinueve (29) del mes de octubre del presente año. Tal como se constata en la credencial Formato E 27 expedida por los escrutadores Municipales de Salamina Caldas, de fecha primero (01) días del mes Noviembre de dos mil veintitrés (2023).

El suscrito Notario le recibe el juramento constitucional en el siguiente sentido: **¿JURA USTED Y PROMETE AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS Y LOS DEBERES QUE LE INCUMBEN, TAL COMO LO MANDA EL ARTÍCULO 122 DE NUESTRA CARTA Y EN ESPECIAL EL ARTÍCULO PRIMERO EN CUANTO QUE SE COMPROMETE A FORTALECER LA UNIDAD DE COLOMBIA COMO UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO, ORGANIZADO EN FORMA DE REPÚBLICA UNITARIA, DESCENTRALIZADA, CON AUTONOMÍA DE SUS ENTIDADES TERRITORIALES, DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA Y PLURALISTA, FUNDADA EN EL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA, EN EL TRABAJO, Y LA SOLIDARIDAD DE LAS PERSONAS QUE LA INTEGRAN Y EN LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL.? A lo que respondió: Sí, JURO.**

De esta forma queda usted legalmente posesionado de su cargo. Se deja expresa constancia que el posesionado presentó los siguientes documentos: Formato E 27 expedida por los escrutadores Municipales de Salamina Caldas, de fecha primero (01) días del mes Noviembre de dos mil veintitrés (2023), copia cédula de ciudadanía número 1.059.810.357 expedida en Salamina, Certificado de antecedentes ordinario 235443385 expedido por la Procuraduría General de la Nación, Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde hace constar que no figura reportado



número 159810357231122114628, de fecha 22 de noviembre 2023, Certificado judicial vigente de fecha 22 de noviembre del 2023. Declaración juramentada relacionada con el monto de sus bienes y rentas, Formato de hoja de vida. Copia Libreta Militar y certificación de libreta militar, declaración sobre la inexistencia de proceso de alimentos, declaración de renta formulario número 2117722774510, declaración de impedimentos e inhabilidades. Como no es otro el objeto de esta diligencia, el compareciente manifiesta que conoce la ley y sabe que la Notaria Única del Circulo de Salamina Caldas, responde únicamente de la regularidad formal del los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones del otorgante, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. El notario no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes, en igual sentido se informa al compareciente que esta posesión tendrá efectos legales y fiscales a partir de las 0:00 horas del primero (1) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y el posesionado ejercerá su cargo de Alcalde Municipal a partir de esta fecha. No siendo otro el objetivo de la presente diligencia, se termina el acta respectiva y se firma como aparece, una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.



[Handwritten signature of Aldemar López Maya]

ALDEMAR LÓPEZ MAYA

Notario

[Handwritten signature of Manuel Fermín Giraldo Gutiérrez]

MANUEL FERMIN GIRALDO GUTIERREZ

Posesionado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 ORGANIZACIÓN ELECTORAL
 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E27


REGISTRADURÍA
 NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL


DECLARAMOS

Que, MANUEL FERMIN GIRALDO GUTIERREZ identificado(a) con C.C. 1059810357 ha sido elegido(a) ALCALDE por el Municipio de SALAMINA - CALDAS, para el Periodo Constitucional de 2024 al 2027, por el PARTIDO COALICION RECUPEREMOS NUESTRA GRANDEZA.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en SALAMINA (CALDAS), el miércoles 01 de noviembre del 2023.


 JULIÁN RICARDO MORENO
 Adubelo
 MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA


 MARÍA LUISA TABORDA GARCÍA
 MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA


 OSCAR ALBERTO HERNÁNDEZ
 DÍAZ
 SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1-059.810.357

NUMERO

GIRALDO GUTIERREZ

APELLIDOS

MANUEL FERMIN

NOMBRES



Manuel Fermin Giraldo G

FIRMA



INDICE DERECHIO

FECHA DE NACIMIENTO 02-AGO-1986

SALAMINA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-NOV-2004 SALAMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMADEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0910900-35 134052-M-1059010357-20050221

0139605052N 02 130965024

**ACTA DE VALORACION DE SERVICIOS
APORTADOS POR EMPOCALDAS S.A E.S. P**

OBJETO: Ejecución de obras complementarias a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 9 A entre carreras 7 y 8, Municipio de Salamina, Caldas


APORTES

MUNICIPIO DE SALAMINA	\$65.367.331
EMPOCALDAS S.A E.S. P ACTA DE SERVICIOS INCLUIDOS SUMINISTROS (SUPERVISION)	\$ 4.575.713

Manizales, 13 de junio de 2023



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A E.S.P



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT 890.803.239-9
RECIBOS DE CAJA

CODIGO: GF-R-220

FECHA VIGENCIA: 2023-01-01

VERSION: 01

Página : 1 de 1

FECHA DE DOCUMENTO: 15/07/2023 ✓

DOCUMENTO: RECIBOS DE CAJA

Nro : 185

NOMBRE: Municipio De Salamina

NIT: 890801131 3

DOMICILIO: clle 5 nro 5-65

TELEFONO: 8595020

MAIL: planeacion@salamina-caldas

DESCRIPCION: APORTES MUNICIPIO DE SALAMINA, CONV 176/23. ✓

CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	DOC	DEBITOS	CREDITOS
111006037	DAVIVIENDA 8977 CONV 176/23			65,367,331.00	
13840601	ADMINISTRACION DE PR /				65,367,331.00
TOTAL				65,367,331.00	65,367,331.00

Elaboro:

OLGA PATRICIA QUINCHIA OSPINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Aprobo:

JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
JEFE SECCION TESORERIA



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT 890.803.239-9
RECIBOS DE CAJA

CODIGO: GF-R-220

FECHA VIGENCIA: 2023-01-01

VERSION: 01

Página : 1 de 1

FECHA DE DOCUMENTO : 21/07/2023

DOCUMENTO : RECIBOS DE CAJA

Nro : 196

NOMBRE: Municipio De Salamina

NIT: 890801131 3

DOMICILIO: clle 5 nro 5-65

TELEFONO: 8595020

MAIL: planeacion@salamina-caldas

DESCRIPCION: APORTES MUNICIPIO DE SALAMINA, CONV 176/23.

CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	DOC	DEBITOS	CREDITOS
111006037	DAVIVIENDA 8977	CONV	176/23	32,683,665.00	
13840601	ADMINISTRACION DE PR /				32,683,665.00
TOTAL				<u>32,683,665.00</u>	<u>32,683,665.00</u>

Elaboro:

OLGA PATRICIA QUINCHIA OSPINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Aprobo:

JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
JEFE SECCION TESORERIA

# CONTRATO Y AÑO	193 DE JUNIO 5 DEL 2023	Acta N°	1-FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 65.367.331,00
				2. VALOR ADICION	\$ 32.683.665,00
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 98.050.996,00
NIT O CC:	901.589.304-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ -
CDP (#, rubro y fecha)	20230548 DE MAYO 26 DE 2023 - 20230644 DE JUNIO 27 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 98.043.901,00
RP (#, rubro y fecha)	684 DEL 5 DE JUNIO DE 2023 - 735 DEL 27 DE JUNIO DE 2023.			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	\$ 7.095,00
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 176-2023	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		X	
9- Diseño de Mezclas.		X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		X	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 11/07/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
108900240889	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Manizales, Junio 30 de 2023.

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Carrera 23 No.75-82
Manizales- caldas

REFERENCIA: "EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS."

ASUNTO: Certificación pagos de seguridad social integral art. 50 ley 789 de 2002

Yo CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ, con cedula de ciudadanía No. 16.078.315 expedida en Manizales y obrando como representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S con cedula tributaria No. 901589304-0, certifico bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo en los últimos 6 meses con los aportes al sistema general de seguridad social integral compuesto por salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF) en acuerdo a lo que establece el artículo del asunto.

Así mismo certifico que me encuentro a paz y salvo con todo lo concerniente a salarios, prestaciones sociales y liquidaciones de los trabajadores a cargo.

CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
Representante Legal Construcciones & Ingeniería Valencia Montes S.A.S
C.C. 16.078.315 De Manizales.
Email: construccionesvalenciamontes@gmail.com
Manizales-Caldas

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

93181352

No. Autorización/CUS

917955199381

Fecha y Hora

10/07/2023

Número de Identificación

901589304

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

0

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 71 A 71 CA 79

Localización

Nacional

Correo electrónico

paojimen@yahoo.es

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

ACUEDUCTO SALAMINA

Fecha Terminación Obra

30/06/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total Mano de Obra

1248066.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,310 4158968

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

193

Fecha Inicio Obra

06/06/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

901589304

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

98050996.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

58000.00

Valor del Pago

58000.00



CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.

NIT 901589304-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764039688830
Fecha 17/11/2022 - 17/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE50

Departamento	Fecha		
Caldas	10	07	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE5

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. NIT: 890803239 Fecha de firmado: 10/07/2023 10:05:10
Dirección: CR 23 75 82 Departamento: Caldas Teléfono: 6068867080
Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co Forma de Pago: Contado Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento: Julio 10 del 2023 Hora emisión: 10:05:07 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 10/07/2023
Total de Líneas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	001	1,00	COSTO DIRECTO	WSD	\$72.652.020,00	\$72.652.020,00
2	Adm1	1,00	Administración 24%	EA	\$17.436.485,00	\$17.436.485,00
3	Imp1	1,00	Imprevistos 5%	EA	\$3.632.601,00	\$3.632.601,00
4	Uti1	1,00	Utilidad 5%	EA	\$3.632.601,00	\$3.632.601,00

SON: (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS DIECINUEVE CENTAVOS)
CUFE: b2f2fb3cb91f4ead7d140b83d21c1f52635ae4213ef123a3bdebe0f51e1ea1edb41c152fd0d65d15fe12b58a870e4644

SUBTOTAL:	\$97.353.707,00
IVA	\$690.194,19
TOTAL:	\$98.043.901,19


NOTAS:
ACTA DE OBRA FINAL No.1- CONTRATO DE OBRA 193-2023 OBRAS.COMPLEMENTARIAS SALAMINA-CALDAS

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
01 IVA	\$3.632.601,00	19,00%	\$690.194,19

Firma Digital: aAHIFUcj91EvDL4fUczxqEJp6mmZZyCFp7q85ZogvBGoqlprIQCuKGGH/Ag7 GkaSVN2Rm2dy/c7PZT6llpnp6CnzKhAuZ45tMBC8vBPGu4cK
Oxrmw6nn77/KZ zXbhOLuEA+zF/Myo9xOwyvHVdAdq9gWTwdSjHh/olpabcEz3N2ouQTZMRQs1Cp hvGAw4KvAM4v106PfwL2pqq0EmmUs7ud4
dn3vajiGzA18B5VDWCa8wZzwtgKG Nir2pPlyH1U3GMsGIUV30D4Qrk77Nu50i74nDaZTritGbdm79GfuDdDe6kyPpE6 3RPBctoxibovAakYKUos
5Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



INFORME TÉCNICO DE OBRA

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el contrato de cambio de la red de alcantarillado en el municipio de Salamina - Caldas celebrado entre CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S y Empocaldas S.A.E.S.P Se desarrolla el proyecto **EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS**

En el presente informe se describen ítems desarrollados en el periodo de ejecución.

Las obras civiles contempladas dentro del presente contrato comprenden Localización y replanteo, demoliciones, movimientos de tierra, excavaciones, llenos, Concretos.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	193 DE JUNIO 5 DEL 2023.
Objeto:	"EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS"
Nombre Contratista:	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
Fecha del contrato:	JUNIO 5 DE 2023.
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial Obra	\$ 65.367.331,00
Adición No.1	\$ 32.683.665,00
Valor total:	\$ 98.050.996,00
Valor ejecutado:	\$ 98.043.901,00
Saldo contrato:	\$ 7.095,00
Fecha de Iniciación:	JUNIO 06 DE 2023.
Fecha de Terminación Inicial:	JULIO 20 DE 2023
Supervisor:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA.

AVANCE DEL CONTRATO
AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	99,98%

AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada: obra	\$ 98.050.996,00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 98.043.901,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 98.043.901,00
Porcentaje total ejecutado:	99,98%

AVANCE EN TIEMPO

Plazo de ejecución:	45 días
Tiempo total transcurrido:	24 días
Avance Porcentual:	53,3%


CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

Mediante el contrato No.193 del 2023, se realizan las obras complementarias a la reposición de la tubería de alcantarillado calle 9a carreras 7 y 8 municipio de Salamina-Caldas en una longitud de 106,0 m en esta longitud se construyó vía vehicular en pavimento hidráulico, bordillos. Muros de contención y andenes peatonales.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- Se construyen andenes peatonales en la CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS en una longitud total de 106,0 m.
- Se realiza demolición de estructuras aledañas a las viviendas con el fin de construir el andén peatonal.
- Se realiza cerramiento y señalización de la obra.
- El concreto hidráulico instalado fue en concreto reforzado y acelerado a 7 con un espesor de 0,18 cms en una longitud de 106 metros.
- Se realizan llenos compactados mecánicamente con material seleccionado (afirmado) y subbase con el fin de sustituir y ajustar para obtener la estructura portante del pavimento y andén peatonal.
- Se instalada acero de refuerzo en los sitios donde se vaciara concreto reforzado (dovelas, mallas electrosoldadas (andenes) y barras de acero para muros).
- Se realiza limpieza final de la obra transportando todo el material sobrante de la excavación, y demoliciones.


EXCAVACIONES PARA ANDÉN PEATONAL

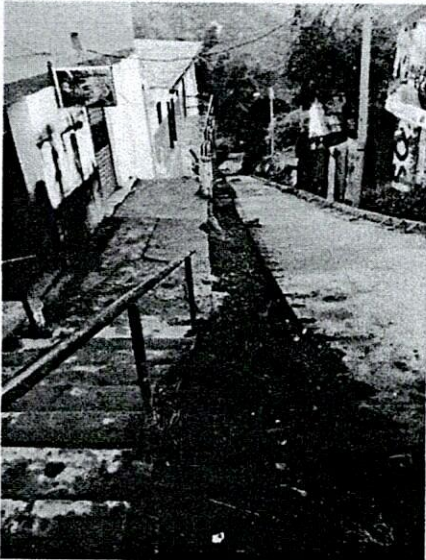


LLENO CON MATERIAL CON AFIRMADO Y SUBBASE



CONCRETO PAVIMENTO HIDRAULICO



ANDENES Y BORDILLOS

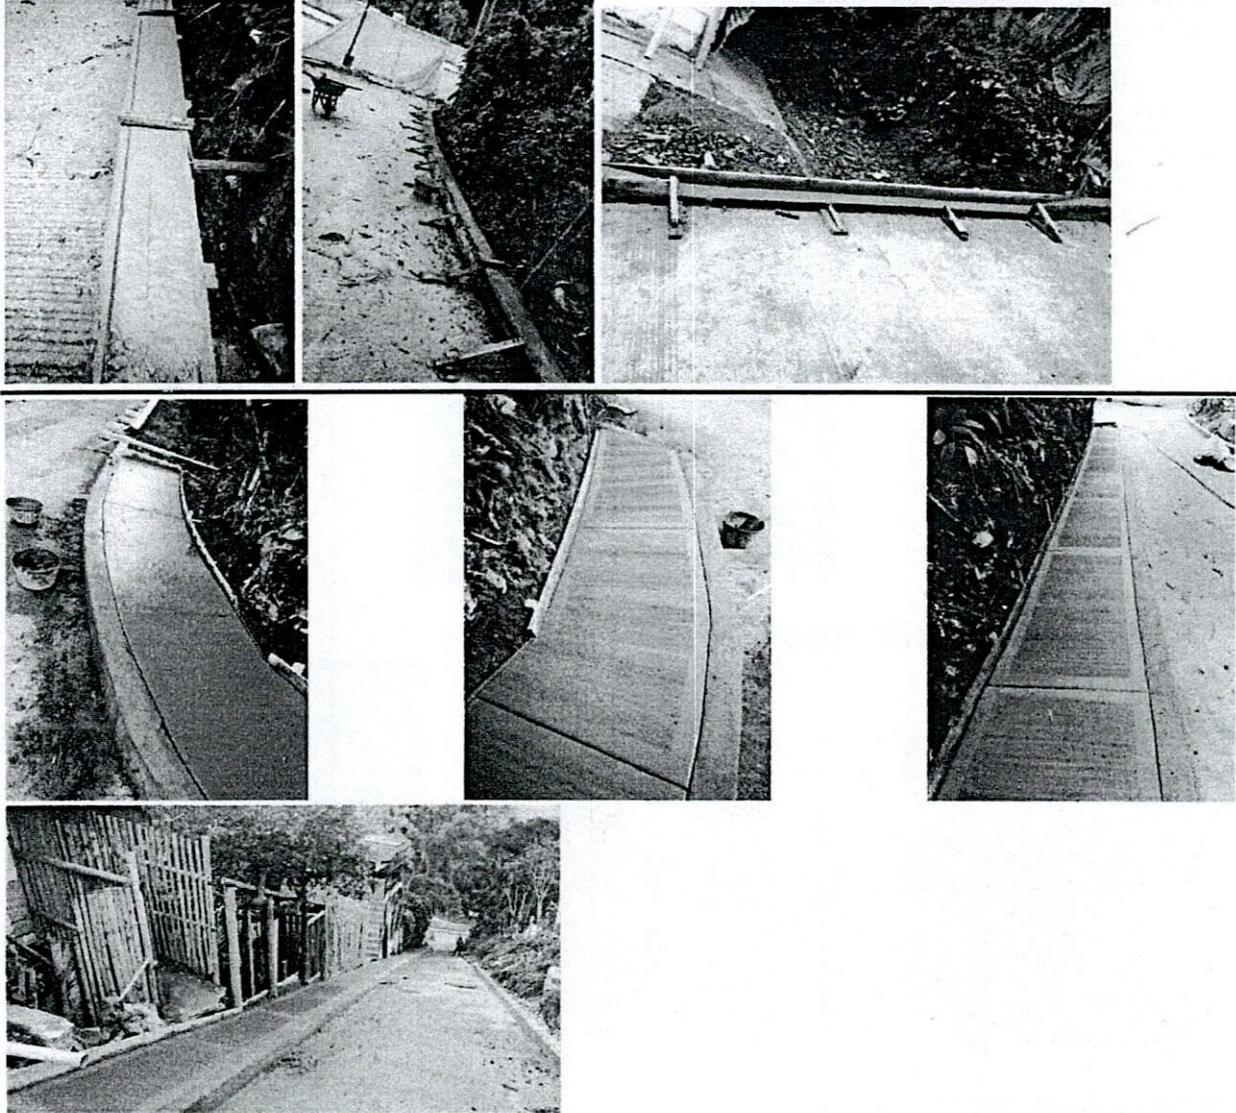

Ing. CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES VALENCIA MONTES S.A.S
Contratista

17 JUNIA 1.05.2023 AL 30.05.2023

		Asignaciones					Deducciones									
EMPLEADOR	Ciudad/REGIONAL/ FRENTE	CARGO	CC	NOMBRES	Barco	Salario Básico Mensual	Horas Efectivas Laboradas	Días Laborados	Salario	Auditor (horas adicional extras)	Incapa- cidades (transporte II)	Subtotal I	EPS (4%)	Pensión 4%	TOTAL DEDUCIDO	Moneto por pagar en Bancos
GRUPO EMPRESARIAL VASAGRA SERVICIOS S.A.S.	ARMAR COMPTON/VALE S.A. ARMAR	ATENDIENTE	65842	ALBA GUZMÁN TULIO (S/N.C.P.)		1.400.000		20	1.400.000	0	1.400.000	1.370.000	46.000	6.200	22.800	1.347.200
GRUPO EMPRESARIAL VASAGRA SERVICIOS S.A.S.	SERVICIOS/ARMAR/ESPACIO S.A. ARMAR	AUXILIAR	659145	DAVID PARRA GONZALEZ		1.400.000		0	1.400.000	0	1.400.000	1.350	15.400	1.542	3.892	1.346.108

\$ 1.248.008

[Signature]
 CONSTANCIAS Y REGISTRO VALLE DEL CAUCA
 CARLOS ALBERTO VALLEJO MANDUZZI
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. N. 878.215 de Medellín
 Email: vallejoc@vallejoc.com
 Medellín - Cauca

Firma del empleado
[Signature]

[Signature]



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Junio 30 de 2023.	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	193 DE JUNIO 5 DEL 2023.
Objeto:	"EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS"
Nombre Contratista:	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
Fecha del contrato:	JUNIO 5 DE 2023.
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial Obra	\$ 65.367.331,00
Adición No.1	\$ 32.683.665,00
Valor total:	\$ 98.050.996,00
Valor ejecutado:	\$ 98.043.901,00
Saldo contrato:	\$ 7.095,00
Fecha de Iniciación:	JUNIO 06 DE 2023.
Fecha de Terminación Inicial:	JULIO 20 DE 2023
Supervisor:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA.

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	99,98%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	24
Avance Porcentual:	53,3%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

Mediante el contrato No.193 del 2023, se realizan las obras complementarias a la reposición de la tubería de alcantarillado calle 9a carreras 7 y 8 municipio de Salamina-Caldas en una longitud de 106,0 m en esta longitud se construyó vía vehicular en pavimento hidráulico, bordillos. Muros de contención y andenes peatonales.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- Se construyen andenes peatonales en la CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS en una longitud total de 106,0 m.
- Se realiza demolición de estructuras aledañas a las viviendas con el fin de construir el andén peatonal.
- Se realiza cerramiento y señalización de la obra.
- El concreto hidráulico instalado fue en concreto reforzado y acelerado a 7 con un espesor de 0,18 cms en una longitud de 106 metros.
- Se realizan llenos compactados mecánicamente con material seleccionado (afirmado) y subbase con el fin de sustituir y ajustar para obtener la estructura portante del pavimento y andén peatonal.
- Se instalada acero de refuerzo en los sitios donde se vaciara concreto reforzado (dovelas, mallas electrosoldadas (andenes) y barras de acero para muros).
- Se realiza limpieza final de la obra transportando todo el material sobrante de la excavación, y demoliciones.

EXCAVACIONES PARA ANDÉN PEATONAL






F-GC-20
Versión 3
Junio 2019


EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


✓ LLENO CON MATERIAL CON AFIRMADO Y SUBBASE

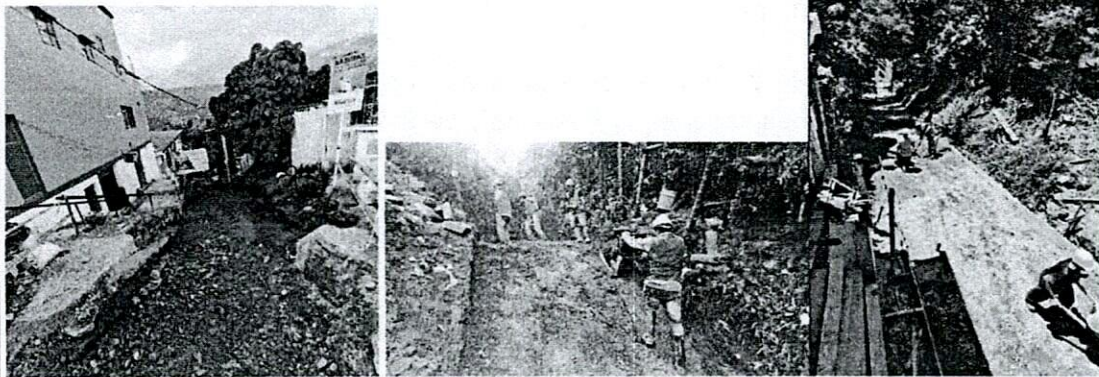

✓ CONCRETO PAVIMENTO HIDRAULICO

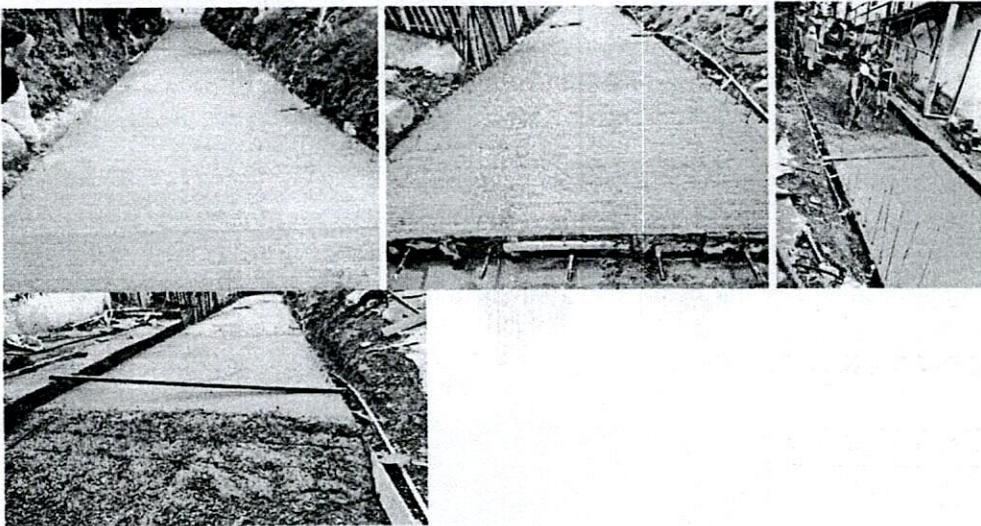

✓ ANDENES Y BORDILLOS

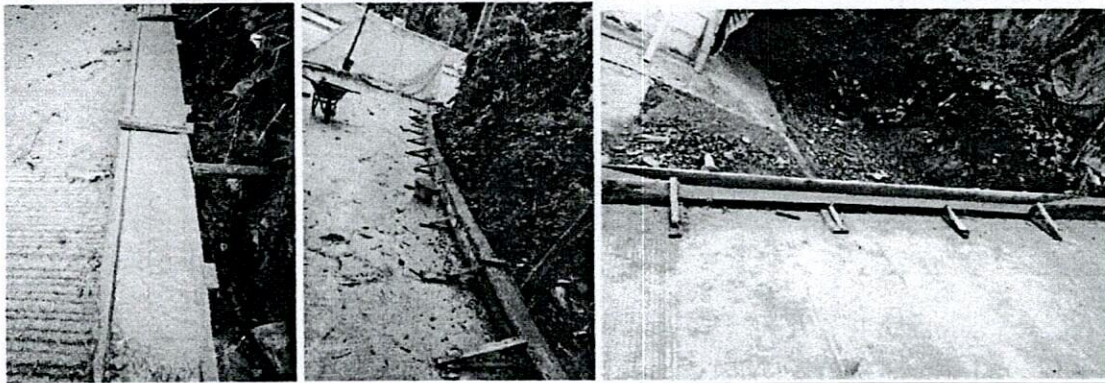




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

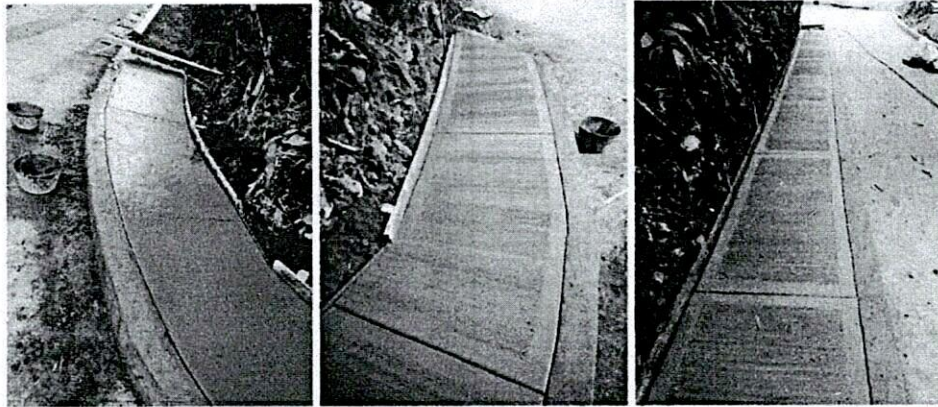

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada: obra	\$ 98.050.996,00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 98.043.901,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 98.043.901,00
Porcentaje total ejecutado:	99,98%

- ✓ 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	S. del estado	42-45-101056517	05/06/2023	20/10/2023	\$29,415,298.80
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	S. del estado	42-45-101056517	05/06/2023	20/07/2026	\$19,610,199.20
Estabilidad de Obra	S. del estado	42-45-101056517	05/06/2023	04/06/2028	\$19,610,199.20
Responsabilidad Civil	S. del estado	42-40-101043363	05/06/2023	20/10/2023	\$29,415,298.80

- ✓ 3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	NX	X
Oficial	x	x	x	x	X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Ayudantes	X	x	x	x	X
-----------	---	---	---	---	---

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Jurídica)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

Para el presente periodo se presenta Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO A	OVEROL N/A	GUANTES A	BOTAS A	CARNET A	CHALECO N/A	SEÑALIZACIÓN A	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A
Junio 30 de 2023	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexan con el acta parcial en el paquete de cobro del Acta Final 01.

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	SI	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Mano de Obra Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
TOTALES				

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

El personal que se utilizó en la ejecución de la obra en su mayoría residen en Salamina- Caldas, tanto calificado como no calificado, la profesional social si era externa.

8.- DOCUMENTOS ANEXOS


DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Se adjunta El pago del FIC para el presente periodo.

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

Ing. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

	F'cr INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
	ENSAYO DENSIDAD DEL SUELO EN CAMPO		
	METODO DEL CONO		
	INV E-161: 07 / E-150:07 / E-228: 07	PAGINA:	1

No. Ensayo:

PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA- CALDAS	<input checked="" type="checkbox"/> X	No. 14-015 -6
LOCALIZACIÓN:	O.S.	FECHA EJECUCION: 17/06/2023
DESCRIPCION: SUBBASE GRANULAR -	FECHA RECEPCION:	FECHA EJECUCION: 17/06/2023
METODO: C	CLIENTE:	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
DIRECCION:	DIRECCION:	MANIZALES

DENSIDAD EN EL TERRENO


PRUEBA No.	1	2	3	4	5
Abscisa	CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8	CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8			
Margen.	VIA	ANDEN			
Peso arena y recipiente antes de ensayo, (g) A	6.772	6.923			
Peso arena y recipiente después de ensayo, (g) B	3.048	3.093			
Peso arena total usada, (g) C = A-B	3.724	3.830			
Peso arena que queda en el cono, (g) K	1.566	1.566			
Peso arena en el hueco (g.)	2.158	2.264			
Peso unitario de la arena (g/cm ³)	1.409	1.409			
Volumen del hueco total (cm ³)	1.532	1.607			
Peso seco de sobretamaños, (g)					
Peso del material fino, humedo (g)	3.178	3.546			
Humedad particulas finas, (%).	4,0%	4,2%			
Peso seco de particulas finas, (g).	3.056	3.403			
Peso total de la muestra seca. (g)	3.056	3.403			
Porcentaje sobretamaños, (%). D.					
Porcentaje de particulas finas, (%). E.	100,0	100,0			
Densidad del suelo (g/cm ³). F.	1,995	2,118			
Densidad máxima de laboratorio (g/cm ³). G.	2,100	2,100			
Gravedad Especifica Bulk sobretamaños. (g/cm ³) H.					
Densidad corregida. (g/cm ³) (100*G*H / G*D+H*E).					
% de compactación.	95,9	97,8			


Metodo A y B Tamiz Ret. No.4 **Metodo C y D** Tamiz Ret. 3/4"

Barrio Lucitania

Densidad máxima de laboratorio = 2.100 g/cm³, suministrado por el cliente

Este informe expresa fielmente el resultado del ensayo realizado
No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se obtenga permiso de Gerencia


 Ejecuto: Nicanor Maya Henao
 Laboratorista


 Aprobó: Ing. Carlos Alberto Figueroa
 Ingeniero Civil

DISEÑO PARA MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS
MR 42 Kg/cm²

FECHA: Manizales Marzo 2 de 2023
PROYECTO: "REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS"
LOCALIZACION: SALAMINA-CALDAS
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
AGREGADOS: Grava: TRITURADO 1" / FUENTE RIO CHAMBERY
 Arena: ARENA / FUENTE RIO CHAMBERY
CEMENTO: CEMEX ESTRUCTURAL

ADITIVO: SIKASET L

ASENTAMIENTO: 10.2 Cm

ENSAYO	ARENA	GRAVA	CEMENTO
PESO ESPECIFICO	2.315 kg/dm ³	2.816 kg/dm ³	3.14 kg/dm ³
% ABSORCION	2.598 %	1.411 %	-
MASA UNI. SUELTA	1.477 kg/dm ³	1.477 kg/dm ³	1.1 kg/dm ³
DIS. GRANULOMETRICA	35 %	65 %	

- 1. ASENTAMIENTO 10.16 Cm
- 2. TAMAÑO MAXIMO 1"
- 3. TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
- 4. AGUA ESTIMADA 200 kg/m³

5. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO

$f_r = 42 \text{ kg/cm}^2 = 4.2 \text{ Mpa}$ $k = 2.7$
 $V = 0$
 $f_{rr} = 45 \text{ kg/cm}^2$ $f_{cr} = k \sqrt{f'_{cr}} = 277.8 \text{ kg/cm}^2$

6. RELACION AGUA CEMENTO

a. Resistencia
 $A/C = 0.45$

7. CANTIDAD DE CEMENTO

$C = 200 \text{ kg/m}^3 / 0.45$
 $C = 444.4 \text{ kg/m}^3$

8. DENSIDAD PROMEDIO DEL AGREGADO

$DP = 0.35 * 2.493 \text{ kg/dm}^3 + 0.65 * 2.786 \text{ kg/dm}^3$
 $DP = 2.683 \text{ kg/dm}^3$

9. VOLUMEN ABSOLUTO DE AGREGADO

$CK = 1000 - A - C / Dc$
 $CK = 1000 \text{ dm}^3 - 200 \text{ dm}^3 - 444.4 \text{ kg} / 3.14 \text{ kg/dm}^3$
 $CK = 658.5 \text{ dm}^3$



Ingenieros Civiles S.A.S.

F C R INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT 900.957.286-1
ASESORIA E INTERVENTORIA - SUELOS - DISEÑOS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

10. PESO DEL VOLUMEN TOTAL DEL AGREGADO

P = 658.5 dm³ * 2.683 kg/dm³
P = 1,767 kg
AGREGADO FINO = 618.4 kg
AGREGADO GRUESO = 1148.5 kg

11. PROPORCIONES EN PESO

CEMENTO 1 kg
ARENA 1.39 kg
GRAVA 2.58 kg
A / C 0.45

12. PROPORCIONES EN VOLUMEN

AJUSTE

CEMENTO 1 1
ARENA 1.02 1.0
GRAVA 1.90 2.0
A / C 0.45

13. CANTIDAD DE MATERIAL POR METRO CUBICO

CEMENTO 444 kg
ARENA 0.41 m³
GRAVA 0.77 m³
AGUA 200 litros
SIKASET L 12 litros

OBSERVACIONES

1. Para realizar la mezcla se debe dosificar con baldes o cajones. las proporciones optimas de diseño fueron el 65

% de grava y 35 % de arena

Las proporciones en Volumen se pueden ajustar para trabajar en obra así:

Cemento 1 : Arena 1.0 : Grava 2.0 : Agua/Cemento 0.45

Para Mezclar 1 bulto de cemento

Cemento = 1 bulto (42.5kg)
Arena = 4.5 baldes
Grava = 9.0 baldes
Agua = 2.0 baldes
Nota: Balde de 8 litros

Para Mezclar 1 bulto de cemento

Cemento = 1 bulto 42.5 kg
Arena = 59.1 kg
Grava = 109.8 kg
Agua = 19.1 Kg
SIKASET L = 1.1 Litros



Ingenieros Civiles S.A.S.

FICR INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT 900.957.286-1
ASESORIA E INTERVENTORIA - SUELOS - DISEÑOS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

2. El diseño se realizo con tamaño máximo nominal de 3/4"
3. Realizar la dosificación con baldes o cajones.
4. Las pruebas de resistencia se realizaron con cemento **CEMEX ESTRUCTURAL**
5. Se recomienda controlar la dosificación del agua para no tener bajas resistencias
6. Se presenta a continuación propiedades características de los agregados:

AGREGADOS		% DE DESGASTE	PESO ESPECIFICO KG/CM3	% ABSORCIÓN	EQUIVALENTE DE ARENA	INDICE DE PLASTICIDAD
GRAVA	TRITURADO 1" / FUENTE RIO CHAMBERY	17.6	2.786	1.42	-	-
ARENA	ARENA / FUENTE RIO CHAMBERY	-	2.493	2.65	75%	NIP

En resumen las proporciones en peso y volumen para trabajar en obra son los siguientes:

DISEÑO	PROP. EN PESO			PROP. EN VOLUMEN			A/C
	CEMENTO	ARENA	GRAVA	CEMENTO	ARENA	GRAVA	
MR 42	1	1.39	2.58	1	1.00	2.00	0.45

Este diseño incluye la incorporación de acelerante Sikaset L al 2%, para acelerar resistencia de concreto a 7 días. Oportunamente estaremos informando los resultados de resistencias a 7 y 28 días de fraguado.

Cordialmente,

Ing. Carlos Alberto Figueroa C.
Especialista en Vías Terrestres



EMPOLCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL NOROCCIDENTAL

CONTRATO No. 103 DE JUNIO 5 DEL 2023
 ACTA No. 1 FINAL
 FECHA INICIACION JUNIO 6 DE 2023
 FECHA VENCIMIENTO AGOSTO 14 DE 2023
 VALOR ADICION \$ 32.683.665,00
 VALOR ADICION \$ 32.683.665,00
 FECHA JULIO 7 DE 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
 SUPERVISOR: ING. JUAN PABLO ZULUAGA

UBICACION: SALAMINA
 EJECCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE MA CARRERAS Y B MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS

DESCRIPCION	UNID	CONCRETO CONTRACTUALES				ADICION INCL				ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA			
		CANTIDAD	VOLUNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VOLUNITARIO	VALOR TOTAL	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	VR TOTAL	VR TOTAL				
EJECCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE MA CARRERAS Y B MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS																			
DEMOLICIONES VARIAS																			
Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye: soldo, aislamiento, impermeabilización, revoque en concreto, MDF, FOLIO INCLuye: andenes, gradilla y caladas	M2	112,00	\$	10.944,00	\$	1.235.713,00	35,65	\$	10.944,00	\$	990.175,00	0,00	147,00	1.628.785,00	0,00%	347,00	\$	1.628.785,00	90,0%
Retiro de sobras en vehículo autómata	M3	11,39	\$	119.509,00	\$	1.384.870,00	9,26	\$	119.509,00	\$	1.106.650,00	0,00	18,96	2.309.891,00	95,94%	18,96	\$	2.309.891,00	90,7%
Excavación en zanja - material común 0 a 2 m	M3	14,89	\$	46.976,00	\$	795.149,00	85,22	\$	46.976,00	\$	3.053.537,00	0,00	84,00	3.945.984,00	102,42%	84,00	\$	3.945.984,00	100,0%
En conglomerado	M3	31,90	\$	37.790,00	\$	1.779.710,00	31,50	\$	37.790,00	\$	1.189.127,00	0,00	63,40	2.400.900,00	97,27%	63,40	\$	2.400.900,00	97,2%
SUBSTITUCIONES BASES Y SUMINISTROS COMPACTOS	M3	26,80	\$	41.776,00	\$	701.300,00		\$		\$			15,96	708.504,00	105,97%	15,96	\$	708.504,00	
Sub-base para pavimento	M3	51,15	\$	207.781,00	\$	10.698.554,00	11,50	\$	207.781,00	\$	2.800.044,00	0,00	65,30	31.548.079,00	100,00%	65,30	\$	31.548.079,00	100,0%
OBRAS EN CONCRETO																			
Concreto de 21 Mpa para gradillas, andenes y jardines incluye formaleta	M3	9,32	\$	964.112,00	\$	8.952.264,00		\$		\$			26,49	25.459.827,00	284,18%	26,49	\$	25.459.827,00	284,1%
Concreto para pavimento 42 Mpa hecho en obra incluye formaleta y gradillas	M3	27,65	\$	1.179.500,00	\$	32.820.432,00	17,72	\$	1.179.500,00	\$	20.901.874,00	0,00	31,56	37.276.596,00	0,00%	31,56	\$	37.276.596,00	99,0%
ACERO																			
Acero de refuerzo para doweles en 7/8" con canasta	KG	399,92	\$	12.189,00	\$	4.143.290,00	100,00	\$	12.189,00	\$	1.442.480,00	0,00	400,00	5.485.070,00	97,84%	400,00	\$	5.485.070,00	97,8%
OBRAS VARIAS																			
Tratado y Retiro de postes de concreto	UN	9,00	\$	1.200.000,00	\$	3.600.000,00		\$		\$			3,00	3.600.000,00	100,00%	3,00	\$	3.600.000,00	100,0%
Retiro e instalación de cerco en esterilla (No incluye materiales)	CL		\$		\$			\$		\$			1,00	1.480.000,00	100,00%	1,00	\$	1.480.000,00	100,0%
Retiro e instalación de baranda peatonal (No incluye materiales)	ML		\$		\$			\$		\$			15,00	284.250,00	100,00%	15,00	\$	284.250,00	100,0%
COSTO DIRECTO																			
ADMINISTRACION %				\$	48.438.185			\$	48.438.185		\$	34.219.092		\$	72.652.020			\$	72.652.020
IMPUESTOS %				\$	11.625.164,00			\$	11.625.164,00		\$	5.812.582,00		\$	17.436.485,00			\$	17.436.485,00
UTILIDADES %				\$	2.421.909,00			\$	2.421.909,00		\$	1.210.955,00		\$	3.632.601,00			\$	3.632.601,00
OBRA ANTES IVA					\$	64.907.168,00			\$	64.907.168,00				\$	97.353.707			\$	97.353.707
IVA					\$	460.163,00			\$	460.163,00				\$	690.194,00			\$	690.194,00
VALOR TOTAL OBRA					\$	65.367.331			\$	65.367.331				\$	98.043.901,00			\$	98.043.901,00
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA					\$	65.367.331			\$	65.367.331				\$	98.043.901,00			\$	98.043.901,00

NOVIENOS Y OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 6 MIL 367 MIL 331

[Handwritten signature]

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
REGIONAL NORTE



CONTRATO No. 183 DE JUNIO 5 DEL 2023		ACTA No.: 1 FINAL	
EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE BA CARREBAS Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS		FECHA INICIACION JUNIO 5 DE 2023	
MUNICIPIO	SALAMINA	VALOR CONTRATO	\$ 65.367.331,00
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VALENCA MONTES S.A.S	VALOR CONTRATO + ADICION:	\$ 98.050.996,00
SUPERVISION Ing. JUAN PABLO ZULLUGA		EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE BA CARREBAS Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	

DESCRIPCION	UNO	CONDICIONES CONTRACTUALES		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VOLUNTARIO	AJUSTE N.L.I	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESIDENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		X OTRA ESCRITADO
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO					CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
REGIONAL NORTE



CONTRATO No. 183 DE JUNIO 5 DEL 2023		ACTA No.: 1 FINAL	
EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE BA CARREBAS Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS		FECHA INICIACION JUNIO 6 DE 2023	
MUNICIPIO	SALAMINA	VALOR CONTRATO	\$ 65.367.331,00
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VALENCA MONTES S.A.S	VALOR CONTRATO + ADICION:	\$ 98.050.996,00
SUPERVISION Ing. JUAN PABLO ZULLUGA		EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE BA CARREBAS Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	

REBUMEN TOTAL DEL CONTRATO:
VALOR CONTRATO INICIAL
Valor Adicion No. 01
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: Junio 30 de 2023)
Saldo del Contrato
SUMAS IGUALES


\$ 65.367.331,00
\$ 32.683.665,00
\$ 98.043.901,00
\$ 7.095,00
\$ 98.050.996,00

Nombre: CARLOS ALBERTO VALERDIA MARQUEZ
R. LEGAL, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VALENCA MONTES S.A.S
CONTRATISTA

Nombre: Ing. JUAN PABLO ZULLUGA CORREA
INGENIERO SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

\$ 65.367.331,00
\$ 32.683.665,00
\$ 98.050.996,00
\$ 98.050.996,00

FECHA CORTE: JUNIO 30 DE 2023	
FECHA VENCIMIENTO: AGOSTO 14 DE 2023	
VALOR ADICION	\$ 65.367.331,00
FECHA: JULIO 7 DE 2023	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA - CALDAS				CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO							
CONTRATO No.		193 JUNIO 6 DE 2023				PRE-ACTA:		No 2- FINAL			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S				FECHA INICIACIÓN:		JUNIO 6 DE 2023			
SUPERVISOR:		Ing. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA				FECHA TERMINACIÓN:		AGOSTO 14 DE 2023			
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomero							ML		147,00	147,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
29	6			147,00					147,00	JUNTA DE DILATACION PARA PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO Y ANDENES EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS.	
									CANTIDAD DE PAGO	147,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas							M3		18,96	18,96
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
6	6			19,85	2,00	0,30		11,91		CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
6	6			10,85	1,00	0,65		7,05		DEMOLICION ESCALAS DE ACCESO A VIVIENDA PARA CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
									CANTIDAD DE PAGO	18,96	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	En material comun de 0 a 2m							M3		63,60	63,60
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
8	6			106,00	1,00	0,60		63,60		EXCAVACION PARA ANDEN PEATONAL EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
									CANTIDAD DE PAGO	63,60	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	En conglomerado							M3		16,96	16,96
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
6	6			106,00	1,00	0,16		16,96		EXCAVACION PARA ANDEN PEATONAL EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS	
									CANTIDAD DE PAGO	16,96	



CONTRATO No.	193 JUNIO 6 DE 2023	PRE-ACTA :	No 2- FINAL
CONTRATISTA.	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S	FECHA INICIACIÓN	JUNIO 6 DE 2023
SUPERVISOR:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA TERMINACION	AGOSTO 14 DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	M3	212,00	28,00	240,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
8	6			14,00				14,00		RETIRO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION
9	6			14,00				14,00		RETIRO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION
10	6			14,00				14,00		RETIRO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION
12	6			14,00				14,00		RETIRO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION
15	6			14,00				14,00		RETIRO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION
17	6			14,00				14,00		RETIRO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION

CANTIDAD DE PAGO 84,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Sub-base para pavimento	M3	0	65,30	65,30

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
17	6			63,00	3,50	0,20		44,10		ESTRUCTURA GRANULAR PARA PAVIMENTO RIGIDO EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE
17	6			106,00	1,00	0,20		21,20		ESTRUCTURA GRANULAR PARA ANDEN PEATONAL EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS

CANTIDAD DE PAGO 65,30

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	M3	0	26,49	26,49

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
28	6			106,00	0,95	0,15		15,11		ANDEN PEATONAL EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
20	6			13,00	1,20	0,20		3,12		MURO No.1 CONTENER EL LLENO DE LA VIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
20	6			13,00	0,80	0,30		3,12		ZAPATA DE MURO No.1 CONTENER EL LLENO DE LA VIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
22	6			7,00	0,20	1,00		1,40		MURO No.2 CONTENER EL LLENO DE LA VIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
22	6			7,00	0,80	0,30		1,68		ZAPATA DE MURO No.2 CONTENER EL LLENO DE LA VIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
22	6			4,70	0,20	1,00		0,94		MURO No.3 CONTENER EL LLENO DE LA VIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
22	6			4,70	0,80	0,30		1,13		ZAPATA DE MURO No.3 CONTENER EL LLENO DE LA VIA EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS

CANTIDAD DE PAGO 26,49



CONTRATO No.	193 JUNIO 6 DE 2023	PRE-ACTA:	No 2- FINAL
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S	FECHA INICIACION:	JUNIO 6 DE 2023
SUPERVISOR:	Ing. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA TERMINACION:	AGOSTO 14 DE 2023

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	M3	0	31,56	31,56

FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M3	ACUMULADO
19	6			43,00	3,50	0,18		27,09	PAVIMENTO RIGIDO EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE
21	6			198,50	0,15	0,15		4,47	BORDILLO PARA PAVIMENTO RIGIDO EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
								CANTIDAD DE PAGO	31,56

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta	KG	0	450,00	450,00

FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	KG	ACUMULADO
19	6							330,00	REFUERZO (DOVELAS) PARA PAVIMENTO RIGIDO EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
20	6							120,00	REFUERZO (MUROS DE CONTENCIÓN) PARA PAVIMENTO RIGIDO EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
								CANTIDAD DE PAGO	450,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Traslado y Retiro de postes de concreto	UNIDAD	0	3,00	3,00

FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	UNIDAD	ACUMULADO
6	6							3,00	RETIRO Y TRASLADO DE POSTES DE ENERGIA E ILUMINADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
								CANTIDAD DE PAGO	3,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Retiro, e instalacion de cerco en esterilla (No incluye materiales)	GL	0	1,00	1,00


FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	GL	ACUMULADO
27	6							1,00	RETIRO Y TRASLADO DE CERRAMIENTO EN ESTERILLA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
								CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Retiro, e instalacion de baranda peatonal (No incluye materiales)	ML	0	15,00	15,00

FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO
29	6			15,00				15,00	RETIRO Y TRASLADO DE BARANDA PEATONAL EXISTENTE PARA CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA DE LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS
								CANTIDAD DE PAGO	15,00




FIRMA CONTRATISTA.
Ing. CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
S.A.S



FIRMA SUPERVISOR
Ing. JUAN PABLO ZULUAGA

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

10-07-2023 10-07-2023 FE FES Factura electrónica 901559304 89050239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación # Factura Electrónica \$98,043,901

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2022-08-03

# CONTRATO Y AÑO	193 DE JUNIO 5 DEL 2023	Acta N°	1-FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	\$	65.367.331,00
				2. VALOR ADICION	\$	32.683.665,00
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	98.050.996,00
NIT O CC:	901.589.304-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-
CDP (#, rubro y fecha)	20230548 DE MAYO 26 DE 2023- - 20230644 DE JUNIO 27 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	98.043.901,00
RP (#, rubro y fecha)	684 DEL 5 DE JUNIO DE 2023 - 735 DEL 27 DE JUNIO DE 2023.			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	7.095,00

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS

TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 176-2023	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	-------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	X	
9- Diseño de Mezclas.	X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	X	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Guevedo P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

11/07/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
108900240889	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

12-07-23
0.20



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	193 DE JUNIO 05 DEL 2023		
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S	NIT O CC:	901.589.304-0

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-GALDAS		
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.			
2. Paz y salvo oficina de trabajo.			
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.			
4- Pago FIC.			
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).			
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).			
7- Original del Acta de Liquidación.			
8- Certificado de obra.			
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)			N/A

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Andrés G.
FIRMA

Fecha

11/07/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO SUPERVISOR DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACION VIGENCIA ESTABILIDAD DE OBRA**



CONTRATO 193 DE 2023

OBJETO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 9ª ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN SALAMINA - CALDAS

VALOR \$98.050.996

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES & INGENIERÍA VALENCIA MONTES S.A.S

NIT 901589304-0

PLAZO 45 DIAS CALENDARIO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101056517

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 42-40-101043363

COMPAÑÍA DE SEGURO SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	05-jun-23	20-oct-23	\$ 29.415.298,80
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	05-jun-23	20-jul-23	\$ 19.610.199,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	30-jun-23	30-jun-28	\$ 19.610.199,20

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 193 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

11/07/2023


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente


LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General


PROYECTÓ. ANDRÉS FELIPE GIRALDO RÍOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101056517	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 07 2023	05 06 2023		00:00	20 07 2028		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.589.304-0
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 4 - 71 CS 79	CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS TELÉFONO: 3104158968

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA No. 193 DE 2023 CUYO OBJETO ES EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 9A ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	05/06/2023	20/10/2023	\$29,415,298.80	\$29,415,298.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	05/06/2023	20/07/2026	\$19,610,199.20	\$19,610,199.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$19,610,199.20	\$19,610,199.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DEL 30/06/2023 AL CONTRATO 193-2023, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO ESTABILIDAD DE LA OBRA ASI:

AMPARO ESTABILIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA DESDE 30/06/2023	VIGENCIA HASTA 30/06/2028
-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****68,635,697.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASECURADO
ODG GRUPO ASEGURADOR LTDA.	153950	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

42-45-101056517

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101056517		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
10 07 2023			05 06 2023			00:00		20 07 2028		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.589.304-0			
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 4 - 71 CS 79						CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS			TELÉFONO: 3104158968		


DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		


ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****68,635,697.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ODG GRUPO ASEGURADOR LTDA.	153950	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.POLIZA 42-45-101056517		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
10 07 2023			05 06 2023			00:00		20 07 2028		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.589.304-0	
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 4 - 71 CS 79		CIUDAD: VILLA MARIA, CALDAS	
		TELÉFONO: 3104158968	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8867080	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101056517

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-45-101056517

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

lunes, 10 de julio de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Tomador:

CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.

Inicio de vigencia:

lunes, 5 de junio de 2023

Fin vigencia:

jueves, 20 de julio de 2028

Valor total asegurado:

\$ 68.635.697

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de **nuestras oficinas** a nivel nacional.

 Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**



MINISTERIO DEL TRABAJO

No. Radicado: 08SE2023741700100002491
 Fecha: 2023-05-25 11:18:31 am
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
 Destinatario: CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.
 Anexos: 0 Folios: 1
 08SE2023741700100002491

MINISTERIO DEL TRABAJO HACE CONSTAR A QUIEN PUEDA INTERESAR:



Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	25/05/2023
Nombre y/o Razón Social:	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S.
Identificación:	901.589.304-0

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.

Dado en la ciudad de Manizales, el día 25 de mayo de 2023.


DARÍO ESCEHOMO DÍAZ
 Director Territorial

DARÍO ESCEHOMO DÍAZ Director Territorial

Elaboro: Luz M. Coral H.
Reviso: D. Escehomo Díaz

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá: 120
www.mintrabajo.gov.co

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.



Manizales, Junio 30 de 2023.

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Carrera 23 No.75-82
Manizales- caldas

REFERENCIA: "EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS."

ASUNTO: Certificación pagos de seguridad social integral art. 50 ley 789 de 2002

Yo CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ, con cedula de ciudadanía No. 16.078.315 expedida en Manizales y obrando como representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S con cedula tributaria No. 901589304-0, certifico bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo en los últimos 6 meses con los aportes al sistema general de seguridad social integral compuesto por salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF) en acuerdo a lo que establece el artículo del asunto.

Así mismo certifico que me encuentro a paz y salvo con todo lo concerniente a salarios, prestaciones sociales y liquidaciones de los trabajadores a cargo.

CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
Representante Legal Construcciones & Ingeniería Valencia Montes S.A.S
C.C. 16.078.315 De Manizales.
Email: construccionesvalenciamontes@gmail.com
Manizales-Caldas

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	93181352	917955199381	10/07/2023

Número de Identificación

901589304

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

0

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 71 A 71 CA 79

Localización

Nacional

Correo electrónico

paojimen@yahoo.es

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ACUEDUCTO SALAMINA

Fecha Terminación Obra

30/06/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total Mano de Obra

1248066.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,310 4158968

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

193

Fecha Inicio Obra

06/06/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

901589304

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

98050996.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

58000.00

Valor del Pago

58000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	93181352	917955199381	10/07/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901589304**


Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.95.42.57**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 58,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 58,000.00	COP\$ 58,000.00

F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES INGENIERÍA VALENCIA MONTES S.A.S	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	901.589.304-0	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-06-30
NUMERO DE CONTRATO:	CONTRATO 193 de 2023	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor.	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y subcontratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Juan Pablo Zuluaga Correa		
CARGO:	Jefe Depto. Planeación y Proyectos - Supervisor		
FIRMA:			

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO 193 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES
S.A.S
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE UNICA OFERTA ✓

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE ✓
C.C. 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO "EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR
EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8
MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS." ✓

OBRA
COSTO DIRECTO \$ 72.657.277
ADMINISTRACIÓN 29% \$ 17.437.746
IMPREVISTOS 5% \$ 3.632.864
UTILIDAD 5% \$ 3.632.864
I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19% \$ 690.244
VALOR TOTAL OBRAS \$ 98.050.996,00 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDAD

RESUMEN DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 65.367.331,00
ADICION \$ 32.686.665,00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS \$ 98.050.996,00

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 98.043.901,00
SALDO NO EJECUTADO \$ 7.095,00
RECURSOS CONVENIO 176-2023
SUPERVISIÓN INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
PLAZO INICIAL CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA FINAL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023.

CDP 2023 20230548 DE MAYO 26 DE 2023- 20230644 DE JUNIO 27 DE 2023.
RP 2023 684 DEL 5 DE JUNIO DE 2023 - 735 DEL 27 DE JUNIO DE 2023.




f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Junio de 2023 se reunieron JUAN PABLO ZULUAGA CORREA, Ingeniero Supervisor por parte de Empocaldas S.A E.S.P y el ingeniero civil CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ Representante legal dela empresa CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S contratista de obra, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL del Contrato 193 de 2023.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe de Planeación y Proyectos
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
CONTRATISTA
R.L CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	193 DEL 5 DE JUNIO DE 2023
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
NIT:	901.589.304-0
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL C.C.	EMPOCALDAS S.A E.S.P ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE 16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	"EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS."
COSTO TOTAL	\$ 97.360.752,00
I.V.A. 19%	\$ 690.244,00
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 98.050.996,00
SALDO NO EJECUTADO	\$ 7.095,00
RECURSOS	CONVENIO 176-2023
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN PLAZO	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA (45) DÍAS CALENDARIO
CDP 2023	20230548 DE MAYO 26 DE 2023- 20230644 DE JUNIO 27 DE 2023.
RP 2023	684 DEL 5 DE JUNIO DE 2023 - 735 DEL 27 DE JUNIO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los **10-07-2023** se reunieron los señores ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., JUAN PABLO ZULUAGA CORREA como ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el Señor CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ, Representante legal dela empresa CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S con Nit. 901.589.304-0, Contratista, con el fin de efectuar la entrega por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato 193 del 5 de Junio de 2023.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente acto.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por





empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS		\$ 65.367.331,00
ADICIÓN No.1		\$ 32.683.665,00

Valor del Contrato		\$ 98.050.996,00	
Valor Acta No 01 FINAL			\$ 98.043.901,00
Saldo No ejecutado			\$ 7.095,00
SUMAS IGUALES		\$ 98.050.996,00	\$ 98.050.996,00

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
Contratista.
R.L CONSTRUCCIONES & INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S

Vo. Bo.
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe de Planeación y Proyectos
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo.
LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**EL SUSCRITO INGENIERO DE ZONA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA
DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

CERTIFICAN QUE:

Una vez revisados los archivos de la entidad, se pudo constatar que el contratista CONSTRUCCIONES & INGENIERÍA VALENCIA MONTES S.A.S con Nit No. 901.589.304-0 realizó para EMPOCALDAS S.A E.S.P el siguiente Contrato

CONTRATO: No. 193 DE JUNIO 5 DE 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES & INGENIERÍA VALENCIA MONTES S.A.S

OBJETO: "EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 9A CARRERAS 7 Y 8 MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS."

VALOR CONTRATO: \$ 98.050.996,00

FECHA DE INICIACIÓN: JUNIO 6 DE 2023

PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO 30 DE 2023

FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL: JUNIO 30 DEL 2023.


VALOR EJECUTADO \$ 98.043.901,00

Con las siguientes cantidades representativas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la supervisión

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
DEMOLICIONES VARIAS				
Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico	ML	147,00	\$10.944,00	\$1.608.768,00
Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	M3	18,96	\$119.509,00	\$2.265.891,00
SOBREACARREOS				
Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	M3	84,00	\$46.976,00	\$3.945.984,00
EXCAVACIONES				
Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	M3	63,60	\$37.750,00	\$2.400.900,00

En conglomerado	M3	16,96	\$41.775,00	\$708.504,00
SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
Sub-base para pavimento	M3	65,30	\$207.781,00	\$13.568.099,00
OBRAS EN CONCRETO				
Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	M3	26,49	\$961.112,00	\$25.459.857,00
Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	M3	31,56	\$1.179.550,00	\$37.226.598,00
ACERO				
Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta	KG	450,00	\$12.189,00	\$5.485.050,00
OBRAS VARIAS				
Traslado y Retiro de postes de concreto	UN	3,00	\$1.200.000,00	\$3.600.000,00
Retiro, e instalación de cerco en esterilla (No incluye materiales)	GL	1,00	\$1.490.000,00	\$1.490.000,00
Retiro, e instalación de baranda peatonal (No incluye materiales)	ML	15,00	\$18.950,00	\$284.250,00
COSTO DIRECTO				\$72.652.020,00
ADMINISTRACION	%	24,00%		\$17.436.485,00
IMPREVISTOS	%	5,00%		\$3.632.601,00
UTILIDADES	%	5,00%		\$3.632.601,00
SUMA ANTES IVA				\$97.353.707,00
I. V. A.	%	19		\$690.194,00
VALOR TOTAL OBRA				\$98.043.901,00

Se firma en Manizales, a los Treinta (30) días del mes de Junio del año 2023.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de zona (Supervisor)
EMPOCALDAS S.A E.S.P
