

ACTA DE LIQUIDACION

CONVENIO No. 215/2023
REPOSICION DE LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y
OBJETO ALCANTARILLADO EN LA
CARRERA 4 CON CALLES 1
Y CALLE 1 SUR MUNICIPIO
DE ANSERMA

VALOR CONVENIO 324.000.000 ✓

APORTES
EMPOCALDAS S.A E.S.P
BIENES Y SERVICIOS (SUPERVISION)
24.000.000 ✓

MUNICIPIO 300.000.000 ✓

TOTAL 324.000.000 ✓

RECIBO No. 258 del
31/08/2023 CONSIGNACION 300.000.000 ✓
MUNICIPIO DE ANSERMA

ACTA DE INICIO 27/06/2023 ✓
PLAZO 31/12/2023 ✓

29-04-24 ✓

En la ciudad de Manizales a los ----- se reunieron los señores **CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.816.510 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A E.S.P**, con NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000425 de la Junta Directiva del 15 de enero de 2024, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** de una parte y de otra parte **OMAR ANDRES REINA MUÑOZ** Alcalde Municipal de Anserma, Caldas, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.774.913 expedida en Manizales, Caldas en su calidad de Alcalde Municipal, con acta de posesión de fecha 3 de enero del 2024, quien obra en representación legal del Municipio de Anserma, y para los mismos efectos se denominará **EL MUNICIPIO DE ANSERMA**, con el fin de liquidar el presente convenio interadministrativo, según la siguiente relación.

0002

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
231/2023	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE	REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON CALLES 1 Y CALLE 1 SUR MUNICIPIO DE ANSERMA	271.472.618	221.702.000
OCC 49/2023	SUPROKOM SAS	SUMINISTROS PARA LA REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON CALLES 1 Y CALLE 1 SUR MUNICIPIO DE ANSERMA	11.763.987	11.763.987
		ACTA DE VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS (SUPERVISION)	24.000.000	24.000.000
TOTAL CONVENIO	324.000.000		307.236.605	257.465.987
VALOR EJECUTADO	257.465.987			
VALOR A REINTEGRAR AL MUNICIPIO DE ANSERMA	66.534.013			


La sección de tesorería deberá reintegrar al municipio los rendimientos financieros generados




OMAR ANDRÉS REINANDO
Alcalde Municipal Anserma




CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente EMPOCALDAS S.A. E.S. P




DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
Supervisor por parte de la alcaldía de Anserma



FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ
Ingeniero de Zona Supervisor.



SERGIO HUMBERTO LOPERA PARDO
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento



TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaria General

LOS SUSCRITOS INTERVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 215 DEL 2023 REPOSICIÓN DE LAS REDES DE
AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON CALLES 1 Y CALLE 1
SUR MUNICIPIO DE ANSERMA


CERTIFICAN


Por parte de la alcaldía de Anserma se recibieron a entera satisfacción las obras realizadas por parte de EMPOCALDAS S.A E.S. P mediante convenio No. 215 del 2023.

Por parte de los supervisores nombrados para el Convenio 215 del 2023, se hace constar que EMPOCALDAS S.A E.S. P se encuentra a Paz y Salvo por cualquier otro concepto relacionado con el presente convenio.

29-04-24


Para constancia se firman a los



OMAY ANDRÉS REINA MUÑOZ
Alcalde Municipal Anserma


DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
Supervisor por parte de la alcaldía de Anserma


SERGIO HUMBERTO LÓPEZ BROAÑOS
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento


CRISTIAMATELO LOAIZA ALFONSO
Gerente EMPOCALDAS S.A E.S. P


FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ
Ingeniero de Zona Supervisor.


TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaria General



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
DATOS DE LA ESCRITURA PUBLICA.
NUMERO: DOS.
N R O: 0002
FECHA DE AUTORIZACION: ENERO 03 DEL 2024
NOTARIA DE ORIGEN: NOTARIA UNICA ANSERMA CALDAS
NATURALEZA DEL ACTO: PROTOCOLIZACION ACTA DE POSESION DEL
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2024 AL 2027
OTORGANTE: MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.
NIT: 890801139-1.
REPRESENTANTE LEGAL: OMAR ANDRES REINA MUÑOZ.

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO: 1.053.774.913 expedida en Manizales

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, a tres (03) de enero del año dos mil veinticuatro (2.024), ante mi, **CESAR JAIME RIOS VALENCIA, Notario Único del Circulo**, compareció el señor **OMAR ANDRES REINA MUÑOZ**, mayor de edad, de estado civil soltero sin unión marital de hecho, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.053.774.913 expedida en Manizales, domiciliado en el municipio de Anserma, departamento de Caldas, quien actúa en este acto en calidad de **ALCALDE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS**, identificado con el NIT 890801139-1 y manifestó: Que presenta a esta Notaria para protocolización y archivo de la misma en diecisiete (17) hojas útiles, copia del **ACTA DE POSESION COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS**, para el período constitucional comprendido entre el primero (01) de Enero de dos mil veinticuatro (2024) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintisiete (2027) y de sus anexos. En consecuencia, Yo el Notario Único del Circulo, declaro protocolizado el documento a que se hizo referencia en está escritura pública a fin de que su contenido se inserte en las copias que de ésta se expidan y surta los efectos de Ley. **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION**: Leído que les fue el instrumento precedente al otorgante, le imparte su aprobación a todas y cada una de sus cláusulas, estampa sus huellas de forma biométrica, y se protocoliza fotocopia de su documentos de identificación, y en señal de asentimiento lo firma por ante mi y conmigo el Notario Único del Circulo

Papel notarial para uso exclusivo de escritura pública, protocolización y levantamiento del acta de notaría

República de Colombia cadena.

quien autoriza este acto y de todo lo cual doy fe. Derechos Resolución EXENTA
Capitulo III, Artículo 25, Literal E. Esta escritura se extendió en la hoja de papel
notarial número Aa089905193. Así firman:



DR. OMAR ANDRES REINA MUÑOZ
C.C 1.053.774.913 expedida en Manizales
DIRECCION: Cra 5ª #22-57
TELEFONO: 3128480063
CORREO ELECTRONICO: alcaldiaomarreina@gmail.com
OTORGANTE

CESAR JAIME RÍOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO



NOTARIA ÚNICA DE ANSERMA CALDAS
LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ANSERMA CALDAS
CERTIFICA
Que la presente es FIEL PRIMERA COPIA de la escritura
N° 0002 de Fecha 03 de 01 de 2024
Tomada de su original, la que se expede y autorizo en Doce
hojas útiles son destino Otorgante: Municipio
de Anserma, Caldas.
CÉSAR JAIME RÍOS VALENCIA
NOTARIO



03 ENE 2024



cadena

República de Colombia

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA



A089905194

En la ciudad de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, el tres (3) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría Única del Circulo de Anserma, compareció: OMAR ANDRES REYES VALENCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1053774913.

NOTARÍA ÚNICA
CESAR JAIME RIOS VALENCIA
NOTARIO



bc678dae78

03/01/2024 10:19:29

Firma autógrafa

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cojejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, que contiene la siguiente información PROTOCOLIZACION ACTA DE POSESION ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS PERIODO 2024-2027.

CESAR JAIME RIOS VALENCIA

Notario Único del Circulo de Anserma, Departamento de Caldas
Consulte este documento en <https://notarid.notariasegura.com.co>
Número Único de Transacción: bc678dae78, 03/01/2024 10:19:36



República de Colombia

¡Esta notaría para sus cobros de copias de certificaciones públicas, información...

C4458708881

08-11-23 133740CGCMANVANNM1

01-13-23

NOT
CESAR
ANSI

PÁGINA EN BLANCO

He aquí notación para sus certificaciones de copia de escrituras públicas, certificaciones y documentos del orden notarial.

ACTA DE POSESION DEL DOCTOR OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ COMO ALCALDE DE ANSERMA, CALDAS



Anserma, Caldas, siendo el día veintinueve (29) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), la suscrita Juez Segunda Promiscua Municipal de esta ciudad, dando cumplimiento al mandato consagrado en el inciso final de la norma 06 del Decreto 1421 de 1993, en asocio de su secretario, se trasladó a la Plaza Jorge Robledo de este municipio, con el fin de dar posesión a quien ha sido elegido como Alcalde de Anserma, por votación popular realizada el día 29 de octubre de 2023, lugar al cual compareció el Doctor OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1.053.774.913 de Anserma y presentó la credencial de fecha 01 de noviembre de 2023, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Delegados del Consejo Nacional Electoral, que acredita su calidad de Alcalde Electo por la circunscripción electoral de Anserma para el periodo constitucional 2024-2027 por la coalición AVANZA POR LA RECUPERACIÓN DE ANSERMA, .

Seguidamente la suscrita Juez Segunda Promiscua Municipal de Anserma, tomó al compareciente el juramento de ley, habiendo este jurado a Dios y prometido al pueblo, cumplir fiel y lealmente la Constitución Nacional, las Leyes de Colombia y los deberes y funciones propios que el cargo de Alcalde de Anserma, Caldas le impone.

Además de los documentos mencionados, el Doctor OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ exhibió, el formato único de hoja de vida que consta de cuatro (4) folios útiles, Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada Persona Natural Ley 190 de 19096 de la Función Pública, Certificado de Antecedentes Fiscales expedido el día 22 de diciembre de 2023, por la Contraloría General de la Republica, Certificado de Antecedentes Disciplinario Ordinario N° 237441085 expedido a los 22 días de diciembre de 2023, Certificado de Antecedentes Disciplinarios Especial No. 237480180 expedido el 25 de diciembre del 2023 por la Procuraduría General de la Nación, Certificado de antecedentes judiciales consultado a los 22 días de diciembre de 2023, consulta al Sistema Registro Nacional de Medidas Correclivas, el día 22 de diciembre, donde se constata que no tiene sanciones o multas.

Declaración bajo juramento en donde manifiesta que su estado civil es soltero y de conformidad con lo ordenado en el artículo 6 de la ley 311 del 12 de Agosto de 1996 declara no tener conocimiento de procesos alimentarios en su contra e igualmente declara que cumplirá con sus obligaciones de familia cuando estas se generen, Declaración bajo juramento de manifestación de no estar incurso en la causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 97 del Decreto Ley 1421 de 1993 para ejercer el cargo de Alcalde de Anserma, Declaración bajo juramento expedida el día 22 de diciembre de 2023, donde manifiesto que no se encuentra en situación de deudor moroso con el estado o en su defecto haber suscrito acuerdo de pago vigente, a la presente se anexan fotocopias de la documentación antes relacionada.



Ca 456706680

SECRETARÍA NOTARIAL 01-17-23



ACTA DE POSESION DEL DOCTOR OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ COMO ALCALDE DE ANSERMA, CALDAS



No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina el acto respectivo y se firma como aparece, una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ
Poseionado

CATALINA FRANCO ARIAS
Juez

JUAN CARLOS ÁLVAREZ AGUIRRE
Secretario Ad-Doc

NOTARIA UNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N.º 0002
del día 03 de 01 de 2024
CEL. 311 211 1111



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Provincia de Colombia cadena.
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E27



LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN REGISTRADORA MUNICIPAL

11. RECUPERAMOS

Que, OMAR ANDRES REINA MUNOZ identificado(a) con C.C.: 1053774913 ha sido elegido(a) ALCALDE por el Municipio de ANSERMA CALDAS, para el Período Constitucional de 2024 al 2027, por el PARTIDO ALIANZA POR LA RECUPERACION DE ANSERMA.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL en ANSERMA (CALDAS), el miércoles 01 de noviembre del 2023

Angela María Ocampo Galeano
ANGELA MARÍA OCAMPO
GALEANO
MIEMBROS DE LA COMISIÓN REGISTRADORA

Cesar Augusto Ramirez Tabares
CESAR AUGUSTO RAMIREZ
TABARES
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN REGISTRADORA

NOTARIA ÚNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTECCIÓN POR ESCRITURA N° 0002
del día 03 de 01 de 2024
CESAR JAIME RIOS VALENCIA NOTARIO

Powered by CamScanner



01-13-23

Código de barras

C:4458708879

11384E0A8F5C4C09

PÁGINA EN BLANCO





FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1990)

ENTIDAD RECEPTORA



1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO REINA	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) MUÑOZ	NOMBRES OMAR ANDRÉS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> No. 3063774913	SEXO + <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/>	NACIONALIDAD COL <input checked="" type="checkbox"/> EXTRANJERO <input type="checkbox"/> PAÍS COLOMBIA
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE <input type="checkbox"/> SEGUNDA CLASE <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO 3063774913	D.M. 22
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
FECHA DÍA 14 MES 02 AÑO 1987	CALLE 81 B 26 41 CASA 43 BOSQUES DE L 43 BOSQUES DE LA SIERRA	
PAÍS COLOMBIA	PAÍS COLOMBIA	DEPTO. CALDAS
DEPTO. CALDAS	MUNICIPIO NANZALES	
MUNICIPIO ANSERMA	TEL. FÓFONO 8480083	EMAIL omarmhscorautor@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO	BÁSICA SECUNDARIA				
PRIMARIA					SECUNDARIA					MEDIA	FECHA DE GRADO					
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	DT	AÑO	2003		

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
SUGIERE EN ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TIPO (TÉCNICA) TL (TECNOLÓGICA) TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)
 (ESPECIALIZACIÓN) MG (MAESTRÍA O MAGISTER) DDO (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

Modalidad Académica	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA URBANA Y REGIONAL	12	2019	N/A
POSTGRADO	4	X		MAESTRIA EN ESTUDIOS POLITICOS	10	2018	N/A
PREGRADO	10	X		ADMINISTRACION DE MERCADERO	11	2018	N/A

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES			X			X			X





FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1996)

3

EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO VIGENTE													
EMPRESA O ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO BOGOTÁ, D.C.			MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 5187100			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO					
			Día		Mes		Año		Día		Mes		Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL			DEPENDENCIA					DIRECCIÓN CARRERA 69 - 44 35					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD MILENUM Y CIA LTDA				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 3307191649			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO					
			Día		Mes		Año		Día		Mes		Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA					DIRECCIÓN CALLE 19 N 9 14					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 6932444			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO					
			Día		Mes		Año		Día		Mes		Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL					DIRECCIÓN CARRERA 21 N 22 57 Edificio Gobernación de Caldas					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO					
			Día		Mes		Año		Día		Mes		Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA					DIRECCIÓN info@asambleadecaldas.gov.co					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD CONCEJO ANSERMA CALDAS				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO ANSERMA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 8536091			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO					
			Día		Mes		Año		Día		Mes		Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL					DIRECCIÓN Centro Administrativo Municipal, Plaza Jorge Roble					

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 180 de 1993, 459 y 443 de 1995)



República de Colombia cadena.

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CALDAS				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA								
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANIZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD								
TELÉFONOS 8952444			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO								
			Día		05	Mes	09	Año	2011	Día		17	Mes	10	Año	2011
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					DIRECCIÓN CARRERA 21 E 22 Y 23								
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CALDAS				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA								
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANIZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD								
TELÉFONOS 8952444			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO								
			Día		01	Mes	08	Año	2011	Día		23	Mes	09	Año	2011
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					DIRECCIÓN CARRERA 21 E 22 Y 23								
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CALDAS				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA								
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANIZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD								
TELÉFONOS 8952444			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO								
			Día		14	Mes	05	Año	2010	Día		13	Mes	09	Año	2010
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					DIRECCIÓN CARRERA 21 E 22 Y 23								
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CALDAS				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA								
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANIZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD								
TELÉFONOS 8952444			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO								
			Día		18	Mes	05	Año	2010	Día		17	Mes	08	Año	2010
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SECRETARIA DE CULTURA					DIRECCIÓN CARRERA 21 E 22 Y 23								
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																
EMPRESA O ENTIDAD CORPORACION CIVICA PROGRESAR				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA								
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANIZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD								
TELÉFONOS 8856027			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO								
			Día		15	Mes	05	Año	2008	Día		25	Mes	09	Año	2008
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA PRENSA Y COMUNICACIONES					DIRECCIÓN CARRERA 4 N 9 40 piso 2								

Ca459700877



C.C.C.C. 01112-23



FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
 Persona Natural
 (Leyes 190 de 1995, 460 y 443 de 1995)



EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																	
EMPRESA O ENTIDAD ESE HOSPITAL SAN RAFAEL PUEBLO RICO RISARALDA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA									
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANIZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD									
TELÉFONOS 3693236388			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO									
			Día		01	Mes		08	Año		2008	Día	01	Mes	08	Año	2009
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					DIRECCIÓN CARRERA 4 N 9 - 85 Pueblo Pico Manizales									
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																	
EMPRESA O ENTIDAD E.S.E RITA ARANGO ALVÁREZ DEL PND				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA									
DEPARTAMENTO CALDAS			MUNICIPIO MANIZALES					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD									
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO									
			Día		01	Mes		08	Año		2006	Día	31	Mes	12	Año	2007
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					DIRECCIÓN CARRERA 19 T 17 - Risaralda									

4

EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE																	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS									
DEPARTAMENTO			MUNICIPIO					CORREO ELECTRÓNICO									
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO									
			Día			Mes			Año			Día		Mes		Año	
ÁREA DE CONOCIMIENTO			NIVEL EDUCATIVO					DIRECCIÓN									

5

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	2	2
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	1	6
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	11	1
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	15	0

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)



6 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES. (ARTÍCULO 86 DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento

Bogotá, Marzo 16 de 2023

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

7 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS



CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 01000011775 PÁGINA WEB: www.serviciopublico.gov.co

NOTARIA ÚNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N° 0002
de fecha 03 de 01 de 2024
CESAR JAIME RÍOS VALENCIA NOTARIO



Ca458706076

04-13-23

RÉGULA EN BLANCO

NOT
2567
545

FORMULARIO ÚNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES
Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 de 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS C# 458700675



Periodo Declarado: 01/01/2022 - 31/12/2022



1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, OMAR EMILIO REINA MUÑOZ
IDENTIFICADO CON C.C. X C.E. T.I. No. 1053774813 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:
PAIS: COLOMBIA DEPARTAMENTO: CALDAS MUNICIPIO: MANIZALES
DIRECCIÓN: ONCE B 25-41 CASA 43 BOSQUES DE L 43 BOSQUES DE LA TELÉFONO: 3128480063
Y TENIENDO COMPARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
SALVADOR REINA PELAEZ	1054888318	HIJO(A)
ESTEFANA REINA MUÑOZ	1054926120	HERMANO(A)
MARTHA CECILIA MUÑOZ QUICENO	24391254	MADRE
OMAR EMILIO REINA LLANOS	16801368	PADRE

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESIÓN PARA RETIRARME PARA ACTUALIZACIÓN X PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE QUE LOS ÚNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los Ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	\$290.368,000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0
CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS	\$27.237,000
HONORARIOS	\$35.000,000
OTROS INGRESOS Y RENTAS	\$30.000,000
TOTAL	\$352.622,976

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	70837730226	BANCOLOMBIA	20,000,000
BBVA	CUENTA DE AHORROS	937002566	BBVA	80,000,000
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	86000678069	DAVIVIENDA	12,000,000

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	VALOR
INMUEBLES	EDIFICIO MURANO 403	180,000,000

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR
BBVA	CREDITOS	320,000,000
DAVIVIENDA	CREDITOS	450,000,000

1.2. DE PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCIÓN	CALIDAD DE MIEMBRO
INVERSIONES PRIOREM SAS	miembro de la junta

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACIÓN, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN	CALIDAD DE SOCIO
------------------------------------	------------------

República de Colombia cadena.

Ca 458700675



Cadena - 18.04.2022 011-12-23

En la actualidad

tipo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
LINEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000-917770



NOTARIA ÚNICA DE ANSERIMA CALDAS
PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N° 0002
de fecha 03 de 01 de 2024
- CESAR JAIME RÍOS VALENCIA NOTARIO



¡Basta! ¡Realidad para nos, ecología de capital de escritura pública, certificaciones y bases de datos del ambiente nacional!



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO



CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 22 de diciembre de 2023, a las 16:14:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1053774913
Código de Verificación	1053774913231222161436

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

NOTARIA UNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N° 0002
de fecha 03 de 01 de 2024
CESAR JAIME RIOS VALENCIA, NOTARIO

[Signature]
YESID LOZANO PUNTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Ca458700074



Código de Verificación 01-17-23



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 237441085



PIB
15:55:29
Hoja 1 de 01



Bogotá D.C., 22 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OMAR ANDRES REINA MUÑOZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1053774913:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

NOTARIA UNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N° 0002
de fecha 03 de 01 de 2024
CÉSAR JAIME RÍOS VALENCIA NOTARIO

ATENCIÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ESPECIAL No. 237480180



PIB
22-54-44
Hoja 1 de 01



C4456708673

Bogotá DC, 25 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OMAR ANDRES REINA MUÑOZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1053774913:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

INHABILIDAD ESPECIAL

Cargo: ALCALDE

Observación: NO PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO.

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se derivan de las relaciones contractuales con el estado, de los hechos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en el ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establece la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relaciónamiento Con El Ciudadano

NOTARIA UNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N° 0002
de Fecha 03 de Febrero de 2024
CESAR JAIME RIOS VALENCIA NOTARIO

ATENCIÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relaciónamiento con el Ciudadano
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5876750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

República de Colombia

Después de haberse verificado en el sistema de registros públicos


C4456708673



01-12-23



Policia Nacional de Colombia
www.policia.gov.co/7007/webjudicial/bofin/bofin.html



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO CONTACTOS REGLAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:30:18 PM horas del 22/12/2023, el ciudadano identificado con
Cédula de Ciudadanía N° 1063774913
Apellidos y nombre: REINA MUÑOZ OMAR ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de la Sentencia SU-456 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registren antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y apellidos, corresponden con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

NOTARIA UNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTOCLIZADO POR ESCRITURA N° 0002
de fecha 03 de 01 de 2024
CESAR JAIME RIOS VALENCIA NOTARIO

Verá el notario para sus notificaciones de copias de certificaciones, verificaciones y documentos del territorio nacional



Ca458706688

Consulta RNM

www.policia.gov.co/FSC/m_consulta.asp

Policía Nacional de Colombia

Portal de Servicios al Ciudadano FSC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/11/2023 08:48:47 p. m., el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N.º 10531749913,

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2014 "Por la cual se recibe el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", Registro Interno de Validación No. 88768936. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web instructiva ubicada <https://www.policia.gov.co/menú/ciudadano/consulta-medidas-correctivas>, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondiente con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Búsqueda](#) [Imprimir](#)

Ca458706688



NOTARIA ÚNICA DE ANSERMA CALDAS
 PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N.º 0002
 de Fecha 03 de 01 de 2024
 CESAR JAIME RIOS VALENCIA, NOTARIO

Ca458706688 01-17-24



DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS Y DE NO TENER CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE PROCESOS PENDIENTES DE CARÁCTER ALIMENTARIO

OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ identificado con la cedula de ciudadanía número 1.053.774.913 de Anserma, declaro bajo la gravedad de juramento:

- a) No hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 97 del Decreto Ley 1421 de 1993 para ejercer el cargo de Alcalde de Anserma, Caldas.
- b) No tener conocimiento sobre la existencia de procesos pendientes de carácter alimentario e igualmente declaro que cumplirá con sus obligaciones de familia cuando estas se generen. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 6º de la Ley 311 de 1996.

La presente declaración se suscribe a los 22 días de diciembre de 2023, con el fin de acreditar los documentos para la posesión en el cargo como Alcalde del Municipio de Anserma, Caldas.

Cordialmente,

OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ
cc. n° 1.053.774.913 de Anserma

NOTARIA UNICA DE ANSERMA CALDAS
PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA N° 0002
de fecha 03 de 01 de 2024
CEGAR JAIME RIOS VALENCIA NOTARIO

N.
CES



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
RECIBOS DE CAJA

CODIGO: GF-R-220
FECHA VIGENCIA: 2023-01-01
VERSION: 01
Página: 1 de 1

FECHA DE DOCUMENTO: 31/08/2023

DOCUMENTO: RECIBOS DE CAJA

Nro: 258


NOMBRE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
DOMICILIO: AVENIDA EL DORADO 68 C 61 P 10

NIT: 860034313 7
TELEFONO: 6013300000
MAIL: cempresarial@davivienda.co


DESCRIPCION: APORTES CONV 215/2023, MUNICIPIO DE ANSERMA

CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	DOC	DEBITOS	CREDITOS
111006038	DAVIVIENDA 9199 CONV 215/23			300,000,000.00	
13840601	ADMINISTRACION DE PR /	202001			300,000,000.00
TOTAL				<u>300,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>

Elabora:


BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Aprobo:


JOHN JAIME GARCIA OSPINA
JEFE SECCION TESORERIA



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT 890803239-9

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 13/07/2023

Contrato :

Proveedor: [900319774] Suprokom Sas

Nit: 900319774

ORDEN DE COMPRA

Direccion: CR 21 16-23

49

Telefono: 8549663

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	19	01	METRO	36.00	18,559.00	126,943.56	795,067
1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-19	19	01	METRO	84.00	55,752.00	899,801.92	5,572,969
1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	19	01	NO EXISTE	3.00	57,500.00	32,775.00	205,275
115181001655	SILLA YEE DE 12X8	19	01	UNIDAD	6.00	89,496.00	102,025.44	639,001
1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	19	01	METRO	90.00	1,948.00	33,310.80	208,630
7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	19	01	METRO	84.00	23,617.00	376,927.32	2,360,755
1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	19	01	UNIDAD	8.00	11,400.00	17,328.00	108,528
7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	19	01	UNIDAD	16.00	2,300.00	6,992.00	43,792
1151811007329	VALVULA HD JH DE 3"	19	01	UNIDAD	1.00	370,000.00	70,300.00	440,300
7750201000278	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	19	01	UNIDAD	10.00	89,400.00	169,860.00	1,063,860
1151811007484	TEE HD 3X2 JH	19	01	UNIDAD	1.00	124,100.00	23,579.00	147,679
7750201001363	TEE HF EXTREMO LISO DE 2"	19	01	UNIDAD	1.00	79,188.00	15,045.72	94,233
1151811007334	REDUCCION HD 3 X 2 JH	19	01	UNIDAD	1.00	70,500.00	13,395.00	83,895

OBSERVACION : SPO 104/23, CDP643/23, ACTA DE COMITE 60/23, SUPROKOM STRO TUBERIA Y ACCESORIOS REDES ACT Y ALC ANSERMA

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
9,265,704	1,878,283	11,143,987

ELABORADO POR

APROBADO POR
GERENCIA

REVISADO POR
JEFE DE SUMINISTROS

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2023-08-03

# CONTRATO Y AÑO	231 - 2023	Acta N°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AJU e IVA)	271.472.618
CONTRATISTA	ADRIÁN CAMILO HERNÁNDEZ MANRIQUE			2. VALOR ADICIÓN	0
NT O CC:	16.077.675			3. VALOR TOTAL (1+2)	271.472.618
COP (#, rubro y fecha)	2024263 - 19/01/24			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	179.026.812
RP (#, rubro y fecha)	2024265 - 19/01/24			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	42.675.188
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 215 / 2023 MUNICIPIO DE ANSERMA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR - A LIBERAR (3-4-5)	49.770.618
DOCUMENTO VERIFICADOS					
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓
2- Pagos SENA e ICSF, cuando aplique.					✓
3- Pagos al FIC					✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓
8- Ensayos de densidad.					✓
9- Diseño de Mezclas.					✓
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					✓
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					✓
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					✓
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Solo aplica para el acta final)					✓
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					✓
15- Acta parcial o final del contrato.					✓
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					✓

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	✓
Acta parcial o final del contrato	✓
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	✓
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	✓
Copia del registro presupuestal	✓

Fecha de presentación

08/02/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
716-327871-21	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes:
08-02-24
215 ca



PARAFISCALES

Ingenieri 


Claudia Mazo
CONTADORA PÚBLICA TITULADA

Asesorías Contables
Tributarias y Financieras
Elaboración de declaraciones de renta
personas naturales y jurídicas.

CERTIFICACIÓN APORTES Y PARAFISCALES

Yo, **CLAUDIA STELLA MAZO TORRES** identificada con cédula de ciudadanía No. 42.136.777 de Pereira, en mi condición de Contadora Pública del Ingeniero **ADRIÁN CAMILO HERNÁNDEZ MANRIQUE** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.077.675, expedida en Manizales, en calidad de **CONTRATISTA**, Certifico que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social a, SALUD, PENSION, ARP y parafiscales de los últimos seis (06) meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide con destino **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Del contrato N° 231 - 2023, Cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS".

Se adjunta copia de tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores.

Dado en Pereira a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año (2024) dos mil veinticuatro.

Cordialmente,


CLAUDIA STELLA MAZO TORRES
Contadora Pública Titulada
TP 144172 - T

Pereira - Risaralda

☎ 3104172438 ✉ csmazo@yahoo.es - csmazo@hotmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09001631E17A0209

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA STELLA MAZO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42136777 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 144172-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

144172-T

**CLAUDIA STELLA
MAZO TORRES
C.C. 42136777**

RESOLUCION INSCRIPCION 241 FECHA 10/09/2009

UNIVERSIDAD LIBRE



LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ 154416

Claudia

VIRMACTE TITULAR **68199**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 100 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DEPARTAMENTO DE CONTADORES
 PARA ESPECIALIZACIONES
 FECHA 24 DE ENERO DE 2010

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.136.777
MAZO TORRES
APELLIDOS
CLAUDIA STELLA
NOMBRES

Claudia Stella *[Signature]*
FIRMA



INDICE DE BIOMETRIA

FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1980
PEREIRA
(RISORALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

54 A+ F
ESTATURA G.S RH SEXO

16-FEB-1998 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00113762 F-0042136777-20081028 0004950830A 1 4950007996

CÉDULA CON DESTINACIÓN A EMPLEADOS S.A. E.S.P. CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL
 DE ADRIÁN CAMILO HERNÁNDEZ MARIQUE
 REGISTRO DE ENERO 2024



SEGURIDAD SOCIAL

Ingenieri



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27648629
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-09-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE		TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675		D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 601 CC PLAZUELA		DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290		CORREO ELECTRONICO	CAFESA2008@HOTMA IL.COM	TELÉFONO	3183659249
FAX	0		SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	3
TIPO DE ENTIDAD	Privada		ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente
REPRESENTANTE LEGAL						
Nro. DE IDENTIFICACIÓN			PRIMER APELLIDO			
PRIMER NOMBRE			SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN						
Año: 2023	Mes: 08		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Nro. DE TRABAJADORES			Año: 2023	Mes: 08	Sucursal	
1				VLr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
				S0		27648629

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	SUBTOT AL AORTE S COT	SUBTOT AL AORTE S COT	RADICA CION AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍO O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍO O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍO O ANTERI OR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$375.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$375.00	\$375.00	0	\$0	\$375.00	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$375.00	\$0	\$0	\$375.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$375.000
PENSIONES	1	\$480.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$208.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.063.800



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27656054
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-17

PAGADA

RAZÓN SOCIAL		ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE		DATOS DEL APORTANTE			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TIPO DE PERSONA	TIPO DE DOCUMENTO	Natural	Cédula de Ciudadanía		
16077675	CRA 6 N 18 46 OFC 501 CC PLAZUELA	D.V.	TIPO DE APORTANTE	0	Independiente		
4290		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RISARALDA	PEREIRA		
0		CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CAFESA20088HOYMA IL.COM	3183659249		
Privada		SUCURSAL	NOMBRE SUCURSAL	3	3		
		ARL	Tipo de aportante	ARL SURA	Independiente		

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 09	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$0		27656054	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO												Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico	
CC-16077675	57	No	No	55	1	0	Salario	HERNANDEZ MARIQUE ADRIAN CAMILO				\$3.000.000	

Identificación	I N G	Fecha Ret	R E T	D I A S	V O L	Fecha Nov	V O L	Fecha V S L	I Z C	D i a s	C o t i z a d o s	NOVEDADES											
												Fecha Ingreso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IZC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Subsistenci	Vlr no ret
CC - 16077675	FORVENIR	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cotizados	IZC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Tarifa ESAP	Tarifa ICBF	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC - 16077675	EPS SURA	30	\$3.000.000	0.1250000	\$375.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.000	1	0.0696000	\$208.800

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBS Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SERA	Aporte SERA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-16077675	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALS HASTA EL PERIODO 2023 - 09										
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADO NA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	VLR INTERESES FONDO DE VLR	TOTAL PAGAR
FORVENIR	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UFC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DISE LMA	VLR DISE LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
RFS SURA	1	\$375.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$375.00	0	\$0	\$375.00	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$375.00	\$0	\$375.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$375.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$480.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$208.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.063.800



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27972477
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675	D. V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 601 CC FLAZUELA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CAFESA2008@HOTMAIL.COM
FAX	0	SUCURSAL	3
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			NUMERE SUCURSAL 3
			Tipo de aportante Independiente
			TIPO DE DOCUMENTO
			TIPO DE APORTANTE
			MUNICIPIO PEREIRA
			TELÉFONO 3183659249
			Independiente
			Cédula de Ciudadanía

REFERENTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
	SEGUNDO NOMBRE

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10
Nro. DE TRABAJADORES	V.E. TOTAL NÓMINA	FORMA DE PRESENTACIÓN	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	Sucursal	27972477

IDENTIFICACION DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-16077675	57	No No	No	No	66	1	0	Salario	HERNANDEZ HANSIQUE ADRIAN CAMILO		\$3.000.000

Identificación	CC - 16077675	NOVEDADES																						
		I	R	T	T	T	V	V	L	F	F	V	F	F	F									
		Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha DA	Fecha E	Fecha P	Fecha P	Fecha S	Fecha I	Fecha G	Fecha M	Fecha L	Fecha A	Fecha V	Fecha A	Fecha V	Fecha V	Fecha V	Fecha V	Fecha V	Fecha I	Fecha I	Fecha I	Fecha I
		Sl	Ret	As	EP	PI	PI	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl
		Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio
		IRL																						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES					
Identificación	APP	Días Cotizados	Tarifa	Cot Obl	Total Cot
CC - 16077675	POVENIR	30	0.1600000	\$480.000	\$480.000
					Fondo Substanci
					\$0
					Vlr no ret
					\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Núm Aut Lic	Valor Lic	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 16077675	EPS SUBA	30	\$3.000.000	0.1250000	\$375.000	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$3.000.000	1	\$208.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-16077675	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL APORTE PARA EL PERIODO 2023 - 10											
TOTAL APORTE DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR AFORTE FONDO PENSION SOL	VLR AFORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
POVENIR	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SUPA	1	\$375.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$375.00	\$375.00	0	\$0	\$375.00	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$375.00	\$0	\$0	\$375.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SUPA	1	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$375.000
PENSIONES	1	\$480.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$208.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.063.800



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28182312
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 601 CC PLAZUELA	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CAFESA2008@HOTMA IL.COM	TELÉFONO	3183659249
FAX	0	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	3
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		VLI. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$0		28182312	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-16077675	57	No	No	No	66	1	0	Salario	HERNANDEZ MARIQUIN ADRIAN CAMILO	\$3.000.000

NOVEDADES																						
I	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T	D	T	V	Fecha Nov	V	Fecha Vsp	Fecha Vov	V	Fecha Vov	V	Fecha Vov	V	Fecha Vov	V	Fecha Vov	V	Fecha Vov	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES													
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substanci	Vir no ret
CC - 16077675	FORVENIR	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD																		
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UFC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Valor ICBF	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC - 16077675	EPS SURA	30	\$3.000.000	0.1250000	\$375.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$208.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-16077675	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALS PARA EL PERÍODO 2023 - 11										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VLR AFIL	VLR COTIZACIÓN VLR AFIL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS HOBA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$480.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. ICE	VLR ICE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPC	SUBVOT AL APORTE S COT	SUBVOT AL APORTE S	RADICACIÓN AUTOLIMITADA INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$375.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$375.00	0	\$0	\$0	\$375.00	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$375.00	\$0	\$0	\$375.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIMITACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ANL SURA	1	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD SIN CCP	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	1	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$375.000
FENSIONES	1	\$480.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$208.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.063.800



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28397675
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-18

PAGADA

RAZÓN SOCIAL		DATOS DEL APORTANTE				Cédula de Ciudadanía
ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE		TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Independiente ✓	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente ✓	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 601 CC FLAZUELA	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CAFESA20088HOTMA IL.COM	TELÉFONO	3183659249	
FAX	0	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	3	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente	
REPRESENTANTE LEGAL						
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO			
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE					
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN						
Año: 2023		Mes: 12		Año: 2023		Mes: 12
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		FORMA DE PRESENTACIÓN		Sucursal
1		90		Nro. DE RADICACIÓN		28397675

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-16077675	57	No	No	No	56	1	0	Salario	HERNANDEZ MARIQUE ADRIAN CAMILO		\$3.000.000

NOVEDADES														
Identificación	Fecha Ingreso	R. E. T.	Fecha Retiro	Días Cotizados	Días de Vacación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha		
												Vacación	Fin	
CC - 16077675														

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES					
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl
CC - 16077675	FORVENIR	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD										
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 16077675	EPS SURA	30	\$3.000.000	0.1250000	\$375.000	\$0	0	\$0	0	\$0

APORTES PARAFISCALES									
Identificación	CCF	Días Cotizados	IBC Cajas	Tarifa	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-16077675	SIN_CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS SURA	Días Cotizados	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	Cód CT	Valor	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 16077675	EPS SURA	30	\$3.000.000	0.0696000	\$208.800	1	\$0	0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL.	VLR TOTAL COT OBL.	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS HORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLÍQUIDAD O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$375.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$375.00	0	\$0	\$0	\$375.00	\$0	0	\$0	\$0	\$375.00	\$0	\$0	\$375.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PACO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDAD ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$208.800	0	\$0	\$0	\$208.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$375.000
PENSIONES	\$400.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$208.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$1.063.800



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27626671
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675	D. V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 601 CC PLAZUELA	DEPARTAMENTO	RISARALDA	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CAFFSA20088HOTMA IL.COM	3183659249
FAX	0	SUCURSAL	13	ANSEMA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Empleador
				Tipo de aportante
				NOMBRE SUCURSAL
				TELÉFONO
				MUNICIPIO
				TIPO DE APORTANTE

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
SEGUNDO NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN FENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	7	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$3.249.612	Nro. DE RADICACIÓN
				27626671

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	tipo Vinculación	Sub tipo de Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario	
CC-1054918105	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	ADAMES GONZALEZ CARLOS MARIO	\$1.160.000	\$1.160.000
CC-1089933574	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	BEFANCCOURT GARCIA JUAN JOSE	\$1.160.000	\$1.160.000
CC-1054924663	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CARAS SEPULVEDA JOSE FERNANDO	\$1.160.000	\$1.160.000
CC-75037584	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	PUERTA SEPULVEDA LUIS HERNANDO	\$1.160.000	\$1.160.000
CC-1054920342	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	RESTREPO MEJIA ANDRES MAURICIO	\$1.160.000	\$1.160.000
CC-16221101	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	SANCHEZ GOMEZ GERARDO DE JESUS	\$1.160.000	\$1.160.000
CC-1054920467	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VALENCIA VASQUEZ JOHN FREDY	\$1.160.000	\$1.160.000

NOVEDADES																								
Identificación	I N C	Fecha Inq	R E I	Fecha Ret	T D E	T A D E	T V A S	Fecha Nov vsp	V T S T E	Fecha Ige Fin	Fecha Ige Inicio	L M A	Fecha L Inicio	Fecha L Fin	V A C	Fecha V Inicio	Fecha V Fin	A V C P T	Fecha A V C P T Inicio	Fecha A V C P T Fin	IRL	Fecha Irt Inicio	Fecha Irt Fin	
CC - 1054918105	X	1023-09-14																				0		
CC - 1089933574	X	1023-09-14	X	2021-08-18																		0		
CC - 1054924663	X	1023-09-14																				0		
CC - 75037584	X	1023-09-14																				0		
CC - 1054920342	X	1023-09-14																				0		
CC - 16221101	X	1023-09-14																				0		
CC - 1054920467	X	1023-09-14																				0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancial	Vit no ret
CC - 1054918105	COLFONDOS	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1089933574	PROTECCION	1	\$38.667	0.1600000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054924663	PORVENIR	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0
CC - 75037584	PORVENIR	16	\$618.667	0.1600000	\$99.000	\$0	\$0	\$99.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054920342	PORVENIR	6	\$232.000	0.1600000	\$37.200	\$0	\$0	\$37.200	\$0	\$0	\$0
CC - 16221101	COMPENIONES	16	\$618.667	0.1600000	\$99.000	\$0	\$0	\$99.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054920467	PORVENIR	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Múm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 1054918105	NUOVA E.P.S. S.A.	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	0.0696000	\$40.400
CC - 1089933574	SALUD TOTAL	1	\$38.667	0.0400000	\$1.600	\$0	0	\$0	\$0	1	\$38.667	0.0696000	\$2.700
CC - 1054924663	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	0.0696000	\$40.400
CC - 75037584	NUOVA E.P.S. S.A.	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	\$0	0	\$0	\$0	16	\$618.667	0.0696000	\$43.100
CC - 1054920342	SALUD TOTAL	6	\$232.000	0.0400000	\$9.300	\$0	0	\$0	\$0	6	\$232.000	0.0696000	\$16.200
CC - 16221101	SANITAS	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	\$0	0	\$0	\$0	16	\$618.667	0.0696000	\$43.100
CC - 1054920467	NUOVA E.P.S. S.A.	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	0.0696000	\$40.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SERA	Aporte SERA	Tarifa ICRP	Aporte ICRP	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1054918105	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1089933574	CCF DE CALDAS	1	\$40.278	0.0400000	\$1.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054924663	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75037584	CCF DE CALDAS	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054920342	CCF DE CALDAS	6	\$232.000	0.0400000	\$9.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-16221101	CCF DE CALDAS	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054920467	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL APORTES PARA EL PERIODO 2023 - 08									
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADORA	NÚM APIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	4	\$321.800	\$0	\$0	17	\$5.900	\$0	\$0	\$327.700
PROTECCION	1	\$6.200	\$0	\$0	17	\$200	\$0	\$0	\$6.400
COLPENSIONES	1	\$99.000	\$0	\$0	17	\$1.900	\$0	\$0	\$100.900
COLFONDOS	1	\$92.800	\$0	\$0	17	\$1.700	\$0	\$0	\$94.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. ICE	VLR ICE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES UPC	RADICACION AUTOLICENCIAMIENTO INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALDO TOTAL	2	\$10.90	\$0	0	\$0	0	\$0	\$10.90	17	\$200	\$0	\$11.10	\$0	0	\$0	\$0	\$11.10	\$0	\$0	\$11.10
SANITAS	1	\$24.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$24.80	17	\$500	\$0	\$25.30	\$0	0	\$0	\$0	\$25.30	\$0	\$0	\$25.30
NUOVA S.P.S. S.A.	3	\$71.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$71.20	17	\$1.400	\$0	\$72.60	\$0	0	\$0	\$0	\$72.60	\$0	\$0	\$72.60
NUOVA S.P.S. S.A. NOV	1	\$23.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$23.20	17	\$500	\$0	\$23.70	\$0	0	\$0	\$0	\$23.70	\$0	\$0	\$23.70

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INTE MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICENCIAMIENTO INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$726.300	0	\$0	\$0	\$226.300	17	\$4.200	\$730.500	0	\$0	\$2.305	\$230.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

BOGOTÁ ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERSES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	7	\$130.200	17	\$2.400	\$132.600
SENA	0	\$0	17	\$0	\$0
ICRP	0	\$0	17	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	17	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	17	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$132.700
PENSIONES	4	\$529.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$230.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$132.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.025.300



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27889465
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 501 CC FLAZUELA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CAFESA2008@HOTMAIL.COM
FAX	0	SUCURSAL	13
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			TELÉFONO 3183659249
			NOMBRE SUCURSAL ANSERMA
			Tipo de sportante Empleado
			Cédula de Ciudadanía B menor a 200 empleados PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
13		\$7.111.449	
		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Sucursal	
		Nro. DE RADICACIÓN	
		27889465	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1054918105	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	ADAMES GONZALEZ CARLOS MAJIO	\$1.160.000
CC-1010001907	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CACERES JIMENEZ LAURA SOFIA	\$1.160.000
CC-1054924663	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CANALES SEPULVEDA JOSE FERNANDO	\$1.160.000
CC-1002595273	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	GALLEGO BUSTAMANTE JEON STIVEN	\$1.160.000
CC-1054926067	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	GALLEGO MEJIA JUAN MANUEL	\$1.160.000
CC-1054923211	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CRISALES HERRERA JOSE MENNELBERT	\$1.160.000
CC-1002593598	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	HURTADO GIRALDO CARLOS ANDRES	\$1.160.000
CC-1002744149	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	MUÑOZ HERNANDES YONIER ALEXANDER	\$1.160.000
CC-1116264764	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	PIEDRAHITA ESPINAL CARLOS EDUARDO	\$1.160.000
CC-75037584	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	PUERTA SEPULVEDA LUIS HERNANDO	\$1.160.000
CC-1054920342	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	RESTREPO MEJIA ANDRES MAURICIO	\$1.160.000
CC-16221101	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	SANCHEZ GOMEZ GERARDO DE JESUS	\$1.160.000
CC-1054920467	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VALENCIA VAQUERO JOHN FREDY	\$1.160.000

Identificación	I	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T D E	T A D	T V S	V T S	Fecha Nov Vag	L S N	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Ige Fin	I C E	NOVEDADES		Fecha Vct Fin	Fecha Irp Fin
															Fecha Inicio	Fecha Fin		
CC - 1054918105			X	2023-04-03														
CC - 1010001907	X	2023-08-08																
CC - 1054924663			X	2023-07-18														
CC - 1002595273	X	2023-08-13	X	2023-08-18														
CC - 1054926067	X	2023-09-08																
CC - 1054923211	X	2023-09-13																
CC - 1002593598	X	2023-09-08	X	2023-08-08														
CC - 1002744149	X	2023-09-08																
CC - 1116264764	X	2023-09-08																
CC - 75037584																		
CC - 1054920342			X	2023-08-02														
CC - 16221101																		
CC - 1054920467			X	2023-08-08														

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Val Afil	Cot Val Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	VLR no Est
CC - 1054918105	COLFONDOS	3	\$116.000	0.1600000	\$18.600	\$0	\$0	\$18.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1010091907	PROTECCION	23	\$889.334	0.1600000	\$142.300	\$0	\$0	\$142.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1054924663	FORVENIR	16	\$618.667	0.1600000	\$99.000	\$0	\$0	\$99.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002595273	PROTECCION	11	\$425.334	0.1600000	\$68.100	\$0	\$0	\$68.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1054926067	FORVENIR	26	\$1.005.334	0.1600000	\$160.900	\$0	\$0	\$160.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1054923211	FORVENIR	20	\$773.334	0.1600000	\$123.800	\$0	\$0	\$123.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002593598	PROTECCION	5	\$193.334	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002744149	FORVENIR	3	\$116.000	0.1600000	\$18.600	\$0	\$0	\$18.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1116264764	FORVENIR	3	\$116.000	0.1600000	\$18.600	\$0	\$0	\$18.600	\$0	\$0	\$0
CC - 75037584	FORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1054920342	FORVENIR	2	\$17.334	0.1600000	\$2.400	\$0	\$0	\$2.400	\$0	\$0	\$0
CC - 16221101	COMPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1054920467	FORVENIR	9	\$348.000	0.1600000	\$55.700	\$0	\$0	\$55.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UBC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
											IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	
CC - 1054918105	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$116.000	1	0.0696000	\$8.100
CC - 1010091907	SALUD TOTAL	23	\$889.334	0.0400000	\$35.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$889.334	1	0.0696000	\$61.900
CC - 1054924663	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$618.667	1	0.0696000	\$43.100
CC - 1002595273	SALUD TOTAL	11	\$425.334	0.0400000	\$17.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$425.334	1	0.0696000	\$29.700
CC - 1054926067	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.005.334	1	0.0696000	\$70.000
CC - 1054923211	EPS SURA	20	\$773.334	0.0400000	\$31.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$773.334	1	0.0696000	\$53.900
CC - 1002593598	EPS SURA	5	\$193.334	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$193.334	1	0.0696000	\$13.500
CC - 1002744149	EPS SURA	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$116.000	1	0.0696000	\$8.100
CC - 1116264764	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$116.000	1	0.0696000	\$8.100
CC - 75037584	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1054920342	SALUD TOTAL	2	\$17.334	0.0400000	\$3.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$17.334	1	0.0696000	\$5.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16221101	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1054920467	NUOVA E.P.S. S.A.	9	\$348.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$348.000	1	0.0696000	\$24.300

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-1054918105	CCF DE CALDAS	3	\$146.611	0.0400000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1010081907	CCF DE CALDAS	23	\$889.334	0.0400000	\$35.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054924663	CCF DE CALDAS	16	\$620.278	0.0400000	\$24.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1002895273	CCF DE CALDAS	11	\$443.056	0.0400000	\$17.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054926067	CCF DE CALDAS	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054923211	CCF DE CALDAS	20	\$773.234	0.0400000	\$31.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1002593598	CCF DE CALDAS	5	\$201.390	0.0400000	\$8.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1002744149	CCF DE CALDAS	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1116264764	CCF DE CALDAS	3	\$116.000	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75037584	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054920342	CCF DE CALDAS	2	\$21.834	0.0400000	\$3.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-16221101	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054920467	CCF DE CALDAS	9	\$388.278	0.0400000	\$15.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALS PARA EL PERÍODO 2023 - 09										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLK TOTAL COT OBL	VLK COTIZACIÓN VOL AFIL	VLK COTIZACIÓN VOL AFOR	VLK APORTE FONDO PENSION SOL	VLK APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS HORA	VLK INTERESES SOLIDARIDAD	VLK INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
POVENIR	8	\$674.600	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$10.400	\$0	\$685.000
COMPONDOS	1	\$16.600	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$300	\$0	\$18.900
PROTECCION	3	\$241.600	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$3.800	\$0	\$245.200
COMPENSIACIONES	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$2.900	\$0	\$188.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC INA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLICIA INICIA OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	\$55.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$55.80	\$55.80	15	\$900	\$0	\$56.70	\$0	0	\$0	\$56.70	\$0	\$0	\$56.70	
SANITAS	1	\$46.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40	\$46.40	15	\$800	\$0	\$47.20	\$0	0	\$0	\$47.20	\$0	\$0	\$47.20	
EPS SURA	3	\$43.50	\$0	0	\$0	0	\$0	\$43.50	\$43.50	15	\$700	\$0	\$44.20	\$0	0	\$0	\$44.20	\$0	\$0	\$44.20	
NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$105.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$105.40	\$105.40	15	\$1.700	\$0	\$107.10	\$0	0	\$0	\$107.10	\$0	\$0	\$107.10	
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$29.50	\$0	0	\$0	0	\$0	\$29.50	\$29.50	15	\$500	\$0	\$30.00	\$0	0	\$0	\$30.00	\$0	\$0	\$30.00	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICUID ACCION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	13	\$487.700	0	\$0	\$0	\$487.700	15	\$7.600	\$495.300	0	\$0	\$4.953	\$495.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	13	\$285.100	15	\$4.400	\$289.500
SENA	0	\$0	15	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	15	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	15	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	15	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$285.200
PENSIONES	\$1.137.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$495.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$289.500
SENA	1	\$0
ICBP	1	\$0
REAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.207.600

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colectivo ano ext	Depto	Num	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1010081907	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CACERES JIMENEZ LAURA SOFIA	\$1.160.000	
CC-1123161092	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CARVAJAL TIQUE JHON JAIBER	\$1.160.000	
CC-1054926067	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	GALLEGO MEJIA JUAN MANUEL	\$1.160.000	
CC-1054923211	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	GRISALES HERRERA JOSE MENDELBERT	\$1.160.000	
CC-1002744149	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	MUNOZ HERNANDEZ YONIER ALEXANDER	\$1.160.000	
CC-1116264764	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	FIEDRANITA ESPINAL CARLOS EDUARDO	\$1.160.000	
CC-75037584	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	FUERTA SEPULVEDA LUIS HERNANDO	\$1.160.000	
CC-16221101	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	SANCHEZ GOMEZ GERARDO DE JESUS	\$1.160.000	
CC-77177750	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	SUNDBE GAMARRA EDWIN ALBERTO	\$1.160.000	
CC-1114399174	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VANEZAS ARIAS RUBEN DANIO	\$1.160.000	
CC-85439249	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VILLA VANEZAS JORGE ENRIQUE	\$1.160.000	
CC-75102229	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VILLADA MEJIA EDMAR LEANDRO	\$1.160.000	

NOVEDADES																											
Identificación	I R C	Fecha Ing	R Fecha Ret	T T D A S	T T D A S	V V S	V V S	Fecha Nov	Fecha Vsp	Fecha T S L	Fecha E T N	Fecha Ige	Fecha Ige	L Fecha M A	L Fecha M A	Fecha Lea	Fecha Vac	Fecha Vac	Fecha A V C	Fecha A V C	Fecha V C T	Fecha V C T	Fecha Irl	Fecha Irl	Fecha Irp	Fecha Irp	
CC - 1010081907	X	2013-10-10																									
CC - 1123161092	X	2013-10-10																									
CC - 1054926067	X	2013-10-11																									
CC - 1054923211	X	2013-10-11																									
CC - 1002744149	X	2013-10-11																									
CC - 1116264764	X	2013-10-11																									
CC - 75037584	X	2013-10-11																									
CC - 16221101	X	2013-10-11																									
CC - 77177750	X	2013-10-11																									
CC - 1114399174	X	2013-10-11																									
CC - 85439249	X	2013-10-11																									
CC - 75102229	X	2013-10-11																									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Apert	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci	Vlr no ret
CC - 1010081907	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no cot
CC - 1123161092	PORVENIR	21	\$812.000	0.1600000	\$130.000	\$0	\$0	\$130.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054926067	PORVENIR	7	\$270.667	0.1600000	\$43.400	\$0	\$0	\$43.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1054923211	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1002744149	PORVENIR	7	\$270.667	0.1600000	\$43.400	\$0	\$0	\$43.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1116264764	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 75037584	PORVENIR	6	\$232.000	0.1600000	\$37.200	\$0	\$0	\$37.200	\$0	\$0	\$0
CC - 16221101	COLPENSIONES	6	\$232.000	0.1600000	\$37.200	\$0	\$0	\$37.200	\$0	\$0	\$0
CC - 77177750	PORVENIR	20	\$773.334	0.1600000	\$123.800	\$0	\$0	\$123.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1114399174	COMPONDOS	13	\$502.667	0.1600000	\$80.500	\$0	\$0	\$80.500	\$0	\$0	\$0
CC - 85439349	PORVENIR	21	\$812.000	0.1600000	\$130.000	\$0	\$0	\$130.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75102229	PORVENIR	21	\$812.000	0.1600000	\$130.000	\$0	\$0	\$130.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1010081907	SALUD TOTAL	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1123161092	EPS CARACORI	21	\$812.000	0.0400000	\$32.500	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$812.000	1	0.0696000	\$56.600
CC - 1054926067	NUOVA E.P.S. S.A.	7	\$270.667	0.0400000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$270.667	1	0.0696000	\$18.900
CC - 1054923211	EPS SURA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1002744149	EPS SURA	7	\$270.667	0.0400000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$270.667	1	0.0696000	\$18.900
CC - 1116264764	NUOVA E.P.S. S.A. NOV	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 75037584	NUOVA E.P.S. S.A.	6	\$232.000	0.0400000	\$9.300	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$232.000	1	0.0696000	\$16.200
CC - 16221101	SANITAS	6	\$232.000	0.0400000	\$9.300	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$232.000	1	0.0696000	\$16.200
CC - 77177750	SALUD TOTAL	20	\$773.334	0.0400000	\$31.000	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$773.334	1	0.0696000	\$53.900
CC - 1114399174	ESSC ARDET SALUD	13	\$502.667	0.0400000	\$20.200	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$502.667	1	0.0696000	\$35.000
CC - 85439349	FAMISANAR	21	\$812.000	0.0400000	\$32.500	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$812.000	1	0.0696000	\$56.600
CC - 75102229	NUOVA E.P.S. S.A.	21	\$812.000	0.0400000	\$32.500	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$812.000	1	0.0696000	\$56.600

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot s CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1010081907	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1123161092	CCF DE CALDAS	21	\$812.000	0.04000000	\$32.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1054926067	CCF DE CALDAS	7	\$323.834	0.04000000	\$13.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1054923211	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1002744149	CCF DE CALDAS	7	\$286.778	0.04000000	\$11.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1116764764	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-75037584	CCF DE CALDAS	6	\$317.389	0.04000000	\$12.700	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-16221101	CCF DE CALDAS	6	\$317.389	0.04000000	\$12.700	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-77177750	CCF DE CALDAS	20	\$773.334	0.04000000	\$31.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1114399174	CCF DE CALDAS	13	\$502.667	0.04000000	\$20.200	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-85439349	CCF DE CALDAS	21	\$812.000	0.04000000	\$32.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-75102229	CCF DE CALDAS	21	\$812.000	0.04000000	\$32.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$600	\$0	\$0	\$186.200
PORVENIR	9	\$1.009.000	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$3.000	\$0	\$0	\$1.012.000
COLFONDOS	1	\$89.500	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$300	\$0	\$0	\$90.800
COLPENSIONES	1	\$37.200	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$200	\$0	\$0	\$37.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR NETO AFORTES S DE COT	DÍAS HORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL AFORTE S COT	SUBTOT AL AFORTE S COT	RADICA CIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO O ANTERI O OR COT OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUOVA E.P.S. S.A.	3	\$52.700	\$0	3	\$200	\$0	\$52.900	\$0	0	\$0	\$52.900	\$0	\$0	\$52.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. ICE	VLR ICE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FUNDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$9.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$9.300	3	\$100	\$9.400	\$0	0	\$0	\$0	\$9.400	\$0	\$0	\$9.400
FMIBANAR	1	\$32.50	\$0	0	\$0	0	\$0	\$32.50	3	\$100	\$32.60	\$0	0	\$0	\$0	\$32.60	\$0	\$0	\$32.60
EPS	1	\$32.50	\$0	0	\$0	0	\$0	\$32.50	3	\$100	\$32.60	\$0	0	\$0	\$0	\$32.60	\$0	\$0	\$32.60
CANTACOPI	1	\$57.30	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.30	3	\$200	\$57.50	\$0	0	\$0	\$0	\$57.50	\$0	\$0	\$57.50
EPS SURA	2	\$46.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40	3	\$200	\$46.60	\$0	0	\$0	\$0	\$46.60	\$0	\$0	\$46.60
MEVA E.P.S.	1	\$77.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$77.40	3	\$300	\$77.70	\$0	0	\$0	\$0	\$77.70	\$0	\$0	\$77.70
S.A. MOV	2	\$20.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$20.20	3	\$100	\$20.30	\$0	0	\$0	\$0	\$20.30	\$0	\$0	\$20.30
SALUD	1	\$571.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$571.300	3	\$1.700	\$573.000	\$573.000	0	\$0	\$0	\$5.730	\$0	\$0	\$573.000
TOTAL																			

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIA L	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FUNDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ABL SURA	12	\$571.300	0	\$0	\$0	\$571.300	3	\$1.700	\$573.000	0	\$0	\$5.730	\$573.000
TOTAL													

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	12	\$337.800	3	\$1.100	\$338.900
SENA	0	\$0	3	\$0	\$0
ICBP	0	\$0	3	\$0	\$0
EGAP	0	\$0	3	\$0	\$0
Miudad	0	\$0	3	\$0	\$0
TOTAL					

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$329.600
TOTAL ENTIDADES	\$329.600

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
PENSIONES	4		\$1.316.400
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$573.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$338.900
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$2.557.900



ASOPAGOS
S.d.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28456696
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675	D.V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 601 CC PLAZUELA	DEPARTAMENTO	RISARALDA	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CAFESA20088HOTMA IL.COM	3183659249
FAX	0	SUCURSAL	13	ANSERMA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN	FORMA DE PRESENTACIÓN
8	\$8.223.112	28456696	Sucursal

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Man	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1010081907	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CACERES JIMENEZ LAURA SOFIA		\$1.160.000
CC-1123161092	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	CARVAJAL TIQUE JHON JAIBER		\$1.160.000
CC-1054923211	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	GRISALES HERRERA JOSE MENNELBERT		\$1.160.000
CC-1116264764	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	PIEDRAHITA ESPINAL CARLOS EDUARDO		\$1.160.000
CC-77177750	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	SUAREZ GAMARRA EDWIN ALBERTO		\$1.160.000
CC-1114399174	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VANEGAS ARIAS RUBEN DARIO		\$1.160.000
CC-85439349	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VILLA VANEGAS JORGE ENRIQUE		\$1.160.000
CC-75102229	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo	VILLADA MEJIA EDGAR LEANDRO		\$1.160.000

NOVEDADES																					
Identificación	I N G	R E T	D E R	T I V	Fecha Nov Vep	V V S T S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E E	Fecha Ige Fin	L M A Fin	Fecha Lea Fin	V A C C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V V C P T	Fecha V C P T Inicio	Fecha V C P T Fin	I R P Inicio	Fecha I R P Fin	
CC - 1010081907																			0		
CC - 1123161092																			0		
CC - 1054923211																			0		
CC - 1116264764																			0		
CC - 77177750																			0		
CC - 1114399174		X	8039-11-22																0		
CC - 85439349																			0		
CC - 75102229																			0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Apport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancia	Vie no ret
CC - 1010081907	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.160000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1123161092	FORVENIR	30	\$1.160.000	0.160000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1054923211	FORVENIR	30	\$1.160.000	0.160000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1116264764	FORVENIR	30	\$1.160.000	0.160000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 77177750	FORVENIR	30	\$1.160.000	0.160000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1114399174	COFONDOS	2	\$77.334	0.160000	\$12.400	\$0	\$0	\$12.400	\$0	\$0	\$0
CC - 85439349	FORVENIR	30	\$1.160.000	0.160000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 75102229	FORVENIR	30	\$1.160.000	0.160000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Múm Aut EC	Valor EG	Múm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1010081907	SALUD TOTAL	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1123161092	EPS CAJACOFI	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1054923211	EPS SURA	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1116264764	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0696000	\$80.800
CC - 77177750	SALUD TOTAL	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1114399174	RSSC ASHET SALUD	2	\$77.334	0.0400000	\$3.100	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$77.334	1	0.0696000	\$5.400
CC - 85439349	FAMISANAR	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0696000	\$80.800
CC - 75102229	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0696000	\$80.800

APORTES PARAMISCALES														
Identificación	CCF	Días Co n CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-1010081907	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1123161092	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054923211	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1116264764	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-77177750	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1114399174	CCF DE CALDAS	2	\$103.112	0.0400000	\$4.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-85439349	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75102229	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2023 - 11

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO SA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT CBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR APORTÉ FONDO PENSION SOL	VLR APORTÉ FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLEFONDOS	1	\$12.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$12.400
PROTECCION	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$185.600
PORVENIR	6	\$1.113.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.113.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT CBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR APORTÉ FONDO PENSION SOL	VLR APORTÉ FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
EPS CAJACOPÍ	1	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$46.400
EPS SURTA	1	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$46.400
NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$46.400
SALUD TOTAL	2	\$92.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$92.800
ESSC ASHET SALUD	1	\$3.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.100
NUOVA E.P.S. S.A. NOV	1	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$46.400
FINANCIAR	1	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$46.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT CBL	VLR APORTES INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT CBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTO LIQUIDACION INICIAL	SAIDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ABL SURTA	8	\$571.000	\$0	\$0	\$571.000	0	\$0	\$571.000	0	\$0	\$0	\$571.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AETIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	
CFE DE CALDAS	8	\$329.000	0	\$0	\$329.000	
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	
MInEdu	0	\$0	0	\$0	\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	\$327.900
PENSIONES	3	\$1.311.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$571.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$329.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.539.500



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28597467
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16077675	D.V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 N 18 46 OFC 601 CC PLAZUELA	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CAFESA2008@HOTMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	13	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	ANSEFMA
				Tipo de aportante
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023 Mes: 12	Año: 2024 Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
7	\$3.402.667	28597467

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Nombre		Salario		
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colembi ano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario			Nombre		Salario	
CC-1010081907	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo			CACERES JIMENEZ LAURA SOFIA		\$1.160.000	
CC-1123161092	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo			CARVAJAL TIGRE JOHN JAIBER		\$1.160.000	
CC-1054923211	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo			GRISALES HERRERA JOSE MENEHEBERT		\$1.160.000	
CC-1116264764	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo			PIEDRAHITA ESPINAL CARLOS EDUARDO		\$1.160.000	
CC-77177750	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo			SUAREZ GAMARRA EDWIN ALBERTO		\$1.160.000	
CC-85439349	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo			VILLA VAREGAS JORGE ENRIQUE		\$1.160.000	
CC-75102229	01	No	No	No	17	42	5711001	Fijo			VILLADA MEJIA EDUAR LEANDRO		\$1.160.000	

Identificación	I R G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T D S	V T S	Fecha Nov Vsp	Fecha Nov Vsp	I G E	Fecha Ige	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lea A Inicio	V A C	Fecha Vac A Inicio	A V V C P T	Fecha V C P T Inicio	Fecha V A C P T Inicio	I R L	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
																									NOVEDADES
CC - 1010081907			X	2023-12-08																					
CC - 1123161092			X	2023-12-08																					
CC - 1054923211			X	2023-12-11																					
CC - 1116264764			X	2023-12-08																					
CC - 77177750			X	2023-12-09																					
CC - 85439349			X	2023-12-09																					
CC - 75102229			X	2023-12-09																					

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 1010081907	PROTECCION	9	\$348.000	0.1600000	\$55.700	\$0	\$0	\$55.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1123161092	PORVENIR	9	\$348.000	0.1600000	\$55.700	\$0	\$0	\$55.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1054923211	PORVENIR	13	\$502.667	0.1600000	\$80.500	\$0	\$0	\$80.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1116264764	PORVENIR	9	\$348.000	0.1600000	\$55.700	\$0	\$0	\$55.700	\$0	\$0	\$0
CC - 77177750	PORVENIR	9	\$348.000	0.1600000	\$55.700	\$0	\$0	\$55.700	\$0	\$0	\$0
CC - 85439349	PORVENIR	9	\$348.000	0.1600000	\$55.700	\$0	\$0	\$55.700	\$0	\$0	\$0
CC - 75102229	PORVENIR	9	\$348.000	0.1600000	\$55.700	\$0	\$0	\$55.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor MG	Núm Aut Lac	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1010081907	SALUD TOTAL	9	\$348.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$348.000	1	0.0696000	\$24.300
CC - 1123161092	EPS CAJACOSI	9	\$348.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$348.000	1	0.0696000	\$24.300
CC - 1054923211	EPS SURA	13	\$502.667	0.0400000	\$20.200	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$502.667	1	0.0696000	\$35.000
CC - 1116264764	NUOVA E.P.S. S.A. HOV	9	\$348.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$348.000	1	0.0696000	\$24.300
CC - 77177750	SALUD TOTAL	9	\$348.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$348.000	1	0.0696000	\$24.300
CC - 85439349	FAMISANAR	9	\$348.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$348.000	1	0.0696000	\$24.300
CC - 75102229	NUOVA E.P.S. S.A.	9	\$348.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$348.000	1	0.0696000	\$24.300

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-1010081907	CCF DE CALDAS	9	\$497.933	0.0400000	\$20.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1123161092	CCF DE CALDAS	9	\$446.278	0.0400000	\$17.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054923211	CCF DE CALDAS	13	\$554.111	0.0400000	\$26.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1116264764	CCF DE CALDAS	9	\$467.272	0.0400000	\$18.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-77177750	CCF DE CALDAS	9	\$444.667	0.0400000	\$17.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-85439349	CCF DE CALDAS	9	\$446.278	0.0400000	\$17.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75102229	CCF DE CALDAS	9	\$446.278	0.0400000	\$17.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2023 - 12										
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	6	\$359.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$359.000
PROTECCION	1	\$55.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$55.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERES COT OBL	VLR INTERES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES UPC	SUBTOT AL APORTES	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$20.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$20.20	0	\$0	\$0	\$20.20	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$20.20	\$0	\$0	\$20.20
FAMISANAR	1	\$14.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.00	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$14.00
NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$14.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.00	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$14.00
NUOVA E.P.S. S.A. NOV	1	\$14.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.00	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$14.00
EPS CAJACORI	1	\$14.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.00	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$14.00	\$0	\$0	\$14.00
SALUD TOTAL	2	\$28.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$28.00	0	\$0	\$0	\$28.00	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$28.00	\$0	\$0	\$28.00

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ABL SURA	7	\$180.800	0	\$0	\$0	\$180.800	0	\$0	\$180.800	0	\$0	\$0	\$180.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	7	\$136.400	0	\$0	\$136.400
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
TOTAL ENTIDADES	\$104.200
SALUD	\$104.200

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	\$414.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$180.800
CANTAS DE COMPENSACIÓN	1	\$136.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAF	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$836.100



APORTES FIC

Ingenieri A

COMPROBANTE

Nº	Medio de Pago	No. Transacción	Nº Autorización/Código	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	99040479	253318543	01/11/2023

Razón Social: **SENA**
Usuario Pagador: **16077675**
Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**
Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **APROBADA** por la **Total Pagado \$ 203,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 203,000.00	COP\$ 203,000.00

NIT 8999990341 Medio de Pago BANCOLOMBIA No. Transacción 99040479 No. Autorización/CLLIS 253318543 Fecha y Hora 01/11/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Digito de Verificación (Si es persona

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Risaralda

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

PAVIMENTO - ANSERMA

Fecha Terminación Obra

22/10/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Período a Pagar

8 y

Costo Total Mano de Obra

3249612.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO

Tipo de documento

03

Naturaleza Jurídica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57 318 3659249

Código SIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIF

36-02-00-066-000000

Número Contrato de Obra

231-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Período a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Período

7

Aporte FIC

203000.00

Valor del Pago

203000.00

1 and 1/2

COMPROBANTE

ntf	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/EUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	99040050	253299306	01/11/2023

Razón Social: **SENA**
Usuario Pagador: **16077675**
Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**
Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **APROBADA** por la **Total Pagado \$ 377,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 377,000.00	COPs 377,000.00

ecollect

NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS Fecha y hora
8999990341 BANCOLOMBIA 99040050 253299306 01/11/2023

Número de identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Risaralda

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

PAVIMENTO ANSERMA

Fecha Terminación Obra

23/10/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

7111449.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Comentarios

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO

Tipo de documento

03

Naturaleza jurídica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57,318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-066-000000

Número Contrato de Obra

231-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Periodo

13

Aporte FIC

377000.00

Valor del Pago

377000.00

COMPROBANTE

NIT: 8999990341 Medio de Pago: BANCOLOMBIA No. Transacción: 101993725 No. Autorización/CUS: 366359593 Fecha y Hora: 28/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **16077675**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **APROBADA** por la **Total Pagado \$ 203,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 203,000.00	COP\$ 203,000.00

NIT 8999990341 Medio de Pago BANCOLOMBIA No. Transacción 101989938 No. Autorización/CUS 366249914 Fecha y Hora 28/12/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Fecha Terminación Obra

20/12/2023

Tipo FIC

Mensual ✓

Mes Periodo a Pagar

10 ✓

Costo Total Mano de Obra

8437391.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO ✓

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57,318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

231-2023 ✓

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Periodo

12 ✓

Aporte FIC

348000.00

Valor del Pago

348000.00

COMPROBANTE

NIT 8999990341 Medio de Pago BANCOLOMBIA No. Transacción 101990372 No. Autorización/CUS 366262592 Fecha y Hora 28/12/2023

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 16077675

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 186.0.11.178

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado \$ 232,000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 232,000.00	COP\$ 232,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101990372	366262592	28/12/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Fecha Terminación Obra

20/12/2023

Tipo FIC

Mensual ✓

Mes Periodo a Pagar

11 ✓

Costo Total Mano de Obra

8223112.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO ✓

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57,318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

231-2023 ✓

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Periodo

8 ✓

Aporte FIC

232000.00

Valor del Pago

232000.00

COMPROBANTE

NIT 89999990341 Medio de Pago BANCOLOMBIA No. Transacción 101989938 No. Autorización/CUS 366249914 Fecha y Hora 28/12/2023

Razón Social: SENA
Usuario Pagador: 16077675
Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC
Dirección IP: 186.0.11.178

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado \$ 348,000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 348,000.00	COP\$ 348,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101993725	366359593	28/12/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Fecha Terminación Obra

20/12/2023

Tipo FIC

Mensual ✓

Mes Periodo a Pagar

12 ✓

Costo Total Mano de Obra

3402667.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO ✓

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57,318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

231-2023 ✓

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7 ✓

Aporte FIC

203000.00

Valor del Pago

203000.00



FACTURA

IngenieriA



**ADRIAN CAMILO HERNANDEZ
MANRIQUE**
NIT 16.077.675-0
CR 6 18 48 OF 601 EQ PLAZUELA
Tel: (036) 3163058249
Pensola - Colombia
adriancamilo14@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 108

Señoras	EMPOCALDAS		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 23 75 82 SECRETARIA GENERAL BARRIO MILAN	Ciudad	Anserma - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2024, 12:21
Expedición	07/02/2024, 12:21
Verificación	07/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Construcción	1.00	31,622,960.00
2	Administración Construcción	1.00	9,170,859.00
3	Utilidad Construcción	1.00	1,881,586.12

Total Items: 3

Valor en Letras:

Cuarenta y dos millones seiscientos setenta y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por \$ 42,675,188.12

Total Bruto	42,374,770.00
IVA 19%	300,418.12
Total a Pagar	42,675,188.12

Observaciones:

ACTA Nº2 Y FINAL CONTRATO 231 DE 2023 CUYO OBJETO: "REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la ley de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764061361501 aprobada en 20231235 prójeto FVE desde el número 101 al 1000
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tacta
CUPE: 02a22a363a34c0c7a6f820487c26fa3b0112a1597ba20e1386c02add795456a446c8b01eccc5cb60603a0a624dc2

Fabricante: Software y Proveedor: Ingenieros Sligo SAS - Nit: 830308145 - Nombre: Software: Sligo Nube. Prens: october.com ver en el PDF



ADRIAN CAMILO
HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 18.077.875-C
CR 6 18 48 OF 601 EO
PLAZUELA
Tel. (038) 3183659249
Pereira - Colombia



Nota Crédito
No. 2 24

Señores	ENPOCALDAS		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(808) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 23 75 82 SECRETARIA GENERAL BARRIO MILAN	Ciudad	Anserma - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-02-07
Factura de Venta	FVE-107
Generación	07/02/2024, 12:19
Expedición	07/02/2024, 12:19
Vencimiento	30/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Construcción	1,00	31,622,963.00
2	Administración Construcción	1,00	3,170,659.00
3	Utilidad Construcción	1,00	1,881,566.12

Total Items: 3

Valor en Letras:

Cuarenta y dos millones seiscientos setenta y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos m/cde con doce cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence al 2024-01-30 \$ 42,675,188.12 por

Total Bruto	42,374,770.00
IVA 19%	300,418.12
Total	42,675,188.12

Observaciones:

CUDE: 86882b110ebad323e8c72b9c36254d4eb5a3129b00331c8e72b7b351c88378270ea4511ed044475c150e0c621729
CUFE factura: c54d5703ab502e1aa8db3d59a7a7695ed54b0ee26e11e88147e4866439c0ac1d700ee7afe5390ee5a029474b88d0cc



INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA POR EL CONTRATISTA

Ingenieri



INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

Este documento se realiza con el fin de informar a detalle el desarrollo de las actividades contratadas por la entidad **EMPOCALDAS S.A. E.S.P** en el periodo de tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la obra. Hemos contado con personal calificado como Maestro de obra, Oficiales y ayudantes de construcción especializados en actividades de Hidráulica y Concretos para ejecutarlas de la mejor manera y así brindar y garantizar el mejor resultado.

En la parte administrativa, la obra cuenta con director de obra, un residente de obra, Siso y Trabajadora social que en conjunto desempeñan un buen trabajo al momento de relación con la comunidad y excelente ejecución de actividades de obra mediante reuniones realizadas para exponer inquietudes y planes de trabajo.

A continuación, se dará una descripción de las actividades contractuales relacionadas con lo ejecutado en obra:

Actividades Preliminares

- **Localización y replanteo**, con el fin de definir las áreas o límites reales en campo para implantar la obra.
- **Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros**, limita las zonas de trabajo, garantizando seguridad con respecto a el entorno exterior.
- **Señal preventiva y reglamentaria**, para garantizar el tráfico adecuado y seguridad en el lugar donde se va a realizar la obra.
- **Instalación de valla institucional 2x4**, le da claridad a la comunidad e informa el tipo de obra que se está realizando

Actividades de Demolición

- Se realizó esta actividad para retirar el pavimento existente ya que se encontraba en muy mal estado, También se demolió las zonas de andenes para reponerlo nuevamente, unos cuerpos en concreto que existían e impedían la correcta ejecución de la obra y replanteo. Para terminar, se demolió una recámara de calda que al inspeccionarla vimos muchas falencias para su correcto funcionamiento y la tubería existente de 16" en concreto para Sustituirla por una nueva de 12" en PVC NOVAFORT Suministrado por la entidad contratante.



INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

Marizales, Martes 19 de Diciembre de 2023

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas.

Referencia: INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 231 DE 2023 CUYO OBJETO ES "REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



Asunto: Informe Actividades de Obra del Contrato 231 de 2023.

Cordial saludo,

Mediante este documento se pretende informar que los ajustes introducidos al proyecto que significan un incremento presupuestal (Dentro de lo permitido) en la ejecución han sido formulados con base en las necesidades en sitio y condiciones técnicas y manifestaciones de la comunidad que surten en desarrollo del contrato objeto del asunto.

ANTECEDENTES

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO DE OBRA NO.231 DE 2023	
OBJETO: "REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"	
Fecha firma contrato:	28 DE JUNIO DE 2023
Plazo inicial:	SESENTA (60) DÍAS
Prórroga:	SESENTA (60) DÍAS
Fecha de inicio:	VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación:	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo transcurrido	NOVENTA (90) DÍAS
Valor inicial:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MICTE. (\$ 271.472.618)
Valor final proyectado:	DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES, SETECIENTOS DOS MIL PESOS MICTE. (\$ 221.702.000)
Supervisión:	INGENIERO DE ZONA - EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Estado del contrato	TERMINADO

	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA</p> <p>"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"</p>	
---	--	---

CTO-231-2023

Actividades de Excavación

- Se realizaron las brechas para retirar la anterior tubería y por el mismo hilo sustituirlas tanto Alcantarillado como Acueducto, se excavó para instalar las nuevas acometidas, cajas de inspección, recámaras de caída y para la realización de nuevos andenes planteados hacia la entidad contratante que permitan un mejor flujo peatonal para la comunidad en el sitio de intervención.

Actividades de Llenos

- Se suministra e instalan los respectivos atraques con arena para el colector principal, para las domiciliarias y acometidas realizadas. Se finalizan los llenos de estas brechas con material proveniente de la excavación en el sitio de ejecución.

Actividades de Retiro de Material Sobrante en Vehículo Automotor

- Durante este periodo de ejecución se han realizado estas actividades de retiro de material sobrante como escombros de demolición, conglomerado extraído y material excavado no apto para conformación de llenos.

Actividades de Alcantarillado

- **Instalación en tubería PVC corrugada de 12"**, Elemento principal del alcantarillado, escogida específicamente para sistemas subterráneos y evacuación de aguas residuales. Se instalaron 78.8 ml de Tubería CORRUGADA NOVAFORT en total.
- **Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias**, importante para el transporte de las aguas residuales de las viviendas. Se instalaron 4 puntos en total.
- **Instalación de silletas de 12"x6"**, conexión implementada para conectar el drenaje de la vivienda. Se instalaron 2 de ellas empalmando a la tubería de 12" instalada.
- **Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto**, destinada a la inspección y limpieza de la tubería de recolección. Se realizaron 4 en total reponiendo las que existían o que conectaban a la antigua red.
- **Cámara de caída D=12, H≤3.04, espesor de pared e=0.20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla**, estructura que aporta continuidad al flujo que viaja por una tubería cuando llega a una cámara de inspección. Se realizaron 3 recámaras con diferentes alturas de cuerpos como 1,40 m – 1,60 m y 1,90 m.



INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

- **Empalme a cámara**, importante para que la nueva red haga parte de la red de tuberías del municipio. Se hicieron dos empalmes, el primero en la parte de arriba sobre la calle 1 y el segundo sobre la calle 1 sur, cerca al Hospital.
- **Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60m para tráfico pesado con logo y araña de refuerzo**, instalamos 3 tapas con el logo de Empocaldas y marcadas con año 2023.

Actividades de Acueducto

- **Instalación de tubería PVC de 3"**, elemento principal para transportar el agua hacia las viviendas. Se instalaron 47 ml incluyendo un tramo de tubería que conecta a una recámara de caída que tiene como función transportar el flujo de agua mediante una válvula instalada.
- **Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor**, para derivar el flujo en otra dirección hasta el tubo madre. Se instalaron 12 acometidas en total, 8 longitudinales y 4 transversales. Se pensaba reponer solamente los puntos existentes, pero se expuso y se socializó a la entidad contratante la necesidad de añadir otros nuevos puntos ya que evidenciamos que en el sitio había algunas viviendas que no tenían contadores independientes.
- **Instalación de Válvula**, para modificar el paso del fluido a través del conducto. Se instaló una.
- **Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula**.
- **Empalme a tubería existente**, Al momento de hacer esta actividad estuvimos acompañados y supervisados por el equipo técnico de Empocaldas para una correcta conexión. Evidenciamos que la tubería anterior que suministraba a las viviendas el recurso era de un diámetro menor por lo que hicimos un acople óptimo y eficaz para reponer la nueva tubería de mayor diámetro (3").
- **Suministro e instalación de cajas metálicas para contadores**, De ellas se reponen 1 y se instalan 7 más para tener uniformidad en la obra y así brindar gran funcionalidad al momento de inspeccionar los medidores o contadores del servicio suministrado.

Actividades de Pavimento

- **Corte con disco abrasivo**, Se realizaron dos cortes en los empalmes de la nueva vía a reponer para que tuviera mejor simetría y entrega a la vía por conectar, también se realizó un corte sobre la calle 1 para poder instalar una nueva Te y acople necesario para reponer la red



INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

de acueducto nueva. Por último, se realizaron cortes para dilatación de las nuevas losas en concreto vaciadas.

- **Excavación en conglomerado**, se implementa para la extracción de materiales como gravas resistentes, redondeadas, consolidadas y cementadas.
- **Subbase para pavimento**, Se suministra e instala Sub-Base tipo INVIAS requerida en el contrato y se da una compactación con ayuda de un Benitín (Maquinaria semi pesada) Para lograr su optima instalación, teniendo en cuenta su porcentaje de asentamiento y garantizando al momento de su instalación lograr una densidad por encima del 95% (Según el Ensayo de Densidades, arrojó una densidad del 98%).
- **Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1mts cada metro**, necesario para aumentar las capacidades mecánicas a tensión de los elementos estructurales de concreto (pavimento).
- **Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles**, concreto el cual se utiliza para la elaboración del pavimento, incluyendo formaletería y sardineles. A la fecha se han vaciado 35M³ de Concreto hidráulico pre-mezclado.
- **Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel**, incluye formaleta, concreto el cual se utiliza para la realización de una (01) gradería y andenes que se van a establecer en la zona, incluyendo la formaletería.

Acompañamiento Social, Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se realizó el acompañamiento de la SISO durante el desarrollo de la obra, también se tuvo acompañamiento social a cargo del profesional social en el transcurso de las actividades de socialización, se termina el cierre del trabajo social al final de este periodo una vez terminadas las domiciliarias, el informe social con las actas de vecindad y el cierre se adjuntará con los documentos del acta final o Liquidación.

Actividades no previstas

- Para garantizar una pendiente constante tanto en andenes proyectados y en la nueva vía a pavimentar, se realizó una actividad de sobre excavación en un tramo de la vía para darle estética y funcionalidad a la nueva reposición.
- Se evidenció en el momento de reposición de alcantarillado, una red de aguas lluvias que venía conectada incorrectamente, se socializó y se aprobó el suministro e instalación de un tramo de tubería de 8" y una Silla Yee de 12" a 8" para hacer el correcto empalme e instalación a la nueva tubería instalada.



INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

- Según el contrato, el contratista se percató de que las recámaras de caídas a construir no tenían especificación ni diseño de refuerzo por lo que se solicitó y se aprobó implementarle el refuerzo necesario y requerido según la normativa para las 3 nuevas recámaras de caída.
- Para dar garantía y una mejor transición de cargas del pavimento nuevo a vaciar, se propusieron unas losas reforzadas con acero de $\frac{1}{2}$ " para generar un mejor tránsito debido a las posibles cargas y esfuerzos verticales ejercidas por los vehículos. Esta decisión se expuso y se aprovechó el recurso a favor del contrato para ejecutar esta actividad en pro de la obra.
- Se realiza corte y se aplica sello elastomérico en las dilataciones o juntas realizadas en las nuevas losas de pavimentos vaciadas para dar garantía del trabajo realizado, se aplica Vulkem 45 SSL.
- Se realizan 30 ML de Andén aprobados por la entidad contratante para tener un mejor tránsito peatonal en la zona de intervención.
- Se realizaron 3 escalones conformando una gradería en un sector de la obra que en conjunto con un tramo de sardinel brindaron un mejor direccionamiento de las aguas, así disminuyendo el impacto negativo de las viviendas aledañas por temas de humedades y también brindó mejor tránsito peatonal para las mismas.
- Debido a las lluvias presenciadas durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta la pendiente de la vía y que muy cerca se encuentra el Hospital del municipio, se planteó la construcción de un Sumidero el cual canalice parte del volumen de agua proveniente de lluvias hacia la red de alcantarillado.



INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

SE ANEXA A CONTINUACIÓN UN REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:






INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

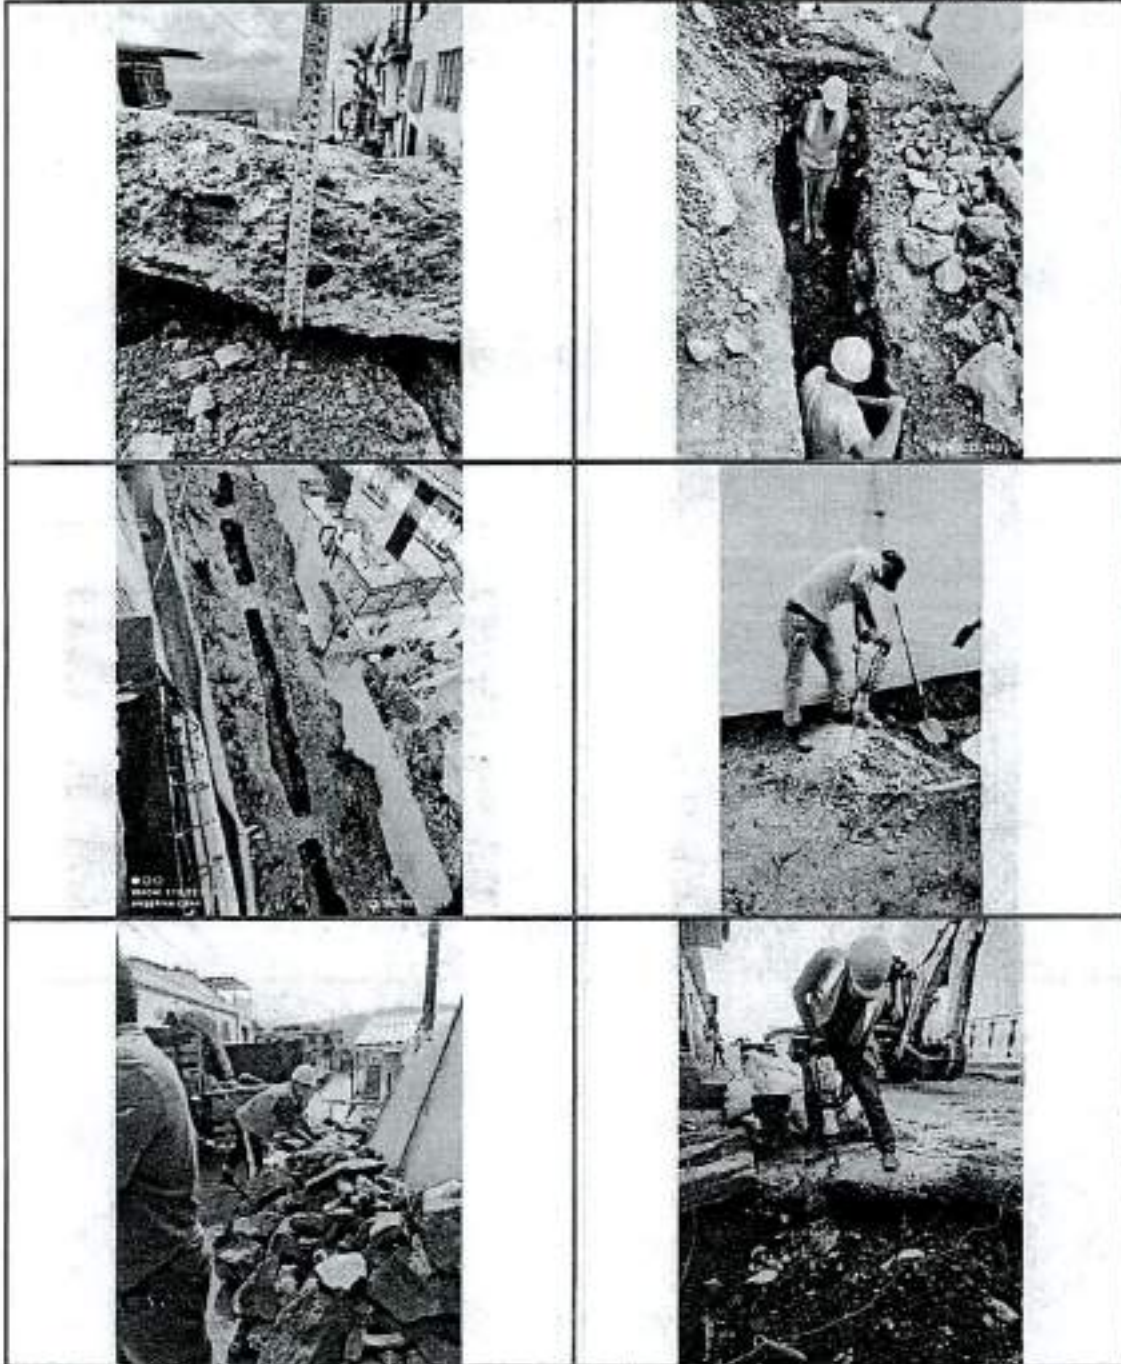





INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

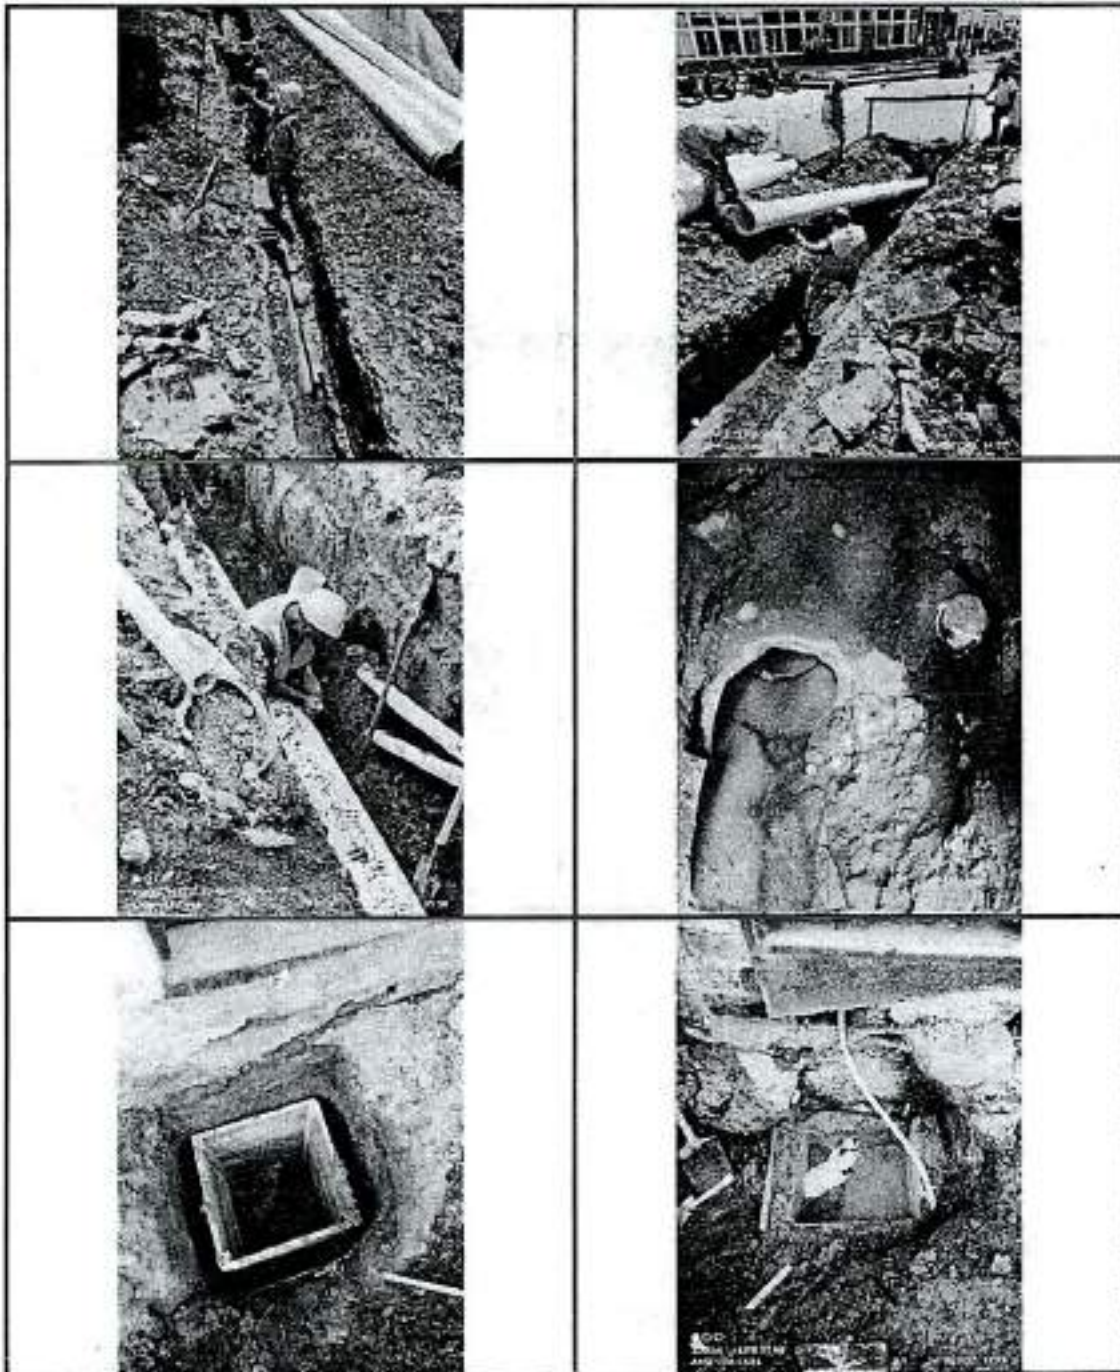

CTO-231-2023

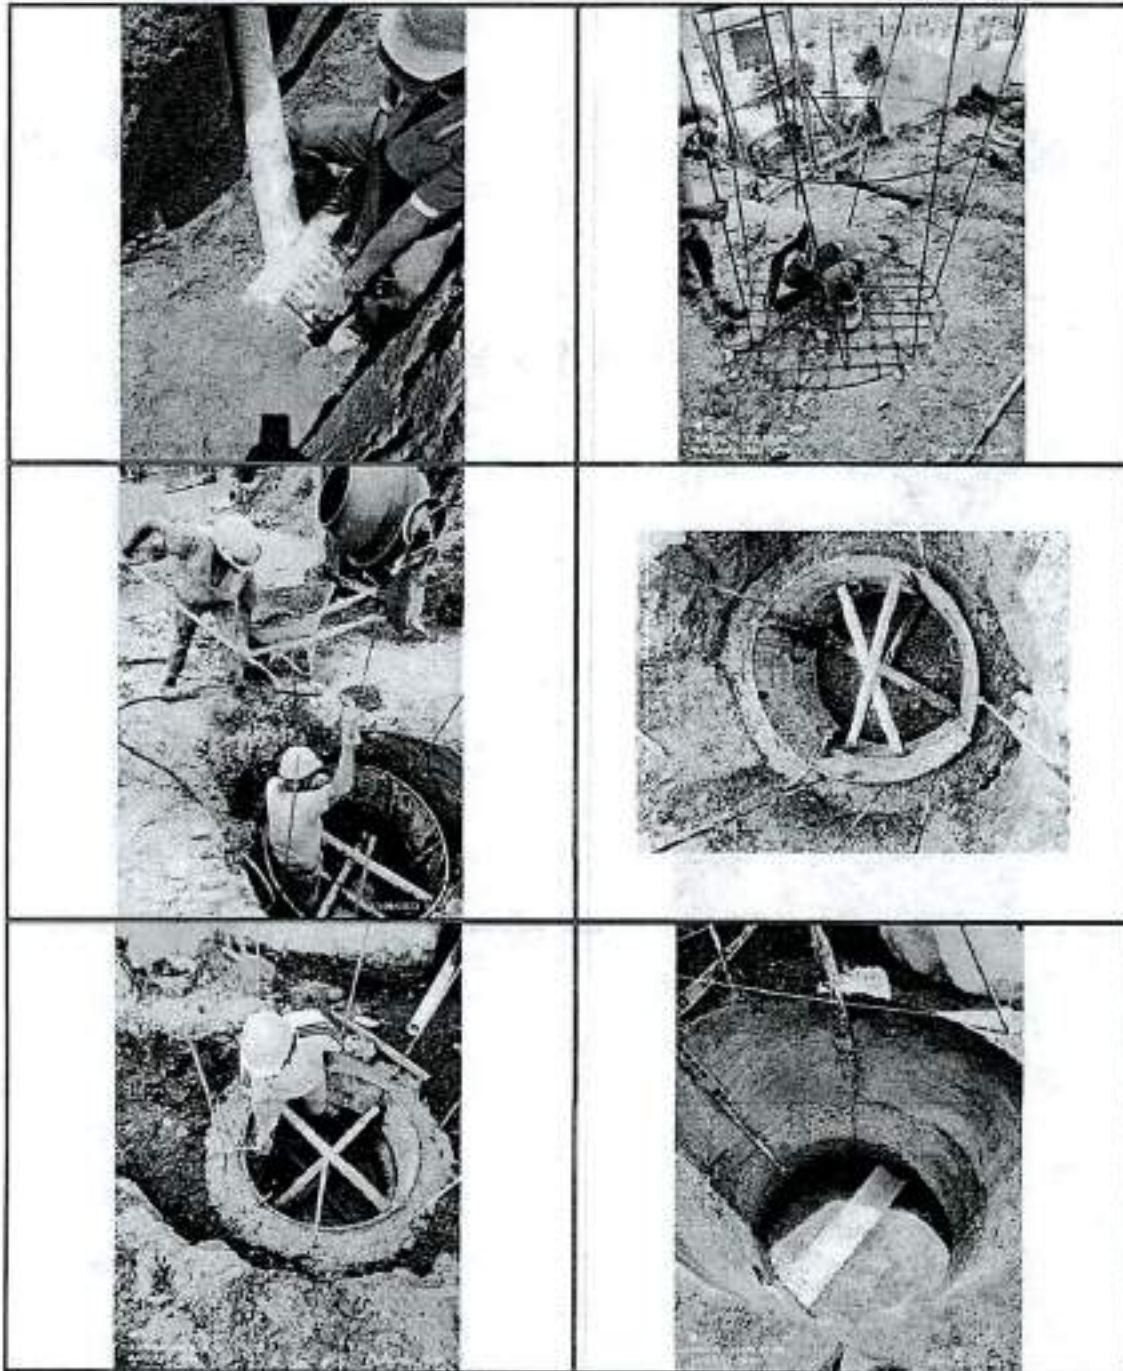




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

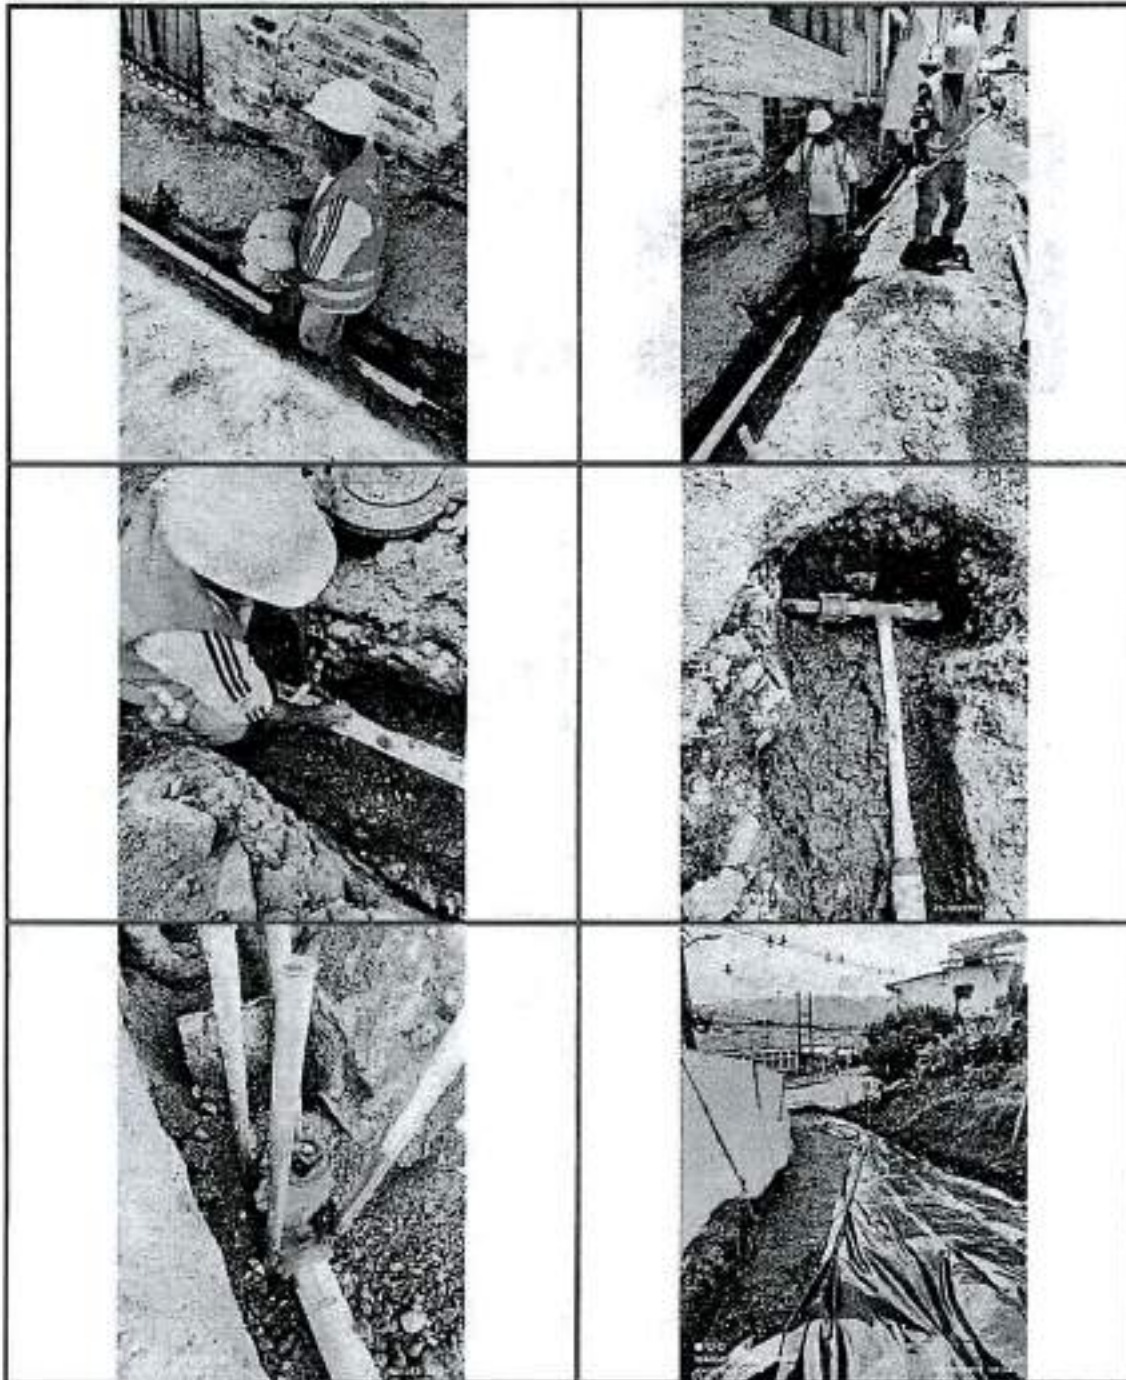




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

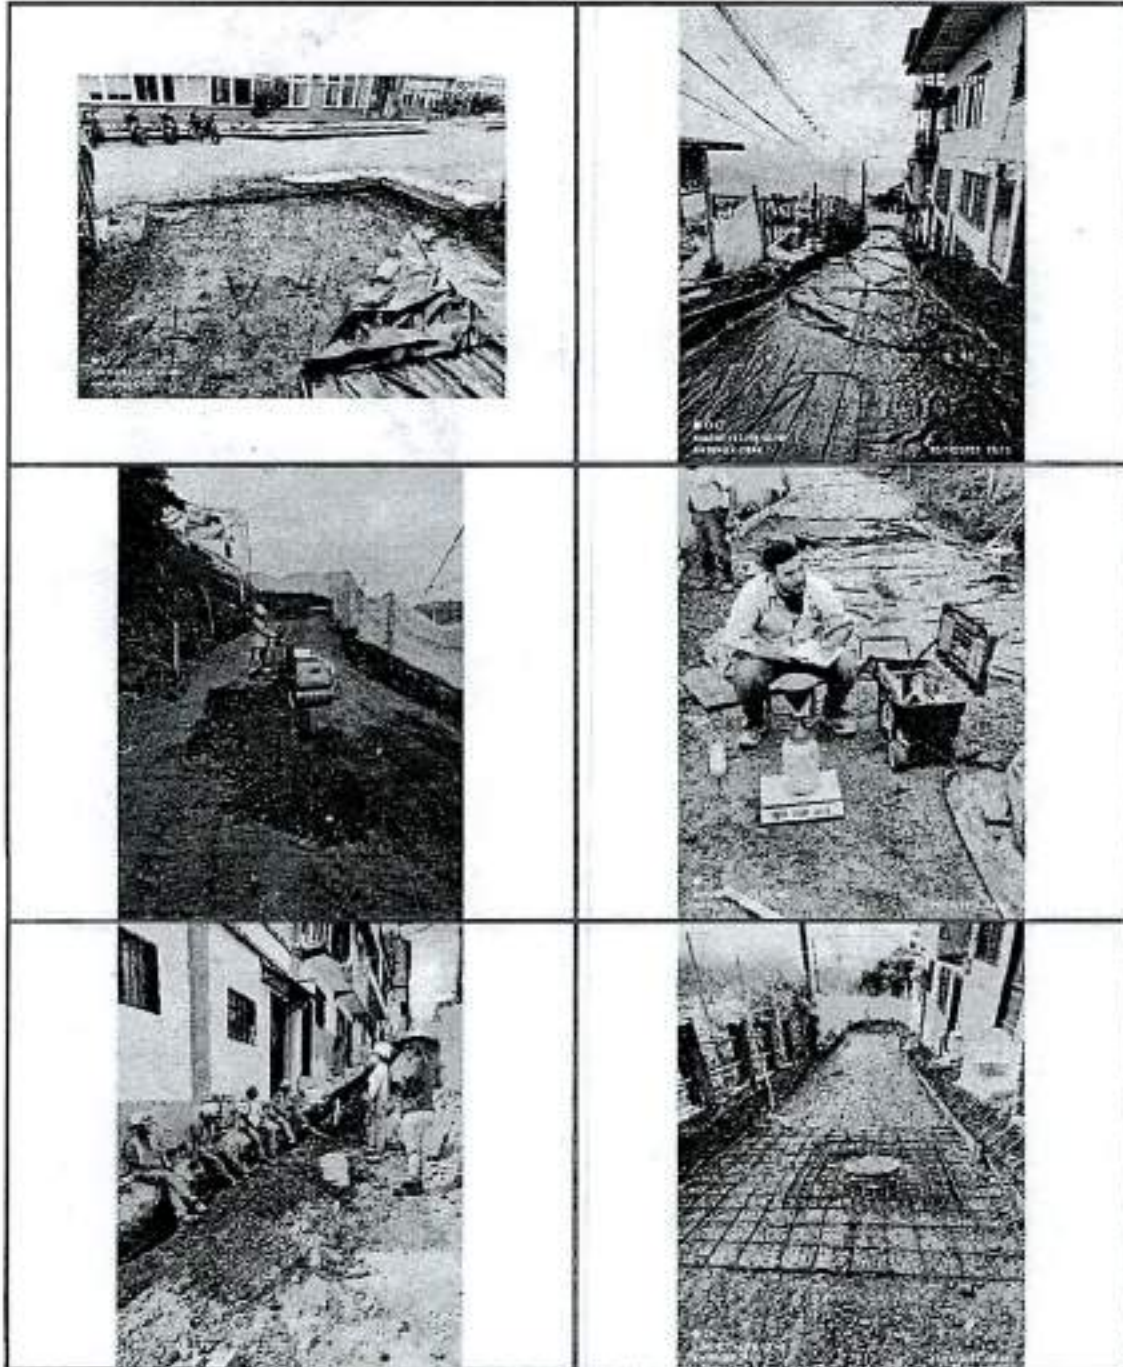




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

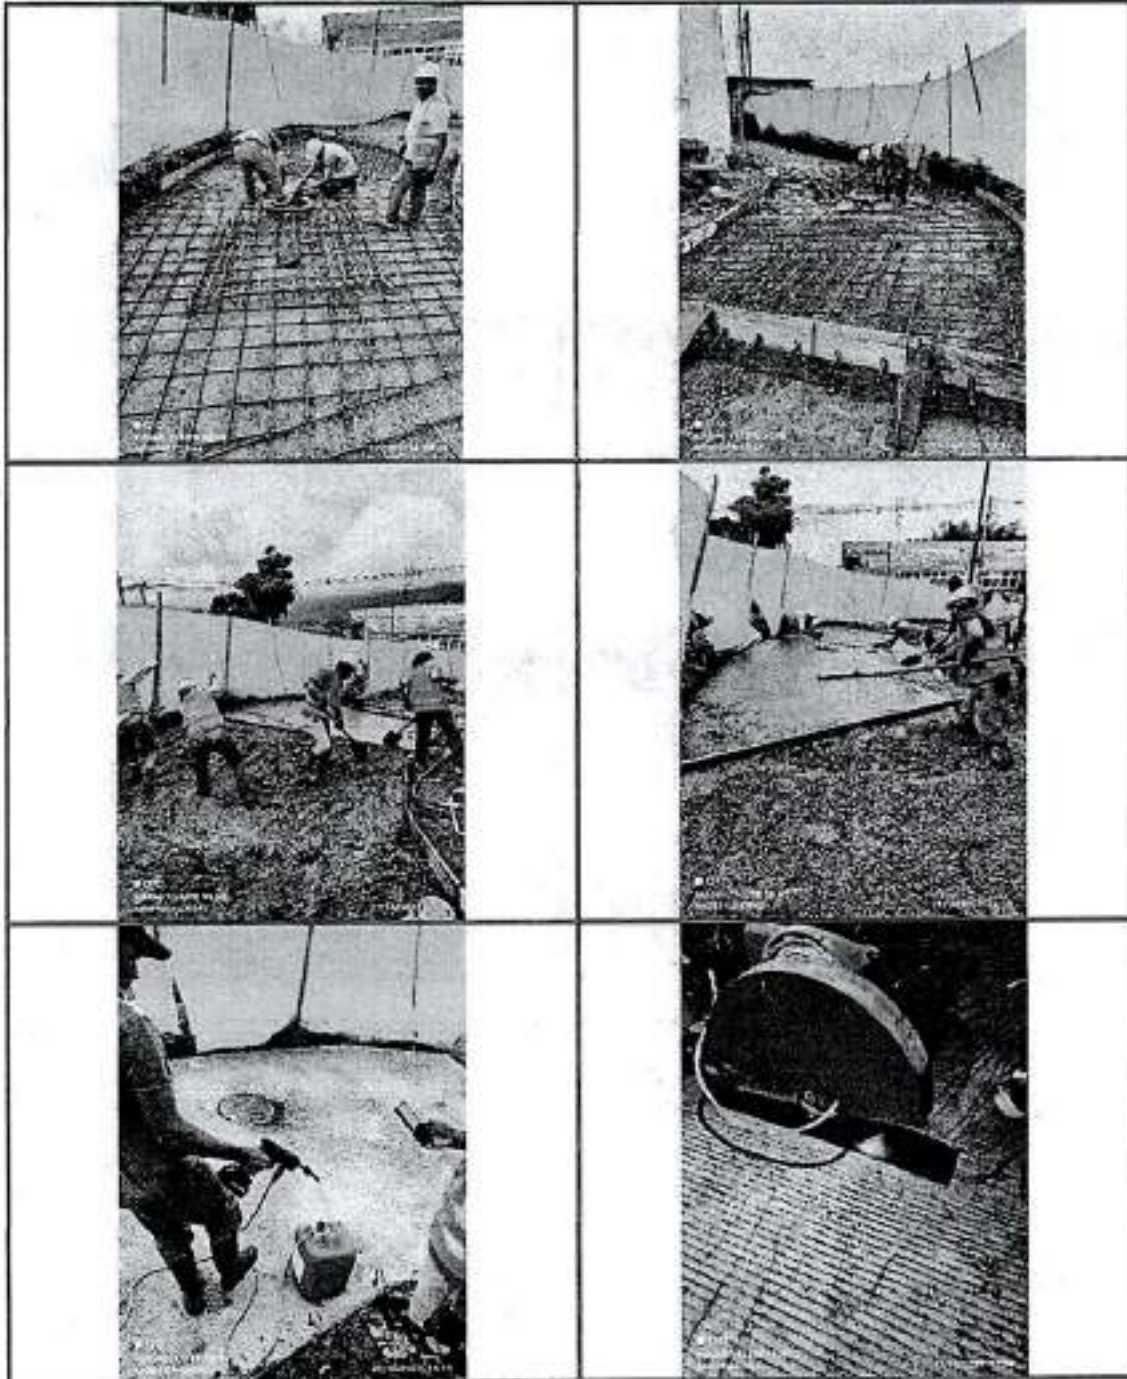




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

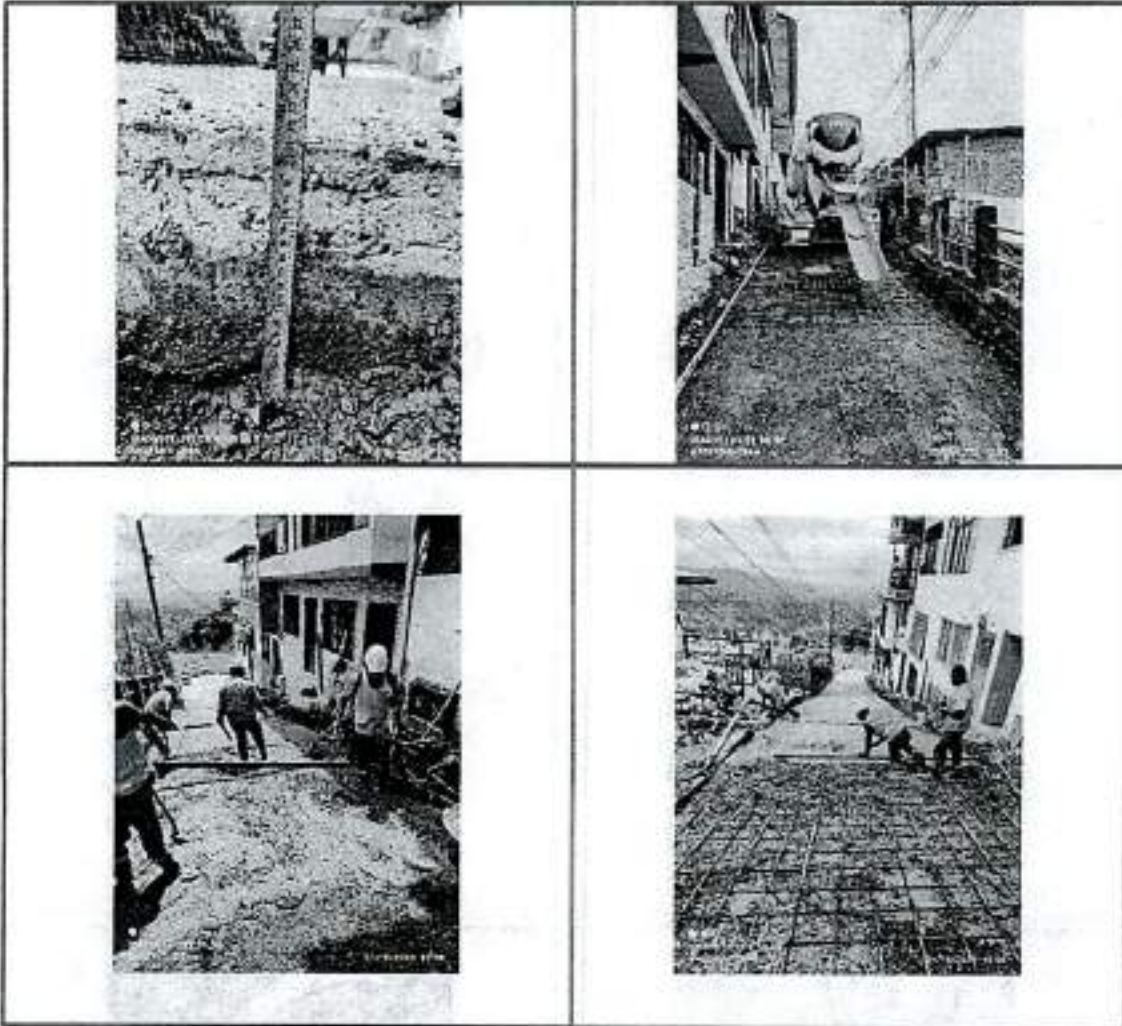




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

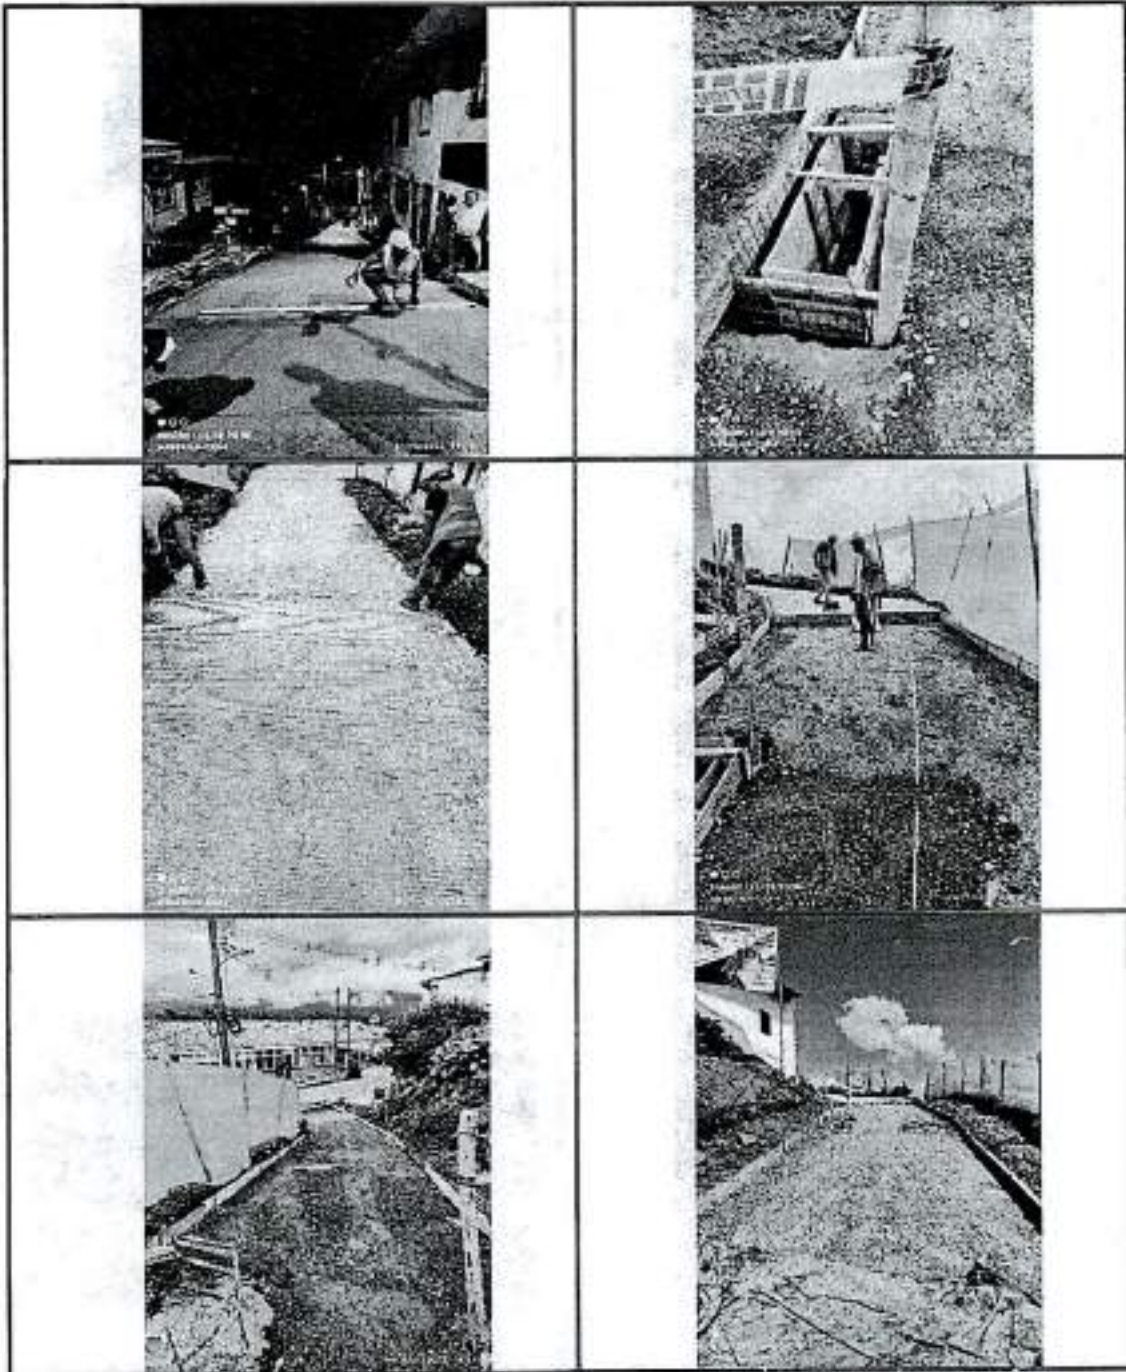




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

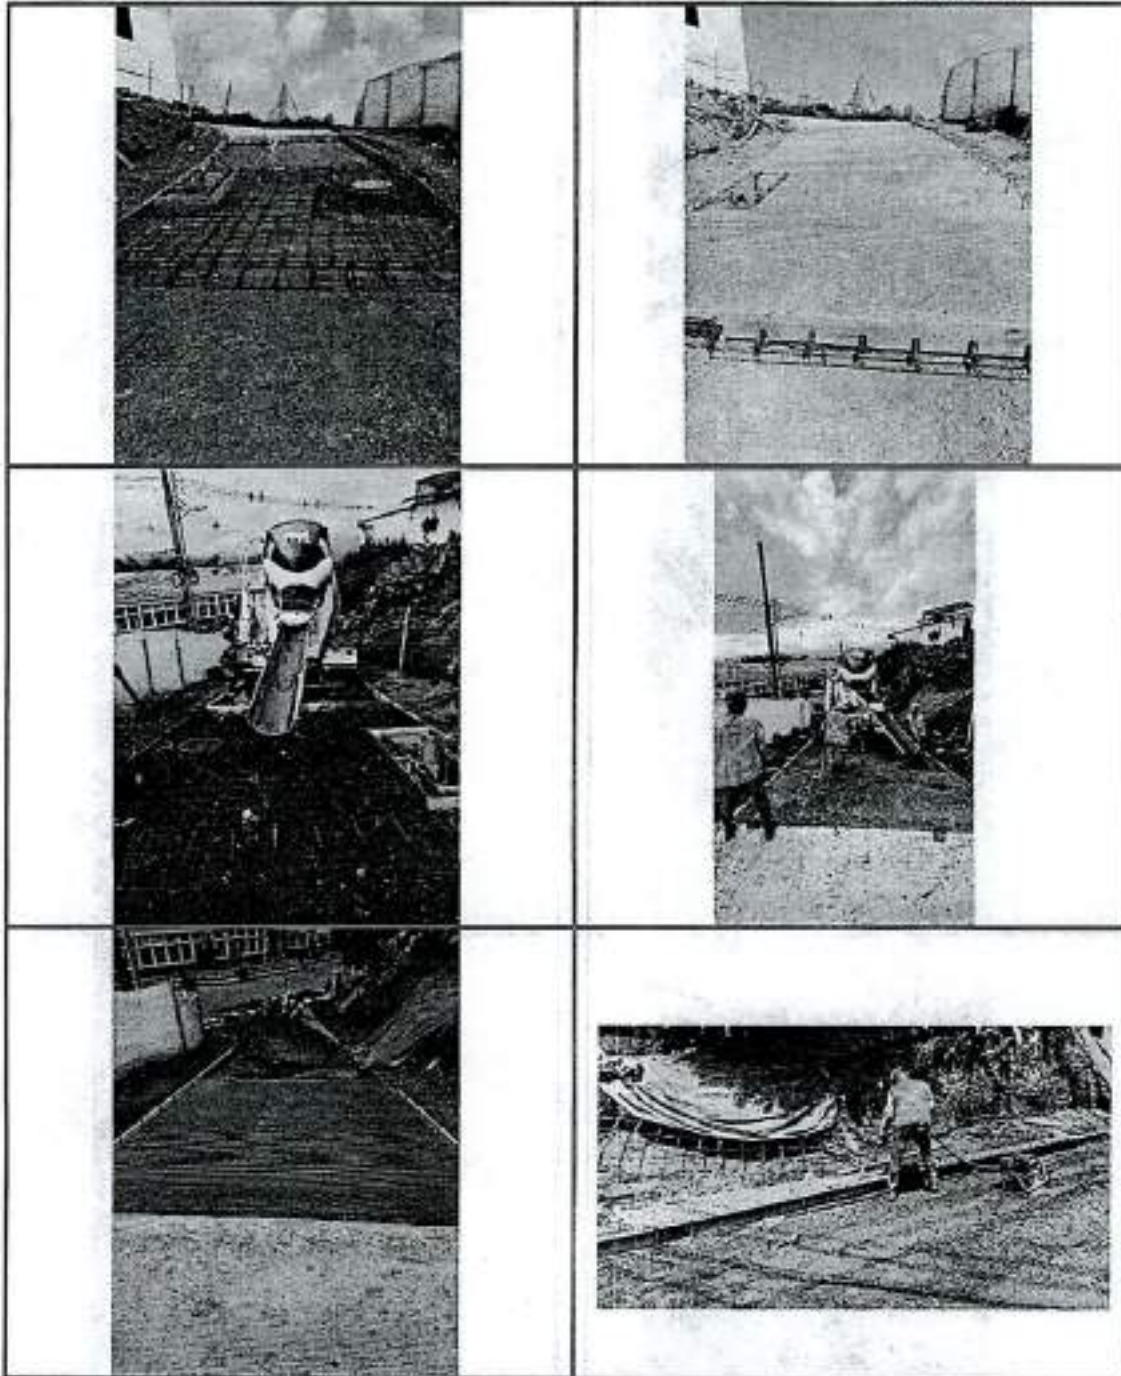




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

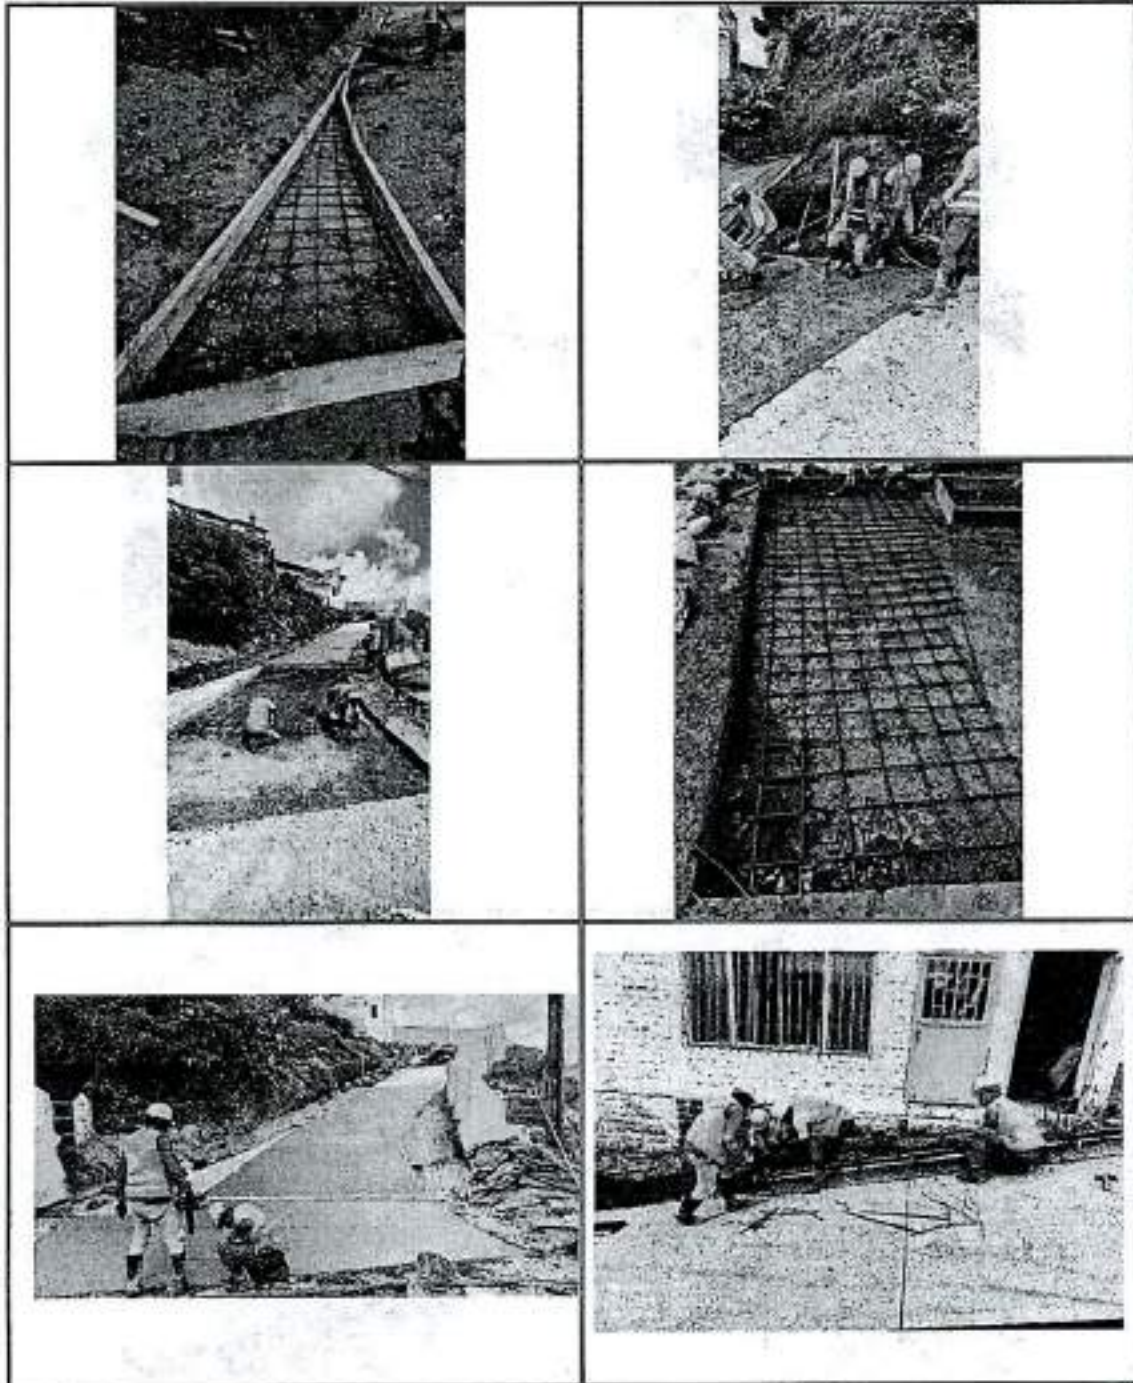




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

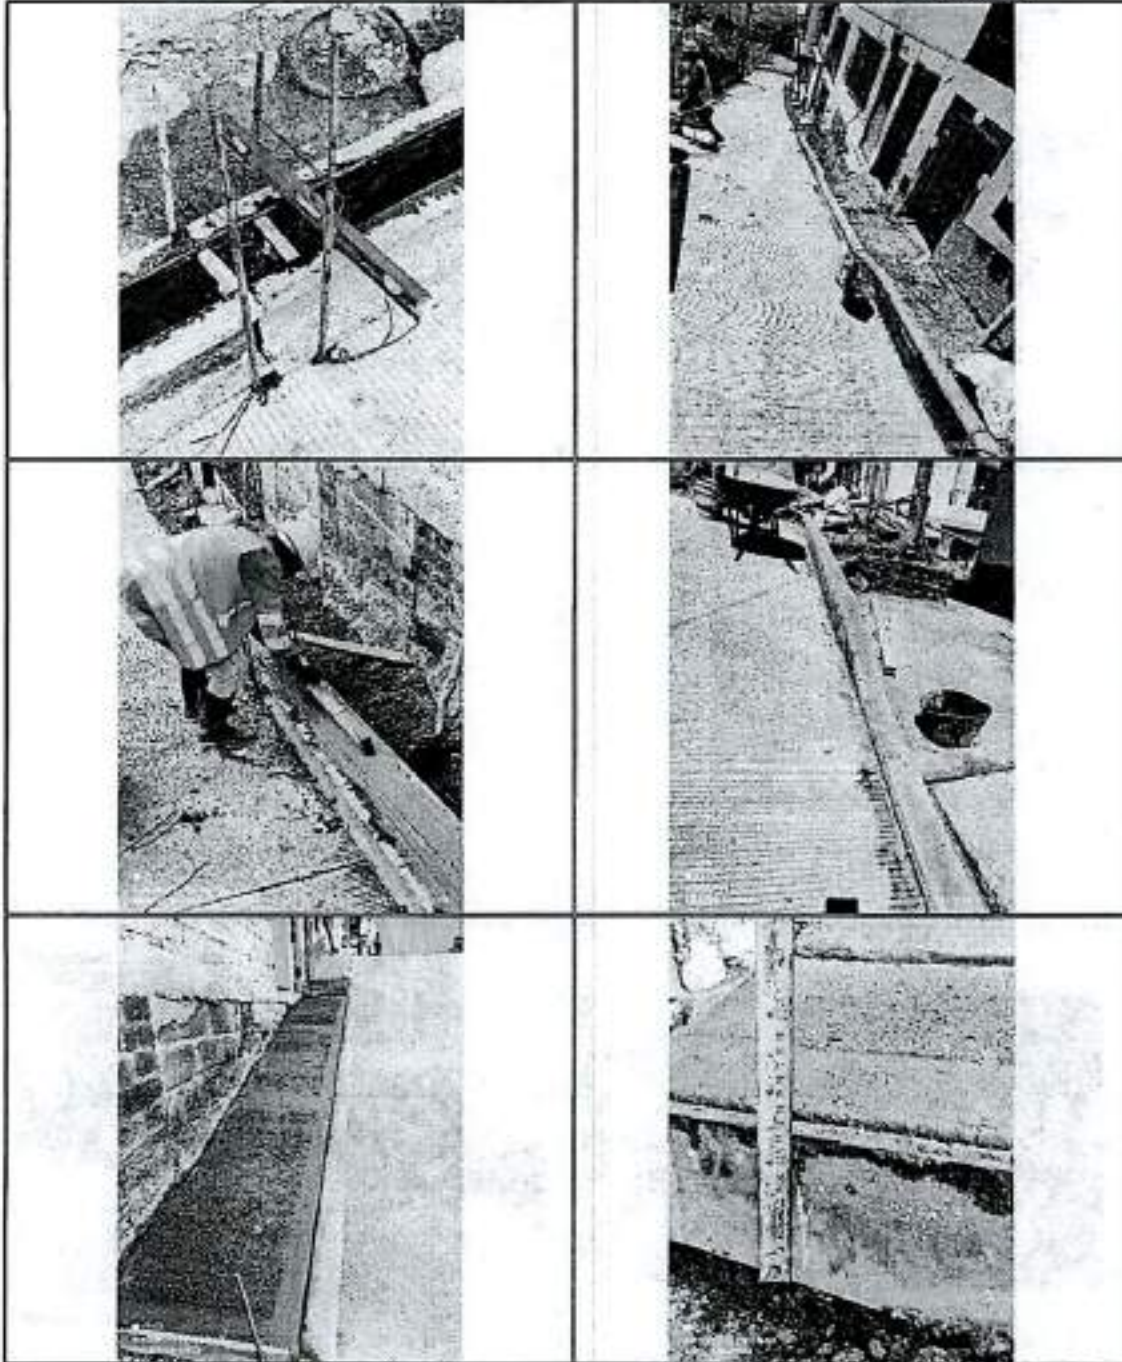




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

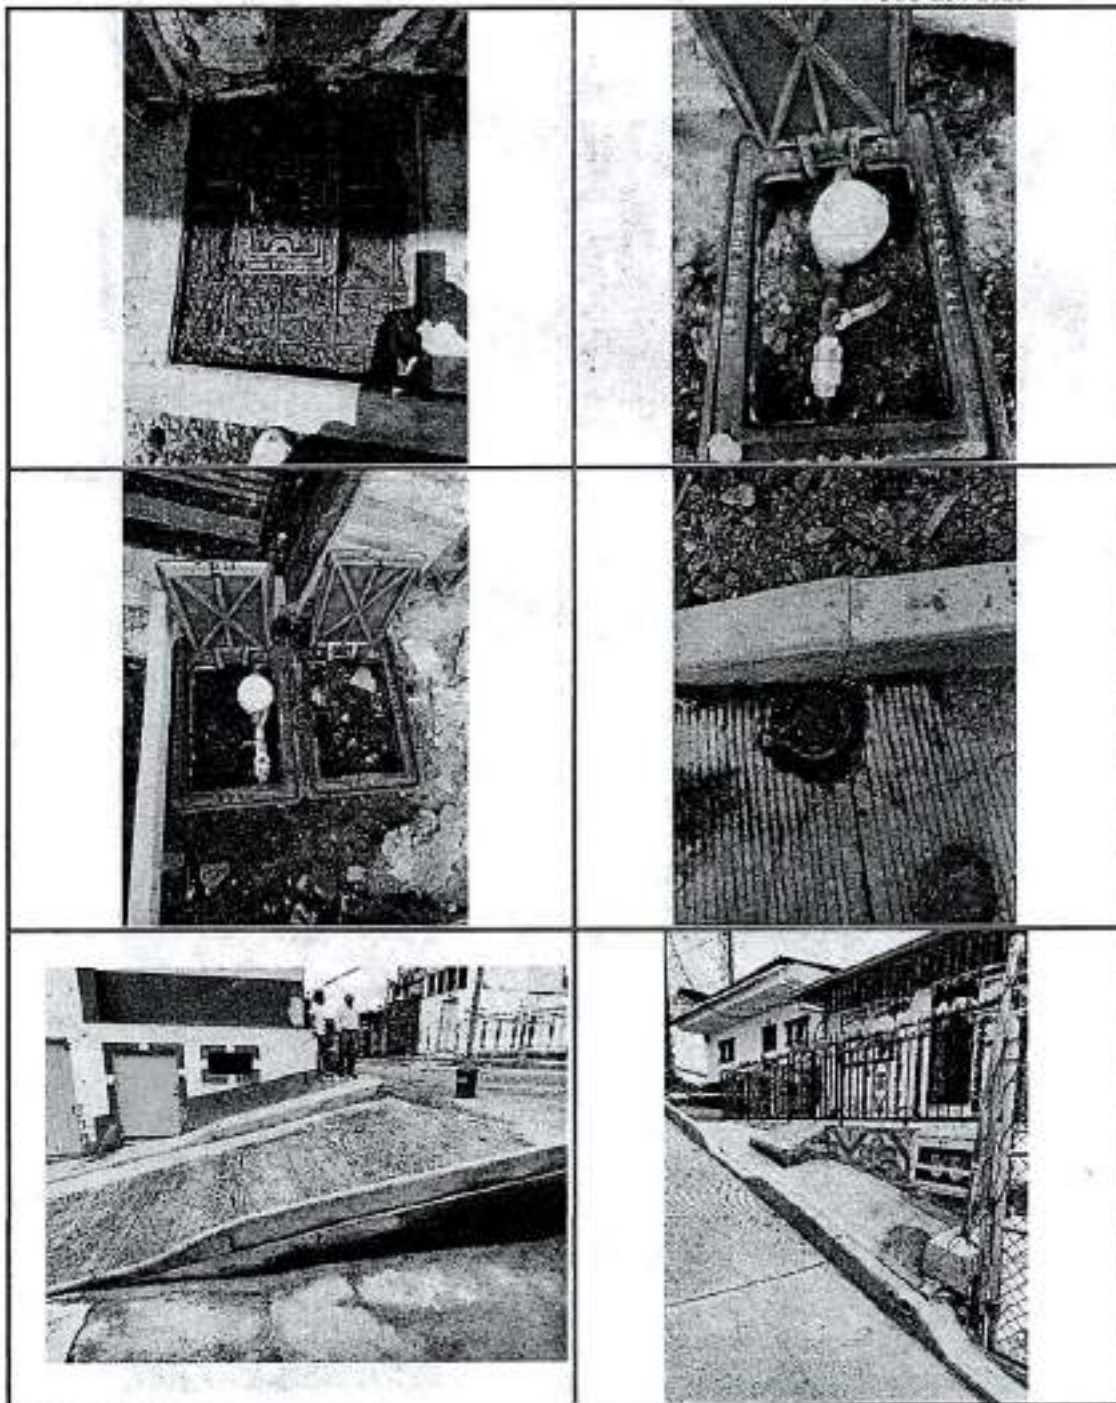




INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

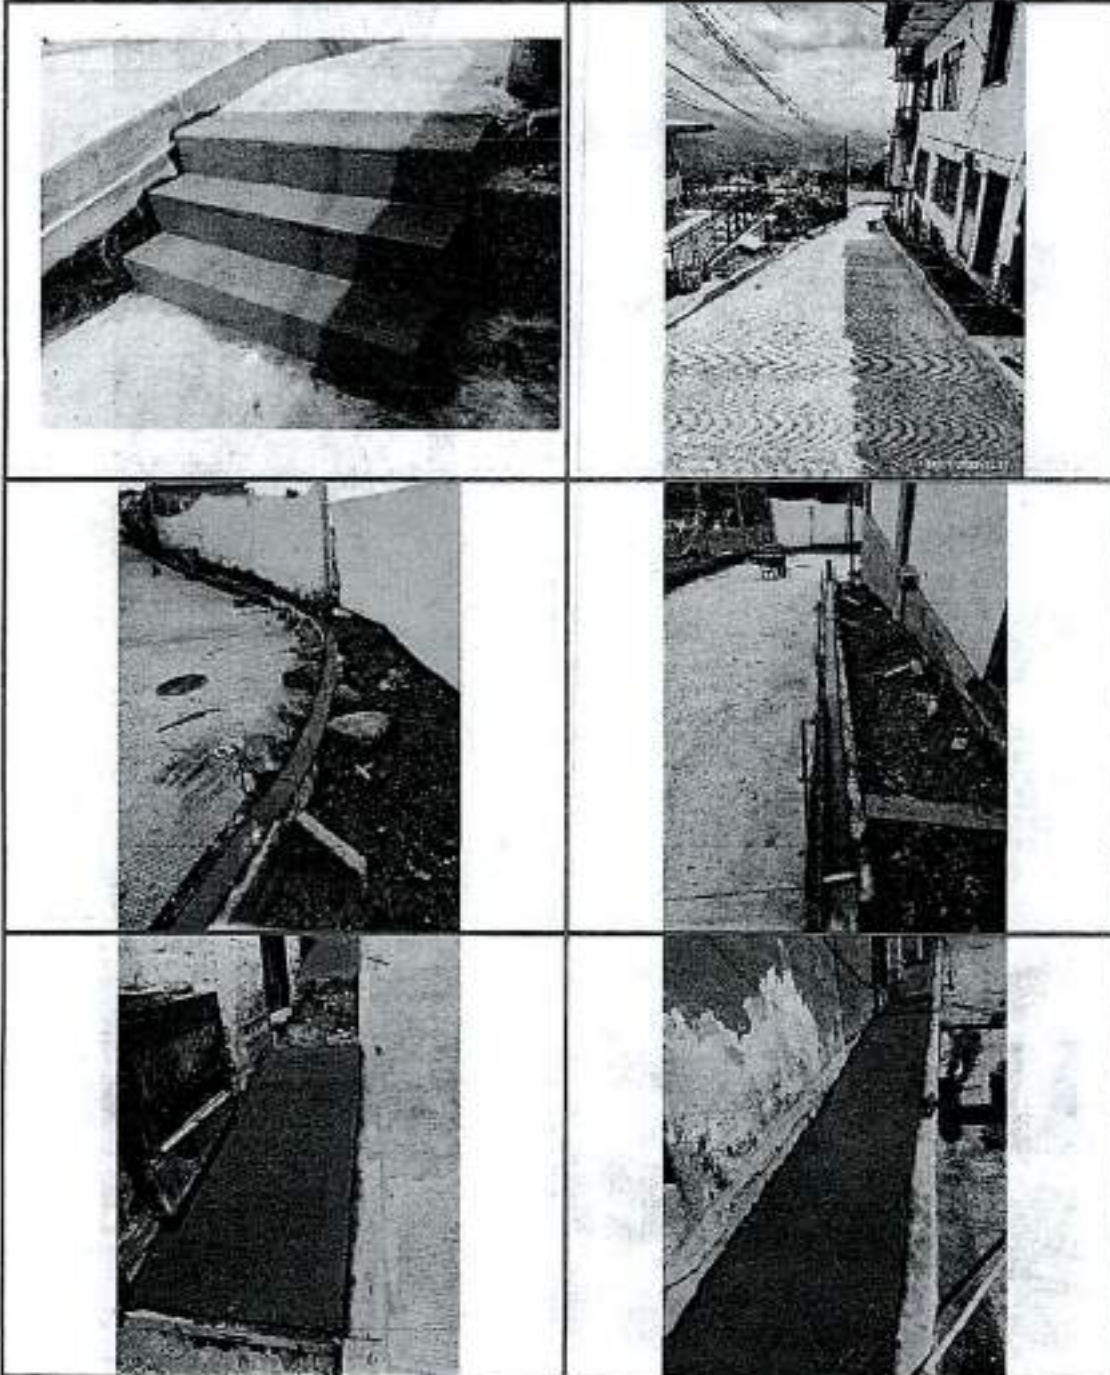





INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y
CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"



CTO-231-2023

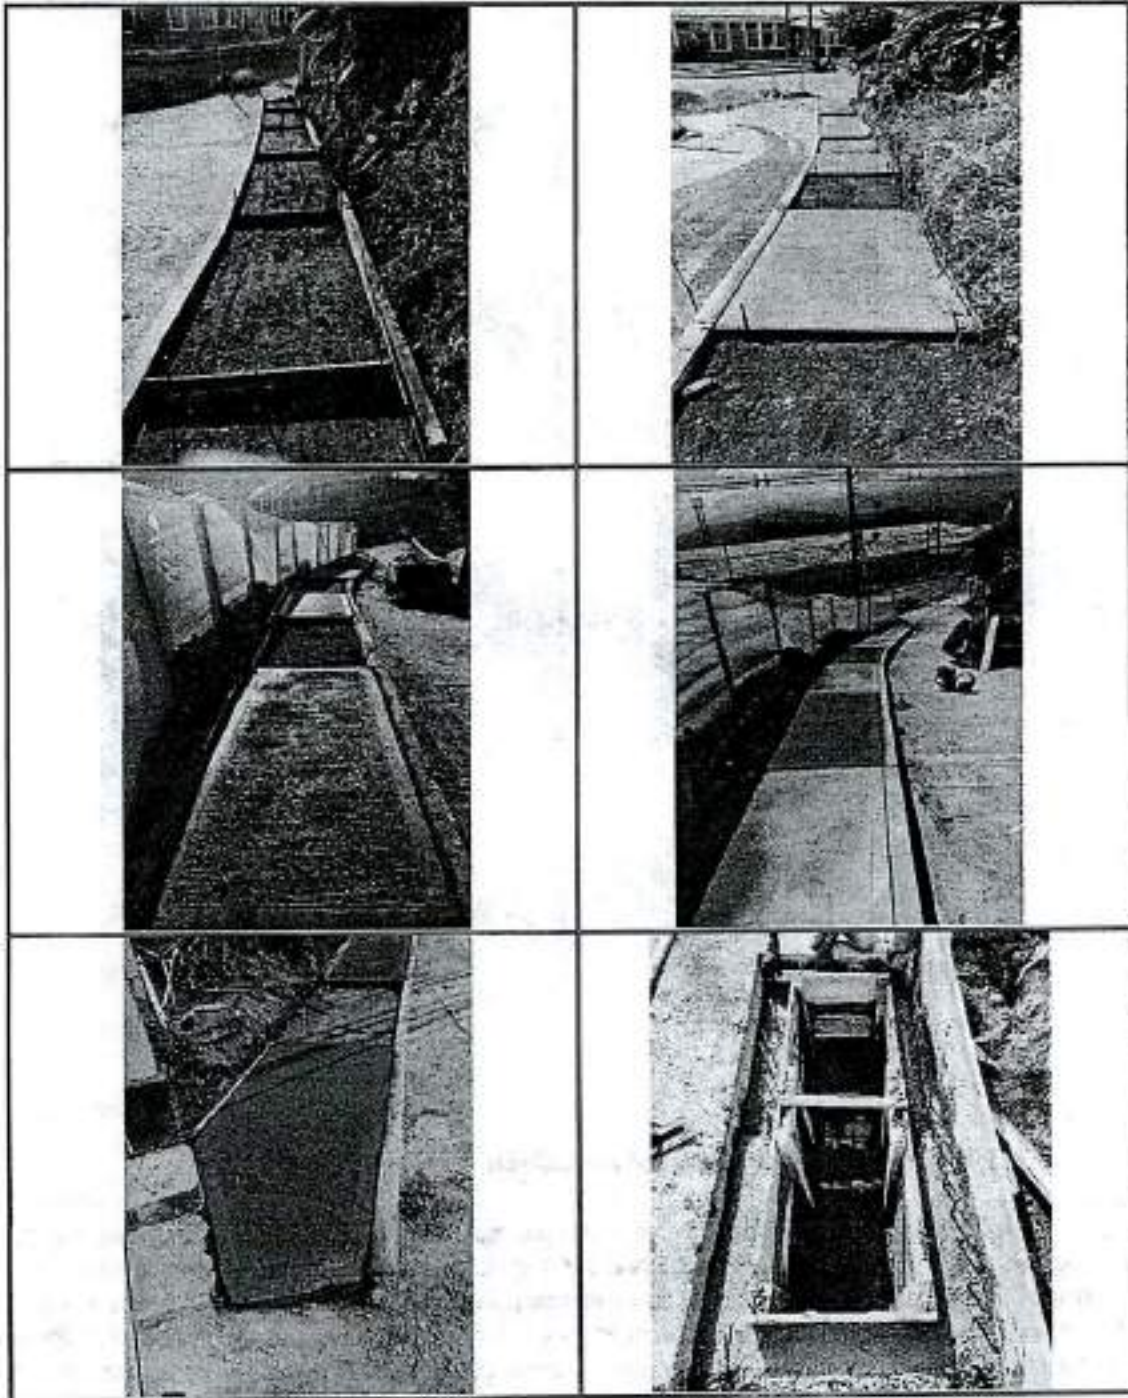

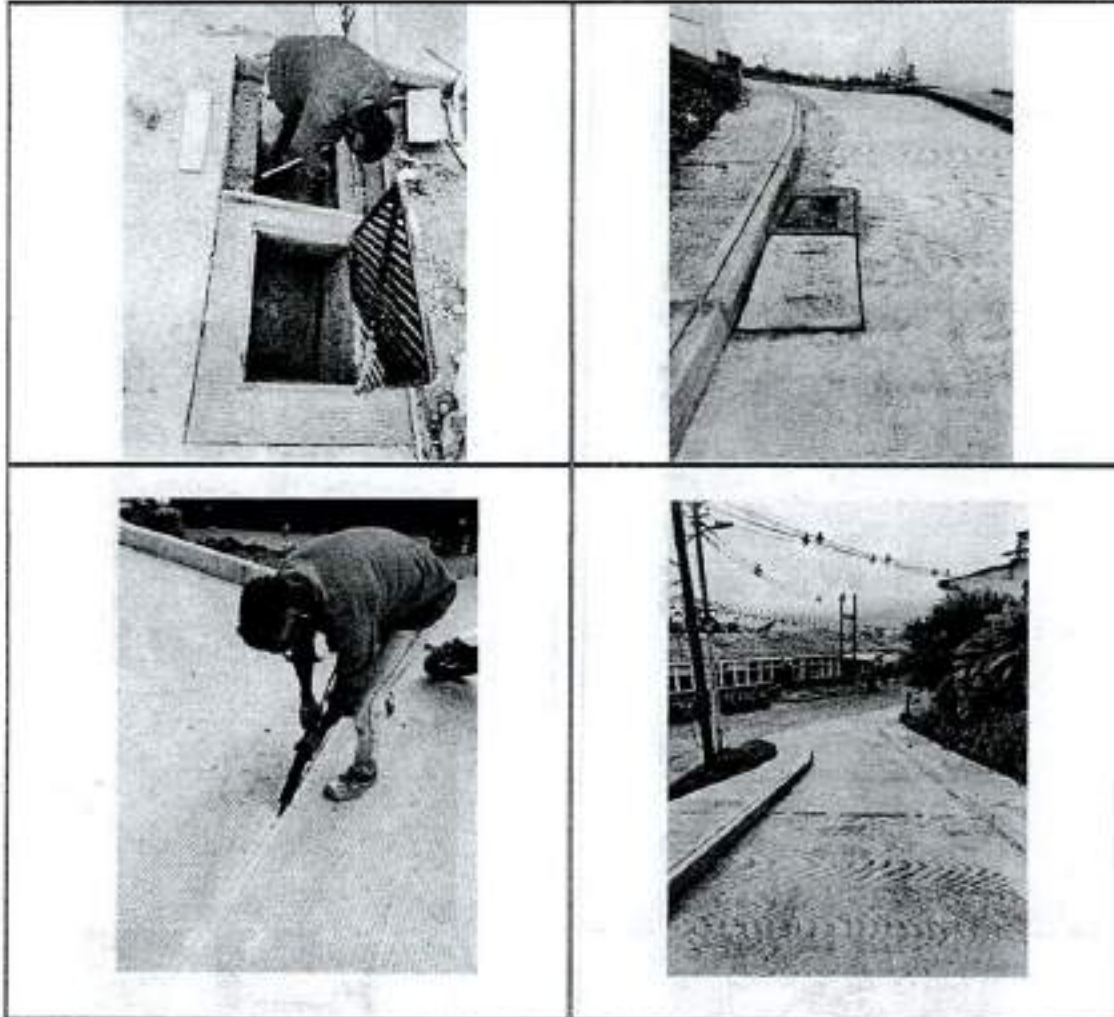

CTO-231-2023



VISITAS TÉCNICAS DE CAMPO CON SUPERVISORES

Se han realizado reuniones en el sitio de la obra, con la participación de los ingenieros del equipo de apoyo a la supervisión por parte de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** y contratista de obra, con el objetivo de identificar y verificar las cantidades y actividades que se deben realizar para la correcta ejecución de ella. De estas visitas se han recibido muchas sugerencias sobre las actividades realizadas y se han expuesto algunos puntos, donde se muestran algunas actividades adicionales para así poder cuantificar sus cantidades, de acuerdo con los planos y las verificaciones tomadas en campo.

	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA</p> <p>"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"</p>	
---	--	---

CTO-231-2023

INCONVENIENTES EN OBRA

La presencia de lluvias afecta el normal desarrollo de las actividades, en la medida que los movimientos de tierra, e instalación de material granular se deben suspender dado que el primero, en condiciones de humedad, genera afectación del estado del terreno y en consecuencia del parámetro de CBR, fundamental para el cumplimiento de las premisas de diseño de la estructura de pavimento, por lo cual, ante la presencia de lluvias se deben suspender actividades de manera inmediata. Por su parte, el material granular de subbase, presenta una densidad óptima a la cual debe ser compactado, de acuerdo con el ensayo Proctor, y en caso de exceder esta humedad por causa de las lluvias, debe ser remezclado e instalado nuevamente, generando pérdida de tiempo y reprocesos constructivos.



Vo.Bo. POR:

Adrián Camilo Hernández Manrique

ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
CC 16.077.675
CONTRATISTA DE OBRA

REALIZADO POR:

Juan Camilo Rodríguez García

JUAN CAMILO RODRIGUEZ GARCÍA
C.C 1.088.345.551
RESIDENTE DE OBRA

Página 23 de 23

Adrián Camilo Hernández Manrique – Ing. Civil-Esp. Ing. Hidráulica y ambiental
Carrera 5 No 18-46 C.C Plazaola Of 601 Celular: 3183659249
E-mail: adriancamilio14@gmail.com
Pereira, Risaralda



SOPORTE NÓMINAS ELECTRÓNICAS

Ingenieros A

Adrián Camilo Hernández Manrique – Ing. Civil-Esp. Ing. Hidráulica y ambiental
Carrera 6 No 18-46 C.C. Plazuela Of 601 Celular: 3183659249
E-mail: adriancamilo14@gmail.com
Pereira, Risaralda

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1227

Nombre: **CARLOS MARIO ADAMES GONZALEZ**
Identificación: **1054918105**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 580,000.00	Fondo de salud	0	\$ 23,200.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 70,303.00	Fondo de pensión	0	\$ 23,200.00
Total Ingresos		\$ 650,303.00	Total Deducciones		\$ 46,400.00
NETO A PAGAR					\$ 603,903.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1228

Nombre: JUAN JOSE BETANCOURT GARCIA
Identificación: 1089933574
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	1.00	\$ 38,667.00	Fondo de salud	0	\$ 1,547.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	1.00	\$ 4,687.00	Fondo de pensión	0	\$ 1,547.00
Total Ingresos		\$ 43,354.00	Total Deducciones		\$ 3,094.00
NETO A PAGAR					\$ 40,260.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sliigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30

Comprobante Número: 1227



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Nombre: CARLOS MARIO ADAMES GONZALEZ

Identificación: 1054918105

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 580,000.00	Fondo de salud	0	\$ 23,200.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 70,303.00	Fondo de pensión	0	\$ 23,200.00
Total Ingresos		\$ 650,303.00	Total Deducciones		\$ 46,400.00
NETO A PAGAR					\$ 603,903.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1228

Nombre: JUAN JOSE BETANCOURT GARCIA
Identificación: 1089933574
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	1.00	\$ 38,667.00	Fondo de salud	0	\$ 1,547.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	1.00	\$ 4,687.00	Fondo de pensión	0	\$ 1,547.00
Total Ingresos		\$ 43,354.00	Total Deducciones		\$ 3,094.00
NETO A PAGAR					\$ 40,260.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1229

Nombre: **JOSE FERNANDO CAÑAS SEPULVEDA**
Identificación: 1054924663
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 580,000.00	Fondo de salud	0	\$ 23,200.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 70,303.00	Fondo de pensión	0	\$ 23,200.00
Total Ingresos		\$ 650,303.00	Total Deducciones		\$ 46,400.00
NETO A PAGAR					\$ 603,903.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1230

Nombre: LUIS HERNANDO PUERTA SEPULVEDA
Identificación: 75037584
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	16.00	\$ 618,667.00	Fondo de salud	0	\$ 24,747.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	16.00	\$ 74,990.00	Fondo de pensión	0	\$ 24,747.00
Total Ingresos		\$ 693,657.00	Total Deducciones		\$ 49,494.00
			NETO A PAGAR		\$ 644,163.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit: 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1231

Nombre: **ANDRES MAURICIO RESTREPO MEJIA**
Identificación: **1054920342**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000,00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	6.00	\$ 232,000.00	Fondo de salud	0	\$ 9,280.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	6.00	\$ 28,121.00	Fondo de pensión	0	\$ 9,280.00
Total Ingresos		\$ 260,121.00	Total Deducciones		\$ 18,560.00
NETO A PAGAR					\$ 241,561.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1232

Nombre: GERARDO DE JESUS SANCHEZ GOMEZ
Identificación: 16221101
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	16.00	\$ 818,067.00	Fondo de salud	0	\$ 24,747.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	16.00	\$ 74,990.00	Fondo de pensión	0	\$ 24,747.00
Total Ingresos		\$ 693,657.00	Total Deducciones		\$ 49,494.00
			NETO A PAGAR		\$ 644,163.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/08/30
Comprobante Número: 1233

Nombre: JHON FREDY VALENCIA VASQUEZ
Identificación: 1054920467
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 580,000.00	Fondo de salud	0	\$ 23,200.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 70,303.00	Fondo de pensión	0	\$ 23,200.00
Total Ingresos		\$ 650,303.00	Total Deducciones		\$ 46,400.00
NETO A PAGAR					\$ 603,903.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Handwritten title at the top of the page, possibly a name or subject.

Handwritten text in the upper left quadrant, appearing to be a list or set of notes.



Handwritten text in the upper right quadrant, possibly a date or a reference.

Handwritten text in the middle left quadrant, continuing the notes or list.

Handwritten text in the middle right quadrant, possibly a signature or a note.

Handwritten text in the lower left quadrant, near the bottom of the page.

Handwritten text in the lower right quadrant, near the bottom of the page.



Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1180

Nombre: **CARLOS MARIO ADAMES GONZALEZ**
Identificación: **1054918105**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	3.00	\$ 116,000.00	Fondo de salud	0	\$ 4,640.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	3.00	\$ 14,061.00	Fondo de pensión	0	\$ 4,640.00
Total Ingresos		\$ 130,061.00	Total Deducciones		\$ 9,280.00
NETO A PAGAR					\$ 120,781.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: **2023/09/01 - 2023/09/30**
Comprobante Número: **1181**

Nombre: **JOSE FERNANDO CAÑAS SEPULVEDA**
Identificación: **1054924663**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	16.00	\$ 618,667.00	Fondo de salud	0	\$ 24,747.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	16.00	\$ 74,990.00	Fondo de pensión	0	\$ 24,747.00
Total Ingresos		\$ 693,657.00	Total Deducciones		\$ 49,494.00
			NETO A PAGAR		\$ 644,163.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siiigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit: 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1182

Nombre: **LUIS HERNANDO PUERTA SEPULVEDA**
Identificación: 75037584
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1183

Nombre: **ANDRES MAURICIO RESTREPO MEJIA**
Identificación: 1054920342
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 77,333.00	Fondo de salud	0	\$ 3,093.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 9,374.00	Fondo de pensión	0	\$ 3,093.00
Total Ingresos		\$ 86,707.00	Total Deducciones		\$ 6,186.00
NETO A PAGAR					\$ 80,521.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1184

Nombre: GERARDO DE JESUS SANCHEZ GOMEZ
Identificación: 16221101
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1185

Nombre: JHON FREDY VALENCIA VASQUEZ
Identificación: 1054920467
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 348,000.00	Fondo de salud	0	\$ 13,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 42,182.00	Fondo de pensión	0	\$ 13,920.00
Total Ingresos		\$ 390,182.00	Total Deducciones		\$ 27,840.00
			NETO A PAGAR		\$ 362,342.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siiigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1186

Nombre: LAURA SOFIA CACERES JIMENEZ
Identificación: 1010081907
Cargo: PALETERA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	23.00	\$ 889,333.00	Fondo de salud	0	\$ 35,573.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	23.00	\$ 107,798.00	Fondo de pensión	0	\$ 35,573.00
Total Ingresos		\$ 997,131.00	Total Deducciones		\$ 71,146.00
NETO A PAGAR					\$ 925,985.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1187

Nombre: JHON STIVEN GALLEGO BUSTAMANTE
Identificación: 1002595273
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	11.00	\$ 425,333.00	Fondo de salud	0	\$ 17,013.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	11.00	\$ 51,556.00	Fondo de pensión	0	\$ 17,013.00
Total Ingresos		\$ 476,889.00	Total Deducciones		\$ 34,026.00
NETO A PAGAR					\$ 442,863.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sligo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit: 16077675

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1188

Nombre: JUAN MANUEL GALLEGO MEJIA
Identificación: 1054926067
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	26.00	\$ 1,005,333.00	Fondo de salud	0	\$ 40,213.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	26.00	\$ 121,859.00	Fondo de pensión	0	\$ 40,213.00
Total Ingresos		\$ 1,127,192.00	Total Deducciones		\$ 80,426.00
NETO A PAGAR					\$ 1,046,766.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sligo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1189

Nombre: JOSE MENHELBERT GRISALES HERRERA
Identificación: 1054923211
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	20.00	\$ 773,333.00	Fondo de salud	0	\$ 30,933.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	20.00	\$ 93,737.00	Fondo de pensión	0	\$ 30,933.00
Total Ingresos		\$ 867,070.00	Total Deducciones		\$ 61,866.00
			NETO A PAGAR		\$ 805,204.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30

Comprobante Número: 1190



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Nombre: CARLOS ANDRES HURTADO GIRALDO

Identificación: 1002593598

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	5.00	\$ 193,333.00	Fondo de salud	0	\$ 7,733.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	\$ 23,434.00	Fondo de pensión	0	\$ 7,733.00
Total Ingresos		\$ 216,767.00	Total Deducciones		\$ 15,466.00
NETO A PAGAR					\$ 201,301.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARIQUE
NIT 16077675

Período de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: 1191

Nombre: YONIER ALEXANDER MUÑOZ HERNANDEZ
Identificación: 1002744149
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	3.00	\$ 116,000.00	Fondo de salud	0	\$ 4,640.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	3.00	\$ 14,061.00	Fondo de pensión	0	\$ 4,640.00
Total Ingresos		\$ 130,061.00	Total Deducciones		\$ 9,280.00
NETO A PAGAR					\$ 120,781.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sliigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30

Comprobante Número: 1192



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Nombre: CARLOS EDUARDO PIEDRAHITA ESPINAL

Identificación: 1116264764

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	3.00	\$ 116,000.00	Fondo de salud	0	\$ 4,640.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	3.00	\$ 14,061.00	Fondo de pensión	0	\$ 4,640.00
Total Ingresos		\$ 130,061.00	Total Deducciones		\$ 9,280.00
NETO A PAGAR					\$ 120,781.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número:1245

Nombre: EDWAR LEANDRO VILLADA MEJIA
Identificación: 75102229
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	21.00	\$ 812,000.00	Fondo de salud	0	\$ 32,480.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	21.00	\$ 98,424.00	Fondo de pensión	0	\$ 32,480.00
Total Ingresos		\$ 910,424.00	Total Deducciones		\$ 64,960.00
NETO A PAGAR					\$ 845,464.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número: 1244

Nombre: JORGE ENRIQUE VILLA VANEGAS
Identificación: 85439349
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	21.00	\$ 812,000.00	Fondo de salud	0	\$ 32,480.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	21.00	\$ 98,424.00	Fondo de pensión	0	\$ 32,480.00
Total Ingresos		\$ 910,424.00	Total Deducciones		\$ 64,960.00
NETO A PAGAR					\$ 845,464.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número:1243

Nombre: **RUBEN DARIO VANEGAS ARIAS**
Identificación: **1114399174**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	13.00	\$ 502,667.00	Fondo de salud	0	\$ 20,107.00
Aux. de transporte(Aux. de conectividad digital)	13.00	\$ 60,929.00	Fondo de pensión	0	\$ 20,107.00
Total Ingresos		\$ 563,596.00	Total Deducciones		\$ 40,214.00
NETO A PAGAR					\$ 523,382.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número: 1242

Nombre: EDWIN ALBERTO SUAREZ GAMARRA
Identificación: 77177750
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	20.00	\$ 773,333.00	Fondo de salud	0	\$ 30,933.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	20.00	\$ 93,737.00	Fondo de pensión	0	\$ 30,933.00
Total Ingresos		\$ 867,070.00	Total Deducciones		\$ 61,866.00
NETO A PAGAR					\$ 805,204.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número: 1241

Nombre: **JHON JAIBER CARVAJAL TIQUE**
Identificación: **1123161092**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	21.00	\$ 812,000.00	Fondo de salud	0	\$ 32,480.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	21.00	\$ 98,424.00	Fondo de pensión	0	\$ 32,480.00
Total Ingresos		\$ 910,424.00	Total Deducciones		\$ 64,960.00
			NETO A PAGAR		\$ 845,464.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número:1240

Nombre: CARLOS EDUARDO PIEDRAHITA ESPINAL
Identificación: 1116264764
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NR 16077675

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número: 1239

Nombre: YONIER ALEXANDER MUÑOZ HERNANDEZ
Identificación: 1002744149
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	7.00	\$ 270,667.00	Fondo de salud	0	\$ 10,827.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	7.00	\$ 32,808.00	Fondo de pensión	0	\$ 10,827.00
Total Ingresos		\$ 303,475.00	Total Deducciones		\$ 21,654.00
NETO A PAGAR					\$ 281,821.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número: 1238

Nombre: JOSE MENHELBERT GRISALES HERRERA
Identificación: 1054923211
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: **2023/10/01 - 2023/10/30**
Comprobante Número:**1237**

Nombre: **JUAN MANUEL GALLEGO MEJIA**
Identificación: **1054926067**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	7.00	\$ 270,667.00	Fondo de salud	0	\$ 10,827.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	7.00	\$ 32,808.00	Fondo de pensión	0	\$ 10,827.00
Total Ingresos		\$ 303,475.00	Total Deducciones		\$ 21,654.00
NETO A PAGAR					\$ 281,821.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: **2023/10/01 - 2023/10/30**
Comprobante Número: **1236**

Nombre: **LAURA SOFIA CACERES JIMENEZ**
Identificación: **1010081907**
Cargo: **PALETERA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1.160.000.00	Fondo de salud	0	\$ 46.400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140.606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46.400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número:1235

Nombre: GERARDO DE JESUS SANCHEZ GOMEZ
Identificación: 16221101
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	6.00	\$ 232,000.00	Fondo de salud	0	\$ 9,280.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	6.00	\$ 28,121.00	Fondo de pensión	0	\$ 9,280.00
Total Ingresos		\$ 260,121.00	Total Deducciones		\$ 18,560.00
NETO A PAGAR					\$ 241,561.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30

Comprobante Número: 1234

Nombre: LUIS HERNANDO PUERTA SEPULVEDA

Identificación: 75037584

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	6.00	\$ 232,000.00	Fondo de salud	0	\$ 9,280.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	6.00	\$ 28,121.00	Fondo de pensión	0	\$ 9,280.00
Total Ingresos		\$ 260,121.00	Total Deducciones		\$ 18,560.00
NETO A PAGAR					\$ 241,561.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: **2023/11/01 - 2023/11/30**
Comprobante Número: **1287**

Nombre: **JORGE ENRIQUE VILLA VANEGAS**
Identificación: **85439349**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2023/11/01 - 2023/11/30
Comprobante Número: 1288

Nombre: EDWAR LEANDRO VILLADA MEJIA
Identificación: 75102229
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sligo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/11/01 - 2023/11/30
Comprobante Número: 1281

Nombre: LAURA SOFIA CACERES JIMENEZ
Identificación: 1010081907
Cargo: PALETERA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/11/01 - 2023/11/30
Comprobante Número: 1282

Nombre: JOSE MENHELBERT GRISALES HERRERA
Identificación: 1054923211
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,806.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,806.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
			NETO A PAGAR		\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: **2023/11/01 - 2023/11/30**
Comprobante Número: **1283**

Nombre: **CARLOS EDUARDO PIEDRAHITA ESPINAL**
Identificación: **1116284764**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sligo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/11/01 - 2023/11/30
Comprobante Número: 1284

Nombre: JHON JAIBER CARVAJAL TIQUE
Identificación: 1123161092
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deducciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sligo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/11/01 - 2023/11/30
Comprobante Número: 1285

Nombre: **EDWIN ALBERTO SUAREZ GAMARRA**
Identificación: 77177750
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	\$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	\$ 46,400.00
Total Ingresos		\$ 1,300,606.00	Total Deduciones		\$ 92,800.00
NETO A PAGAR					\$ 1,207,806.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/11/01 - 2023/11/30
Comprobante Número: 1286

Nombre: RUBEN DARIO VANEGAS ARIAS
Identificación: 1114399174
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 77,333.00	Fondo de salud	0	\$ 3,093.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 9,374.00	Fondo de pensión	0	\$ 3,093.00
Total Ingresos		\$ 86,707.00	Total Deducciones		\$ 6,186.00
NETO A PAGAR					\$ 80,521.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Período de Pago: 2023/12/01 - 2023/12/30
Comprobante Número: 1463

Nombre: LAURA SOFIA CACERES JIMENEZ
Identificación: 1010081907
Cargo: PALETERA
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 348,000.00	Fondo de salud	0	\$ 13,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 42,182.00	Fondo de pensión	0	\$ 13,920.00
Total Ingresos		\$ 390,182.00	Total Deducciones		\$ 27,840.00
NETO A PAGAR					\$ 362,342.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
NIT 16077675

Periodo de Pago: 2023/12/01 - 2023/12/30

Comprobante Número: 1464

Nombre: **JOSE MENHELBERT GRISALES HERRERA**

Identificación: 1054923211

Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**

Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	13.00	\$ 502,667.00	Fondo de salud	0	\$ 20,107.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	13.00	\$ 60,929.00	Fondo de pensión	0	\$ 20,107.00
Total Ingresos		\$ 563,596.00	Total Deducciones		\$ 40,214.00
NETO A PAGAR					\$ 523,382.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/12/01 - 2023/12/30
Comprobante Número: 1465

Nombre: **CARLOS EDUARDO PIEDRAHITA ESPINAL**
Identificación: **1116264764**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 348,000.00	Fondo de salud	0	\$ 13,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 42,182.00	Fondo de pensión	0	\$ 13,920.00
Total Ingresos		\$ 390,182.00	Total Deducciones		\$ 27,840.00
			NETO A PAGAR		\$ 362,342.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/12/01 - 2023/12/30
Comprobante Número: 1466

Nombre: **JHON JAIBER CARVAJAL TIQUE**
Identificación: 1123161092
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: \$1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 348,000.00	Fondo de salud	0	\$ 13,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 42,182.00	Fondo de pensión	0	\$ 13,920.00
Total Ingresos		\$ 390,182.00	Total Deducciones		\$ 27,840.00
NETO A PAGAR					\$ 362,342.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/12/01 - 2023/12/30

Comprobante Número: 1467

Nombre: **EDWIN ALBERTO SUAREZ GAMARRA**

Identificación: 77177750

Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**

Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 348,000.00	Fondo de salud	0	\$ 13,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 42,182.00	Fondo de pensión	0	\$ 13,920.00
Total Ingresos		\$ 390,182.00	Total Deducciones		\$ 27,840.00
NETO A PAGAR					\$ 362,342.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siiigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2023/12/01 - 2023/12/30**
Comprobante Número: **1468**

Nombre: **JORGE ENRIQUE VILLA VANEGAS**
Identificación: **85439349**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 348,000.00	Fondo de salud	0	\$ 13,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 42,182.00	Fondo de pensión	0	\$ 13,920.00
Total Ingresos		\$ 390,182.00	Total Deducciones		\$ 27,840.00
			NETO A PAGAR		\$ 362,342.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Silgo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARRIQUE
Nit 16077675

Periodo de Pago: 2023/12/01 - 2023/12/30
Comprobante Número:1469

Nombre: **EDWAR LEANDRO VILLADA MEJIA**
Identificación: **75102229**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **\$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 348,000.00	Fondo de salud	0	\$ 13,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 42,182.00	Fondo de pensión	0	\$ 13,920.00
Total Ingresos		\$ 390,182.00	Total Deducciones		\$ 27,840.00
			NETO A PAGAR		\$ 362,342.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Sigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1. The first part of the document
describes the general situation
and the objectives of the project.
It also mentions the main results
achieved so far.

2. The second part of the document
describes the methodology used
for the data collection and analysis.
It also mentions the main results
achieved so far.





INFORME DE INTERVENTORIA

Ingenieri A

1910

RECEIVED
FEB 10 1910
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

1910

INSTITUTE OF BACTERIOLOGY

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	19/12/2023	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	231 DE 2023
Objeto:	"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"
Nombre Contratista:	ADRIÁN CAMILO HERNÁNDEZ MANRIQUE
Fecha del contrato:	28/06/2023
Plazo de ejecución:	60 DÍAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$271.472.618
Valor ejecutado presente acta:	\$42.675.188
Saldo a liberar:	\$49.770.618
Fecha de iniciación:	24/08/2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	22/10/2023
Nueva fecha de terminación:	21/12/2023
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	60 DÍAS CALENDARIO
Supervisor:	FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	20%
Avance físico Acumulado	100%
Saldo porcentual	0%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.2. Informe de actividades

(Se anexa resumen de ejecución de la obra durante este segundo periodo)

MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS

Actividades de Demolición

- Se realizó esta actividad sobre andenes en mal estado para reponerlos y unos cuerpos en concreto que existían e impedían la correcta ejecución de la obra.

Actividades de Excavación

- Se ejecutan cajeros necesarios para la realización de nuevos andenes planteados hacia la entidad contratante que permitan un mejor flujo peatonal para la comunidad en el sitio de intervención.

Actividades de Retiro de Material Sobrante en Vehículo Automotor

- Durante este periodo de ejecución se han realizado estas actividades de retiro de material sobrante como escombros de demolición, conglomerado extraído y material excavado no apto para conformación de llenos.

Actividades de Alcantarillado

- Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60m para tráfico pesado con logo y araña de refuerzo, En este periodo se instala 1 tapa con el logo de Empocaldas y marcadas con año 2023.

Actividades de Acueducto

- Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula.
- Suministro e instalación de cajas metálicas para contadores, De ellas se repone 1 y se instalan 7 más para tener uniformidad en la obra y así brindar gran funcionalidad al momento de inspeccionar los medidores o contadores del servicio suministrado.

Actividades de Pavimento

- **Corte con disco abrasivo**, Se realizaron dos cortes en los empalmes de la nueva vía a reponer para que tuviera mejor simetría y entrega a la vía por conectar, también se realizó un corte sobre la calle 1 para poder instalar una nueva Te y acople necesario para reponer la red de acueducto nueva. Por último, se realizaron cortes para dilatación de las nuevas losas en concreto vaciadas.
- **Excavación en conglomerado**, se implementa para la extracción de materiales como gravas resistentes, redondeadas, consolidadas y cementadas.
- **Subbase para pavimento**, Se suministra e instala Sub-Base tipo INVIAS requerida en el contrato y se da una compactación con ayuda de un Benitín (Maquinaria semi pesada) Para lograr su óptima instalación, teniendo en cuenta su porcentaje de asentamiento y garantizando al momento de su instalación lograr una densidad por encima del 95% (Según el Ensayo de Densidades, arrojó una densidad del 98%).
- **Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1mts cada metro**, necesario para aumentar las capacidades mecánicas a tensión de los elementos estructurales de concreto (pavimento).
- **Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles**, concreto el cual se utiliza para la conformación de la vía, incluyendo formaletería y sardineles. A la fecha se culmina el vaciado de 46M³ en Concreto hidráulico pre-mezclado para un total de 80.9M³.

Acompañamiento Social, Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se realizó el acompañamiento SISO durante el desarrollo de la obra, también se tuvo acompañamiento social de la profesional encargada en el transcurso de las actividades de socialización, se termina el cierre del trabajo social al final de este periodo una vez terminadas las domiciliarias, el informe social con las actas de vecindad y el cierre se adjuntará con los documentos del acta final o Liquidación.

Actividades no previstas


- Para garantizar una pendiente constante tanto en andenes proyectados y en la nueva vía a pavimentar, se realizó una actividad de sobre excavación en un tramo de la vía para darle estética y funcionalidad a la nueva reposición.
- Para dar garantía y una mejor transición de cargas del pavimento nuevo a vaciar, se propusieron unas losas reforzadas con acero de $\frac{1}{2}$ " para generar un mejor tránsito debido a las posibles cargas y esfuerzos verticales ejercidas por los vehículos. Esta decisión se expuso y se aprovechó el recurso a favor del contrato para ejecutar esta actividad en pro de la obra.
- Se realiza sello elastomérico en las dilataciones o juntas realizadas en las nuevas losas de pavimentos vaciadas para dar garantía del trabajo realizado, se aplica Vulkem 45 SSL.
- Se realizaron 3 escalones conformando una gradería en un sector de la obra que en conjunto con un tramo de sardinel brindaron un mejor direccionamiento de las aguas, así disminuyendo el impacto negativo de las viviendas aledañas por temas de humedades y también brindó mejor tránsito peatonal para las mismas.
- Debido a las lluvias presenciadas durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta la pendiente de la vía y que muy cerca se encuentra el Hospital del municipio, se planteó la construcción de un Sumidero el cual canalice parte del volumen de agua proveniente de lluvias hacia la red de alcantarillado.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución (días):	90 días
Tiempo total transcurrido (días):	90 días
Avance Porcentual:	100.0%

1.4. Registro fotográfico

CARRERA 4, ENTRE CALLES 1 Y CALLE 1 SUR BARRIO PABLO VI

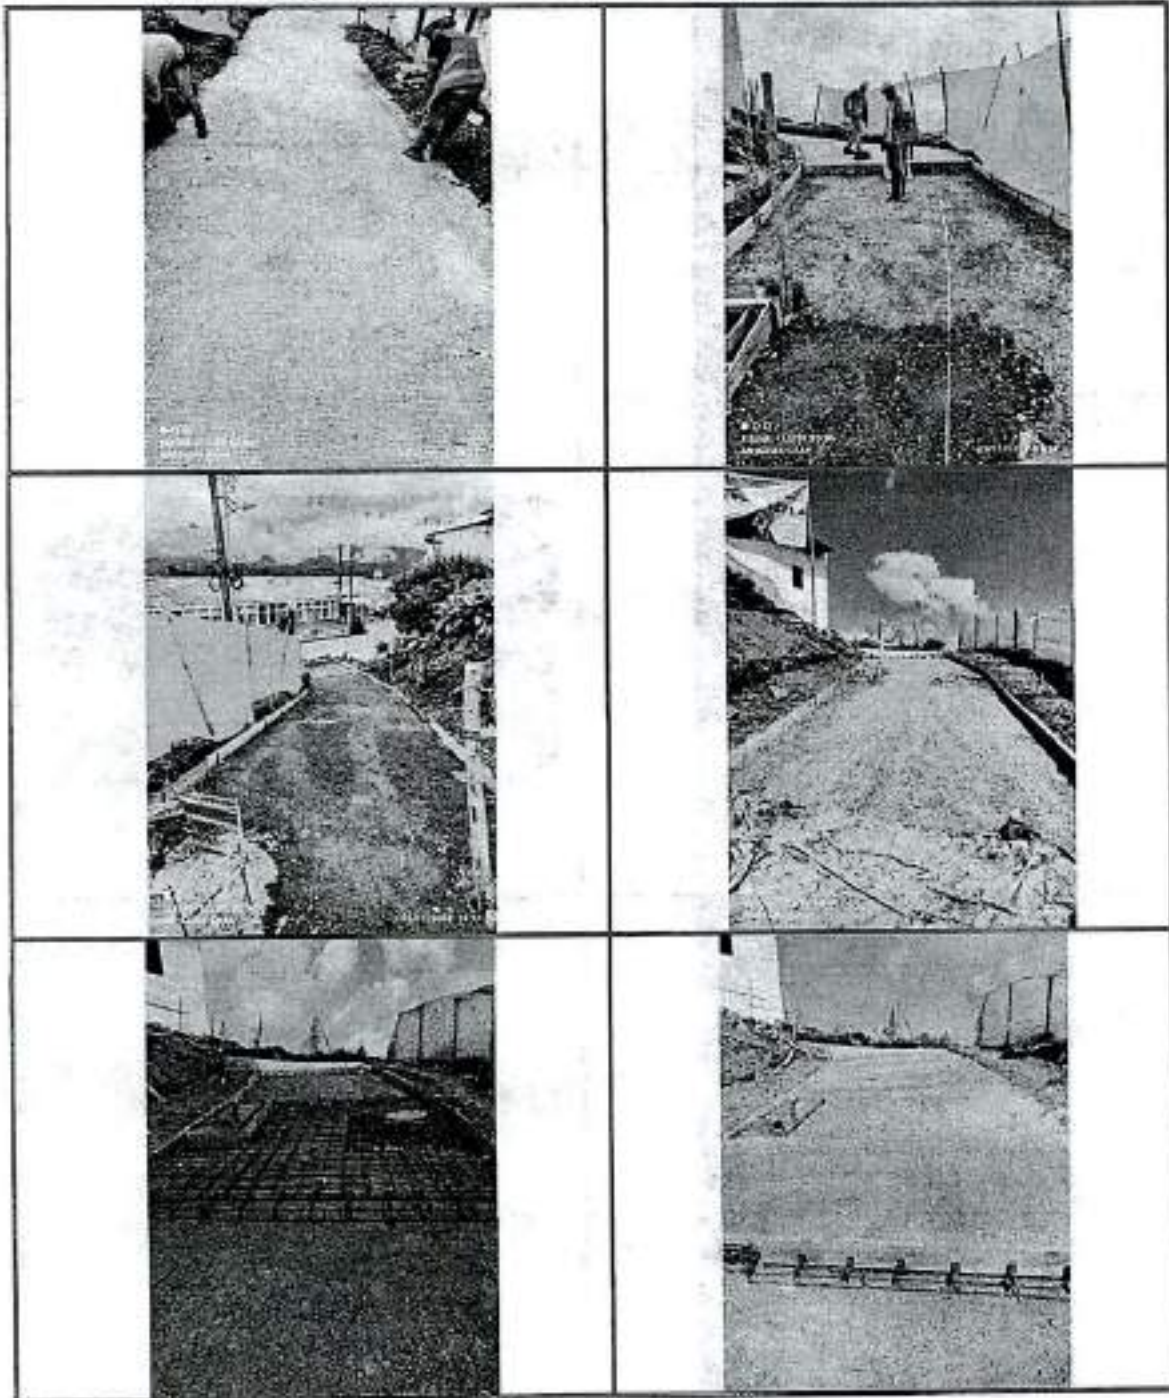










F-00-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

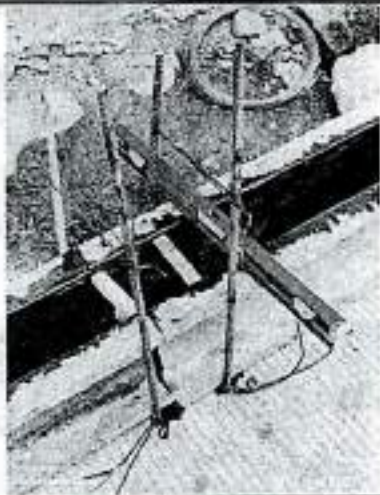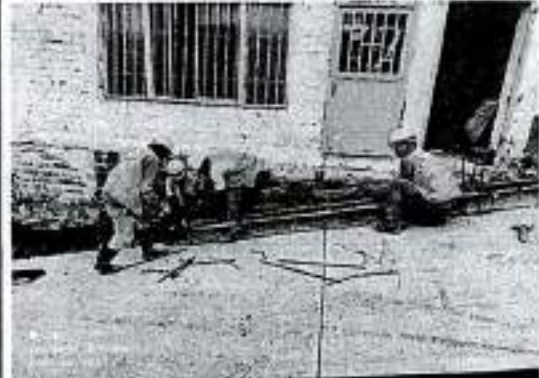

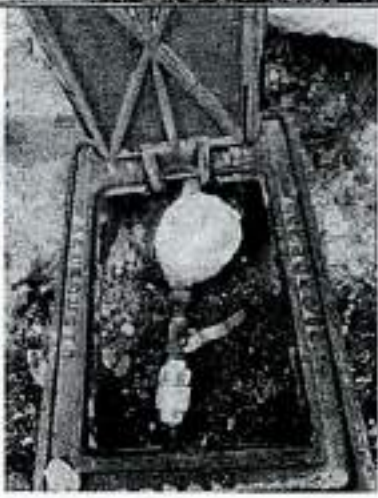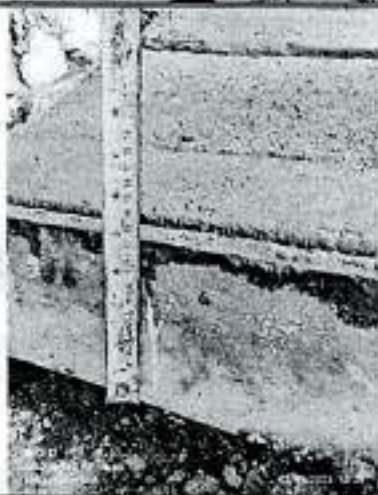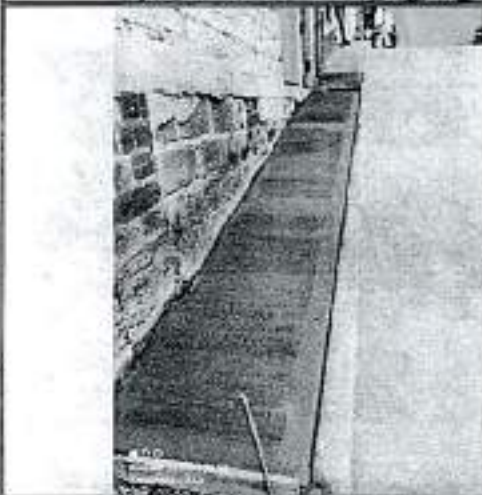




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

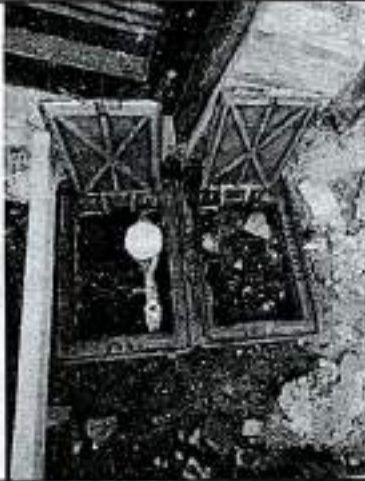




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

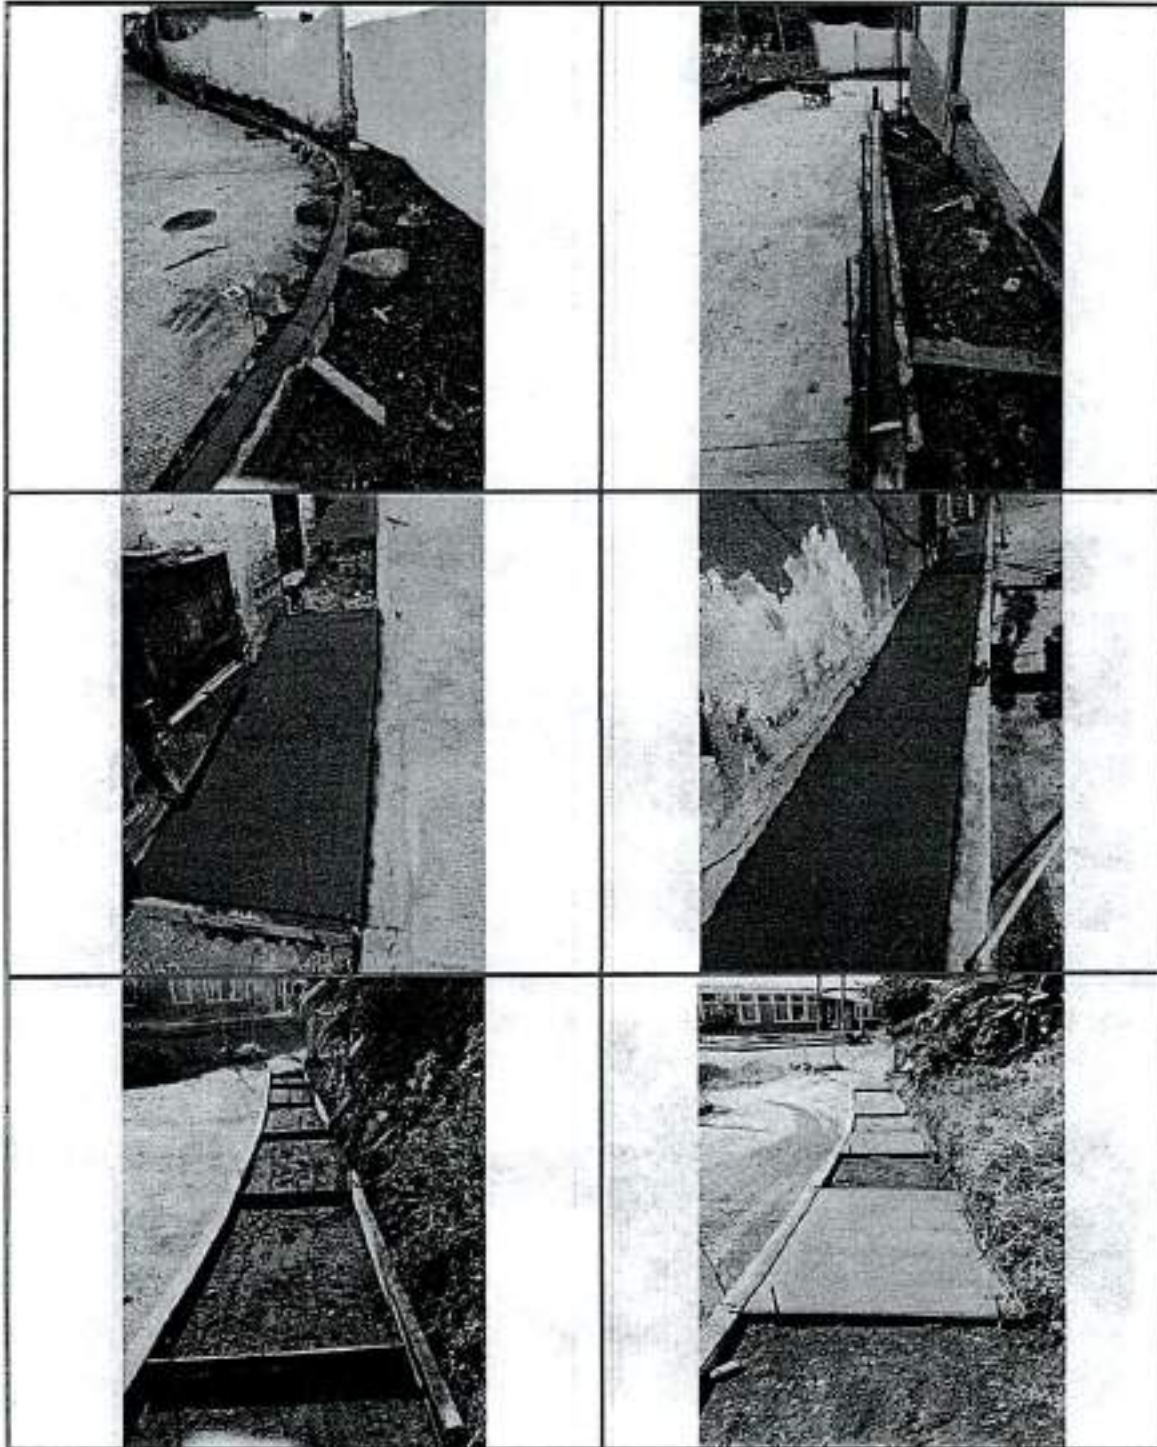





1.5. Problemáticas con la obra

SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE - 2023

La presencia de lluvias afecta el normal desarrollo de las actividades, en la medida que los movimientos de tierra, e instalación de material granular se deben suspender dado que el primero, en condiciones de humedad, genera afectación del estado del terreno y en consecuencia del parámetro de CBR, fundamental para el cumplimiento de las premisas de diseño de la estructura de pavimento, por lo cual, ante la presencia de lluvias se deben suspender actividades de manera inmediata. Por su parte, el material granular de subbase, presenta una densidad óptima a la cual debe ser compactado, de acuerdo con el ensayo Proctor, y en caso de exceder esta humedad por causa de las lluvias, debe ser remezclado e instalado nuevamente, generando pérdida de tiempo y procesos constructivos.





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$271.472.618
Inversión ejecutada en el periodo pasado:	\$179.026.812
Porcentaje ejecutado en el periodo pasado:	65.9%
Inversión ejecutada en el periodo actual:	\$42.675.188
Porcentaje ejecutado en el periodo actual:	15.7%
Inversión total ejecutada:	81.6%
Saldo:	\$49.770.618
Porcentaje total en saldo:	18.3%

2. **CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES** (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	Seguros del Estado S.A.	60-45-101005621	24/08/2023	25/03/2024	\$82.459.769.10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ESTABILIDAD DE LA OBRA	Seguros del Estado S.A.	60-45-101005621	24/08/2023	25/12/2026	\$54.973.179.40

Se anexa pólizas actualizadas.

3. **CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA** (Persona natural)

Se anexa pago seguridad social y parafiscales del contratista.

4. **CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN** (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
04/11/2023	A	N /A	A	N /A	N /A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa memorias de cálculo de cantidades acta No 02 Y FINAL.
6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				0
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		N/A
Acta de veeduría	4	
Acta de convenio de precios	4	
Plan de manejo ambiental		N/A
Ensayos de laboratorio	4	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		N/A
Bitácora de la obra o informe de actividades	4	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	4	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	4	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	4	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	4	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	4	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR



ENSAYOS DE DENSIDAD

Ingenieri



DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO DE ARENA NORMA INVIAS INVE 181-13

CODIGO:	FCN-038
VERSION:	1
FECHA ELABORACION:	11/02/2020

Obra: CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y CALLE 1 SUR ANSERMA - CALDAS
 Material: SUBBASE
 Fuente: RIO RISARALDA
 Fecha de Ensayo: 20 de octubre de 2020

DATOS DE IDENTIFICACION

Prueba N°:	1	2	3	4	5	6
Ubicación/Resacas:	LADO RECAMARA 1	LADO RECAMARA 2	CASA 1 A 10	CASA 1 A 52		
Profundidad (cm):	12,0	12,5	12,0	12,0		
Capa N°:	CAPA 1	CAPA 1	CAPA 1	CAPA 1		
Espesor de la capa ensayada (cm):	15	15	15	15		
Lado:	DERECHO	IZQUIERDO	E/E	IZQUIERDO		

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL MATERIAL EN EL TERRENO

M1=Constante del cono en (g):	1427	1427	1427	1427		
M2=Masa del frasco y arena inicial (g):	6290	6240	6185	6130		
M3=Masa del frasco y arena restante (g):	3348	3595	3180	3500		
M4=Masa arena utilizada para llenar el hueco (g) (M2-M3/A):	1518	1218	1578	1403		
γ_{arena} =Densidad de la arena (g/cm³):	1,287	1,287	1,287	1,287		
VH=Volumen del hueco (m³) (M4/ γ_{arena}):	1170	946	1226	1089		
M5=Masa húmeda del material removido del hueco (g):	2790	2225	2875	2588		
W=humedad del material removido (%):	7,0	7,2	7,0	6,8		
M6=Masa seca del material removido del hueco (g) (M5/(1+W/100)):	2607	2075	2687	2418		
γ_w =Densidad húmeda del material (g/cm³) M5/V:	2,385	2,351	2,345	2,367		
γ_d =Densidad seca del material (g/cm³) M6/V:	2,211	2,190	2,191	2,216		
Peso unitario seco (kN/m³):	21,7	21,8	21,8	21,7		
γ_{max} =Densidad seca máxima de laboratorio (g/cm³):	2,235	2,235	2,235	2,235		
Compactación del terreno γ_r/γ_{max} (%):	98,9	98,1	98,1	98,1		
Porcentaje de compactación especificado (%):	95	95	95	95		
% humedad óptima laboratorio:	7,7	7,7	7,7	7,7		

OBSERVACIONES: _____

 Ingeniero - Gerente Local
 Aux. de Laboratorio

Redondo Apellido: José María Rivera
 Técnico En Obras Civiles
 MP 063713-0902204 5242



DISEÑO DE MEZCLAS

Ingenieri A



EL CAIRO	Diseño de concreto hidráulico	RE CQ 23
Generador:	Gestión de calidad	Versión 1
Fecha de elaboración:	28 de marzo de 2023	Página 1-2

DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA A LA FLEXO TRACCIÓN DE 4.2 MPa

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Asentamiento:	5"
Tamaño máximo nominal:	1"
Módulo de finura de la arena:	2.9
Resistencia a la flexión:	4.2 MPa

La Virginia, Risaralda 28 de Marzo de 2023

Elaboró: 	Aprobó: 
Nombre: Antonio Murillo R.	Nombre: Ing. Camillo Cuellar
Cargo: Laboratorista	Cargo: Jefe de Planta

EL CAIRO	Diseño de concreto hidráulico	RE CQ 23
Generador:	Gestión de calidad	Versión 1
Fecha de elaboración:	15 de octubre de 2022	Página 2-2



CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS

Para realizar el diseño de concreto hidráulico, se utilizaron materiales provenientes del Río Risaralda, procesados en la planta de construcción es El Cairo S.A.S. localizada en la intersección de la quebrada el Cairo y el Río Risaralda; clasificado de la siguiente manera:

- GRUESOS: TRITURADO TAMAÑO MAXIMO 1"
- FINOS: ARENA LAVADA, PROVENIENTE DEL RIO RISARALDA
- CEMENTO: ARGOS
- ADITIVOS: PLASTOL HR-DM CC
EUCON WR-85

A los materiales se les realizaron los siguientes ensayos

- Granulometría de los agregados por separado.
- Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones sulfato de sodio o de magnesio.
- Terrones de arcilla y partículas deleznable. (Grueso y fino).
- Ensayo de partículas planas y alargadas (Relación 5:1)
- Equivalente de arena
- Caras fracturadas
- Peso específico de los agregados
- Índice de alargamiento y aplanamiento.
- Índice de plasticidad.

Elaboró: 	Aprobó: 
Nombre: Antonio Murillo R.	Nombre: Ing. Camilo Cuellar
Cargo: Laboratorista	Cargo: Jefe de Planta

Cliente: _____

Fecha: 28 de marzo de 2023

Proyecto: _____


Procedencia: Rio Risaralda

Material: Arena Meda

Peso inicial muestra húmeda (g)	590,0	humedad (%)	5,4	Peso inicial muestra seca (g)	560,0
---------------------------------	-------	-------------	-----	-------------------------------	-------

TAMIZ		Peso Ret.	Retenido	Ret. acum	Pasa - curva	NORMA NTC 174	
No.	Aber.(mm)	(g)	(%)	(%)	(%)	Mín	Máx
1/2"	12,500	0	0,0	0	100	100	100
3/8"	9,510	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
No 4	4,760	1,6	0,3	0,3	99,7	95	100
No 8	2,380	50,0	8,9	9,2	90,8	80	100
No 16	1,180	150,1	26,8	36,0	64,0	50	85
No 30	0,600	145,0	25,9	61,9	38,1	25	60
No 50	0,300	106,1	18,9	80,9	19,1	10	30
No 100	0,015	90,9	16,2	97,1	2,9	2	10
No 200	0,075	11,3	2,0	99,1	0,9	0	0
pasa 200		5,0	0,9				

CURVA GRANULOMETRICA

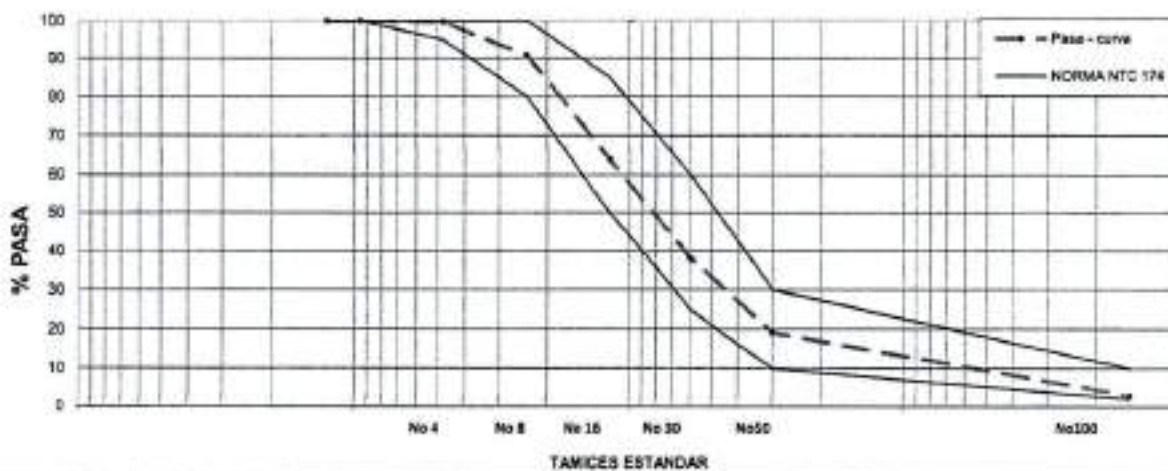

OBSERVACIÓN:

Cumple con las especificaciones del Inviás - 2022

Peso seco material	560,0
Diferencia	5,0
% Pasa tamiz 200	0,9
Módul (2,3 - 3,1)	2,9

Antonio Murillo

Elabora: Antonio Murillo
Laboratorista

Camilo Cuellar
Jefe de planta

Revisó: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

OBRA: _____

FECHA: 28 de marzo de 2023

MATERIAL: Arena Media

28/03/2023

RIO RISARALDA

ENSAYO	1	2	3	PROMEDIO
Lectura nivel de arena (mm)	86,0	87,0	88,0	70
Lectura nivel de arcilla (mm)	126,0	124,0	124,0	
Equivalente de arena (%)	68	70	71	

EQUIVALENTE DE ARENA (%)	70
--------------------------	----

OBSERVACIONES:

Cumple con las especificaciones del Inviás - 2022

ESPECIFICACION INVIAS 2013

MATERIAL	MINIMO (%)
Agregado fino concreto	60
Agregado fino para asfalto	50



Antonio Murillo



Elaboro: Antonio Murillo
Laboratorista



Camilo Cuelar
Jefe de planta

Revisó: Ing. Camilo Cuelar
Jefe de planta

Construcciones EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD		RE CQ 17																					
	CONTENIDO MATERIA ORGANICA																							
	INVIAS E - 212		Versión 2																					
CLIENTE: _____ PROYECTO: _____ MATERIAL: <u>Arena Media</u>		FECHA: <u>28 de marzo de 2023</u> PROCEDENCIA: <u>Río Risaralda</u>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Solución o referencia</th> <th>Contenido de materia orgánica</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Aceptable no contiene</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 a 1</td> <td>Aceptable</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>1 a 2</td> <td>Aceptable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 a 3</td> <td>Aceptable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 a 4</td> <td>Inaceptable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 a 5</td> <td>Inaceptable</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Solución o referencia	Contenido de materia orgánica	Resultado	0	Aceptable no contiene		0 a 1	Aceptable	X	1 a 2	Aceptable		2 a 3	Aceptable		3 a 4	Inaceptable		4 a 5	Inaceptable	
Solución o referencia	Contenido de materia orgánica	Resultado																						
0	Aceptable no contiene																							
0 a 1	Aceptable	X																						
1 a 2	Aceptable																							
2 a 3	Aceptable																							
3 a 4	Inaceptable																							
4 a 5	Inaceptable																							
Observaciones: Cumple con las especificaciones invias -2022		ESPECIFICACIONES																						
Forma de ensayo:	Por medio de paleta con vidrio de colores de referencia.	MATERIAL	MAXIMO																					
		Agregados fino para concreto	3																					
Elaboro: <u>Antonio Murillo</u> Laboratorista		Revisó: <u>Ing. Camilo Cuellar</u> Jefe de planta																						

Construcciones EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD				RE CQ 08																																											
	LIMITE DE ATTERBERG																																															
	NORMA INVIAS E-125 y E-126				Versión 2																																											
CLIENTE: _____ PROYECTO: _____ MATERIAL: <u>Arena Media</u>	FECHA: <u>28 de marzo de 2023</u> PROCEDENCIA: <u>Río Risaralda</u>																																															
LIMITE PLASTICO		1	2	3	HUMEDAD NATURAL																																											
Peso suelo humedo + tara (g)		NL																																														
peso suelo seco + tara (g)																																																
Ww Peso del agua (g)																																																
Peso de la tara (g)																																																
Ws Peso del suelo seco (g)																																																
W Humedo 100 x Ww/Ws (%)																																																
LIMITE LIQUIDO		1	2	3	4	5																																										
No de golpes		NP																																														
peso suelo seco + tara (g)																																																
Ww Peso del agua (g)																																																
Peso de la tara (g)																																																
Ws Peso del suelo seco (g)																																																
W Humedo 100 x Ww/Ws (%)																																																
LIMITE DE ATTERBERG																																																
% DE HUMEDAD	<table border="1" style="width:100%; height: 150px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																															
No DE GOLPES																																																
LIMITE LIQUIDO		N.L	DESCRIPCION: Material arenoso color gris																																													
LIMITE PLASTICO		N.P																																														
INDICE DE PLASTICIDAD		N.P																																														
OBSERVACION: CUMPLE CON ESPECIFICACIONES INVIAS 2022 INDICE DE PLASTICIDAD MÁX. 0																																																
 Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista		 Revisó: Ing. Camilo Cuallar Jefe de planta																																														

<small>Comercio</small> EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD		RE CQ 11																												
	PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO FINO INV E-222		Versión 1																												
Cliente: _____ Obra: _____ Material: <u>Arena Media</u>	Fecha: _____ Fuente: <u>Rio Risaralda</u>	26 de marzo de 2023																													
<table border="1"> <tr> <td>Ensayo #</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Picnometro (Ref.)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura del ensayo °C</td> <td>25,1</td> <td>25,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso picnometro + agua (curva) a T °C (B)</td> <td>671,5</td> <td>676,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso muestra S.S.S (Grs) (S)</td> <td>500,0</td> <td>500,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso picnometro + agua + muestra (Grs) (C)</td> <td>980,8</td> <td>984,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de la muestra seca (Grs) (A)</td> <td>489,4</td> <td>488,5</td> <td></td> </tr> </table>	Ensayo #	1	2		Picnometro (Ref.)	1	2		Temperatura del ensayo °C	25,1	25,1		Peso picnometro + agua (curva) a T °C (B)	671,5	676,1		Peso muestra S.S.S (Grs) (S)	500,0	500,0		Peso picnometro + agua + muestra (Grs) (C)	980,8	984,7		Peso de la muestra seca (Grs) (A)	489,4	488,5				
Ensayo #	1	2																													
Picnometro (Ref.)	1	2																													
Temperatura del ensayo °C	25,1	25,1																													
Peso picnometro + agua (curva) a T °C (B)	671,5	676,1																													
Peso muestra S.S.S (Grs) (S)	500,0	500,0																													
Peso picnometro + agua + muestra (Grs) (C)	980,8	984,7																													
Peso de la muestra seca (Grs) (A)	489,4	488,5																													
<table border="1"> <tr> <td>Peso Especifico Aparente $A / (B+S-C)$</td> <td>2,566</td> <td>2,552</td> <td>2,559</td> </tr> <tr> <td>Peso Especifico Aparente S.S.S $S / (B+S-C)$</td> <td>2,622</td> <td>2,612</td> <td>2,617</td> </tr> <tr> <td>Peso Especifico Nominal $A / (B+A-C)$</td> <td>2,717</td> <td>2,715</td> <td>2,716</td> </tr> <tr> <td>Absorción $((S - A) / A) * 100$</td> <td>2,17</td> <td>2,35</td> <td>2,26</td> </tr> </table>	Peso Especifico Aparente $A / (B+S-C)$	2,566	2,552	2,559	Peso Especifico Aparente S.S.S $S / (B+S-C)$	2,622	2,612	2,617	Peso Especifico Nominal $A / (B+A-C)$	2,717	2,715	2,716	Absorción $((S - A) / A) * 100$	2,17	2,35	2,26															
Peso Especifico Aparente $A / (B+S-C)$	2,566	2,552	2,559																												
Peso Especifico Aparente S.S.S $S / (B+S-C)$	2,622	2,612	2,617																												
Peso Especifico Nominal $A / (B+A-C)$	2,717	2,715	2,716																												
Absorción $((S - A) / A) * 100$	2,17	2,35	2,26																												
Observaciones:																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisó: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta </div> </div>																															

<small>CONSTRUCCIONES</small> EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			RE CQ 09
	DENSIDAD BULK DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO NORMA INV E-217-13			Versión 2
Cliente : _____ Proyecto: _____ Material : <u>Arena Media</u>	Fecha: <u>28 de marzo de 2023</u> Procedencia: <u>Rio Risaralda</u>			
DENSIDAD BULK DEL MATERIAL SUELTO				
Ensayo	1	2	3	Promedio
Peso del material + molde (g)	9090	9036	9083	
Peso del molde (g)	5754	5754	5754	
Volúmen del molde (cm ³)	2114	2114	2114	
Densidad bulk material suelto (Kg/m ³)	1578	1553	1565	1565
DENSIDAD BULK DEL MATERIAL COMPACTO				
Ensayo	1	2	3	Promedio
Peso del material + molde (g)	9422	9445	9450	
Peso del molde (g)	5754	5754	5754	
Volúmen del molde (cm ³)	2114	2114	2114	
Densidad bulk material compacto (Kg/m ³)	1735	1746	1748	1743
Observaciones:				
 Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista		 Revisó: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta		

Construcciones EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD		RE CQ 25
	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES		
	I.N.V. E - 211		Version 01

CLIENTE:	_____	FECHA:	28 de marzo de 2023
OBRA:	_____	PROCEDENCIA:	RIO RISARALDA
MATERIAL:	Arena media		

TERRONES DE ARCILLA CON PONDERACIÓN A LA GRANULOMETRÍA

FRACCION FINA		Peso seco (g)	Peso despues de lavado (g)	Terrones de arcilla	Gradación Original (%)	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES (%)
PASA	RETIENE					
3/8"	N°. 4	-	-	-	-	-
N°. 4	N°. 16	94,2	93,9	0,32	44,7	0,32
TOTAL		94,2	93,9	0,32	44,66	0,32

Terrones de arcilla y partículas delez. del Agregado Fino = **0,32**

Cumple con las especificaciones del Inviás - 2022

OBSERVACIONES:	ESPECIFICACIONES INVIAS 2013	
	MATERIAL	NORMA
	AGREGADO GRUESO (Estructural)	0,25 % Máx
	AGREGADO FINO (Estructural)	1,0 % Máx
	AGREGADO GRUESO (Pavimento)	3 % Máx
	AGREGADO FINO (Pavimento)	3 % Máx

 Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista	 Revisó: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta
--	--

CLIENTE: _____ 28/03/2023 28 de marzo de 2023
 OBRA: _____
 TIPO DE MATERIAL: Arena media PROCEDENCIA: RIO RISARALDA
 TIPO DE SULFATO: SULFATO DE SODIO N° DE CICLOS: 5

TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
2 1/2	2	-	-	-	-	-	-
2	1 1/2	-	-	-	-	-	-
1 1/2	1	-	-	-	-	-	-
1	3/4	-	-	-	-	-	-
3/4	1/2	-	-	-	-	-	-
1/2	3/8	-	-	-	-	-	-
3/8	4	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

PERDIDA DE FRACCION GRUESA (%)

-

TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
3/8	No. 4	0,3	-	-	-	-	-
No. 4	No. 8	8,9	100,0	97,5	2,5	2,5	0,22
No. 8	No. 16	26,8	100,0	98,1	1,9	1,9	0,51
No. 16	No. 30	25,9	100,0	98,4	1,6	1,6	0,41
No. 30	No. 50	18,9	100,0	95,0	4,0	4,0	0,76
TOTAL		80,9	400,0	390,0	10,0	2,5	1,90

PERDIDA DE FRACCION FINA (%)

2,4

ESPECIFICACION INVIAS - 2022

	VALOR MAXIMO PERMITIDO	
	Sodio (Na) %	Magnesio (Mg) %
CONCRETO HIDRAULICO	10	16
MEZCLA ASFALTICA	N/A	16
BASE GRANULAR	12	16
SUB-BASE GRANULAR	12	16

OBSERVACIONES:

Antonio Murillo

Elabora: Antonio Murillo
Laboratorista

Cecilia Cuellar
Jefe de planta

Revisó: Ing. Cecilia Cuellar
Jefe de planta

CLIENTE: _____

FECHA: 28 de marzo de 2023

OBRA: _____

TIPO DE MATERIAL: Arena media

PROCEDENCIA: RIO RISARALDA

TIPO DE SULFATO: Sulfato de magnesio

N° DE CICLOS: 5

TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
2 1/2	2	-	-	-	-	-	-
2	1 1/2	-	-	-	-	-	-
1 1/2	1	-	-	-	-	-	-
1	3/4	-	-	-	-	-	-
3/4	1/2	-	-	-	-	-	-
1/2	3/8	-	-	-	-	-	-
3/8	4	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

PERDIDA DE FRACCION GRUESA (%)

-

TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
3/8	No. 4	0,3	-	-	-	-	-
No. 4	No. 8	8,9	100,0	99,8	0,2	0,2	0,02
No. 8	No. 16	26,8	100,0	99,7	0,3	0,3	0,08
No. 16	No. 30	25,9	100,0	98,9	1,1	1,1	0,28
No. 30	No. 50	18,9	100,0	97,8	2,2	2,2	0,42
TOTAL		80,9	400,0	396,2	3,8	1,0	0,80

PERDIDA DE FRACCION FINA (%)

1,0

ESPECIFICACION INVIAS - 2013

	VALOR MAXIMO PERMITIDO	
	Sodio (Na) %	Magnesio (Mg) %
CONCRETO HIDRAULICO	10	15
MEZCLA ASFALTICA	N/A	18
BASE GRANULAR	12	18
SUB-BASE GRANULAR	12	18

OBSERVACIONES:

Antonio Murillo

Elaboro: Antonio Murillo
Laboratorista

Camilo Cuellar
Jefe de planta

Revisó: Ing. Camilo Cuellar Cepeda
Jefe de planta

Cliente: _____
 Proyecto: _____
 Material: Agregado 1"
 TRITURADORA: Mem


Fecha: 28 de marzo de 2023

Precedencia: Rio Risaralda

Peso inicial muestra húmeda (g) 5995,0 humedad (%) 1,0 Peso inicial muestra seca (g) 5933,0

TAMIZ		Peso Ret.	Retenido	Ret. acum	Pasa - curva	NORMA NTC 174 AGR 57	
No.	Aber.(mm)	(g)	(%)	(%)	(%)	Mín	Máx
1" 1/2	25	0	0	0	100	100	100
1"	19,000	0	0,0	0,0	100,0	95	100
1/2"	9,510	3440,2	58,0	58,0	42,0	25	80
N° 4	4,760	1894,4	31,9	89,9	10,1	0	10
N° 8	2,360	505,2	8,5	98,4	1,6	0	5
N° 200	0,075	120,4	2,0	100,5	-0,5	0	0
FONDO		-27,2	-0,5	100,0	0,0	0	0

CURVA GRANULOMETRICA

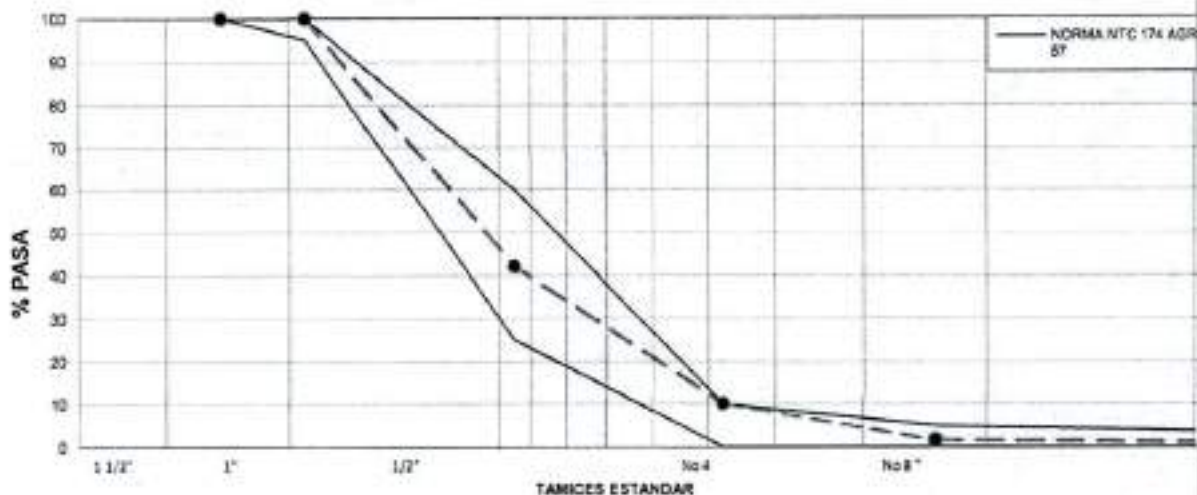

OBSERVACIÓN:
 Cumple con las especificaciones del Invias - 2022

Peso seco material:	5933,0
Diferencia	-27,2
% Pasa tamiz 200	-0,5

Antonio Murillo

Elabora: Antonio Murillo
 Laboratorista

Camilo Cuellar
 Jefe de planta

Revisa: Ing. Camilo Cuellar
 jefe de planta

EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD		RE CQ 02
	ENSAYO DE CARAS FRACTURADAS		
	INV E - 227		Versión 1

CLIENTE: _____ OBRA: _____ MATERIAL: <u>Agregado 1"</u> TRITURADORA: <u>Mam</u>	PROCEDENCIA: <u>28 de marzo de 2023</u> FECHA: <u>Río Risaralda</u>
--	--

Fracciones		Muestra inicial (g)	Material caras fract. (g)	Caras fracturadas (g)	Gradación original (g)	Corregido
Pasa	Retiene					
1" 1/2	1"	-	-	-	-	-
1"	3/4 "	800,0	550	68,8%	13,5	9,3
3/4 "	1/2"	2640,2	1950	73,8%	44,5	32,8
1/2"	3/8 "	684,2	600	87,7%	11,5	10,1
TOTAL					69,5	52,3


% CARAS FRACTURADAS (UNA CARA)	75
---------------------------------------	-----------



Fracciones		Muestra inicial (g)	Material caras fract. (g)	Caras fracturadas (g)	Gradación original (g)	Corregido
Pasa	Retiene					
1" 1/2	1"	-	-	-	-	-
1"	3/4 "	800,0	200	25,0%	13,5	3,4
3/4 "	1/2"	2640,2	1440	54,5%	44,5	24,3
1/2"	3/8 "	684,2	500	73,1%	11,5	8,4
TOTAL					69,5	36,1



% CARAS FRACTURADAS (DOS CARAS)	52
--	-----------




OBSERVACIONES:
 Cumple con las especificaciones del Inviás - 2022



ESPECIFICACIONES INVÍAS - 2013		
MATERIAL	CARAS FRACTURAD	NORMA
Triturado para concreto hidráulico	UNA CARA	60 % Min
Triturado para mezcla asfáltica	UNA CARA	75 % Min
	DOS CARA	60 % Min

 Elabora: Antonio Munillo Laboratorista	 Reviso: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta
--	--

<small>CONSTRUCIONES</small> EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD				RE CQ 04	
	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO					
	INV E-230				Versión 1	
CLIENTE:	_____			FECHA:	28 de marzo de 2023	
OBRA:	_____			PROCEDENCIA:	Río Risaralda	
MATERIAL:	Agregado 1"					
TRITURADORA:	Mem					
Tamaño	Gradación original	Peso muestra	Peso material con alargamiento	Índice de alargamiento	Alargamiento corregido	
	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)	
1" - 3/4"	13,5	800	60,5	7,6	102,0	
3/4" - 1/2"	44,5	2640,2	376,0	14,2	633,7	
1/2" - 3/8"	11,5	684,2	280,0	40,9	471,9	
3/8" - 1/4"	16,9	1000	360,0	36,0	606,8	
TOTAL	86,4				1814,4	
ÍNDICE DE ALARGAMIENTO (%)			21			
Tamaño	Gradación original	Peso muestra	Peso material	Índice de Aplanamiento	Aplanamiento corregido	
	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)	
1" - 3/4"	13,5	800	51,0	6,4	86,0	
3/4" - 1/2"	44,5	2640,2	220,0	8,3	370,8	
1/2" - 3/8"	11,5	684,2	200,0	29,2	337,1	
3/8" - 1/4"	16,9	1000	210,0	21,0	354,0	
TOTAL	86,4				1147,8	
ÍNDICE DE APLANAMIENTO (%)			13			
OBSERVACIONES: Cumple con la especificación del Inviás - 2022				ESPECIFICACIONES INVIAS 2013		
				DESCRIPCIÓN	NORMA(MAX)	
				Índ. Alargamiento	25%	
				Índ. Aplanamiento	25%	
 Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista				 Reviso: Ing. Camilo Cuelar Jefe de planta		

<small>Empresas</small> EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD					RE CQ 04
	ENSAYO DE PARTÍCULA PLANAS Y ALARGADAS (RELACIÓN 5:1)					
INV.E-240					Versión 1	
CLIENTE: _____ OBRA: _____ MATERIAL: <u>Agregado 1"</u> TRITURADORA: <u>Mem</u>	FECHA: <u>26 de marzo de 2023</u> PROCEDENCIA: <u>Rio Rissalda</u>					
TAMAÑO DE LA FRACCIÓN	peso material gradación original	Gradación Original	Muestra de ensayo	partículas planas y alargadas	partículas planas y alargadas	partículas planas y alargadas corregidas.
	(g)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
1"-3/4"	800,0	-	-	-	-	-
3/4"-1/2"	2640,2	44,5	2640,2	2,0	0,1	3,4
1/2"-3/8"	684,2	11,5	684,2	4,9	0,7	8,3
3/8"-No4	1210,2	20,4	669,4	8,0	1,4	28,7
Totales	4634,6	76,4				40,3
Ensayo de partículas planas y Alargadas (%)			0,53			
Observaciones:			ESPECIFICACIÓN INVIAS 2013			
Cumple con la especificación del Invias - 2022			Agregados para concreto		10 (%) máximo	
 Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista			 Reviso: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta			

	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD		RE CQ 10
	PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO INV E-223		Versión 1
Cliente: _____ Proyecto: _____ Material: <u>Agregado 1*</u>	Fecha: 28 de marzo de 2023 Trituradora: Man Fuente: RIO RISARALDA		
Ensayo #	1	2	Promedio
peso en el aire de la muestra seca (g) (A)	6695,1	6514,3	6704,7
Peso en el aire sss (g) (B)	6980,0	6670,6	6825,3
Peso muestra sumergida en agua (g) (C)	4362,3	4196,5	4279,4
Peso Específico Aparente (A / B-C)	2,634	2,633	2,634
Peso Específico Aparente S.S.S (B / B-C)	2,666	2,696	2,681
Peso Específico Nominal (A / A-C)	2,722	2,811	2,766
Absorción ((B - A) / A) * 100	1,23	2,40	1,82
OBSERVACIONES:			
 Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista	 Reviso: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta		

<small>Construcción</small> EL CAIRO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			RE CQ 09
	DENSIDAD BULK DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO NORMA INV E-217-13			Versión 2
Cliente : _____ Proyecto: _____ Material : <u>Agregado 1"</u>	Fecha: <u>28 de marzo de 2023</u> Trituradora: <u>Mam</u> Procedencia: <u>Río Risaralda</u>			
DENSIDAD BULK DEL MATERIAL SUELTO				
Ensayo	1	2	3	Promedio
Peso del material + molde (g)	20152	20114	20189	
Peso del molde (g)	11260	11260	11260	
Volúmen del molde (cm ³)	5636	5636	5636	
Densidad bulk material suelto (Kg/m ³)	1578	1571	1584	1578
DENSIDAD BULK DEL MATERIAL COMPACTO				
Ensayo	1	2	3	Promedio
Peso del material + molde (g)	20856	20838	20891	
Peso del molde (g)	11260	11260	11260	
Volúmen del molde (cm ³)	5636	5636	5636	
Densidad bulk material compacto (Kg/m ³)	1703	1699	1709	1704
OBSERVACIONES:				
 Elaboro: Antonio Murillo Laboratorista		 Reviso: Ing. Camilo Cuellar Jefe de planta		

CLIENTE: _____

FECHA: 29 de marzo de 2023

OBRA: _____

TRITURADORA: Men

MATERIAL: Agregado 1*

PROCEDENCIA: RIO RISARALDA

TERRONES DE ARCILLA CON PONDERACIÓN A LA GRANULOMETRÍA

FRACCION FINA		Peso seco (g)	Peso despues de lavado (g)	Terrones de arcilla	Gradación Original (%)	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES (%)
PASA	RETIENE					
3/8"	N°. 4	-	-	-	-	-
N°. 4	N°. 16	95,6	94,9	0,73	8,6	0,73
TOTAL		95,6	94,9	0,73	8,60	0,73

FRACCION GRUESA		Peso seco (g)	Peso despues de lavado (g)	Terrones de arcilla (%)	Gradación Original (%)	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES (%)
PASA	RETIENE					
-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
3/4"	3/8"	2050,2	2049,5	0,03	56,6	0,03
3/8"	N°4	1122,6	1122,0	0,05	20,6	0,01
TOTAL		3172,8	3171,5	0,09	77,2	0,04

Terrones de arcilla y particulas delez. del Agregado grueso = 0,04

Terrones de arcilla y particulas delez. del Agregado Fino = 0,73

OBSERVACIONES:

Cumple con la especificación del Inviás - 2022

ESPECIFICACIONES INVIAS 2013

MATERIAL	NORMA
AGREGADO GRUESO (Estructural)	0.25 % Máx
AGREGADO FINO (Estructural)	1.0 % Máx
AGREGADO GRUESO (Pavimento)	3 % Máx
AGREGADO FINO (Pavimento)	3 % Máx

Antonio Murillo P.

Elaboro: Antonio Murillo
Laboratorista

Camilo Cuellar
Jefe de planta

Revisó: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

CLIENTE: _____

FECHA: 28 de marzo de 2023

OBRA: _____

TIPO DE MATERIAL: Agregado 1"

PROCEDENCIA: RIO RISARALDA

TIPO DE SULFATO: Sulfato de magnesio

N° DE CICLOS: 5

TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
2 1/2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1 1/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 1/2"	3/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3/4"	3/8	56,5	1506,3	1498,0	8,3	0,6	0,3
3/8	4	20,5	344,1	320,0	24,1	7,0	1,4
TOTAL		77,2	1850,4	1818,0	32,4	1,6	1,6

PERDIDA DE FRACCION GRUESA (%)

2,3

TAMANO DEL AGREGADO		% RET. GRADACION ORIGINAL	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	PERDIDA EN PESO (g)	PERDIDA REAL (%)	PERDIDA CORREGIDA (%)
PASA	RETIENE						
No. 4	No. 8	0,0	0,0	98,7	0,0	0,0	0,0
No. 8	No. 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No. 16	No. 30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No. 30	No. 50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		0,0	0,0	98,7		0,0	0,0

PERDIDA DE FRACCION FINA (%)

0,0

ESPECIFICACION INVIAS - 2013

	VALOR MAXIMO PERMITIDO	
	Sodio (Na) %	Magnesio (Mg) %
CONCRETO HIDRAULICO	10	15
MEZCLA ASFALTICA	N/A	18
BASE GRANULAR	12	18
SUB-BASE GRANULAR	12	18

OBSERVACION

Cumple con la especificación del Inviás - 2022

Antonio Murillo

Elaboro: Antonio Murillo
Laboratorista

Camilo Cuellar
Camilo Cuellar
LABORATORIO

Reviso: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

PLASTOL HR – DM CC

Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto con moderado retardo

Descripción

PLASTOL HR – DM CC es un aditivo reductor de agua de alto rango, con moderado retardo, diseñado para producir concretos con mayor tiempo de manejabilidad.

PLASTOL HR – DM CC no contiene cloruros u otros materiales con potencial de oxidación.

PLASTOL HR – DM CC cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-494 como Tipo D y G. ASTM C-1017 Especificaciones de aditivos químicos usados en la fabricación de concreto fluido.

Información Técnica

Apariencia : Líquido de baja viscosidad

Color : Café

Densidad : 1,09 kg/l +/- 0,02 kg/l

Usos

PLASTOL HR – DM CC es especialmente recomendado cuando se requiere:

- Concreto con relación agua / cemento bajo.
- Concretos para estructuras hidráulicas, enterradas o en contacto permanente con agua.
- Concretos bombeables.
- Para lograr plasticidad en concretos para lanzamiento vía húmeda.
- En procesos constructivos como formaletas deslizantes en donde se requiere alta manejabilidad y excelentes acabados.
- En general para todos los propósitos de un concreto premezclado.
- Concreto de alto desempeño.

Ventajas

- PLASTOL HR – DM CC provee una excelente manejabilidad.
- Permite el uso de un solo aditivo cuando se requiere reducción de agua y alta manejabilidad.
- Genera reducciones de agua típicas para aditivos de alto rango: 5% a 25%.
- Provee una alta calidad en el acabado de los prefabricados.
- Reduce la permeabilidad del concreto.
- Ideal cuando se emplean arenas de módulo de finura altos.
- Se puede trabajar como reductor de agua de alto poder, como aditivo de rango medio y como plastificante tipo G-
- Otorga a las mezclas excelentes resistencias mecánicas.

Dosificación

PLASTOL HR – DM CC puede ser usado a dosis de 0.20% a 1.20% del peso del cemento, es decir, de 183 ml a 1100 ml por cada 100 kg de cemento, según la reducción de agua requerida.

Dado que la dosis del aditivo depende de las características de los materiales que se usen en el diseño, así como de la temperatura y humedad relativa del medio ambiente, recomendamos consultar con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT, para efectuar las mezclas previas necesarias y determinar la dosificación óptima en función de sus materiales.

ADITIVOS

PLASTOL HR – DM CC

TX40T830

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial de Guaymas S.R.L. - 147 - Guaymas

San Luis Potosí

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

PLASTOL HR – DM CC

Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto con moderado retardo

Aplicación

PLASTOL HR – DM CC debe ser adicionado preferiblemente al agua de amasado o al concreto antes de la colocación, no debe ser colocado al cemento seco o sobre otros aditivos hasta que éstos estén completamente incorporados en la mezcla. Para incrementar el asentamiento se adiciona a una mezcla de consistencia normal para obtener una mezcla con características de concreto bombeable. Para cualquiera de las anteriores aplicaciones es fundamental que el tiempo de mezclado una vez se adiciona el aditivo sea como mínimo de 5 a 10 minutos, esto con el fin de permitir que el aditivo se incorpore adecuadamente a la mezcla de concreto.

PLASTOL HR – DM CC puede ser dosificado con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.

Recomendaciones Especiales

- Se deben realizar pruebas de comportamiento y compatibilidad con el cemento y con los materiales a utilizar haciendo concretos a nivel de laboratorio, de esta manera se establecen dosis y comportamiento esperado, las dosis establecidas en esta Hoja Técnica son una guía.
- No es compatible con aditivos base Naftenosulfonato.
- No adicione simultáneamente con otros aditivos.
- Para la homologación de este producto en laboratorio, consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- Si se va a utilizar en conjunto con aditivos incorporadores de aire, se deben realizar ensayos previos para establecer la dosis adecuada.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

PLASTOL HR – DM CC debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y en áreas ventiladas con temperatura entre 5°C y 35°C.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento
- 6 meses a granel en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 20 kg
Tambor : 220 kg
Granel

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visita nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Octubre 21 de 2020

CONSTRUCCIONES
EL CAIRO

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - CONCRETO HIDRÁULICO

TIPO DE CONCRETO : MR 4,2 Mpa
 CUENTE : HISTORIAL DE RESISTENCIAS
 OBRA: VARIAS

Resistencia especificada (Mpa)	Fecha Vaciado	Fecha ensayo	Edad muestra (días)	Resistencia obtenida (Mpa)	Desarrollo resistencia (%)	Asentamiento (Pulg)	Observaciones
4,2	08/07/2022	15/07/2022	7	4,02	96,8	7,50	
				4,11			
		05/08/2022	28	4,56	109,5		
				4,64			
4,2	31/08/2022	07/09/2022	7	3,90	93,2	6,00	
				3,93			
		28/09/2022	28	4,65	110,2		
				4,60			
4,2	05/09/2022	12/09/2022	7	3,75	90,7	7,00	
				3,88			
		03/10/2022	28	4,52	105,8		
				4,36			
4,2	07/09/2022	14/09/2022	7	3,98	94,2	6,50	
				3,93			
		05/10/2022	28	4,32	102,1		
				4,25			
4,2	09/09/2022	16/09/2022	7	4,31	103,3	7,50	
				4,37			
		07/10/2022	28	4,74	111,8		
				4,66			
4,2	12/09/2022	19/09/2022	7	4,04	96,2	7,00	
				4,05			
		10/10/2022	28	4,90	117,0		
				4,93			
4,2	14/09/2022	21/09/2022	7	4,39	102,3	7,50	
				4,21			
		12/10/2022	28	4,76	110,5		
				4,53			

Antonio Murillo P.

Elaboro: Antonio Murillo
Laboratorista

Camilo Cuellar
Jefe de planta

Reviso: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

Construcciones EL CAIRO		LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - CONCRETO HIDRÁULICO					
		TIPO DE CONCRETO :		MR 4,2 Mpa			
		CLIENTE :		HISTORIAL DE RESISTENCIAS			
		OBRA:		VARIAS			
Resistencia especificada (Mpa)	Fecha Vaciado	Fecha ensayo	Edad muestra (días)	Resistencia obtenida (Mpa)	Desarrollo resistencia (%)	Asentamiento (Pulg)	Observaciones
4,2	15/09/2022	22/09/2022	7	4,05	96,6	7,50	
				4,06			
		13/10/2022	28	4,82	114,0		
				4,76			
4,2	19/09/2022	26/09/2022	7	4,58	109,2	8,00	
				4,59			
		17/10/2022	28	4,92	117,6		
				4,96			
4,2	20/09/2022	27/09/2022	7	4,07	97,2	8,00	
				4,10			
		18/10/2022	28	4,53	106,2		
				4,39			
4,2	21/09/2022	28/09/2022	7	4,49	107,4	8,00	
				4,53			
		19/10/2022	28	4,59	109,7		
				4,63			
4,2	23/09/2022	30/09/2022	7	4,42	103,1	5,00	
				4,24			
		21/10/2022	28	4,89	116,4		
				4,89			
4,2	26/09/2022	03/10/2022	7	4,30	99,3	6,00	
				4,04			
		24/10/2022	28	5,27	120,6		
				4,86			
4,2	27/09/2022	04/10/2022	7	4,25	100,5	6,00	
				4,19			
		25/10/2022	28	4,66	113,2		
				4,84			

Antonio Murillo

Elaboro: Antonio Murillo
Laboratorista

Camilo Cuellar

Reviso: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

Construcciones EL CAIRO		LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - CONCRETO HIDRÁULICO					
		TIPO DE CONCRETO :		MR 4,2 Mpa			
		CLIENTE :		HISTORIAL DE RESISTENCIAS			
		OBRA:		VARIAS			
Resistencia especificada (Mpa)	Fecha Vaciado	Fecha ensayo	Edad muestra (días)	Resistencia obtenida (Mpa)	Desarrollo resistencia (%)	Asentamiento (Pulg)	Observaciones
4,2	28/09/2022	05/10/2022	7	4,14	96,5	7,00	
				3,97			
		26/10/2022	28	4,77	113,9		
				4,79			
4,2	29/09/2022	06/10/2022	7	4,90	115,3	5,00	
				4,79			
		27/10/2022	28	5,28	127,9		
				5,46			
4,2	30/09/2022	07/10/2022	7	4,39	103,0	7,00	
				4,26			
		28/10/2022	28	5,08	118,7		
				4,89			
4,2	03/10/2022	10/10/2022	7	4,18	101,4	7,50	
				4,34			
		31/10/2022	28	5,42	124,4		
				5,03			
4,2	04/10/2022	11/10/2022	7	4,25	101,7	7,00	
				4,29			
		01/11/2022	28	4,83	115,4		
				4,86			
4,2	05/10/2022	12/10/2022	7	4,18	100,6	7,00	
				4,27			
		02/11/2022	28	4,84	114,1		
				4,75			

Antonio Murillo

Elaboro: Antonio Murillo
Laboratorista

Camilo Cuellar

Reviso: Ing. Camilo Cuellar
Jefe de planta

EUCON WR 85

Aditivo reductor de agua de rango medio y retardante

ADITIVOS

EUCON WR 85

TX40T601

Descripción

EUCON WR 85 es un aditivo líquido, reductor de agua, de prolongado tiempo de manejabilidad para concreto. EUCON WR 85 está formulado para dar un óptimo desempeño en concretos que requieren reducir agua o que va a ser trabajado en ambientes de alta temperatura.

EUCON WR 85 no contiene cloruro de calcio y otros materiales con potencial de oxidación.

EUCON WR 85 es compatible con Incorporadores de aire, impermeabilizantes, aditivos base cloruro de calcio, etc., siempre que se adicionen separados a la mezcla.

EUCON WR 85 cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-494, Tipo D.

Información Técnica

Apariencia : Líquido de color café oscuro
Densidad : 1.17 kg/l +/- 0.02 kg/l

Usos

- Concreto general y/o de uso arquitectónico.
- Concreto que requiere un fraguado prolongado y mayor tiempo de manejabilidad.
- Aplicaciones de concreto en clima cálido o donde se requiera largo tiempo para su colocación.
- Concretos donde se requiera reducción de agua.
- Para concretos de alto desempeño permitiendo mejorar las características en estado fresco y endurecido.
- EUCON WR 85 es compatible con todos los aditivos de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.

Ventajas

EN CONCRETO FRESCO

- Mejora el terminado y la apariencia.
- Incrementa la trabajabilidad.
- Reduce el requerimiento de agua.
- Reduce la segregación.
- Compatible con otros aditivos.
- Permite reducción de agua mayor al 10%.
- Incrementa el desarrollo de resistencias mecánicas.
- Fraguado retardado en las dosis recomendadas.

EN CONCRETO ENDURECIDO

- Incrementa las resistencias del concreto cuando se utiliza como reductor de agua.
- Reduce la permeabilidad.
- Incrementa la durabilidad.

Dosificación

EUCON WR 85 se dosifica de 0,2% al 0,7% del peso del cemento, es decir, de 171 ml a 598 ml por cada 100 kg de cemento, según la reducción de agua requerida.

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Bolívar y Calle 100, Bogotá, Colombia

Tel: +57 (0)2 481 4333

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCON WR 85

Aditivo reductor de agua de rango medio y retardante

Dado que la dosis del aditivo depende de las características de los materiales que se usen en el diseño, así como de la temperatura y humedad relativa del medio ambiente, recomendamos consultar con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT, para efectuar las mezclas previas necesarias y determinar la dosificación óptima en función de sus materiales.

Aplicación

EUCON WR 85 debe ser adicionado preferiblemente al agua de amasado o al concreto antes de la colocación. No se debe ser colocado al cemento seco o al mismo tiempo con otros aditivos hasta que éstos estén completamente incorporados en la mezcla.

EUCON WR 85 puede ser dosificado con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.

Recomendaciones Especiales

- El empleo de EUCON WR 85 en dosificaciones mayores a las recomendadas puede ocasionar retardos en el fraguado de concreto sin afectar la resistencia final. Sobredosificaciones altas pueden afectar las características del concreto.
- Determine la dosis adecuada mediante la ejecución de ensayos previos.
- No adicione simultáneamente con otros aditivos.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCON WR 85 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y en áreas ventiladas con temperatura entre 5°C y 35°C.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.
- 6 meses a granel en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa: 20 kg
Tambor: 230 kg.
Granel

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.


Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.



Enero 14 de 2021



ENSAYO RESISTENCIA DE CONCRETO

Ingenieri

		LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD					
		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN - CONCRETO HIDRÁULICO					
		TIPO DE CONCRETO :		MR 4,2			
		CUENTE :		ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE			
OBRA:		ANSERMA (CALDAS)					
Resistencia especificada (Mpa)	Fecha Votado	Fecha ensayo	Edad muestra (días)	Resistencia obtenida (Mpa)	Desarrollo resistencia (%)	Asentamiento (Pulg)	Observaciones
4,2	27/10/2023	03/11/2023	7	3,90	91,7%	7,0	
			7	3,80			
4,2		24/11/2023	28	4,64	112,5%		
			28	4,81			
4,2	31/10/2023	07/11/2023	7	4,02	95,0%	7,5	
			7	3,96			
4,2		28/11/2023	28	4,75	114,8%		
			28	4,89			
4,2	10/11/2023	17/11/2023	7	3,84	92,4%	6,5	
			7	3,92			
4,2		08/12/2023	28				
			28				
4,2	14/11/2023	21/11/2023	7	4,56	111,5%	7,0	PENDIENTE RESULTADOS A 28 DIAS
			7	4,81			
4,2		12/12/2023	28				
			28				
4,2	23/11/2023	30/11/2023	7	4,35	106,4%	7,0	PENDIENTE RESULTADOS A 28 DIAS
			7	4,59			
4,2		21/12/2023	28				
			28				

 Elaboro: Isaac Pineda Medina Laboratorista	 Reviso: Ing. Jhon Jairo Sanin Jefe de planta
--	---



TRAZABILIDAD DE LA TUBERIA

F-GC-79

BO	PROCESO	IMPUESTO DE INYECTACION DE LA TURBINA	NUMERO DE TURBINA	LONGITUD	DIAMETRO	TIPO DE INYECTACION	NUMERO DE SECTOR HOMOLOGADO (MERE)	CONEXION DE CUBIERTA DE CUBIERTA	NUMERO DE CUBIERTA	ORGANISMO OPERADOR DEL PROYECTO	FIGURA	FABRICANTE	NET	FECHA DE INSTALACION (DD/MM/AAAA)	DIAMETRO DE LA TURBINA ANTERIOR	MATERIAL TURBINA ANTERIOR	LONGITUD TURBINA ANTERIOR (M)
1	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2775	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
2	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2780	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
3	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2785	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
4	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2790	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
5	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2795	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
6	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2800	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
7	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2805	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
8	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2810	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00
9	Red Transmisión Mada	CMH - ENTRE CASILLAS Y CANCHES	2	6,00	3,00	Inyección con apertura de junta		3	2815	ECOTEC	2008/11	P.V.C. GORON S.A.	800.500.500.2	11/09/2023	2"	PVC-80000	6,00

NOMBRE: JAVIER COMET JARQUE
 CARGO: INGENIERO EN SISTEMAS DE INYECTACION
 FIRMADO: JAVIER COMET JARQUE

NOMBRE CONTACTO: JAVIER COMET JARQUE
 DIRECCION CONTACTO:

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y PROMOCIONES
 COORDINADOR:

ASESORIA TECNICA PARA LA ASISTENCIA
 TECNICA PARA LA ASISTENCIA



DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE COSTOS

FORMATO F-GF-32



ACTA

Ingenieri A



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

ZONA OCCIDENTE



CONTRATO No.:	071 DE 2003	ACTA No.:	017 FINAL	FECHA CORTE:	Diciembre 7 de 2003
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE AGÜEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANORMA, CALDAS.	FECHA PROMOCIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2003	FECHA VENCIMIENTO:	veintidós (22) de diciembre de 2003
CONTRATISTA:	GONNAR CARMELO HERNANDEZ MAMBELE	PROYECTO:	071 DE 2003	VALOR ACTA:	\$ 47.875.796,80
		SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ	FECHA DE CORTE:	Diciembre 7 de 2003

"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE AGÜEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANORMA, CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATUAL			PRESENTE ACTA No 2			ACUMULADO PRESENTE ACTA			
			CANTIDAD	VL UNITARIO	VL TOTAL	CANTIDAD	VL PARCIAL	CANTIDAD	VL PARCIAL	CANTIDAD	VL TOTAL	
A. Reparación de alcantarillado Carrera 4 con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anormá Caldas												
1	PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo	m ²	84,00	\$ 7,443	\$ 622.883	84,00	\$ 622.883	-	-	84,00	\$ 622.883	
1.02	Cerramiento con tela verde y superficies de grava 20 cm espesor	m ²	380,00	\$ 19,508	\$ 7.413.040	380,00	\$ 7.413.040	-	-	380,00	\$ 7.413.040	
1.03	Señal preventiva y señalización	unif	2,00	\$ 222.820	\$ 445.640	2,00	\$ 445.640	-	-	2,00	\$ 445.640	
1.04	Instalación de cables de fibra óptica 2x8	unif	1,00	\$ 1.128.064	\$ 1.128.064	1,00	\$ 1.128.064	-	-	1,00	\$ 1.128.064	
2	DEMOLICIONES											
2.01	Corte con disco abrasivo	m ²	240,00	\$ 10,910	\$ 2.618.400	240,00	\$ 2.618.400	-	-	240,00	\$ 2.618.400	
2.02	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andamios, gradilla y calceas	m ³	20,00	\$ 119,507	\$ 2.390.140	20,00	\$ 2.390.140	-	-	20,00	\$ 2.390.140	
3	CAVACIÓN											
3.01	En material común de 0 a 2 m	m ³	188,00	\$ 37,719	\$ 7.089.180	188,00	\$ 7.089.180	-	-	188,00	\$ 7.089.180	
3.02	En material común Tipo 1	m ³	10,00	\$ 44,606	\$ 446.060	10,00	\$ 446.060	-	-	10,00	\$ 446.060	
3.03	Refrío de material sobrante en vehículo automotor	m ³	64,00	\$ 46,948	\$ 3.004.672	64,00	\$ 3.004.672	-	-	64,00	\$ 3.004.672	
4	ESTRUCTURA ALCANTARILLADO											
4.01	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	m ²	84,00	\$ 34,101	\$ 2.864.884	84,00	\$ 2.864.884	-	-	84,00	\$ 2.864.884	
4.02	Cámaras de caída (0-1,2, 1653,04, espesor de pared e=0,20) con colchón de piedra pegada e=10cm y boquilla	m ²	4,00	\$ 314,328	\$ 1.257.312	4,00	\$ 1.257.312	-	-	4,00	\$ 1.257.312	
4.03	Suministro e instalación de tapa con aro poco de inspección en 10' D=0,60m para tráfico pesado con logo y trazo de refuerzo	unif	3,00	\$ 1.093,218	\$ 3.279.654	3,00	\$ 3.279.654	-	-	3,00	\$ 3.279.654	
4.04	Bases y Calceas	unif	4,00	\$ 775,256	\$ 3.101.024	4,00	\$ 3.101.024	-	-	4,00	\$ 3.101.024	
4.05	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para drenajes	m ²	86,00	\$ 19,788	\$ 1.700.968	86,00	\$ 1.700.968	-	-	86,00	\$ 1.700.968	
4.06	Cajas de inspección (0,30x0,50) para drenajes, incluye tasa en concreto	unif	6,00	\$ 579,521	\$ 3.477.126	6,00	\$ 3.477.126	-	-	6,00	\$ 3.477.126	
4.07	Instalación de sifón de 12" x 60"	unif	6,00	\$ 62,336	\$ 373.816	6,00	\$ 373.816	-	-	6,00	\$ 373.816	
4.08	Impulsores a cámara	unif	6,00	\$ 129,518	\$ 777.108	6,00	\$ 777.108	-	-	6,00	\$ 777.108	
5	LEÑOS											
5.01	Arma para base y trapear	m ³	12,00	\$ 173,071	\$ 2.076.852	12,00	\$ 2.076.852	-	-	12,00	\$ 2.076.852	
5.02	Leño compactado con material de la obra	m ³	142,00	\$ 31,781	\$ 4.512.892	142,00	\$ 4.512.892	-	-	142,00	\$ 4.512.892	
5.03	Sub base para pavimentos	m ³	35,00	\$ 207,748	\$ 7.271.180	35,00	\$ 7.271.180	-	-	35,00	\$ 7.271.180	
6	CONCRETOS											
6.01	Concreto de 21Mpa para gradetas y andenes	m ³	20,00	\$ 868,536	\$ 17.370.720	20,00	\$ 17.370.720	-	-	20,00	\$ 17.370.720	
6.02	Concreto para pavimento 42Mpa hecho en obra	m ³	30,00	\$ 1.143,062	\$ 34.291.860	30,00	\$ 34.291.860	-	-	30,00	\$ 34.291.860	
7	ACERO											
7.01	Acero de refuerzo para gradetas	Mg	36,00	\$ 32,153	\$ 1.157.508	36,00	\$ 1.157.508	-	-	36,00	\$ 1.157.508	



CONTRACTUAL:	2017 DE 2023	ACTA No.:	52 Y FIRM	FECHA CORTE:	Quindimo 7 de 2023
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERIMA, CALDAS.	FECHA INICIACIÓN:	04 DE AGOSTO DE 2023	FECHA VENCIMIENTO:	en febrero, 20 de diciembre de 2023
CONTRATISTA:	ANDRÉS CAMILO FERNÁNDEZ SARRIÉZ	PROYECTO:	16 DIAS CAL ENTREGADO	VALOR ACTA:	\$ 47.875.188.00
		SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ	FECHA DE CORTE:	Quindimo 7 de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL			ACUMULADO ANTERIOR 1			PRESENTE ACTA No 2			ACUMULADO PRESENTE ACTA				
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL		
8	PERSONAL				\$ 10.638.293											
8.01	acompañamiento social durante toda la obra	m	1,00	7.410.109	\$ 7.410.109	1,00	2.410.109	\$ 2.410.109				1,00	\$ 2.410.109	\$ 2.410.109		
8.02	Trabajador Social bajo régimen 3 meses	mes	2,00	4.119.072	\$ 8.238.144	2,00	8.238.144	\$ 8.238.144				2,00	\$ 8.238.144	\$ 8.238.144		
9	ITEMS NO PREVISTOS															
9.01	Suministro, transporte e instalación de materiales sencillos, incluye caja con anticorrosivo	und		\$ 1.486.813	\$ -	1,00	1.486.813	\$ 1.486.813				1,00	\$ 1.486.813	\$ 1.486.813		
9.02	Suministro, transporte e instalación de tubería de 12" a 8"	und		\$ 800.000	\$ -	1,00	800.000	\$ 800.000				1,00	\$ 800.000	\$ 800.000		
	COSTO TOTAL				\$ 182.274.390		\$ 182.274.390	\$ 182.274.390				\$ 182.274.390	\$ 182.274.390			
	COSTO DIRECTO				\$ 75.785.802		\$ 75.785.802	\$ 75.785.802				\$ 75.785.802	\$ 75.785.802			
	ADMINISTRACIÓN				\$ 23.978.173		\$ 23.978.173	\$ 23.978.173				\$ 23.978.173	\$ 23.978.173			
	IMPUESTOS				\$ -		\$ -	\$ -				\$ -	\$ -			
	UTILIDAD				\$ 3.789.345		\$ 3.789.345	\$ 3.789.345				\$ 3.789.345	\$ 3.789.345			
	SUMAS ARTES DE IVA				\$ 181.554.315		\$ 181.554.315	\$ 181.554.315				\$ 181.554.315	\$ 181.554.315			
	IVA Sobre utilidades				\$ 739.975		\$ 739.975	\$ 739.975				\$ 739.975	\$ 739.975			
	COSTO TOTAL OBRA				\$ 182.274.390		\$ 182.274.390	\$ 182.274.390				\$ 182.274.390	\$ 182.274.390			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA				
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL		
2	DEMOLICIONES				\$ 3.833.470											
2.01	Corte con disco de asfalto	m ²	240,00	\$ 16.000	\$ 3.840.000	4,39	\$ 68.711	\$ 68.711				4,39	\$ 68.711	\$ 68.711		
2.02	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye: armadura, gradaje y capatas	m ³	10,00	\$ 115.500	\$ 1.155.000		\$ -	\$ -					\$ -	\$ -		
3	ERIGACIÓN				\$ 3.287.808											
3.01	En material común de 0 a 2 m	m ³	50,00	\$ 65.560	\$ 3.278.000	15,76	\$ 205.500	\$ 205.500				15,76	\$ 205.500	\$ 205.500		
3.02	Revo de material sobra en vehículo autorizador	m ³	32,00	\$ 46.948	\$ 1.502.896	4,85	\$ 67.218	\$ 67.218				4,85	\$ 67.218	\$ 67.218		
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				\$ 2.194.966											
4.01	Instalación de tubería PVC de 3"	m	84,00	\$ 26.130	\$ 2.194.966	47,00	\$ 152.510	\$ 152.510				47,00	\$ 152.510	\$ 152.510		
4.02	Instalación de acomodación de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	unif	0,00	\$ 60.255	\$ -	12,00	\$ 723.060	\$ 723.060				12,00	\$ 723.060	\$ 723.060		
4.03	Instalación de válvulas	unif	1,00	\$ 301.495	\$ 301.495	1,00	\$ 301.495	\$ 301.495				1,00	\$ 301.495	\$ 301.495		


B. Cambio red acueducto carrera 4 con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anserima - Caldas



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

ZONA OCCIDENTE



CONTRATO No. 001 DE 2023	ACTA No. 001 DE 2023	FECHA EMISIÓN: 07 DE AGOSTO DE 2023	FECHA VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.	FECHA RECEPCIÓN: 30 DE ABRIL DE 2023	VALOR ACTA: \$ 42.875.148,00	FECHA DE CORTE: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRACTUAL: AERDUA CARLOS HERNANDEZ MARRQUE	SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARRQUEZ		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA No.2			ACUMULADO PRESENTE ACTA		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
4.04	Servicio e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chavite para alcantarillado de alcantarilla	und	1,00	\$ 495.757	\$ 495.757	1,00	\$ 495.757	\$ -	1,00	\$ 495.757	
4.05	Empalme a tubería existente	m3	2,00	\$ 141.431	\$ 282.862	1,00	\$ 141.431	\$ -	1,00	\$ 141.431	
5.01	Arma para león y drenaje	m3	8,00	\$ 173.071	\$ 1.384.568	4,48	\$ 773.308	\$ -	4,48	\$ 773.308	
5.02	Junto compactado con material de la obra	m3	26,00	\$ 31.731	\$ 825.006	10,91	\$ 346.105	\$ -	10,91	\$ 346.105	
5.03	Subbase para pavimento	m3	13,00	\$ 207.248	\$ 2.694.224	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6	CONCRETOS				\$ 11.864.889			\$ -		\$ -	
6.01	Concreto de 21Mpa para gradajes y andenes	m3	0,50	\$ 868.538	\$ 434.269	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6.02	Concreto para pavimento 42Mpa hecho en obra	m3	10,00	\$ 1.143.062	\$ 11.430.621	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
7	ACERO				\$ 218.754			\$ -		\$ -	
7.01	Arma de refuerzo para gradajes	kg	18,00	\$ 12.153	\$ 218.754	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
8	OTROS				\$ 899.736			\$ -		\$ -	
8.01	Servicio e instalación de cajas metálicas para contador	und	6,00	\$ 149.958	\$ 899.736	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
COSTO TOTAL					\$ 27.289.939			\$ 4.071.523		\$ 31.361.462	
COSTO DIRECTO					\$ 20.222.360			\$ 3.027.259		\$ 23.249.619	
ADMINISTRACIÓN					\$ 5.864.855			\$ 874.947		\$ 6.739.802	
IMPREVISTOS					\$ -			\$ -		\$ -	
UTILIDAD					\$ 1.202.724			\$ 159.317		\$ 1.362.041	
SUMAS ANTES DE IVA					\$ 27.289.939			\$ 4.071.523		\$ 31.361.462	
Iva Sobre actividades					\$ 192.111			\$ 28.662		\$ 220.773	
COSTO TOTAL OBRA					\$ 27.482.050			\$ 4.100.186		\$ 31.582.236	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
C. Reposición de pavimento por cambio de alcantarillado y alcantarillado con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anserma Caldas											
2	DEMOLECCIONES				\$ 8.547.794			\$ -		\$ -	
2.01	Corte en disco abrasivo	m ²	195,00	\$ 43.850	\$ 8.547.794	73,70	\$ 3.254.867	\$ -	73,70	\$ 3.254.867	
2.02	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluir pedregales, gradajes y cables	m3	62,00	\$ 118.503	\$ 7.367.058	72,67	\$ 8.644.574	\$ -	72,67	\$ 8.644.574	
3	EXCAVACION				\$ 30.224.328			\$ -		\$ -	
3.01	En material común de 0 a 2 m	m3	34,06	\$ 887.110	\$ 30.224.328	13,36	\$ 3.646.095	\$ -	13,36	\$ 3.646.095	
COSTO TOTAL OBRA					\$ 38.139.180			\$ 3.646.095		\$ 41.785.275	



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE



CORTEJO No. 200 DE 2023	ACTUAL:	30 DE ABRIL 2023	FECHA CORTE:	15 DICIEMBRE 7 DE 2023
OBJETO CONTRATO: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.	SEGUN INSCRIPCIÓN:	26 DE ABRIL 2023	FECHA VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: ARIANY CAMILO HERNANDEZ MARRQUEZ	PROVIDORA:	30 DE ABRIL 2023	VALOR ACTA:	\$ 42.875.188.00
	SUPERVISOR FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ		FECHA DE CORTE:	15 DICIEMBRE 7 DE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR 1		PRESENTE ACTA No 2		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
3.02	En conglomerado	m3	50,00	41,757	2.087.856	115,36	4.817,088	2,29	95,208	117,65	4.912,293
3.03	Mezcla de material sustrato en vehículo automotor	m3	148,00	46,940	6.954.120	211,74	9.940,770	27,77	1.303,746	239,51	11.244,515
5	LEÑOS	m3	84,00	202,288	17.458.832	88,31	18.348,276	3,95	817,857	91,26	18.993,082
5.03	Sub base para pavimentos	m2	4,00	868,516	3.474,144	-	-	17,46	15.164,639	17,46	15.164,639
6	CONCRETOS	m3	73,00	1.143,062	83.443,536	43,02	50.303,289	32,96	14.814,085	56,88	65.017,374
6.01	Concreto de 1/Meja para gradetas y andenes	m3	4,00	868,516	3.474,144	-	-	17,46	15.164,639	17,46	15.164,639
6.02	Concreto para pavimento 42088 hecho en obra	m3	73,00	1.143,062	83.443,536	43,02	50.303,289	32,96	14.814,085	56,88	65.017,374
7	ACERO	kg	1462,00	32,359	47.458,832	542,25	6.589,964	-	-	542,25	6.589,964
7.01	Acero de refuerzo para traviesas en 1/8" con curvatura y trafilado en 1/2" de lomo cada metro	kg	1462,00	32,359	47.458,832	542,25	6.589,964	-	-	542,25	6.589,964
8	PRECIOS NORPREVISIOS										
8.01	Acero de refuerzo	kg	1.917,63	12,157	23.304,067	1.917,63	23.304,067	395,11	8.933,792	2.052,74	32.238,769
8.02	Plantas para protección sobre base (travies)	m2	480,00	1.920,000	921.600,00	480,00	921.600,00	-	-	920,00	1.752.000
8.03	Seto abastecedor para juntas	m	9,500	84,000	798,000	12,00	100,800	-	-	12,00	100,800
	COSTO TOTAL				341.908.389					41.475.548	167.296.571
	COSTO DIRECTO				341.908.389					41.475.548	167.296.571
	ADMINISTRACIÓN	20%			68.381.678					8.295.109	33.258.240
	IMPUESTOS	0%			0					0	0
	UTILIDAD	5%			17.095.419					2.187.774	8.640.261
	SUMAS ANTES DE IVA				427.384.886					52.958.431	210.195.072
	IVA sobre utilidades	10%			42.738.489					5.295.843	21.019.507
	COSTO TOTAL OBRA				470.123.375					58.254.274	231.214.579
	COSTO TOTAL				470.123.375					58.254.274	231.214.579
	COSTO DIRECTO				341.908.389					41.475.548	167.296.571
	ADMINISTRACIÓN	20%			68.381.678					8.295.109	33.258.240
	IMPUESTOS	0%			0					0	0
	UTILIDAD	5%			17.095.419					2.187.774	8.640.261
	SUMAS ANTES DE IVA				427.384.886					52.958.431	210.195.072
	IVA Sobre utilidades	10%			42.738.489					5.295.843	21.019.507
	COSTO TOTAL OBRA				470.123.375					58.254.274	231.214.579



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

ZONA OCCIDENTE



CONTRATO No.:	702 DE 2023	ACTA No.:	70 Y FINAL	FECHA OBRANTE:	Diciembre 7 de 2023
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTELLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.	FECHA PROMOCIÓN:	20 DE ABRIL DE 2023	FECHA VENCIMIENTO:	30 de diciembre de 2023
CONTRATISTA:	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARIQUEZ	PROBATORIA:	30 DIAS CALENDARIO	VALOR ACTA:	\$ 42.875.100,00
		SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ	FECHA DE CORTE:	Diciembre 7 de 2023

RESUMEN DEL CONTRATO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	URD	CANTIDAD	VAL UNITARIO	VAL. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR 1
						VAL. PARCIAL
						CANTIDAD
						PRESENTA ACTA No 2
						VAL. PARCIAL
						CANTIDAD
						ACUMULADO PRESENTE ACTA
						VAL. TOTAL

REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTELLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.

VALOR CONTRATO	\$ 271.472.618
VALOR ACTA 1	\$ 179.026.812
VALOR ACTA 2	\$ 42.875.100
SALDO DEL CONTRATO	\$ 49.570.706
SUMAS IGUALES	\$ 271.472.618

[Signature]

Vs. Sr. FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE
SUPERVISOR

[Signature]

ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARIQUEZ
CONTRATISTA



PREACTAS

ingenieri A

MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - ACTA PARCIAL 01

CONTRATO No	011 DE 2003	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AGUAFRILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.
CONTRATISTA:	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MARRIQUE	SUPERVISOR:	INGENIERO DE OBRA FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ

B. Cambio red acueducto carrera 4 con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anserma - Caldas

Item	3.01	Burbujeo e instalación de agua metálica para acueducto					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
		1,00	1,41	0,11	2,35		8,00	8,00	
							TOTAL PRE-ACTA	8,00	

C. Reposición de pavimento por cambio de alcantarillado y acueducto carrera 4 con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anserma - Caldas

Item	3.02	Reposición de estructuras de concreto: tuberías, techos, gradales y curvados					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
		1,00	1,41	0,11	2,35		2,23	2,23	
		1,00	1,41	0,11	2,35		0,27	2,50	
							TOTAL PRE-ACTA	2,50	

Item	3.03	En concreto (curva de 0 a 90°)					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
		1,00	21,00	1,30	0,40		11,50	11,50	
							TOTAL PRE-ACTA	11,50	

Item	3.04	En concreto					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
		1,00	10,00	1,30	0,19		2,18	2,18	
							TOTAL PRE-ACTA	2,18	

Item	3.05	Tubo de material sintético en vehículo automotor					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
						0,23	0,23	0,23	
			25,00	0,15	0,10		3,75	3,98	
			10,00	1,00	0,10		1,00	4,98	
			10,00	0,10	0,10		1,10	6,08	
			1,00			0,88	1,98	8,06	
						10,00	10,00	18,06	
						0,18	0,18	18,24	
							TOTAL PRE-ACTA	18,24	

Item	3.06	Baldosa para pavimento					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
			0,21	1,30	0,20		0,28	0,28	
			1,00	0,94	0,10		0,27	0,55	
							TOTAL PRE-ACTA	0,55	

Item	3.07	Cemento de C Max para gradales y curvas					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
			10,91	1,10	0,10		0,78	0,78	
			1,00	0,75	0,10		0,81	1,59	
			1,00	0,75	0,10		0,81	2,40	
			10,00	0,10	0,10		1,00	3,40	
			1,00	0,10	0,10	0,00	0,10	3,50	
			0,75	0,10	0,10		0,10	3,60	
			0,00	0,10	0,10		0,10	3,70	
							TOTAL PRE-ACTA	3,70	

Item	3.08	Cemento para pavimento C200 tipo 40					Unidad	Med	
Fecha medición	Punto	Medidas					Total medidas	Acumuladas medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)			
		1	38,00	0,80	0,10		11,84	11,84	
							TOTAL PRE-ACTA	11,84	

MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - ACTA PARCIAL 01

CONTRATO No		275 DE 2023		OBJETO:		"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERIAS, CALDAS"					
CONTRATISTA:		ADRIAN CARLOS HERNANDEZ MAHROQUE		SUPERVISOR:		FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCKE					
Fecha medición	Especificación	Unidad de medida					Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Observaciones
		Cantidad	Longitud (m)	Superficie (m ²)	Volúmenes (m ³)	Área (m ²)					
	Acero de parrillas base 1 reforzada (1.50*1.70) longitudinal	28.00	1.40				1.50	42.00	12.60	76.7	
	Acero de parrillas base 1 reforzada (1.50*1.70) transversal	5.00	3.40				1.50	5.10	16.75	76.7	
	Acero de parrillas base 2 reforzada (2.00*1.50) longitudinal	33.00	1.40				1.50	49.50	14.49	76.7	
	Acero de parrillas base 2 reforzada (2.00*1.50) transversal	8.00	3.50				1.50	12.00	36.45	76.7	
	Acero de parrillas base 3 reforzada (3.00*1.50) longitudinal	21.00	2.00				1.50	31.50	94.65	76.7	
	Acero de parrillas base 3 reforzada (3.00*1.50) transversal	11.00	4.50				1.50	16.50	49.95	76.7	
	Acero de parrillas base sobre ancho (1.50*1.50)	25.00	0.80				1.50	37.50	109.65	76.7	
	Acero de parrillas base sobre ancho (1.50*1.50)	5.00	0.75				1.50	7.50	22.43	76.7	
	Refuerzo para armaros naves				5.71		2.75	15.70	46.83	76.7	
	Refuerzo para armaros zona verde		11.00		1.20		2.75	30.25	87.58	76.7	
	Refuerzo para armaros zona impermeabilización		1.00		0.75		2.75	2.75	8.03	76.7	
	Refuerzo para armaros retención	177.00	0.50				0.50	88.50	255.44	76.7	
	Refuerzo para armaros longitudinal	141.00	1.00				0.50	70.50	202.07	76.7	
	Refuerzo para armaros para rejilla de fibra de vidrio	18.00	0.40				1.00	18.00	51.81	76.7	
							TOTAL PRO-OBRA		335.00		


FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCKE
 SUPERVISOR


ADRIAN CARLOS HERNANDEZ MAHROQUE
 CONTRATISTA

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

97003004 87-02-1004 PVN 776198 760496000048 16877675 AGRICULTORES... 49901259 87-00001045 Aprobado con sus Fondos 00 Factura Existencia 602,873,918



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2018

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	231 - 2023		
CONTRATISTA	ADRIÁN CAMILO HERNÁNDEZ MANRIQUE	NIT O CC:	16.077.675

OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.
----------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	✓	
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	✓	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	✓	
4- Pago FIC.	✓	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	✓	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-18).	✓	
7- Original del Acta de Liquidación.	✓	
8- Certificado de obra.	✓	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Andrés Felipe Graldo R.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Andrés G.
FIRMA

Fecha

08/02/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



PÓLIZA
Ingenieri

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
 ACTUALIZACIÓN ESTABILIDAD DE LA OBRA



CONTRATO 231 DE 2023

OBJETO REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN ANSERMA - CALDAS
 VALOR \$271.472.618
 CONTRATISTA ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
 CC 16.077.675

PLAZO HASTA EL 19/12/2028

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 60-45-101005621

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	24-ago-24	25-mar-24	\$ 82.459.769,10
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	24-ago-24	25-dic-26	\$ 54.973.179,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	19-dic-23	19-dic-28	\$ 54.973.179,40

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 231 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 06/02/2024

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente

TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaria General

Andrés G

PROYECTO. ANDRÉS FELIPE GIRALDO RIOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN ARMENIA	SUCURSAL ARMENIA	COD.SUC 60	NO.PÓLIZA 60-45-101005621	ANEXO 5
---------------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 12 2023	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 08 2023	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 19 12 2028	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
---	---	----------------------	---	----------------------	--------------------------------------

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HERNANDEZ MANRIQUE, ADRIAN CAMILO	IDENTIFICACIÓN CC: 16.077.675
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 18 - 46 OFC 512 EDF PLAZUELA	CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA TELÉFONO: 3337669

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 896.833.235-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 6867080

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 2-CC-027A 22-26-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON Ocasión AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN DESARROLLO AL CONTRATO N 391 CUYO OBJETO ES LA REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ADUCTO Y ALDANTARILLADO EN LA CARRERA 4 DOS LAS CALLES 1 Y CALLE 3 SIN EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/08/2023	25/03/2024	\$82.453.769.10	
	24/08/2023	25/12/2024	\$54.973.179.40	
	SI AMPARO 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$54.973.179.40	\$54.973.179.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL HECHO MEDIANTE PRESENTE ANEXO ACLARA DE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ACTA RECIBO DE OBRA.

VALOR PRIMA META \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****192.405.127.90	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURADO		
NOMBRE	C.I.R	% DE PAGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PAGO	VALOR ASEGURADO
DSO SEGUROS SOCIEDAD LTDA	352943	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

60-45-101005621

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarama B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE CALIDAD



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 850.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD.SUC 60		NO.PÓLIZA 60-45-101005921		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
29 12 2023		24 08 2023		00:00		19 12 2028		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL HERNANDEZ MANRIQUE, ADRIAN CAMILO								IDENTIFICACIÓN CC: 16.077.675			
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 18 - 48 OFC 512 EDF PLAZUELA						CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA			TELÉFONO: 3337605		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 52						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****102.405.127.90	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COLABORADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DPO SEGUROS SOCIEDAD LTDA	153943	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELÉFONO: 7258800 - ARMENIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICION ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD.SUC 60		NO.PÓLIZA 60-45-101005821		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 12 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 08 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 19 12 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HERNANDEZ MANRIQUE, ADRIAN CAMILO								IDENTIFICACIÓN CC: 16.877.678			
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 18 - 46 OFC 512 EDF PLAZUELA						CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA			TELÉFONO: 3337665		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.883.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8887080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELÉFONO: 7358800 - ARMENIA

60-45-101005821

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

60-45-101005621

Número de anexo:

6

Fecha de expedición:

viernes, 29 de diciembre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Tomador:

HERNANDEZ MANRIQUE ADRIAN CAMILO

Inicio de vigencia:

jueves, 24 de agosto de 2023

Fin vigencia:

martes, 19 de diciembre de 2028

Valor total asegurado:

\$ 192.406.128

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo Automóviles: (601) 218 6977 ext. 311 - Email: verificacion.pólizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
 - Pólizas ramo Generales: (601) 218 6977 ext. 532 - Email: verificacion.pólizas.todociasgubernacion@segurosdelestado.com
 - Pólizas ramo Fianzas - Cumplimiento: 316 327 9980 / verificacion.pólizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
 - Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (601) 664 9560 ext. 157-159-163 - Email: verificacion.pólizas.automoviles@segurosdelestado.com
 - Pólizas ramo Vida: (601) 218 6977 - Email: verificacion.pólizas.vida@segurosdelestado.com
 - Pólizas ramo SOAT: (601) 432 4302 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Diríjase a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

X Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado



PAZ Y SALVOS

Ingenieri

No. Radicado: 08SE2023741700100006385
Fecha: 2023-12-22 01:57:52 pm
Remitente: Sede: D. T. CALDAS
Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario: ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE ✓
Anexos: 0 Folios: 1

08SE2023741700100006385

**MINISTERIO DEL TRABAJO
HACE CONSTAR
A QUIEN PUEDA INTERESAR:**



Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	22 DE DICIEMBRE 2023 ✓
Nombre y/o Razón Social:	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Identificación:	16077675-0

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supía, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San José, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.

Dado en la ciudad de Manizales, el día 22 de diciembre de 2023. ✓


DARIO ESCEHOMO DIAZ
Director Territorial

Elabora:
Revisó: D. Diaz

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.


Claudia Mazo
CONTADORA PÚBLICA TITULADA

Asesorías Contables
Tributarias y Financieras
Elaboración de declaraciones de renta
personas naturales y jurídicas.

CERTIFICACIÓN APORTES Y PARAFISCALES

Yo, **CLAUDIA STELLA MAZO TORRES** identificada con cédula de ciudadanía No. 42.136.777 de Pereira, en mi condición de Contadora Pública del Ingeniero **ADRIÁN CAMILO HERNÁNDEZ MANRIQUE** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.077.675, expedida en Manizales, en calidad de **CONTRATISTA**, Certifico que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social a, SALUD, PENSION, ARP y parafiscales de los últimos seis (06) meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide con destino **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Del contrato N° 231 - 2023, Cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS".

Se adjunta copia de tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores.

Dado en Pereira a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año (2024) dos mil veinticuatro.

Cordialmente,



CLAUDIA STELLA MAZO TORRES
Contadora Pública Titulada
TP 144172 - T

Pereira - Risaralda

☎ 3104172438 ✉ csmazo@yahoo.es - csmazo@hotmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09001631E17AD209

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA STELLA MAZO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42136777 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 144172-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144172-T

CLAUDIA STELLA
MAZO TORRES
C.C. 42136777
RESOLUCION INSCRIPCION 241 **FECHA 10/09/2009**
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ*
LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ **154416**



Claudia Mazo Torres

68199

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 1080 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores



CERTIFICACION PEB Y SU SUO SEGURO SOCIAL Y PENSIONALES DE ADONIA GARCIA HERNANDEZ MARQUEZ
 PARA EMPLEADOS S.A.S. E.S.P.
 FECHA 21 DE ENERO DE 2011

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.136.777

MAZO TORRES

APELLIDOS

CLAUDIA STELLA

NOMBRES

Claudia Stella

FIRMA



CÉDULA CON DESTINACIÓN A EMPLOYERAS S.A. E.S.P. CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL
DE ADRIÁN CANILO HERNÁNDEZ MARRIQUE
FECHA DE EMISIÓN: 16 DE ENERO 2024



FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1980

PEREIRA
(RISARALDA)

FECHA DE NACIMIENTO

154
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

16-FEB-1998 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE

REGISTRADOR NACIONAL
CAROL ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00113762-F-0042136777-20081028

0004950830A 1

4950007996



PAGOS FIC
Ingenieros Asociados

COMPROBANTE

NIT: 8999990341 Medio de Pago: BANCOLOMBIA No. Transacción: 99040479 No. Autorización/CUI: 253318543 Fecha: 01/11/2023

Razón Social: **SENA**
Usuario Pagador: **16077675**
Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**
Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado \$ 203.000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 203.000.00	COP\$ 203.000.00

Nº 8999990341 Medio de Pago BANCOLOMBIA No. Transacción 99040479 No. Autorización/CU# 253318543 Fecha Hora 01/11/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 5 N 18 46 C C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adnancamilo14@gmail.com

Regional

Risaralda

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

PAVIMENTO - ANSERMA

Fecha Terminación Obra

22/10/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Período a Pagar

8

Costo Total Mano de Obra

3249612.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO

Tipo de documento

03

Naturaleza jurídica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57 318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-066-000000

Número Contrato de Obra

231-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Período a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Período

7

Aporte FIC

203000.00

Valor del Pago

203000.00

1 amilart

COMPROBANTE

Nº	Medio de Pago	Nº Transacción	Nº Autorización	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	99040050	253299306	01/11/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **16077675**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **APROBADA** por la **Total Pagado \$ 377,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 377,000.00	COP\$ 377,000.00

ecollect

121 Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CU5 Fecha venta
8999990341 BANCOLOMBIA 99040050 253299306 01/11/2023

Número de identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Risaralda

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

PAVIMENTO ANSERMA

Fecha Terminación Obra

22/10/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Período a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

7111449.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Comentarios

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO

Tipo de documento

03

Naturaleza jurídica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57.318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-066-000000

Número Contrato de Obra

231-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Período a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Período

13

Aporte FIC

377000.00

Valor del Pago

377000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101989938	366249914	28/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **16077675**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 348,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 348,000.00	COP\$ 348,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101989938	366249914	28/12/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Fecha Terminación Obra

20/12/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

8437391.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57,318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

231-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Periodo

12

Aporte FIC

348000.00

Valor del Pago

348000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101990372	366262592	28/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **16077675**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 232,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 232,000.00	COP\$ 232,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CLUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101990372	366262592	28/12/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamillo14@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Fecha Terminación Obra

20/12/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

8223112.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57,318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

231-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Aporte FIC

232000.00

Valor del Pago

232000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101993725	366359593	28/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **16077675**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.0.11.178**

Su transacción fue **APROBADA** por la **Total Pagado \$ 203,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 203,000.00	COP\$ 203,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101993725	366359593	28/12/2023

Número de Identificación

16077675

Primer Apellido (si es Persona natural)

HERNÁNDEZ

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 6 N 18 46 C.C PLAZUELA OFC 512

Localización

Nacional

Correo electrónico

adriancamilo14@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Fecha Terminación Obra

20/12/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

3402667.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ADRIAN CAMILO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

PEREIRA

Teléfono de Contacto

+57,318 3659249

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

231-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

271472618.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7

Aporte FIC

203000.00

Valor del Pago

203000.00



EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SUPERVISOR

<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ADRIAN CAMILO HERNANDEZ ✓	DIRECCIÓN: CRA 6 No 18-46
NIT O CEDULA		16077675	FECHA DE CALIFICACIÓN 2023-12-28
NUMERO DE CONTRATO:		231/2023 ✓	CALIFICACIÓN 3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	Francisco Javier Gomez Sanchez		
CARGO:	Ingeniero Zona Occidente		
FIRMA:			



ACTA DE RECIBO

Ingenieri A

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	231 de 2023
CONTRATISTA:	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	18.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	"REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".
COSTO DIRECTO	\$ 201.165.334
ADMINISTRACION 29%	\$ 58.337.947
UTILIDAD 5%	\$ 10.058.267
IVA SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 1.911.071
VALOR TOTAL OBRA	\$ 271.472.618
VALOR EJECUTADO	\$ 221.702.000
VALOR NO EJECUTADO	\$ 49.770.618
RECURSOS	CONVENIO 215 DE 2023 – MUNICIPIO DE ANSERMA
SUPERVISIÓN	ING. FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
CDP	2024253 DE 19/01/2024, RUBRO 2320101001030874
RP	2024268 DE 19/01/2024, RUBRO 2320101001030874

En el municipio de Anserma Caldas, a los diecinueve (19) días del mes diciembre de 2023, se reunieron los señores **FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ**, Ingeniero Supervisor y el señor **ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE**, como Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO FINAL, Según contrato 231 de 2023.



FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
Ingeniero de Zona Occidente.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ADRIAN CAMILO HERNANDEZ
MANRIQUE**
Contratista

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO: 231 DE 2023
CONTRATISTA: ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
OBJETO: "REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".

VALOR TOTAL OBRA	\$	271.472.618
VALOR EJECUTADO	\$	221.702.000
VALOR NO EJECUTADO	\$	49.770.618

RECURSOS CONVENIO 215-2023 DEL MUNICIPIO DE ANSERMA

En la ciudad de Manizales a los 06-02-2024-1, se reunieron los señores **CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO** gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. y **ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE** como Contratista, con el fin de realizar el acta de cumplimiento del contrato 231 de 2023.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección del estudio realizado y haber comprobado que el mismo se realizó de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. del estudio realizado no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

ACTAS DE RECIBO	
VALOR ACTA 1 (UNO)	\$ 179.026.812
VALOR ACTA 2 (DOS)	\$ 42.675.188
VALOR TOTAL	\$ 221.702.000
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 49.770.618

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P.



ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
Contratista



FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
Ingeniero de zona



VoBo. SERGIO HUMBERTO LOPERA
Jefe Dpto. de Operación y Mantenimiento



Vo.Bo. TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaria General



CERTIFICADO DE OBRA

Ingenieri

EL SUSCRITO INGENIERO FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO ZONA OCCIDENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

HACE CONSTAR QUE:

ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE identificado con CEDULA No. 16.077.675 de Manizales, como contratista, suscribió el Contrato N.º 231 el 28 de Junio de 2023 con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., que la información de dicho contrato se relaciona a continuación:

CONTRATO:	231 DE 2023
CONTRATISTA:	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
OBJETO:	*REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS*.
VALOR CONTRATO	\$ 271.472.618
VALOR EJECUTADO:	\$ 221.702.000
FECHA DE INICIACION:	Agosto 24 de 2023
FECHA DE RECIBO:	Diciembre 19 de 2023

Que las cantidades definitivas ejecutadas fueron:


"REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON LAS CALLES 1 Y CALLE 1 SUR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS"						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CONTRACTUAL		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	
A. Reposición de alcantarillado carrera 4 con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anserma Caldas						
1	PRELIMINARES					
1,01	Localización y replanteo	ml	\$ 7.443	81,00	\$	602.883
1,02	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	\$ 19.508	150,00	\$	2.926.200
1,03	Señal preventiva y reglamentaria	und	\$ 222.828	2,00	\$	445.652
1,04	Instalación de valla institucional 2x4	und	\$ 1.128.064	1,00	\$	1.128.064
2	DEMOLICIONES					
2,01	Corte con disco abrasivo	ml	\$ 10.910	-	\$	-
2,02	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m3	\$ 119.507	4,30	\$	513.880
3	EKAVACIÓN					
3,01	En material común de 0 a 2 m	m3	\$ 37.710	114,56	\$	4.320.058
3,02	Entibado horizontal Tipo 1	ml	\$ 44.606	-	\$	-
3,03	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	\$ 46.948	35,38	\$	1.661.020
4	ESTRUCTURA ALCANTARILLADO					
4,01	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	\$ 34.101	78,80	\$	2.887.158
4,02	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pagada e=40cm y boquilla	ml	\$ 914.328	4,70	\$	4.297.342
4,03	Suministró e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0,60cm para tráfico pesado con logo y anillo de refuerzo	und	\$ 1.001.218	3,00	\$	3.003.654
4,04	Bases y Cañuelas	und	\$ 775.256	3,00	\$	2.325.768
4,05	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	\$ 19.788	8,00	\$	158.304
4,06	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	\$ 573.521	4,00	\$	2.294.084
4,07	Instalación de siletas de 12"x6"	und	\$ 62.336	2,00	\$	124.672
4,08	Empalme a cámara	und	\$ 120.518	5,00	\$	602.590
5	LENOS					
5,01	Arena para base y atraque	m3	\$ 173.071	11,91	\$	2.061.276
5,02	Ueno compactado con material de la obra	m3	\$ 31.731	85,56	\$	2.714.804
5,03	Sub base para pavimento	m3	\$ 207.748	-	\$	-
6	CONCRETOS					
6,01	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m3	\$ 868.536	-	\$	-
6,02	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m3	\$ 1.143.062	-	\$	-
7	ACERO					
7,01	Acero de refuerzo para graderías	kg	\$ 12.153	391,40	\$	4.756.684
8	PERSONAL					
8,01	Acompañamiento social durante toda la obra	gl	\$ 2.400.109	1,00	\$	2.400.109
8,02	Trabajador Siso se paga máximo 3 meses	mes	\$ 4.119.072	2,00	\$	8.238.144
9	ITEMS NO PREVISTOS					
9,01	Suministro, transporte e instalación de sumidero sencillo, incluye raja con anticorrosivo	und	\$ 1.486.813	1,00	\$	1.486.813
9,02	Suministro, transporte e instalación de siletas de 12" a 6"	und	\$ 400.000	1,00	\$	400.000
COSTO TOTAL						\$ 49.194.260
COSTO DIRECTO						\$ 36.453.894
ADMINISTRACIÓN 29%						\$ 10.571.571
IMPREVISTOS 0%						\$ -
UTILIDAD 5%						\$ 1.822.685
SUMAS ANTES DE IVA						\$ 48.847.950
IVA Sobre utilidades 19%						\$ 346.310
COSTO TOTAL OBRA						\$ 49.194.260

B. Cambio red acueducto carrera 4 con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anserma Caldas

2	DEMOLICIONES					
2,01	Corte con disco abrasivo	ml	\$	10.910	4,10	\$ 44.731
2,02	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m3	\$	119.507	-	\$ -
3	EXCAVACIÓN					
3,01	En material común de 0 a 2 m	m3	\$	37.710	15,76	\$ 594.310
3,03	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	\$	46.948	4,85	\$ 227.698
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO					
4,01	Instalación de tubería PVC de 3"	ml	\$	8.968	47,00	\$ 421.496
4,02	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	und	\$	60.255	12,00	\$ 723.060
4,03	Instalación de Válvulas	und	\$	301.495	1,00	\$ 301.495
4,04	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	und	\$	495.757	1,00	\$ 495.757
4,05	Empalme a tubería existente	m3	\$	141.431	1,00	\$ 141.431
5	LLENOS					
5,01	Arena para base y atraque	m3	\$	173.071	4,48	\$ 775.358
5,02	Lleno compactado con material de la obra	m3	\$	31.731	10,91	\$ 346.285
5,03	Subbase para pavimento	m3	\$	207.748	-	\$ -
6	CONCRETOS					
6,01	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m3	\$	868.536	-	\$ -
6,02	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m3	\$	1.143.062	-	\$ -
7	ACERO					
7,01	Acero de refuerzo para graderías	kg	\$	12.153	-	\$ -
8	OTROS					
8,01	Suministro e instalación de cajas metálica para contador	und	\$	149.956	8,00	\$ 1.199.648
	COSTO TOTAL					\$ 5.271.169
	COSTO DIRECTO					\$ 3.906.016
	ADMINISTRACIÓN	29%				\$ 1.132.745
	IMPREVISTOS	0%				\$ -
	UTILIDAD	5%				\$ 195.301
	SUMAS ANTES DE IVA					\$ 5.234.062
	IVA Sobre utilidades	19%				\$ 37.107
	COSTO TOTAL OBRA					\$ 5.271.169

C. Reposición de pavimento por cambio de alcantarillado y acueducto carrera 4 con calle 1 y calle 1 sur en el municipio de Anserme						
Caldas						
2	DEMOLICIONES					
2.01	Corte con disco abrasivo	m ²	\$	10.910	73,70	\$ 804.067
2.02	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m ³	\$	119.507	72,89	\$ 8.710.465
3	EXCAVACION					
3.01	En material común de 0 a 2 m	m ³	\$	37.710	26,28	\$ 991.019
3.02	En conglomerado	m ³	\$	41.757	117,64	\$ 4.912.293
3.03	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m ³	\$	46.948	239,51	\$ 11.244.515
5	LLENOS					
5.03	Sub base para pavimento	m ³	\$	207.748	91,26	\$ 18.959.062
6	CONCRETOS					
6.01	Concreto de 31Mpa para graderías y andenes	m ³	\$	858.536	17,46	\$ 15.164.539
6.02	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m ³	\$	1.143.032	56,88	\$ 65.017.374
7	ACERO					
7.01	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1mcs cada metro	kg	\$	12.153	543,25	\$ 6.589.964
8	PRECIOS NOPREVISTOS					
8.01	Acero de refuerzo	kg	\$	12.153	2.652,74	\$ 32.238.749
8.02	Plástico para protección Sub-base granular	m ²	\$	4.800	400,00	\$ 1.920.000
8.03	Sello elastomérico para juntas	ml	\$	9.500	72,00	\$ 684.000
	COSTO TOTAL					\$ 167.236.571
	COSTO DIRECTO					\$ 123.924.840
	ADMINISTRACIÓN	25%				\$ 35.938.204
	IMPREVISTOS	0%				\$ -
	UTILIDAD	5%				\$ 6.196.242
	SUMAS ANTES DE IVA					\$ 166.059.286
	IVA Sobre utilidades	19%				\$ 1.177.286
	COSTO TOTAL OBRA					\$ 167.236.571
	COSTO TOTAL					\$ 221.702.000
	COSTO DIRECTO					\$ 164.284.550
	ADMINISTRACIÓN	25%				\$ 47.642.520
	IMPREVISTOS	0%				\$ -
	UTILIDAD	5%				\$ 8.214.228
	SUMAS ANTES DE IVA					\$ 220.141.298
	IVA Sobre utilidades	19%				\$ 1.560.703
	COSTO TOTAL OBRA					\$ 221.702.000

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.



FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
 Ingeniero Zona Occidente
 Empocaldas S.A. E.S.P.

MEMORANDO

1200-2024-II-00001469

Manizales, 26 de Abril de 2024

PARA: TANIA ECHEVERRI RIVERA

DE: DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: ENVIO ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 215 DEL 2023
MUNICIPIO DE ANSERMA

Para su revisión y demás fines necesarios anexo copia del acta de liquidación del convenio 215 del 2023 con el municipio de Anserma, Caldas para la OBRA CIVIL PARA LA REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CON CALLES 1 Y CALLE 1 SUR MUNICIPIO DE ANSERMA.



Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:

Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños
