

# CONTRATO Y AÑO	098 DE 2023	Acta N° 1	01 Y PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	253.881.105
CONTRATISTA	CONSORCIO C Y O			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	901.812.236			3. VALOR TOTAL (1+2)	253.881.105
CDP (#, rubro y fecha)	2024196/19/01/2024, 2320101001030848			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	2024211/19/01/2024, 2320101001030848			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	202,284,891
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EL LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 1210/2022 SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta**


**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Andrés Felipe Girardo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X
Fecha de presentación	30 DE DICIEMBRE 2023

*Do - PATM  
13-03-2024  
3:18 pm*

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05900009841	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

# Certificación Bancaria



Manizales, 4 de Diciembre de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO C Y O identificado(a) con NIT No. 901681236 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	05900009841	2023/12/04	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

\* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

# CONSORCIO C Y O

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS

Yo, CESAR AUGUSTO RESTREPO PARRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 10.283.310, actuando en mi capacidad profesional como Contador Público, en el CONSORCIO C Y O, con NIT. 901.812.236 -- 0, debidamente habilitada con tarjeta profesional No. 72272 - T, conferida por La Junta Central de Contadores.

### CERTIFICO

Que la empresa, desde el mes de junio hasta la fecha del mes de diciembre, ha cumplido de manera oportuna y exhaustiva con el pago de salarios a sus empleados, así como con todas las obligaciones legales y tributarias correspondientes al Sistema de Seguridad Social, incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales, además de los aportes pertinentes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, manteniéndose al día en todas estas responsabilidades.

Este cumplimiento se ajusta a lo establecido en la legislación vigente, en particular al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se emite a solicitud expresa del interesado, en Manizales, a los 30 días del mes de diciembre del 2023.



CESAR AUGUSTO RESTREPO PARRA

Cédula de Ciudadanía 10.283.310

Contadora CPT. 72272 - T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

686074685081AF90

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CESAR AUGUSTO RESTREPO PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10283310 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 72272-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**72272-T**

CESAR AUGUSTO  
RESTREPO PARRA  
C.C. : 0283310  
RESOLUCION INSCRIPCION 55  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 11/05/2000

Presidente *[Signature]*

80214



01/0000 24230

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



010253310



INDICE DERECH-10

FECHA DE NACIMIENTO **07-MAR-1969**

**SAN MARTIN**  
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH


**M**

SEXO

**30-ABR-1987 MANIZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0900100-00086241-M-0010283310-20081001

0003954991A 1

4510003190

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.283.310**

**RESTREPO PARRA**

APELLIDOS  
**CESAR AUGUSTO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*

FIRMA



CONSORCIO C Y O

NIT: 901681236-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 9 A8 27, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3007732129

Email. carlosgonzalez2008@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764058446932 válida desde 2023-10-23 hasta 2024-10-23 rango desde FE1 hasta FE20.

**Cliente:** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.  
E.S.P.  
**NIT :** 890803239  
**Dirección:** CR 2375 82, Manizales, Caldas, Colombia  
**Teléfono:**  
**Email:** facturacionelectronica@empocaldas.com.co

---

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Consignación bancaria  
**Fecha de Pago:** 22/03/2024  
**Total de Lineas:** 3

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FE1

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 10:09:28  
**FECHA FIRMADO:** 07/03/2024 10:09:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	03	2024	22	03	2024


#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$167.177.596,00				0,00	\$167.177.596,00
2	002	ADMINISTRACIÓN	NIU	1,00	\$26.748.415,36				0,00	\$26.748.415,36
3	003	UTILIDAD	NIU	1,00	\$8.358.879,80				0,00	\$8.358.879,80

<b>Notas:</b> REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED.	<b>Subtotal:</b>	\$202.284.891,16
	<b>Cargos:</b>	\$0.00
	<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>SON:</b> (doscientos dos millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos dieciseis centavos) <b>CUFE:</b> e2744689b403861c4cae2a02dd7a100cd922298d17bc57f3c586240e7c505034b69bee36b3bbab5f35f7d1038d62510	<b>Total:</b>	\$202.284.891,16

Firma Digital: hmiYk7xdRhmMaDN7vm6lnvztKzPzInHVhLAYz723JyW3oMaIII3uvGZEYq6113XVKZ8r1rBa0ZCuNYFdjG3668k9FV8khyuvVImdzvZNaKhe+D9pRZQzJIHQVWTV M5980v6AXAJdTEfswCR8jcZs77rjG7bywzISauTcRuzN80vgrRlbnGYWLY DHJ7dFX+rZLr2SSCdpIzIKJNYB8iIMuHm sYIBSX2gt19RPw2g1LuyCgIQ9ELWf J8Sz7a8Mn5vF6ShjEqUheJyCcg699shdcxCy8jMolles0004eV:5pJQqPh0qCv WcTf0ZOSNte5noERlgQS 3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**INFORME PARCIAL DE OBRA CONTRATO 098 DE 2023**

**CONTRATANTE  
EMPOCALDAS S.A E.S. P**



**CONTRATISTA  
CONSORCIO CY O**

**SUPERVISOR  
INTERVENTOR DE ZONA  
JUAN CARLOS GOMEZ**

**MANIZALES, CALDAS  
DICIEMBRE 2023**



## LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA OBRA:

El presente contrato tiene como objetivo realizar REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED.

## FICHA TECNICA

CONTRATO:	098 DE 2023
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD UNICA DE OFERTA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S.P R.L ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
OBJETO:	REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED.
CONTRATISTA:	CONSORCIO C Y O
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 253.881.105 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
FECHA DE INICIACION:	05 DE JUNIO DE 2023
FECHA FINALIZACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROBLEMATICAS DE LA OBRA

- En el área conocida como el Sector del Tambor, hemos enfrentado desafíos considerables debido a la amenaza de deslizamientos, especialmente exacerbada por las condiciones climáticas adversas durante la temporada de lluvias. Estos eventos han generado complicaciones significativas en la movilidad dentro de la zona y han obstaculizado el acceso a los sitios de trabajo durante un período prolongado.
- Además, la contratación de personal cualificado se ha vuelto una tarea ardua debido a la ubicación remota de nuestras obras en esta región. La distancia geográfica ha creado dificultades adicionales en el reclutamiento y retención de trabajadores con las habilidades necesarias para llevar a cabo nuestras operaciones de manera eficiente y segura.

Se ha dado inicio a las labores en el frente de trabajo, tras recibir la aprobación correspondiente por parte de la supervisión del contrato. Nos hemos enfocado especialmente en la provisión e instalación de tuberías en áreas clave, así como en la realización de mantenimiento de los tanques para garantizar un suministro adecuado de agua a la comunidad.

### **ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA.**

A continuación, presentamos el resumen general de ejecución del frente de trabajo hasta la fecha de este informe. Esta información es crucial para evaluar el progreso y el cumplimiento de nuestros objetivos.





#### **FRENTE DE TRABAJO EL TAMBOR LA MECERD**

Localización y replanteo de intervención
Descapote y limpieza
Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante
Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)
Demoliciones varias de repello o revoque existente interior - exterior
Revoque impermeabilizado
Suministro e instalación de válvula HD tipo globo de 2"
Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de 110 mm. Además del suministro de los elementos

## CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA POR FRENTE DE TRABAJO.


EL TAMBOR EN LA MERCED													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			VR. UNITARIO	CANTIDAD		CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206,000.00	1	\$ 206,000.00		\$ -	2.00	\$ 412,000.00	200%	2.00	\$ 412,000.00	200%
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1,750.00	93.4	\$ 163,450.00		\$ -	1029.60	\$ 1,801,800.00	1102%	1,029.60	\$ 1,801,800.00	1102%
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	\$ 5,300.00	463.93	\$ 2,458,829.00		\$ -	395.76	\$ 2,097,553.00	85%	395.76	\$ 2,097,553.00	85%
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	\$ 11,870.00	349.7	\$ 4,150,939.00		\$ -	279.15	\$ 3,313,511.00	80%	279.15	\$ 3,313,511.00	80%
1.7	Demoliciones varias de repello o revoque existente interior - exterior	M2	\$ 7,340.00	349.7	\$ 2,566,798.00		\$ -	674.91	\$ 4,953,875.00	193%	674.91	\$ 4,953,875.00	193%
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	\$ 51,330.00	463.93	\$ 23,813,527.00		\$ -	395.76	\$ 20,314,607.00	85%	395.76	\$ 20,314,607.00	85%
5.18	Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de 110mm. Además del suministro de los elementos	MI	\$ 86,635.00	1800	\$ 155,943,000.00			1550.00	\$ 134,284,250.00	86%	1,550.00	\$ 134,284,250.00	86%

REGISTRO FOTOGRAFICO.

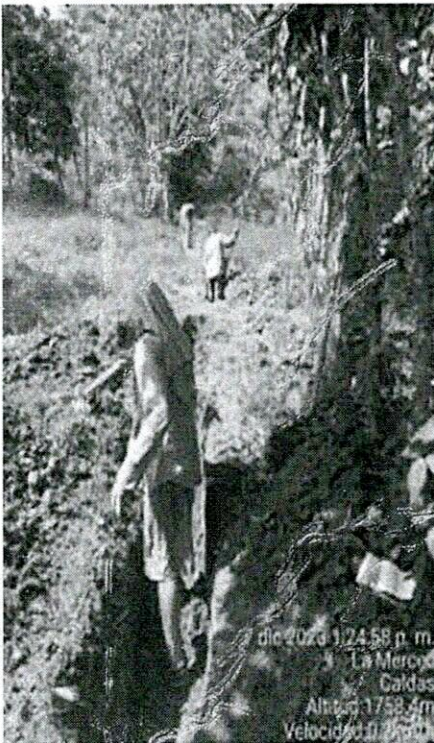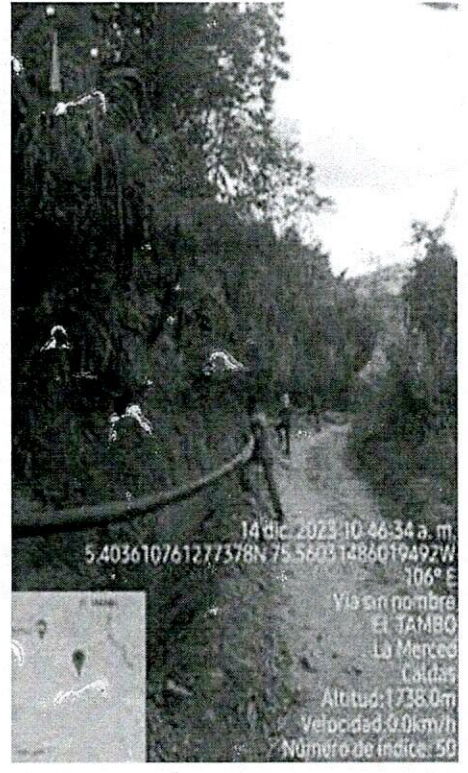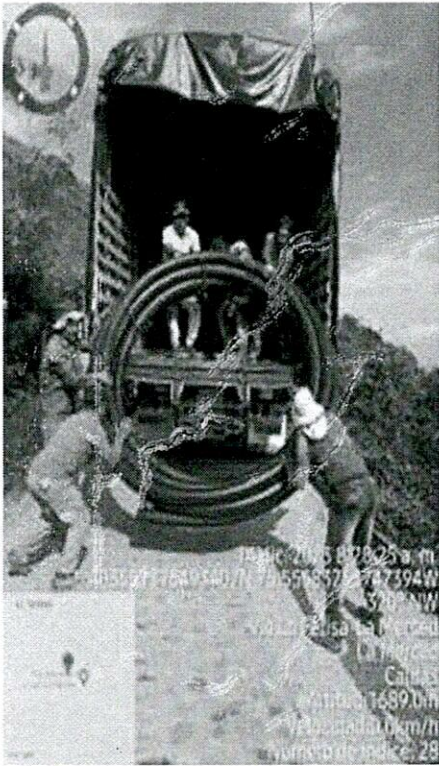




16 ene. 2024 4:18:17 p. m.  
Altitud: 1893.8m  
Velocidad: 0.0km/h

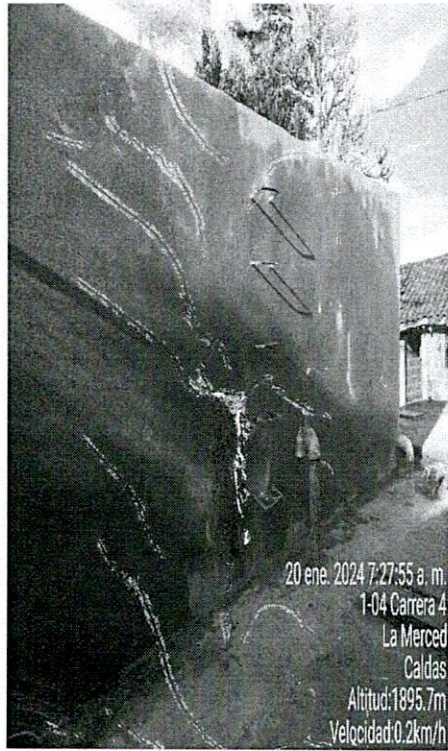

20 ene. 2024 7:27:55 a. m.  
1-04 Carrera 4  
La Merced  
Caldas  
Altitud: 1895.7m  
Velocidad: 0.2km/h

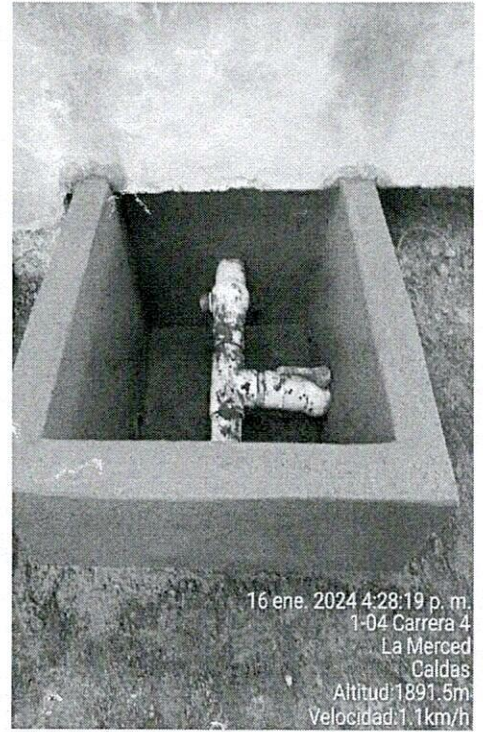


16 ene. 2024 4:28:19 p. m.  
1-04 Carrera 4  
La Merced  
Caldas  
Altitud: 1891.5m  
Velocidad: 1.1km/h



15 ene. 2024 9:29:13 a. m.



29 dic. 2023 10:22:41 a. m.  
Via Salamina-La Merced  
PEÑA RICA  
La Merced  
Caldas  
Altitud: 2048.5m  
Velocidad: 0.0km/h

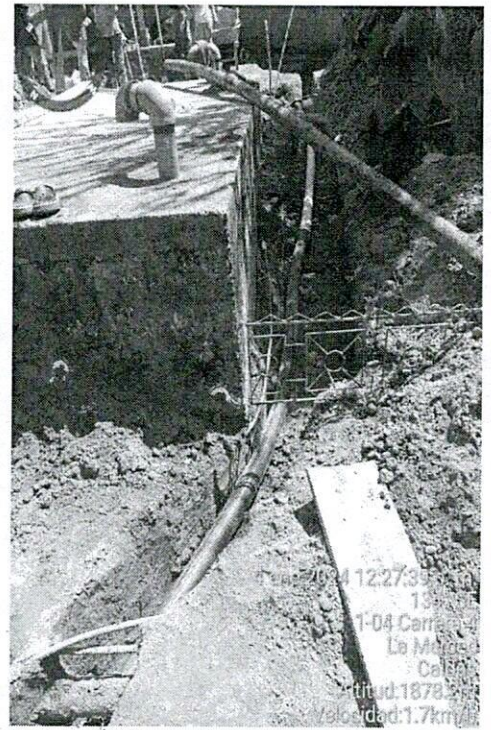


20 ene. 2024 12:27:39 p. m.  
1-04 Carrera 4  
La Merced  
Caldas  
Altitud: 1878.5m  
Velocidad: 1.7km/h

## RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 098 DE 2023

VALOR DEL CONTRATO	\$ 253,881,105	
VALOR ADICION	\$ 0	
VALOR ACTAS ANTERIORES		-
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 202,284,891
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 51,596,214
SUMAS IGUALES	\$ 253,881,105	\$ 253,881,105

En el anterior informe y registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se han realizado en los puntos de trabajo durante la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED.

Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor INGENIERO DE ZONA el cual aprobó cada una de estas.



**CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO**  
Rep. Legal CONSORCIO C Y O  
Contratista

ACORDA DEL 3 JUNIO AL 30 DE 2023 C 098 EL TAMBOR LA MERCED DE 2023 CONSORCIO C Y O

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR		FIRMAS						
								TRANSPORTE	DEVENGADO		PENSION	SALUD	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR								
ADRIAN FERNANDO SUAREZ CASTAÑO	75.059.833	Ayudante	26.0	05/06/2023	30/06/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,005,333	\$ 121,859	\$ 1,127,192	\$ 40,213	\$ 40,213	\$ 80,427	\$ 1,046,765									
SILVERIO MARIN BETANCURTH	1,055,478,209	Ayudante	26.0	05/06/2023	30/06/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,005,333	\$ 121,859	\$ 1,127,192	\$ 40,213	\$ 40,213	\$ 80,427	\$ 1,046,765	Silverio M.								
MAURO ALEJANDRO MARIN AGUDELO	1,056,121,145	Ayudante	26.0	05/06/2023	30/06/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,005,333	\$ 121,859	\$ 1,127,192	\$ 40,213	\$ 40,213	\$ 80,427	\$ 1,046,765	Mauro Alejandro								
VICTOR HUCO ARANGO ARENAS	75.097.254	Maestro	26.0	05/06/2023	30/06/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,005,333	\$ 121,859	\$ 1,127,192	\$ 40,213	\$ 40,213	\$ 80,427	\$ 1,046,765	Victor H. Arango								
TOTAL NOMINA OBRA													\$ 4,640,000.00	\$ 4,021,333.33	\$ 487,434.13	\$ 4,508,767.47	\$ 160,853.33	\$ 160,853.33	\$ 321,706.67	\$ 4,187,060.80		

NOMINA DEL 1 JULIO AL 28 DE 2023 C 060 EL TAMBOR LA MERCED DE 2023 CONSORCIO C Y O

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR		FIRMAS
										PENSION	SALUD	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	
ADRIAN FERNANDO SUAREZ CASTAÑO	75,059,833	Ayudante	28.0	01/07/2023	28/07/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,082,667	\$ 131,232	\$ 1,213,899	\$ 43,307	\$ 43,307	\$ 86,613	\$ 1,127,286	\$ 1,127,286	<i>[Signature]</i>
SILVERIO MARIN BETANCURTH	1,056,478,209	Ayudante	28.0	01/07/2023	28/07/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,082,667	\$ 131,232	\$ 1,213,899	\$ 43,307	\$ 43,307	\$ 86,613	\$ 1,127,286	\$ 1,127,286	Silverio M.
MAURO ALEJANDRO MARIN AGUIDELO	1,056,121,145	Ayudante	28.0	01/07/2023	28/07/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,082,667	\$ 131,232	\$ 1,213,899	\$ 43,307	\$ 43,307	\$ 86,613	\$ 1,127,286	\$ 1,127,286	Mauro Alejandro
VICTOR HUGO ARANGO ARENAS	75,097,254	Maestro	28.0	01/07/2023	28/07/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,082,667	\$ 131,232	\$ 1,213,899	\$ 43,307	\$ 43,307	\$ 86,613	\$ 1,127,286	\$ 1,127,286	Victor H. Arango
TOTAL NOMINA OBRA						\$ 4,640,000.00	\$ 4,330,966.67	\$ 524,929.07	\$ 4,855,895.73	\$ 173,226.67	\$ 173,226.67	\$ 346,453.33	\$ 4,509,142.40	\$ 4,509,142.40	



NOMINA OCTUBRE 2023 C 094 EL TAMBOR LA MERCED DE 423 CONSORCIO C.Y.O

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	FIRMAS	
										PENSION	SALUD	TOTAL DEDUCCIONES			
ADRIAN FERNANDO SUAREZ CASTAÑO	75,059,833	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	<i>[Signature]</i>	
SILVERIO MARIN BETANCURTH	1,055,478,209	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	SILVERIO M	
MAURO ALEJANDRO MARIN AGUIBELO	1,056,121,145	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Mauro Alejandro	
VICTOR HUGO ARANGO ARENAS	75,059,254	Maestro	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Victor H. Arango	
YOHAN MAURICIO MARIN MURILLO	75,050,341	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Johan Mauricio	
JESUS ALBERTO HEMAO CUESTA	1,055,479,018	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Jesus Alberto H	
CRISTIAN DE JESUS BRITO SANCHEZ	1,045,424,056	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Cristian Brito	
JOSE EIBER PARRA GONZALEZ	75,050,406	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Jose Eiber Parra	
FRANCESNET ZAPATA RUA	1,055,478,835	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Francesnet R.	
LUIS FERNEY GALLEGO	75,030,335	Ayudante	12.0	19/10/2023	30/10/2023	\$ 1,160,000	\$ 464,000	\$ 56,242	\$ 520,242	\$ 18,560	\$ 18,560	\$ 37,120	\$ 483,122	Luis Ferny Gallego	
TOTAL NOMINA OBRA										\$ 11,600,000.00	\$ 4,640,000.00	\$ 562,824.00	\$ 185,600.00	\$ 371,200.00	\$ 4,831,224

*[Signature]*  
CARLOS ANDRES GONZALEZ

NOVIEMBRE 2023 E 01 ESTIMADOS (A MERCED DE 2023 CONSORSIO) Y O

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALARIO BASICO PERIODO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR		FIRMAS
										PENSION	SALUD	ALDEBUCCIO	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	
ADRIAN FERNANDO SUAREZ CASTAÑO	75.059.833	Ayudante	12.0	07/11/2023	10/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 428,000	\$ 59,242	\$ 530,242	\$ 18,592	\$ 37,120	\$ 37,120	\$ 483,122	\$ 483,122	<i>[Signature]</i>
SILVERIO MARRI BETANCURTH	1,055,478,209	Ayudante	24.0	07/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 928,000	\$ 112,485	\$ 1,040,485	\$ 37,120	\$ 37,120	\$ 74,240	\$ 966,245	\$ 966,245	<i>SILVERIO MARRI B.</i>
MAURO ALEJANDRO MARRI AGUDELO	1,055,121,145	Ayudante	24.0	07/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 928,000	\$ 112,485	\$ 1,040,485	\$ 37,120	\$ 37,120	\$ 74,240	\$ 966,245	\$ 966,245	<i>MAURO ALEJANDRO MARRI A.</i>
VICTOR HUGO ARANGO ARENAS	75.097.254	Ayudante	24.0	07/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 928,000	\$ 112,485	\$ 1,040,485	\$ 37,120	\$ 37,120	\$ 74,240	\$ 966,245	\$ 966,245	<i>VICTOR H. ARANGO</i>
YOHAN MAURICIO MARRI BURILLO	75.060.341	Ayudante	24.0	07/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 928,000	\$ 112,485	\$ 1,040,485	\$ 37,120	\$ 37,120	\$ 74,240	\$ 966,245	\$ 966,245	<i>YOHAN MAURICIO MARRI B.</i>
JESUS ALBERTO HENAO CUESTA	1,055,478,018	Ayudante	24.0	07/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 928,000	\$ 112,485	\$ 1,040,485	\$ 37,120	\$ 37,120	\$ 74,240	\$ 966,245	\$ 966,245	<i>JESUS ALBERTO H.</i>
CRISTIAN DE JESUS BRITO SANCHEZ	1,045,424,058	Ayudante	14.0	08/11/2023	21/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 511,333	\$ 65,616	\$ 608,949	\$ 21,653	\$ 21,653	\$ 43,307	\$ 563,643	\$ 563,643	<i>CRISTIAN BRITO S.</i>
JOSE EIBER FARRA GONZALEZ	75.050.409	Ayudante	21.0	10/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 812,000	\$ 99,424	\$ 910,424	\$ 37,480	\$ 37,480	\$ 64,960	\$ 845,464	\$ 845,464	<i>JOSE EIBER FARRA G.</i>
FRANCESHET ZAPATA RUA	1,055,478,835	Ayudante	11.0	20/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 425,333	\$ 51,655	\$ 476,989	\$ 17,013	\$ 17,013	\$ 34,027	\$ 442,962	\$ 442,962	<i>FRANCESHET Z.</i>
LUIS FERREY CALLEGO	75.050.335	Ayudante	11.0	20/11/2023	30/11/2023	\$ 1,160,000	\$ 425,333	\$ 51,655	\$ 476,989	\$ 17,013	\$ 17,013	\$ 34,027	\$ 442,962	\$ 442,962	<i>LUIS FERREY CALLEGO</i>
TOTAL NOMINA OBRA										\$ 292,320.00	\$ 534,640.00	\$ 534,640.00	\$ 7,609,178		

*[Signature]*  
CARLOS ANDRES GONZALEZ

NOMINA DICIEMBRE 2023 C 068 EL TAMBOR LA MERCED DE 2023 CONSORCIO C Y O

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	FIRMAS
										PENSION	SALUD	OTRALDEUCCIONE	TOTAL A PAGAR	
SILVERIO MARIN BETANCURTH	1,055,478,209	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Silverio M.
MAURO ALEJANDRO MARIN AGUDELO	1,056,121,145	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Mauro Alejandro
VICTOR HUGO ARANGO ARENAS	75,597,254	Maestro	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Victor H. Arango
YOHAN MAURICO MARIN MURILLO	75,060,341	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Yohana Murillo
JESUS ALBERTO HEMAO CUESTA	1,055,479,018	Ayudante	11.0	01/12/2023	11/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 425,333	\$ 51,556	\$ 476,889	\$ 17,013	\$ 17,013	\$ 34,027	\$ 442,862	Jesus Alberto H
JOSE EIBER PARRA GONZALEZ	75,060,406	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Jose Eiber Parra
FRANCESNET ZAPATA RUA	1,055,478,835	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Francisco
LUIS FERNEY GALLEGO	75,060,335	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Luis Ferney G
JOSE ARLEY AGUDELO GRANADA	1,002,520,522	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Jose Arley
HECTOR WILLIAM GALLEGSO PATIÑO	1,002,520,175	Ayudante	30.0	01/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000	\$ 140,606	\$ 1,300,606	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 92,800	\$ 1,207,806	Hector
ELMER HENAO CASTAÑO	8,432,681	Ayudante	16.0	15/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 618,667	\$ 74,990	\$ 693,657	\$ 24,747	\$ 24,747	\$ 49,493	\$ 644,163	Elmer Henao
HEINER GARCIA RAJIREZ	75,060,474	Ayudante	11.0	20/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 425,333	\$ 51,556	\$ 476,889	\$ 17,013	\$ 17,013	\$ 34,027	\$ 442,862	Heiner Garcia
JUNIOR JESUS GARCIA ACEVEDO	1,090,538,426	Ayudante	11.0	20/12/2023	30/12/2023	\$ 1,160,000	\$ 425,333	\$ 51,556	\$ 476,889	\$ 17,013	\$ 17,013	\$ 34,027	\$ 442,862	Junior Garcia
TOTAL NOMINA OBRA						\$ 15,020,000.00	\$ 12,234,666.67	\$ 1,493,110.47	\$ 13,829,777.13	\$ 493,386.67	\$ 493,386.67	\$ 986,773.33	\$ 12,843,004	

  
CARLOS ANDRES GONZALEZ



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	27/12/23	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	----------	--------------	--	------------	---

Objeto:	REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED.
Nombre Contratista:	CONSORCIO C Y O
Fecha del contrato:	10-02-2023
Plazo inicial de ejecución:	60 días calendario
Valor inicial:	\$ 253.881.105
Fecha de iniciación:	05-06-2023
Fecha de terminación inicial:	03-08-2023
Nueva fecha terminación (Prorroga 1)	05-12-2023
Nueva fecha terminación (Prorroga 2)	31-12-2023
Supervisor:	JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	80%
Avance físico Acumulado	80%

##### 1.2. Informe de actividades: ( **Se anexa resumen de ejecución de la obra**)



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

INSTALACIÓN DE TUBERÍA POLIETILENO PE-100 PN 16 110mm		
SECCIONAL	SERVICIO	METROS
LA MERCED	ACUEDUCTO	1550 m

#### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución inicial:	60 DIAS
Plazo adicional:	150 DIAS
Tiempo total transcurrido:	209 DIAS
Avance Porcentual:	99%

#### 1.4. Registro fotográfico

##### OBRA 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA




- Excavaciones para instalar tubería



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

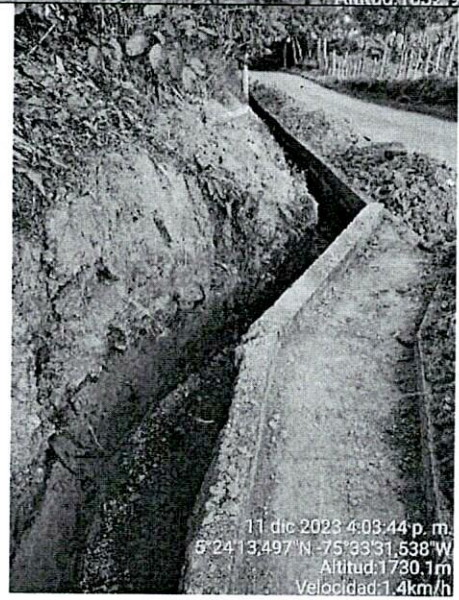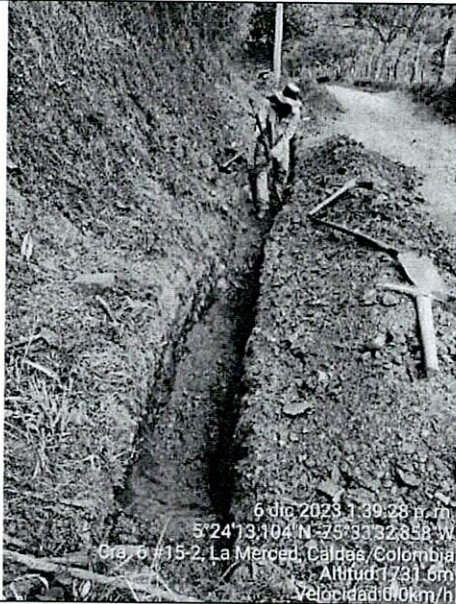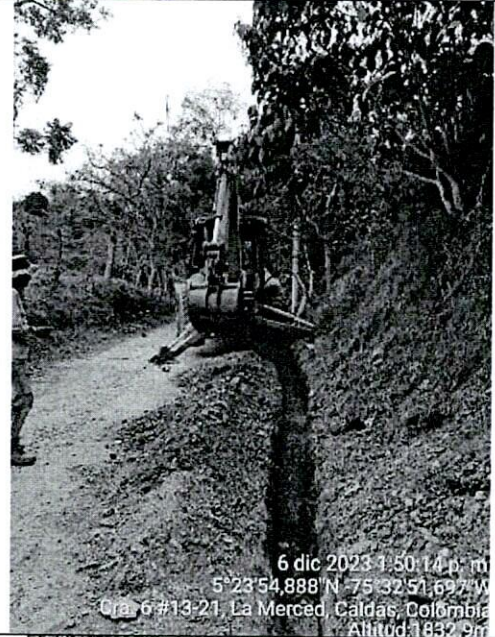




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- Instalación de tubería
- Anclajes en accesorios
- Empalmes y llenos


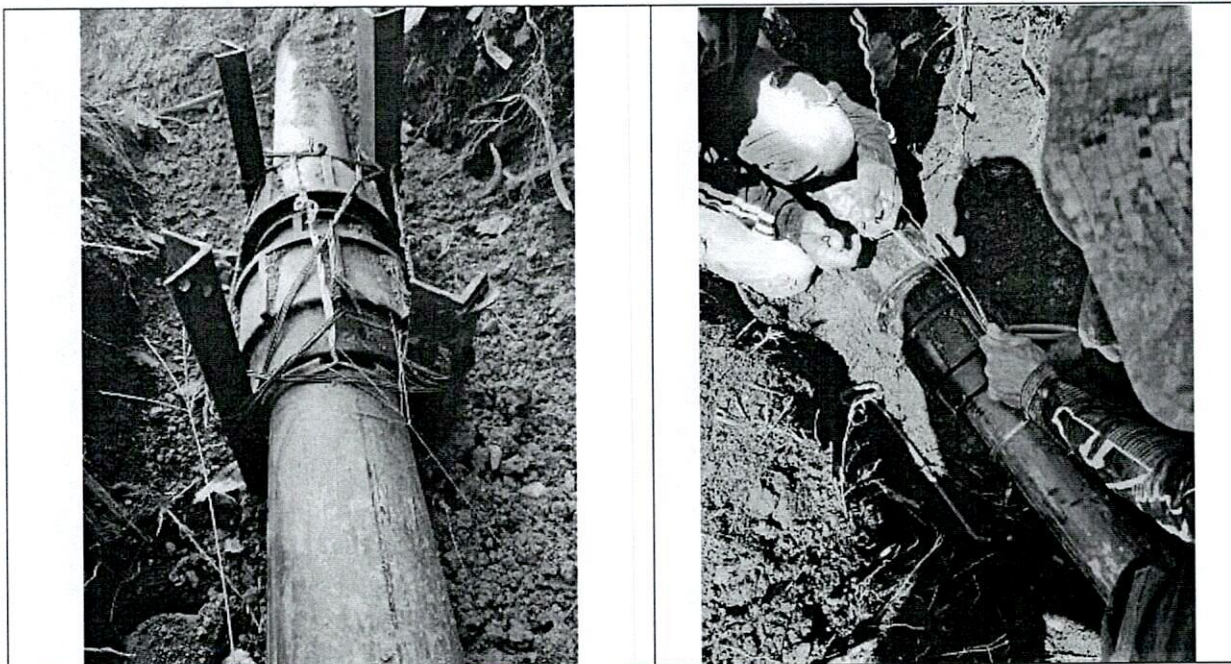




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

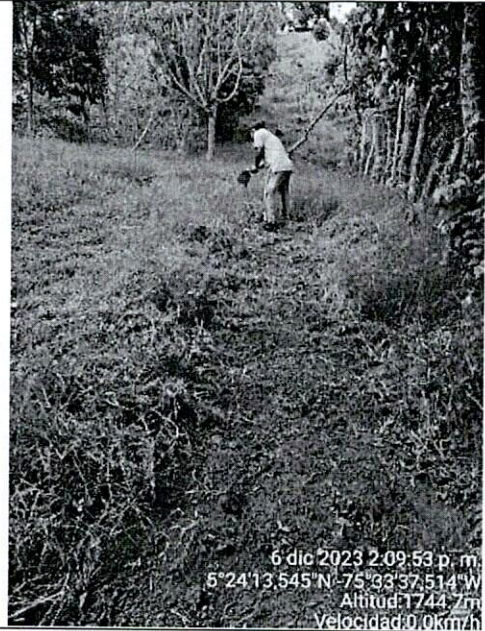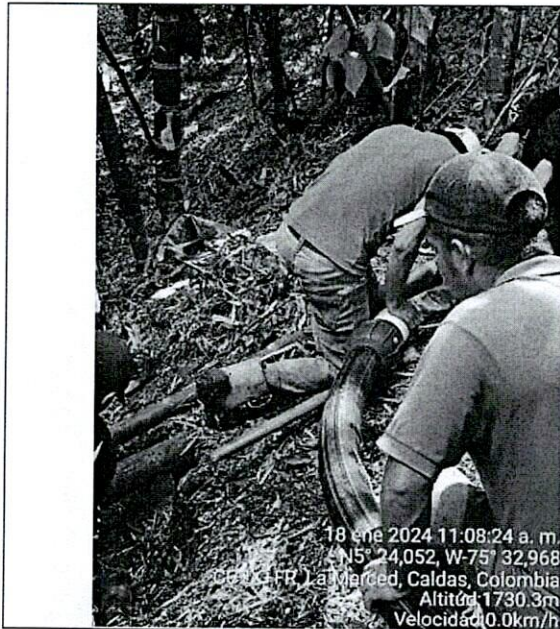

#### OBRA 2 REVOQUE IMPERMEABILIZADO Y MANTENIMIENTO TANQUE

- Mantenimiento exterior e interior del tanque








F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

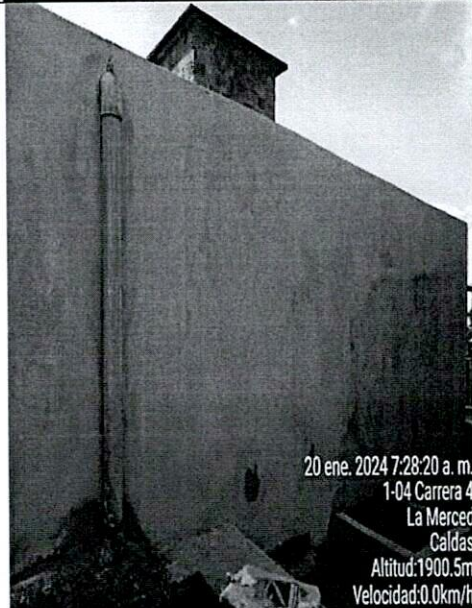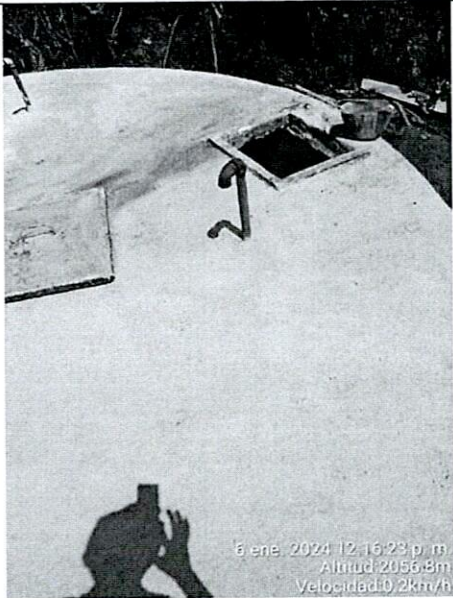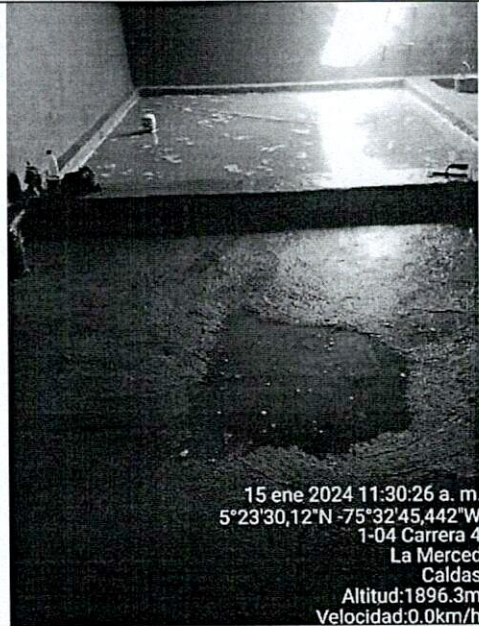



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### LOCALIZACION GENERAL DE LA ZONA

La zona donde se realizan los trabajos de instalación de tubería para el acueducto y mantenimiento del tanque está ubicada en el área rural del municipio de La Merced - Caldas, en la vereda El Tambor.

#### 1.5. Problemáticas con la obra:

Algunos problemas que se presentaron durante la ejecución de la obra fueron:

- Ya que es zona rural y el trazado de la tubería está por zona boscosa, se presentaron amenazas de deslizamientos, esto también debido a las condiciones climáticas y las constantes lluvias

#### AVANCE DE LA OBRA:

Se encuentra en un estado de ejecución del 80% lo que representa una ejecución en pesos de \$202.284.891

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 253.881.105
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 202.284.891
Porcentaje ejecutado en el periodo:	80%
Inversión total ejecutada:	\$ 202.284.891
Porcentaje total ejecutado:	80%

## 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101042505	05/06/2023	31/03/2024	\$76.164.332
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101042505	05/06/2023	31/12/2026	\$50.776.221
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101042505		5 AÑOS	\$50.776.221
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101042505	05/06/2023	31/03/2024	\$76.164.332

Se anexa pólizas actualizadas

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X

En relación con el pago de la seguridad social de los empleados de la obra, se anexa paquete de pago las nóminas y las planillas del personal empleado en la obra.

	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODOS LOS TRABAJADORES	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

En cuanto a la seguridad social de la representante legal de la obra se expide constancia juramentada avalada por contador con matrícula, cedula y registro

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
02/11/2023	A	A	A	A	NU	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

#### 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación).

Se anexan en el paquete para pago del acta 01, las preactas o medidas de la obra ejecutada de las actividades pactadas inicialmente

#### 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

Respecto al impacto social se establece un alto nivel de favorabilidad, teniendo en cuenta que las comunidades beneficiarias han recibido con agrado la intervención destacando el gran beneficio que esto representa en el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes con la reposición de las redes de alcantarillado las cuales por su avanzado estado de deterioro están generando afectaciones en los sectores intervenidos.

##### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

4 empleados de mano de obra no calificada del municipio de La Merced, Caldas.

##### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población rural del municipio de La Merced Caldass, vereda El Tambor

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		X
Informe de actividades o Bitácora	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

Juan Carlos Gomez Mosquera  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



#### ANEXO 1: BALANCE DE OBRA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se presenta el balance de ejecución de obras, cuyo alcance físico es descrito en la siguiente tabla.

EL TAMBOR EN LA MERCED								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		TOTAL	ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			VR.UNITARIO	CANTIDAD		CANTIDAD	VR. TOTAL	
1.1	Localización y replanteo de	Und	\$ 206,000.00	1	\$ 206,000.00	2.00	\$ 412,000.00	200%
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1,750.00	93.4	\$ 163,450.00	1,029.60	\$ 1,801,800.00	1102%
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con adecuación cara exterior de	M2	\$ 5,300.00	463.93	\$ 2,458,829.00	395.76	\$ 2,097,553.00	85%
1.6	tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque de defectos) y relleno o revoque existente interior -	M2	\$ 11,870.00	349.7	\$ 4,150,939.00	279.15	\$ 3,313,511.00	80%
1.7	exterior	M2	\$ 7,340.00	349.7	\$ 2,566,798.00	674.91	\$ 4,953,875.00	193%
2.1	Excavación en material común de O	M3	\$ 23,250.00	46.7	\$ 1,085,775.00	0.00	\$ -	0%
2.8	Regada de material sobrante de la	M3	\$ 11,500.00	2.335	\$ 26,853.00	0.00	\$ -	0%
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	\$ 51,330.00	463.93	\$ 23,813,527.00	395.76	\$ 20,314,607.00	85%
4.4	Suministro e instalación de válvula HD tipo globo de 2"	UND	\$ 809,300.00	2	\$ 1,618,600.00	0.00	\$ -	0%
4.13	Suministro e instalación pasamuro L30 de 2"	UND	\$ 70,000.00	4	\$ 280,000.00	0.00	\$ -	0%
5.18	polietileno de alta densidad PE-100 PN 16 de 110 mm. Además del suministro de los elementos	MI	\$ 86,635.00	1800	\$ 155,943,000.00	1,550.00	\$ 134,284,250.00	86%
5.23	Suministro e instalación de unión PEAD PE - 100 110 mm PN 16	Und	\$ 260,600.00	22.00	\$ 5,733,200.00	0.00	\$ -	0%
8.1	Traslado de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820.00	550	\$ 451,000.00	0.00	\$ -	0%
8.2	Sobreacarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63,940.00	151.49541	\$ 9,686,617.00	0.00	\$ -	0%
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 208,184,588.00</b>		<b>\$ 167,177,596.00</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 208,184,588.00</b>		<b>\$ 167,177,596.00</b>	
ADMINISTRACION %					16%	\$ 33,309,534.08	\$ 26,748,415.36	
UTILIDAD %					5%	\$ 10,409,229.40	\$ 8,358,879.80	
IVA SOBRE UTILIDAD %					19%	\$ 1,977,753.59		
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 253,881,105.07</b>		\$ 202,284,891.16	

#### Resumen del Contrato

VALOR DEL CONTRATO	\$ 253,881,105	
VALOR ADICION	\$ 0	
VALOR ACTAS ANTERIORES		-
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 202,284,891
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 51,596,214
SUMAS IGUALES	\$ 253,881,105	\$ 253,881,105

CONTRATO No		098/2023		MUNICIPIO		LA MERCED												
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)	
	Conduccion	Vda el Tambor	110	1550	PE	Instalacion con apertura de zanja		SI	4585	ICONTEC	E3-3990-23	TECNOPIPE		12/12/2023	NA	NA	NA	
NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR		JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA																
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR																		
VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO																		
NOMBRE CONTRATISTA		CONSORCIO C Y O																
FIRMA CONTRATISTA																		
		REP LEGAL CARLOS A GONZALEZ L																



Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra 098-2023

Acta Número 01

CENTROS DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	202,284,891		202,284,891.16	ACUEDUCTO	202,284,891.16	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				202,284,891.16	-	202,284,891.16		202,284,891.16	-
TOTAL FACTURA				202,284,891.16	-	202,284,891.16		202,284,891.16	-

Fecha de Presentación 31/12/2023

DATOS DEL SUPERVISOR	
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA CENTRO - NORTE
NOMBRE	CARGO

Firma





CONTRATO No. 098 de 2023

ACTA No. 01 PARCIAL

FECHA CORTE: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO  
EN LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED (GRUPO 11)

FECHA INICIACIÓN: JUNIO 05 DE 2023

FECHA VENCIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023

MUNICIPIOS: LA MERCED. - DEPARTAMENTO: CALDAS  
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. GONZALEZ L

VALOR CONTRATO: \$ 253.881.105,00

VALOR ADICIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO C Y O SUPERVISIÓN: INGENIERO DE ZONA JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			VOLUMENARIO	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	206.000,00	1	206.000,00	\$ 412.000,00	\$ 412.000,00	200%	200%
1.3	Descapote y limpieza	M2	1.750,00	93,4	163.450,00	\$ 1.801.800,00	\$ 1.801.800,00	102%	1102%
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	5.300,00	463,93	2.458.829,00	\$ 2.097.553,00	\$ 2.097.553,00	86%	86%
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	11.870,00	349,7	4.150.939,00	\$ 3.313.511,00	\$ 3.313.511,00	80%	80%
1.7	Demoliciones varias de repello o revoque existente interior exterior	M2	7.340,00	349,7	2.566.798,00	\$ 4.953.875,00	\$ 4.953.875,00	195%	195%
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	51.330,00	463,93	23.813.527,00	\$ 20.314.607,00	\$ 20.314.607,00	86%	86%
5.18	Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE-100 PN 16 de 110 mm. Además del suministro de los elementos	MI	86.635,00	1800	155.943.000,00	\$ 134.284.250,00	\$ 134.284.250,00	86%	86%
COSTO TOTAL					\$ 208.184.588,00	\$ 167.177.596,00	\$ 167.177.596,00		
COSTO DIRECTO					\$ 208.184.588,00	\$ 167.177.596,00	\$ 167.177.596,00		
ADMINISTRACIÓN %					\$ 33.309.534,08	\$ 26.748.415,36	\$ 26.748.415,36		
UTILIDAD %					\$ 10.892.229,40	\$ 8.358.879,80	\$ 8.358.879,80		
IVA SOBRE UTILIDAD %					\$ 1.977.733,59	\$ -	\$ -		
VALOR TOTAL OBRA					\$ 253.881.105,07	\$ 202.284.891,16	\$ 202.284.891,16		
TOTAL A PAGAR OBRA					\$ -	\$ -	\$ -		

EL TAMBOR EN LA MERCED	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 253.881.105,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 202.284.891,16
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 51.596.214
SUMAS IGUALES	\$ 253.881.105,00

RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 253.881.105,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 202.284.891,16
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 51.596.214
SUMAS IGUALES	\$ 253.881.105,00

CONSORCIO C Y O  
CARLOS A. GONZALEZ REP. LEGAL

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA  
Supervisor Obra  
FIRMA SUPERVISOR

RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 253.881.105,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 202.284.891,16
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 51.596.214
SUMAS IGUALES	\$ 253.881.105,00

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

CONTRATO No.	098 DE 2023	ACTA 01 PARCIAL FEBRERO 8 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO C Y O	FECHA INICIACIÓN: JUNIO 05 DE 2023
SUPERVISOR:	INTERVENTOR DE ZONA	FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2023

EL TAMBOR

ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
1.1	Localización y replanteo de intervención:							Und		2.00	2.00	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
6	11	0	208					1.00	1.00	TANQUE 1		
14	11	208	426					1.00	2.00	TANQUE 2		
									2.00			
									CANTIDAD DE PAGO			2.00

ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
1.3	Descapote y limpieza							m <sup>2</sup>		1029.60	1029.60	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
7	11	0	208	208.00	1.20			249.60	249.60	TRAMO 1		
15	11	208	426	218.00	1.20			261.60	511.20	TRAMO 2		
22	11	426	657	231.00	1.20			277.20	788.40	TRAMO 3		
29	11	657	730	73.00	1.20			87.60	876.00	TRAMO 4		
30	11	730	858	128.00	1.20			153.60	1029.60	TRAMO 5		
									CANTIDAD DE PAGO			1029.60

ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante									m2		395.76	395.76
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA		TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	lados/ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
26	12			8.50	2.00	2.20		37.40	37.40	Lado 1 interno x alto tanque La Merced			
26	12			7.50	2.00	2.20		33.00	70.40	Lado 2 interno x alto tanque La Merced			
26	12			8.50	7.50			63.75	134.15	Techo por debajo tanque La Merced			
27	12			7.50	0.60			4.50	138.65	Viga desarrollo 60cm x 7,5de largo tanque La Merced			
28	12			8.50	7.50			63.75	202.40	Piso tanque La Merced			
21	12			8.00	2.00	2.20		35.20	237.60	Lado 1 interno x alto tanque El Tambor			
22	12			7.50	2.00	2.20		33.00	270.60	Lado 2 interno x alto tanque El Tambor			
22	12			8.00	7.50			60.00	330.60	Techo por debajo tanque El Tambor			
22	12			7.50	0.60			4.50	335.10	Viga desarrollo 60cm x 7,5de largo tanque El Tambor			
22	12			8.05	7.54			60.66	395.76	Piso tanqueEl Tambor			
											CANTIDAD DE PAGO		395.76
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)									m2		279.15	279.15
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD		TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Lados/Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
26	12			8.90	2.00	2.40		42.72	42.72	Lado 1 externo x alto tanque La Merced			
26	12			7.90	2.00	2.40		37.92	80.64	Lado 2 externo x alto tanque La Merced			
26	12			8.90	7.90			70.31	150.95	Techo por encima tanque La Merced			
21	12			8.00	2.00	2.20		35.20	186.15	Lado 1 externo x alto tanque El Tambor			
22	12			7.50	2.00	2.20		33.00	219.15	Lado 2 externo x alto tanque El Tambor			
22	12			8.00	7.50			60.00	279.15	Techo por encima tanque El Tambor			
											0.00		
											0.00		
											CANTIDAD DE PAGO		279.15

ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.7	Demoliciones varias de repello o revoque existente interior - exterior								M2		674.91	674.91
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
26	12			8.50	2.00	2.20		37.40	37.40	Lado 1 interno x alto tanque La Merced		
26	12			7.50	2.00	2.20		33.00	70.40	Lado 2 interno x alto tanque La Merced		
26	12			8.50	7.50			63.75	134.15	Techo por debajo tanque La Merced		
27	12			7.50	0.60			4.50	138.65	Viga desarrollo 60cm x 7,5de largo tanque La Merced		
28	12			8.50	7.50			63.75	202.40	Piso tanque La Merced		
26	12			8.00	2.00	2.20		35.20	237.60	Lado 1 externo x alto tanque La Merced		
26	12			7.50	2.00	2.20		33.00	270.60	Lado 2 externo x alto tanque La Merced		
26	12			8.00	7.50			60.00	330.60	Techo por encima tanque La Merced		
21	12			7.50	0.60			4.50	335.10	Lado 1 interno x alto tanque El Tambor		
22	12			8.05	7.54			60.66	395.76	Lado 2 interno x alto tanque El Tambor		
22	12			8.90	2.00	2.40		42.72	438.48	Techo por debajo tanque El Tambor		
22	12			7.90	2.00	2.40		37.92	476.40	Viga desarrollo 60cm x 7,5de largo tanque El Tambor		
22	12			8.90	7.90			70.31	546.71	Piso tanqueEl Tambor		
21	12			8.00	2.00	2.20		35.20	581.91	Lado 1 externo x alto tanque El Tambor		
22	12			7.50	2.00	2.20		33.00	614.91	Lado 2 externo x alto tanque El Tambor		
22	12			8.00	7.50			60.00	674.91	Techo por encima tanque El Tambor		
										CANTIDAD DE PAGO		674.91

ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.5	Revoque impermeabilizado								M2		395.76	395.76
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
26	12			8.50	2.00	2.20		37.40	37.40	Lado 1 interno x alto tanque La Merced		
26	12			7.50	2.00	2.20		33.00	70.40	Lado 2 interno x alto tanque La Merced		
26	12			8.50	7.50			63.75	134.15	Techo por debajo tanque La Merced		
27	12			7.50	0.60			4.50	138.65	Viga desarrollo 60cm x 7,5de largo tanque La Merced		
28	12			8.50	7.50			63.75	202.40	Piso tanque La Merced		
21	12			8.00	2.00	2.20		35.20	237.60	Lado 1 interno x alto tanque El Tambor		
22	12			7.50	2.00	2.20		33.00	270.60	Lado 2 interno x alto tanque El Tambor		
22	12			8.00	7.50			60.00	330.60	Techo por debajo tanque El Tambor		
22	12			7.50	0.60			4.50	335.10	Viga desarrollo 60cm x 7,5de largo tanque El Tambor		
22	12			8.05	7.54			60.66	395.76	Piso tanqueEl Tambor		
										CANTIDAD DE PAGO		395.76


		CANTIDAD DE PAGO	0.00
--	--	------------------	------

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.18	Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE-100 PN 16 de 110 mm	ml		1550.00	1550.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LARGO	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
6	11	0	208					208.00	208.00	TRAMO 1
14	11	208	426					218.00	426.00	TRAMO 2
21	11	426	657					231.00	657.00	TRAMO 3
28	11	657	730					73.00	730.00	TRAMO 4
29	11	730	858					128.00	858.00	TRAMO 5
1	12	858	1036					178.00	1036.00	TRAMO 6
6	12	1036	1188					152.00	1188.00	TRAMO 7
11	12	1188	1302					114.00	1302.00	TRAMO 8
14	12	1302	1550					248.00	1550.00	TRAMO 9

		CANTIDAD DE PAGO	1550.00
--	--	------------------	---------

		CANTIDAD DE PAGO	0.00
--	--	------------------	------

  
 CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDONO  
 FIRMA CONTRATISTA.

  
 JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA  
 FIRMA SUPERVISOR

Factura electrónica

CUFE:

# DIAN

e2744689b-403861c4ca2a02dd7a100cd922298d17bc57f5c586240e7c505034b69beac36b3bbab5f357d1038d62510

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 1

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-03-2024

[Descargar PDF](#)

### DATOS DEL EMISOR

NIT: 901681236

Nombre: CONSORCIO C Y O

### DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 890803239

Nombre: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

### TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$0

Total: \$202,284,891

### ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura  
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CONSORCIO C Y O

### Validaciones del documento

Nombre

Resultado

Valida NIT

[Modificación](#)

Valida NIT

[Modificación](#)

### Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.  
Este documento le sirve como certificado de existencia

07-03-2024 07-03-2024 FE FE1 Factura e electrónica 901661236 CONSORCIO C.Y.O 890803239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica 5202,264,691
