



F-GC-22
Versión 6
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

Jurídica

# CONTRATO Y AÑO	RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00190 DE 2017 Y RESOLUCION DE PAGO No. 00222 DE JULIO 17	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	12.922.740
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			7.778.904	12.922.740
NIT O CC:	10.280.643			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00570 DE MAYO 09 DE 2017 Y 00664 DE JUNIO 13 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.922.740
RP (#, rubro y fecha)	000762 DE JUNIO 29 DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA PARA LA CORRECCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GUARINO, MEDIANTE EL SISTEMA DE DRAGADO, EN LA BOCATOMA SOBRE EL RÍO GUARINO SECTOR DEL LLANO, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-				

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		
3- Pagos al FIC		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.		
9- Diseño de Mezclas		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28		
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		

Nota: Si pasa los tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Gardina Salgado S.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18-07-17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	<u>ABEL ROJAS RUBIANO</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
070 00425080	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
INGENIERO CIVIL U.N.**

Manizales, 28 de Junio 2017

EL SUSCRITO INGENIERO:

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICA QUE**

Que me encuentro a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses con el Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Fondo de Fomento a la Construcción FIC, CREE, por todo concepto con los aportes parafiscales de acuerdo a los requerimientos del Artículo 50 de la Ley 789 – 2002.



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Ingeniero Civil
M. P. No. 17202 – 66562 CLD
C.C. No. 10.280.643 de Manizales



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	JUNIO 10 DE 2017	Acta parcial		Acta final	01
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	--	------------	----

Número del contrato	RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00087 DE MARZO 24 DE 2017
Objeto:	EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE CAUCE DEL RIO GUARINÓ, MEDIANTE EL SISTEMA DE DRAGADO, EN LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUARINO, SECTOR DEL LLANO, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-
Nombre Contratista:	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Fecha del contrato:	JUNIO 29 DE 2017
Plazo de ejecución:	OCHO (08) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 12.922.740,00
Fecha de iniciación:	JULIO 5 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	JULIO 12 DE 2017
Nueva fecha de terminación:	JULIO 10 DE 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	08
Tiempo total transcurrido:	06
Avance Porcentual:	75 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

ARZ

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-LA EMERGENCIA se dio por las constantes crecientes del Rio GUARINO incidiendo en la Captación adecuada, por el desvió del Cauce presenta y por el Material de arrastre taparon el Tubo de la entrada a la bocatoma, Reduciendo el suministro de 350 l/seg a 210 lts/seg., perjudicando los Noventa y Ocho mil habitantes de las poblaciones de Purnio, Guarinocito, La Dorada, donde el suministro de agua potable se redujo considerablemente.

-Otro factor que incidió en un Normal Suministro, fue que sobre el Rio Magdalena se presento una contaminación de Aceite, impidiendo la captación a través de la Planta de tratamiento de la Melissa y que oficia como Alternativa en casos de presentarse problemas en la Planta de Tratamiento del Llano.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-Los trabajos se ejecutaron mediante el sistema de Dragado, mediante la Contratación de una Retroexcavadora de Orugas para destapar la Entrada Principal de la Bocatoma localizada en la Margen derecha sobre el Rio GUARINÓ, que por las constante crecientes sedimentaron el lecho y desviaron el Cauce del Rio.

-Luego se procedió a corregir el Cauce del rio para mejorar la Captación en una longitud aproximada de 100 metros colocándose el material sacado por el Dragado en la margen derecha, en los intermedios de los espolones localizados en el cauce del rio y que fueron construidos como protección de la Bocatoma.

-Seguidamente y paralelamente y aprovechando las nuevas corrientes de Agua encausadas, que transitaba por Los compartimientos de la bocatoma y el Desarenador se hicieron el lavado correspondiente, para mejorar la entrega de agua a la Planta de tratamiento, localizada en el Sector del LLANO, Vía Victoria el Cruce – La Dorada.

-Es de anotar que las cantidades de obras contratadas fueron muy específicas y concretas dadas las circunstancias presentadas en la ejecución.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	12.922.740
Inversión ejecutada en el periodo:	12.922.740
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	12.922.740
Porcentaje total ejecutado:	100%



CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Confianza	16-GU063839	29/06/2017	14/08/2020	2.584.548,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	Confianza	16-GU063839	29/06/2017	29/06/2022	2.584.548,00
Cumplimiento del Contrato	Confianza	16-GU063839	29/06/2017	29/11/2017	3.876.822,00
Responsabilidad Civil	Confianza	16-RO010271	29/06/2017	29/11/2017	3.876.822,00

2. **CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Ingeniero zona	X	X	X	X	X
Operador Retroexcavadora-Contratista	X	X	X	X	X
Inspector de Alcantarillado Empocaldas S.A. E.S.P.	X	X	X	X	X
Personal de Mantenimiento Empocaldas	x	X	X	X	X

3. **CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA** (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. **CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN** (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
JUNIO 30 DE 2017	A	A	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. **DOCUMENTOS ANEXOS**

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X

Handwritten signature/initials



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00190 DE JUNIO 29 DE 2017
OBJETO: EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE CAUCE DEL RIO GUARINO, MEDIANTE EL SISTEMA DE DRAGADO, EN LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUARINO
MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.
CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
FECHA INFORME: JULIO 11 DE 2017.



AJP

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -




REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00190 DE JUNIO 29 DE 2017

OBJETO: EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE CAUCE DEL RIO GUARINO, MEDIANTE EL SISTEMA DE DRAGADO, EN LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUARINO
, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

FECHA INFORME: JULIO 11 DE 2017.

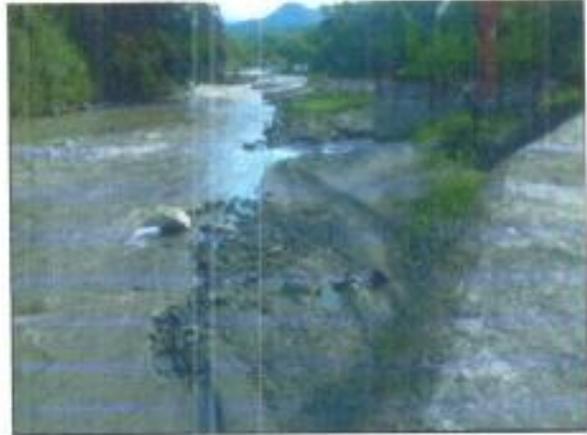

107

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00190 DE JUNIO 29 DE 2017

OBJETO: EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE CAUCE DEL RIO GUARINO, MEDIANTE EL SISTEMA DE DRAGADO, EN LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUARINO
MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

FECHA INFORME: JULIO 11 DE 2017.

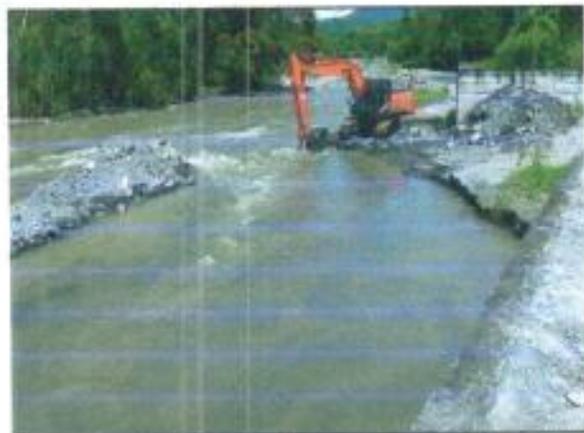

MPZ

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00190 DE JUNIO 29 DE 2017

OBJETO: EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE CAUCE DEL RIO GUARINO, MEDIANTE EL SISTEMA DE DRAGADO, EN LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUARINO
, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

FECHA INFORME: JULIO 11 DE 2017.

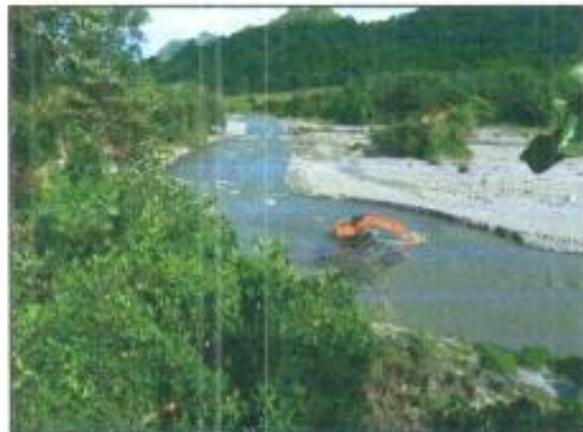

Handwritten signature or initials.

F-GC-16

Versión 3
Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	10280643	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-07-17
NUMERO DE CONTRATO:	190/2017	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites	3

Handwritten signature

	jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub- contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6


EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)


NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	RESOLUCIÓN No. 00190 DE JUNIO 29 DE 2017
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DEL CAUCE DEL RIO GUARINO, MEDIANTE EL SISTEMA DE DRAGADO, SOBRE EL RIO GUARINO, SECTOR DEL LLANO, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.- JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA. 10.280.643
CONTRATISTA	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA 10.280.643
NIT o C.C.	LA DORADA, CALDAS.-
REPRESENTANTE LEGAL	
N.I.T, C.C.	
MUNICIPIO	
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 9.720.000
ADMINISTRACIÓN 22 %	\$ 2.138.400
IMPREVISTOS 5%	\$ 486.000
UTILIDAD 5 %	\$ 486.000
I.V.A. 19 %	\$ 92.340
VALOR TOTAL	\$ 12.922.740
PLAZO	OCHO (08) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
INTERVENTOR	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00664 DE JUNIO 13 DE 2017
CDP	00570 DE MAYO 09 DE 2017
RP	000762 DE JUNIO 29 DE 2017

En la ciudad de Manizales a los Diez (10) días del mes de Julio de 2017, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Interventor y el señor JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA, como Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL Según Contrato EMERGENCIA RESOLUCIÓN No. 00190 DE JUNIO 29 DE 2017.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
Interventor


JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Contratista



EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -

CONTRATO No.: 00190 DE 2017	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: JULIO 30 DE 2017
SUBJECTO: EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE CALIZE DEL RÍO GUARINO, MEDIANTE EL DES- TEMA DE DRAGADO, EN LA BOCATOMA SOBRE EL RÍO GUARINO SECTOR DEL LLANO, MUNI- CIPIO DE LA DOBADA, CALDAS--	FECHA INICIACIÓN: JUNIO 30 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO: JULIO 12 DE 2017
CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAINEZA	VALOR CONTRATO: \$ 12.922.740	VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
	VALOR ADICIÓN No. 1:	PLAZO ADICIONAL:
	SUPERVISOR: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: JULIO 12 DE 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRAS DEGRUADO
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	% EJECUC.	CANTIDAD	
1.-	ALQUILER DE MAQUINARIA		45,00	180,000	0	0	43,00	7.740.000,0	43,00	7.740.000	10,00
1.1	Retransmisora de Omega P200	Horas	2,00	700,000	0	0	2,00	1.400.000,0	2,00	1.400.000	1,00
1.2	Trasporte de retroexcavadora	Viejos	2,00	115,000	0	0	2,00	300.000,0	2,00	300.000	1,00
1.3	Arrendamiento para transporte de la Maquinaria	Días	4,00	70.000	0	0	4,00	280.000,0	4,00	280.000	10,00
1.4	Crédito reestructurado nocturno							0.228.000,0		0.228.000	

COSTO DIRECTO	9.720.000
ADMINISTRACION %	2.158.430
IMPUESTOS %	486.000
UTILIDADES %	486.000
SUMAS ANTAS IVA	12.850.430
I.V.A.	90.340
TOTAL ACTA FINAL	12.940.770
TOTAL OBRAS OBRAS ANTAS	12.922.740
AMORTIZACIÓN ANTERIOR %	0
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	12.922.740

SUM: DICE MILLORES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 12.922.740,00) MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:	
Valor del Contrato	12.922.740
Valor Adición No. 01	
Valor Acta FINAL	12.922.740
Valor Acta No. 01 PARCIAL	0
SUMA	12.922.740
Saldo del Contrato	0
SUMAS IGUALES	12.922.740

(Fecha: JULIO 12 DE 2017)
(Fecha: DE 2017)

Handwritten signature

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO
EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA."

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura N°. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00190 del 29 de Junio del 2017, se declaró la situación de Emergencia en el Municipio de **La Dorada**, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de **La Dorada**, fueron sustentadas mediante oficio de fecha 28 de Junio del 2017 enviado por la señora administradora encargada de la seccional de la Dorada, María Luvy Contreras González, solicita se declare la situación de emergencia "teniendo en cuenta la información suministrada por el señor Jaime Edgar Moreno Restrepo, inspector de redes de la seccional, quien le correspondió realizar visita inicial a la bocatoma debido a la baja de caudal de entrada de agua a la Planta de Tratamiento de Agua Potable el Llano, reportando de manera inmediata el daño encontrado y manifiesta que de manera urgente se intervenga la entrada de agua a la bocatoma y se corrija el cauce del Río Guarinó debido a la sedimentación de material de arrastre, y arena, dando lugar la reducción del caudal a la planta de tratamiento por la sedimentación presentada por la bocatoma y desarenador.

Otro factor que impide el normal suministro de agua a la Dorada, Guarinocito y Purnio es una mancha de aceite en el río Magdalena impidiendo poner en funcionamiento la planta la Melissa, estructura que se tiene de apoyo en caso de fallas en la planta el Llano.

Por tal razón y con el fin de poder solucionar la problemática existente se debe declarar la situación de emergencia para intervenir de manera rápida y oportuna la corrección al cauce del caudal del río para evitar que la ciudad de la **Dorada**, Guarinocito y Purnio se quede sin el suministro de agua.

Que la problemática acaecida en el Municipio de la **Dorada**, puso en riesgo a la población.

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que permitan



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA."

prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio". (Artículo 46).

Que la corrección al cauce del caudal del río para evitar que la ciudad de la Dorada, Guarinocito y Purnio se quede sin el suministro de agua, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la población de la Dorada, Guarinocito, y Purnio.

Que para superar la situación antes anotada, se hizo necesario contratar al ingeniero civil señor Javier de Jesús García Pareja.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el municipio de La Dorada, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 29 de Junio del 2017.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió en alquiler de maquinaria retroexcavadora, con el fin de corregir el cauce del Río Guarinó mediante el sistema de Dragado municipio de la Dorada, Caldas.

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2017 No. 000762 por un valor de \$12.922.740.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la interventoría y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo de total de DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$12.922.740) incluido AIU e IVA.

A continuación se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

17 JUL 2017

ESPACIO EN BLANCO



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7060
NIT: 890.803.239-9
empoc@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA."

EMPICALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SUCURSAL LA DORADA - CALDAS

CONTRATO No. 00090 DE 2017
ACTA No. 1 FINAL
SELECCIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARGAS DEL S.O. GUARINO, MEDIANTE UN (1) M.P. (MATERIA PRIMARIA) EN LA ESCUOLA SOBRE EL BOSQUE DE LA DORADA, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.
FECHA INICIO: JUNIO 30 DE 2017
FECHA VENCIMIENTO: JULIO 11 DE 2017
VALOR CONTRACTUAL: \$ 11.932.745
VALOR ADICIONAL No. 1:
SUPERVISOR: ABEL RUIZ RUIBANO
FECHA: JULIO 12 DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CONTRACTUAL		ALIMINADO ACTA ANTERIOR		PRESENT ACTA		N. OBRAS
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
1.1	MATERIA PRIMARIA	Hora	43,00	180,000	0	0	43,00	180,000	180,000
1.2	Mano de obra	Metro	2,00	780,000	0	0	2,00	780,000	780,000
1.3	Costos de transporte de la maquinaria	Metro	2,00	150,000	0	0	2,00	150,000	150,000
1.4	Costos de mantenimiento	Diario	4,00	75,000	0	0	4,00	75,000	75,000
				879,000				879,000	
				1,380,000				1,380,000	
				494,000				494,000	
				405,000				405,000	
				12,800,000				12,800,000	
				40,340				40,340	
				31,822,000				31,822,000	
				31,822,000				31,822,000	
				0				0	
				31,822,000				31,822,000	
				0				0	
				31,822,000				31,822,000	

TOTAL DIRECTO	879,000
MANEJO DE OBRAS	1,380,000
MANEJO DE OBRAS	494,000
MANEJO DE OBRAS	405,000
MANEJO DE OBRAS	12,800,000
MANEJO DE OBRAS	40,340
TOTAL ACTUAL	31,822,000
TOTAL OBRAS OBRAS OBRAS	31,822,000
MANEJO DE OBRAS	0
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	31,822,000

SON \$31.822.000 MIL SETECIENTOS OCHENTA DOS MIL OCHOCIENTOS Y CINCUENTA Y SEIS PESOS.

ESTADO DEL CONTRATO:
Valor del Contrato:
Valor Adicional No. 01
Valor del contrato:
Valor del contrato:
Valor del contrato:
Valor del contrato:

31.822.000
31.822.000
31.822.000
31.822.000
31.822.000
31.822.000

APP

17 JUL 2017

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA."

	
EMPICALDAS S.A. S.P.A. EMPRESA DE OBRAS SERVICIOS DE CALDAS SITIO DE LA ROSA - CAJICÁ	
CAMBIO No. 0050 DE 2017	ACTA No. FINAL
OBJETO: VERIFICACION DE CONFORMIDAD DE CUOTE DE 10 GUMBO, MUDANZA DE SE- TORA DE EMBAJOS, EN LA CANTONATA SORBI (11.40) GUARINO SECTOR DEL LLANO, MUNI- CIPALDAD DE CALDAS.	FECHA INICIO: AÑO 20 DE 2017 VALOR CONTRATO: \$ 12.507.740
CONTRATISTA: MANRIQUEZ GARCIA WILMA	VALOR ADICIONAL: FECHA: AÑO 12 DE 2017

REVISADO POR:

Manizales

Resolución 0050 de 2017

Resolución 0050 de 2017

Fecha 17 de Julio

Manizales

17 JUL 2017

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA."

Que en consecuencia de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al ingeniero civil Javier de Jesús García Pareja, contratista, por un valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$12.922.740) incluido AIU e IVA.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al ingeniero Civil Javier de Jesús García Pareja con cédula de ciudadanía No.10.280.643, la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$12.922.740) incluido AIU e IVA, Previos descuentos de Ley. De acuerdo a lo estipulado en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al ingeniero civil Javier de Jesús García Pareja con cédula de ciudadanía No.10.280.643, la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$12.922.740) incluido AIU e IVA, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley. De acuerdo a lo estipulado en la parte motiva de la presente Resolución.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

17 JUL 2017

SERGIO HUMBERTO LOPERA PEBAYOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

EL INGENIERO ZONA ORIENTE DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Ingeniero JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA Con C.C. No: 10.280.643, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante la "EMERGENCIA No. 00190 DE 2017, Valor Total FINAL Ejecutado \$ 12.922.740,00

OBJETO:

EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE CAUCE DEL RIO GUARINO, MEDIANTE EL SISTEMA DE DIRIGADO EN LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUARINO SECTOR DEL LLANO, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

Con las siguientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00190 DE 2017
CONTRATISTA	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	10.280.643
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.922.740,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 12.922.740,00
PLAZO EJECUCIÓN	OCHO (08) DIAS
FECHA INICIACIÓN	JULIO 05 DE 2017
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	JULIO 12 DE 2017
FECHA TERMINACIÓN FINAL	JULIO 10 DE 2017
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA ORIENTE

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00190 DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	ALQUILER DE MAQUINARIA				
1.1	Retro-escavadora de Oruga P200	Horas	43	43	7.740.000,00
1.2	Transporte de Retroexcavadora	Viajes	2	2	1.400.000,00
1.3	Camioneta guía para transporte de Maquinaria	Viajes	2	2	300.000,00
1.4	Celaduría Retroexcavadora nocturna	Días	4	4	280.000,00

COSTO DIRECTO		9.720.000
ADMINISTRACION %	22	2.138.400
IMPREVISTOS %	3	486.000
UTILIDADES %	3	486.000
SUMA ANTES IVA		12.830.400
I. V. A. %	10	92.940
SUMA		12.922.740
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		12.922.740
AMORTIZACION ANTICPO %		0
TOTAL CONTRATO DE EMERGENCIA No. 00190 DE 2017		12.922.740

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
RESIDENTE:	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 14 DE JULIO DE 2017.

ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA ORIENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
