





Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 1418684		RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO		B - MENOS DE 200 COTTIZANTES		PRINCIPAL		CARRERA 21 76 15		MANIZALES-CALDAS		89072166		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
2022-07		1594733627		E		2022/08/19		2022/08/09		BANCO DANVIVIENDA		0		\$692,300	

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$357,500	\$0	\$0	\$357,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$213,400	\$0	\$0	\$106,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$155,800	\$0	\$0	\$213,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$89,500	\$0	\$0	\$155,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$89,500	\$0	\$0	\$89,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$26,700	\$0	\$0	\$89,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$36,100	\$0	\$0	\$26,700
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>	<b>\$692,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$692,300</b>

RADICADO 2020\_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución No. 96486 de 2019, concedió pensión **VEJEZ** a **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1418684 .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Septiembre de 2022 es de **\$2,404,924**. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2022-07** y **2022-07** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202207	202207	288,600 /	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 09 de agosto de 2022.

  
**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Director(a) de Nómina de Pensionados

RADICADO 2020\_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS  
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS  
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 1418684** y número de Afiliación **901418684100**, esta Administradora mediante resolución No. **96486** de **2019** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Mayo de 2019**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 09 de agosto de 2022.



**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Director(a) de Nómina de Pensionados

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	76676493	1595156394 ✓	09/08/2022

**Número de Identificación**

1418684

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

RAMIREZ GOMEZ

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 14 A 8 B 15

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

gerago215@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

CONS VARIANTE ADUCC Y REP BOCA

**Fecha Terminación Obra**

05/08/2022 ✓

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

7 ✓

**Costo Total Mano de Obra**

2398196.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO ✓

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

VILLAMARIA

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3688424

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

✓ 038

**Fecha Inicio Obra**

01/07/2022 ✓

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

1418684

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

65347913.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4 ✓

**Aporte FIC**

100000.00

**Valor del Pago**

100000.00

**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
<b>899999034</b>	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	<b>76676493</b>	<b>1595156394 /</b>	<b>09/08/2022</b>

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

**Su transacción fue**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Total Pagado **\$ 100,000.00 /**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 100,000.00	COP\$ 100,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	76676663	1595172008 ✓	09/08/2022

**Número de Identificación**

1418684

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

RAMIREZ GOMEZ

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadania

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 14 A 8 B 15

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

gerago215@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

**Nombre Obra**

CONS VARIANTE ADUCC Y REP BOCA

**Fecha Terminación Obra**

05/08/2022 ✓

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

8 ✓

**Costo Total Mano de Obra**

513900.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO ✓

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS) ✓

**Ciudad de Domicilio**

VILLAMARIA

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3688424

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

✓ 038

**Fecha Inicio Obra**

✓ 01/07/2022 ✓

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

1418684

**Año Periodo a Pagar**

2022 ✓

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

65347913.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

3 ✓

**Aporte FIC**

75000.00

**Valor del Pago**

75000.00



**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	76676663	1595172008 /	09/08/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

**Su transacción fue**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Total Pagado

**\$ 75,000.00 /**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 75,000.00	COP\$ 75,000.00



## Referencias

Tipo de Documento Referencia  
ACTA 1 Y FINAL EMERGENCIA 038 ARAUCA

Número Referencia  
GARG 11

Fecha Referencia  
10/08/2022

## Notas Finales

EMERGENCIA 038 DE 2022 CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA SECTOR LA PRADERA ADUCCION Y REPARACION BOCATOMA CORREG ARAUCA

Línea de negocio: CONTRATACION

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-10 08:21:10  
Documento generado el: 2022-08-10 08:21:09  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	64.813.493,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	2.418.414,00
IVA	459.498,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	459.498,66
<b>Total neto factura (=)</b>	65.272.991,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 65.272.991,66</b>

### Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764033211320

Rango desde: 11

Rango hasta: 200

Vigencia: 2023-02-09

## RESUMEN EJECUTIVO # 1 Y FINAL

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

**NÚMERO DE CONTRATO:** ACTO 038 DE 1/07/2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA SECTOR LA PRADERA, ADUCCION Y REPARACION BOCATOMA CORREGIMIENTO DE ARAUCA CALDAS

**VALOR INICIAL :** \$ 47.171.079.00

**ADICION** \$ 18-176.913.00

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 65.347.913.00

Valor del anticipo (0%) \$ 00,00

**FECHA DE INICIACIÓN:** 1/07/2022

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	ACTO 038 DE 1/07/2022
Objeto:	CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA SECTOR LA PRADERA, ADUCCION Y REPARACION BOCATOMA CORREGIMIENTO DE ARAUCA
Contratista:	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

Supervisor del Contrato:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Fecha de inicio del Contrato:	1/7/2022
Plazo inicial:	20 DIAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	20/7/2022
Fecha de suspensión	1/07/2022
Fecha de reiniciación	11/07/2022
Fecha de terminación inicial	20/07/2022
Nueva fecha de terminación	7/8/2022
Adición (valor)	\$ 18.176.913
Prorroga total	8 DIAS
Supervisor	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:**

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
<b>Valor del Contrato:</b>	<b>\$ 65.347.834</b>
Porcentaje total ejecutado	<b>99,9%</b>
Valor ejecutado del contrato:	<b>\$ 65.272.991</b>
Saldo por ejecutar del contrato:	<b>\$ 74.922</b>

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista durante el periodo del acta 1 y final.


Una vez se reunieron los requisitos de ley para iniciar el desarrollo del contrato se procedió de inmediato a hacer el pedido de los materiales requeridos para el desarrollo del contrato y se procedió al traslado de la tubería, en virtud que los materiales requeridos no se encontraban en la región fue necesario solicitarlos a la ciudad de Medellín por lo tanto se solicitó la suspensión de la obra mientras llegaban los materiales y se llevaba la tubería desde el Km41; el 11 de Julio se reinició la obra percatándose el supervisor de la obra que era necesario retirar los empalmes

del área cerca del cauce del río por tal razón se hace necesario solicitar una prórroga y adición al contrato ya que se hace necesario instalar más tubería y construir más gaviones para proteger el cauce del río y así evitar que haya socavación; se procede a las excavaciones necesarias tanto para la construcción de los muertos donde va anclado el viaducto así como la zanja para la instalación de la tubería, se levanta la tubería de PVC de 6" y se lleva a la agencia de Empocaldas en Anserma, se hacen los empalmes y los respectivos anclajes, instalándose así 160 metros de tubería en polietileno de 8" y se construye un viaducto de 60 metros de longitud, lográndose cumplir con el objeto del contrato y subsanar la emergencia presentada

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACUMULADO	
			CAN	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	gl	1,00	434.850
3	En material comun de 0 a 2 mts	M3	91,10	3.697.385
4	En conglomerado	M3	20,20	936.957
5	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	M3	58,50	3.815.838
6	Instalacion tuberia polietileno PN 16 de 8"	ml	180,00	15.132.780
7	Suministro e instalacion de portaflanches de 8"	un	2,00	1.304.550
8	Suministro e instalacion de bridas locas de 8"	un	2,00	434.850
9	Suministro e instalacion de reducciones en polietileno de 8" a 6"	un	2,00	1.594.450
10	Suministro e instalacion de acoples brida de 6"	un	2,00	1.136.408
11	Empalmes a tuberia de 6"	un	2,00	2.319.200
12	anclajes en tuberia HG de 1 1/1 L=1,50 con cuatro pilotes	un	2,00	1.304.550
13	Lleno compactado con material de obra	m3	79,20	2.066.407
<b>14</b>	<b>VIADUCTO</b>			
NP1	Concreto ciclopeo para muertos	m3	5,80	5.464.615
NP2	Suministro e instalacion de cable de acero de 5/8	ml	60,00	3.478.800
NP3	suministro e instalacion de abrazaderas de 8"	un	14,00	2.029.300
NP4	Suministro e instalacion acero para columnas	kilo	23,40	373.113
NP5	Construccion gaviones recubiertos con concreto	m3	8,00	6.957.600
VALOR COSTOS TOTAL				65.272.991

**GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ**  
Contratista




**GRG**

CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA SETOR LA FRADERA ADUCCION Y REPARACION BOCATOMA CORREGIMIENTO DE ARAUCA  
 CONTRATO : ACTO numero 038 de 1/07/2022  
 CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
**PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA**

PERIODO DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2022

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	SUELDO BASICO	DIA	VLR HORA	No. HE	VLR HE HOC	No. HE HOC	valor horas extras	SUBSIDIO TRANSACCION 8733	DEDUCCIONES			TOTAL 15%	NETO	RECIBI CONFORME		
											TOTAL DEVENGADO	EMPRESA 8.5%	TRABAJADOR 0%				EMPRESA 15%	TRABAJADOR 0%
LOAIZA ARCILA JOHAN SEBASTIAN	1.063.858.186	Ayudante	1.000.000	14,0	4.890		6.504		-	54.680	20.854	20.854	41.708	62.562	20.854	83.416	479.639	Johan Sebastian
TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DARIO	15.990.720	Ayudante	1.000.000	14,0	4.890		6.504		-	54.680	20.854	20.854	41.708	62.562	20.854	83.416	479.639	Ruben Dario Tangarife
ZAPATA RINCON JOSE LUIS	10.271.547	Ayudante	1.000.000	14,0	4.890		6.504		-	54.680	20.854	20.854	41.708	62.562	20.854	83.416	479.639	José Luis Zapata
LOPEZ OSORIO FREDY	4.415.741	Ayudante	1.000.000	7,0	4.890		6.504		-	27.340	10.427	10.427	20.854	31.281	10.427	41.708	239.820	Fredy Lopez
<b>TOTALES</b>				<b>45,0</b>							<b>72.988,6</b>	<b>72.988,6</b>	<b>145.977,1</b>	<b>218.965,7</b>	<b>72.988,6</b>	<b>291.954,3</b>	<b>1.878.737,1</b>	

*GRG*

*[Signature]*

GERARDO A RAMIREZ GOMEZ  
CONTRATISTA

**GRG**

CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA SETOR LA PRADERA ADUCCION Y REPARACION BOCATOMIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA  
 CONTRATO : ACTO numero 038 de 1/07/2022  
 CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

PERIODO DEL 25 DE JULIO 5 DE AGOSTO DE 2022

**PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA**

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BASICO	D	VLR HORA	No. HE	VLR HE NOC	No. HE NOC	valor horas extras	MUESTRO TRANSACCION 8732	DEDUCCIONES			TOTAL PAGO	RECIBI CONFORME			
											TOTAL DEDUCIDO	SALUD	PENSION					
											EMPRESA 15%	TRABAJADOR 4%	TOTAL 19%	NETO				
LOANZA ARCILA JOHAN SEBASTIAN	1.053.856.196	Ayudante	1.000.000	12,0	4.890		6.504		-	46.869	17.875	17.875	35.750	53.624	17.875	71.499	411.119	Johan Sebastian
TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DARIO	15.980.720	Ayudante	1.000.000	12,0	4.890		6.504		-	46.869	17.875	17.875	35.750	53.624	17.875	71.499	411.119	Ruben Escobar
ZAPATA RINCON JOSE LUIS	10.271.547	Ayudante	1.000.000	12,0	4.890		6.504		-	46.869	17.875	17.875	35.750	53.624	17.875	71.499	411.119	Jose Luis
<b>TOTALES</b>				<b>36,0</b>							<b>1.340.606,4</b>	<b>53.624,3</b>	<b>107.248,5</b>	<b>180.872,8</b>	<b>53.624,3</b>	<b>214.497,0</b>	<b>1.233.357,8</b>	

*(Handwritten signature)*  
 GERARDO A RAMIREZ GOMEZ  
 CONTRATISTA





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	6/8/2022	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	---	----------------------	----------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 38 DE 1/7/2022
Objeto:	CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA, SECTOR LA PRADERA, ADUCCION Y REPARACION BOCATOMA CORREGIMIENTO DE ARAUCA
Nombre Contratista:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ
Fecha del contrato:	1/7/2022
Plazo de ejecución:	20 Dias
Valor inicial:	\$ 47.171.079
Fecha de iniciación:	1/7/2022
Fecha de suspensión:	1/7/2022
Fecha de reiniciación:	11/7/2022
Fecha de terminación inicial:	20/7/2022
Nueva fecha de terminación:	30/7/2022
Adición (en valor):	\$ 18.176.834
Prórroga (en tiempo):	8 DIAS Nueva fecha 8 de agosto*
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

##### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
CALDAS	ACUEDUCTO	0.016

##### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	28Días
Tiempo total transcurrido:	28 Días
Avance Porcentual:	100%

#### REGISTRO FOTOGRAFICO






EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

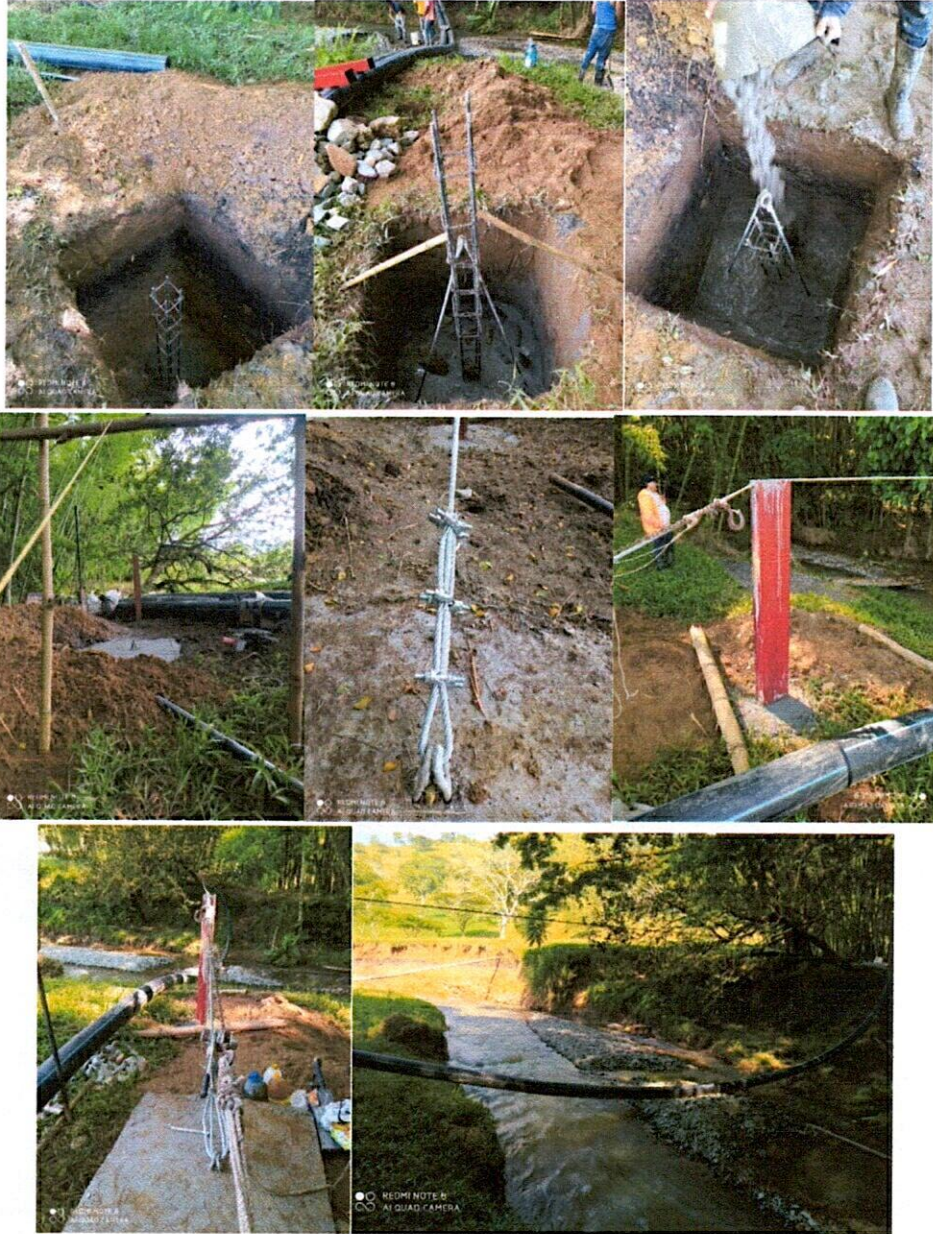



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL




#### 1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 65.347.913
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 65.272.991
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.99%
Inversión total ejecutada:	\$ 65.272.991
Porcentaje total ejecutado:	99.99%

#### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>				
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>				

CUMPLIMIENTO	ESTADO	42-45-101052878	1/07/2022	8/11/2022	19.604.374
SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ESTADO	42-45-101052878	1/07/2022	8/08/2025	12.669.583
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ESTADO	42-45-101052878	5 AÑOS 0 MESES Y 0 DIAS		12.669.583
P (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUA)	ESTADO	42-40-101040295	1/7/2022	8/11/2022	19.604.374

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODO EL PERSONAL	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	N/A	A	A	N/A	A	A	N/A


Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>		

	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
<b>Personal Interventoría</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA : Toda la población del Municipio de Aguadas Caldas

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	



Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1      4

NOMBRE DEL SUPERVISOR  
JOAHNN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO No		ACTO 038 DEL 1/07/2022		MUNICIPIO		CORREGIMIENTO DE ARAUCA											
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGI(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Aduccion	LA PRADERA	8	100	PN16	Instalación con apertura de zanja		SI	6210114142	ICONTEC		EXTRUCOL	890223714	25/07/2022	6	AC	100
1	Aduccion	LA PRADERA	8	60	PN16	Remoción o Rehabilitación sin zanja		SI	6210114142	ICONTEC		EXTRUCOL	890223714	25/07/2022	6	AC	60

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	JOHANN MANUEL SANCHEZ RAMIREZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	
NOMBRE CONTRATISTA	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -	
COORDINADOR ACUEDUCTO	





**CANTIADES DE OBRA ACTA 01 Y FINAL EMERGENCIA 038 de 17/2022**

Ítem:	2	LOCALIZACION Y REPLANTEO			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas ML			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		1			1,00	1,00	longitud total del proyecto
					0,00	1,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00	
Ítem:	11	En material comun de 0 a 2 mts			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		90,00	0,60	0,70	37,80	37,80	longitud inicial del proyecto
		30,00	0,60	0,70	12,60	50,40	longitud adicional del proyecto
	8	2,50	1,00	2,00	40,00	90,40	excavacion para gaviones
	2	0,50	0,50	1,30	0,70	91,10	excavacion para columnas
					0,00	91,10	
					0,00	91,10	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	91,10	
Ítem:	13	En conglomerado			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas UND			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	2	1,10	1,10	2,40	5,80	5,80	excavacion para muertos en concreto
	1	90,00	0,60	0,20	10,80	16,60	
	1	30,00	0,60	0,20	3,60	20,20	excavacion zanja para tuberia e=0,20 mts
					0,00	20,20	
					0,00	20,20	
	ACTA 3		ACTA 2	20,20	ACTA 1	20,20	
Ítem:	14	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	M3			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Espesor			
	2	0,50	0,50	1,30	0,70	0,70	excavacion para columnas
	2	1,10	1,10	2,40	5,80	6,50	excavacion para muertos
	1	37,80	0,30	1,00	11,30	17,80	expansion excavacion zanjas
	8	2,50	1,00	2,00	40,00	57,80	excavacion para gaviones
	2	0,50	0,50	1,30	0,70	58,50	excavacion para columnas
					0,00	58,50	
					0,00	58,50	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	58,50	
Ítem:	15	Instalacion tuberia polietileno PN 16 de 8"			Unidad:	un	
Fecha medición	cant	M3			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		150,00			150,00	150,00	longitud inicial del proyecto
		30,00			30,00	180,00	longitud adicional del proyecto
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	180,00	

*JWSL*

Ítem:	17	Suministro e instalacion de portaflechas de 8"				Unidad:	ml
Fecha medición	mas de una	ML			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		2			2	2	
					0	2	
					0	0	
					0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	
Ítem:	18	Suministro e instalacion de bridas locas de 8"				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		2,00			2,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	
Ítem:	19	Suministro e instalacion de reducciones en polietileno de 8" a 6"				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		2,00			2,00	2,00	al inicio del proyecto
					0,00	2,00	al final del proyecto
					0,00	2,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	
Ítem:	20	Suministro e instalacion de acoples brida de 6"				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	UND			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		2,00			2,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
	ACTA 3		ACTA 2	2,00	ACTA 1	2,00	
Ítem:	21	Empalmes a tubería de 6"				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	UN		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Longitud	Cantidad				
		2,00		2,00	2,00		
				0,00	2,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	

QMR

Ítem:	22	anclajes en tubería HG de 1 1/1 L=1,50 con cuatro pilotes				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		2,00			2,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	
Ítem:	24	Lleno compactado con material de obra				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	DIA			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho				
		90,00	0,60	1,10	59,40	59,40	
		30,00	0,60	1,10	19,80	79,20	
					0,00	79,20	
					0,00	79,20	
						0,00	
						0,00	
	ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	79,20	
Ítem:	27	Concreto ciclopeo para muertos				Unidad:	m3
Fecha medición	Frete	m3			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		ML tubería	KG/ML				
	2	1,10	1,10	2,40	5,80	5,80	
					0,00	5,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	
					0,00	5,80	
						5,80	
	ACTA 3		ACTA 2	5,80	ACTA 1	5,80	
Ítem:	28	Suministro e instalacion de cable de acero de 5/8				Unidad:	ml
Fecha medición		ml			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud					
		60			60	60	longitud del vuelo
					0	60	
					0	60	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	60,00	
Ítem:	29	suministro e instalacion de abrazaderas de 8"				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	un			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud					
		14			14	14	
					0	14	
					0	14	
					0	14	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	14,00	
Ítem:	30	Suministro e instalacion acero para columnas				Unidad:	kilo
Fecha medición	mas de una	M3			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	espesor			
	8	1,8	1	1	14,4	14,4	
	16	1	0,56	1	9	23,4	
						23,4	
					0	0	
					0,00	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	23,40	

*MAL*

Ítem:	31	Concreto 280Kgs/cm2 para columnas			Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	m2		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		logitud	altura			
	2	3	0,4	0,4	1	1
					0	0
					0	0
					0	0
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00
Ítem:		Transporte de tubería del KM 41 al sitio de la obra y acarreo a hombro			Unidad:	GBL
Fecha medición	mas de una	Un		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1		1	1	
				0	1	
				0	0	
				0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00
Ítem:	32	Transporte de personal al sitio de la obra			Unidad:	M2
Fecha medición	mas de una	UND		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		18		18	18	
				0	18	
				0	0	
				0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	18,00
Ítem:		Construccion gaviones recubiertos con concreto			Unidad:	UN
Fecha medición	mas de una	ML		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		8		8	8	
				0	8	
				0	0	
				0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	8,00
Ítem:	NP1	Suministro e instalacion codo de 8" polietileno			Unidad:	UND
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		1,00		1,00	1,00	
	ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00
Ítem:	NP2	Retiro de tubería de 6" PVC existente y transporte Arauca Anserma			Unidad:	m2
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		ALTURA	ANCHO			
		1,00			1,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00

Ítem:	NP3	Suministro e instalacion tubo de 5" de acero calibre 14			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	altura			
		6,00			6,00	6,00
					0,00	6,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	6,00

*JMR*



Falta  
Certificado  
de Existencia  
de Fractura  
electrónica.





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	6/8/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	----------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 38 DE 1/7/2022
Objeto:	CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA, SECTOR LA PRADERA, ADUCCION Y REPARACION BOCATOMA CORREGIMIENTO DE ARAUCA
Nombre Contratista:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ
Fecha del contrato:	1/7/2022
Plazo de ejecución:	20 Días
Valor inicial:	\$ 47.171.079
Fecha de iniciación:	1/7/2022
Fecha de suspensión :	1/7/2022
Fecha de reiniciación :	11/7/2022
Fecha de terminación inicial:	20/7/2022
Nueva fecha de terminación :	30/7/2022
Adición (en valor):	\$ 18.176.834
Prórroga (en tiempo):	8 DIAS
Nueva fecha de terminacion	8/8/2022
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
