

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE106Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-10 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
01ef58e314351d9858e68a7b1d7ad33193202a620b87c05756e
bdbca9dc4b1aa2ac8f119c6d3ce545c806040eddc0adRAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CONSTRUMAQ2022 SASRAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSPUDIENDO EMPLEAR
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDASNIT:
901611470NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
5247900FORMA DE PAGO:
CONTADODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-08-10 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
6ed455ed1f4695f1703227c87d3404fd5a28f51b7f4f7004c093ba
8e6a6de5bf6c7a2eed4e24faa1d3ceba45a54a1bebPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-10 12:27:56.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSTRUMAQ2022 SAS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANLa validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE106

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-10 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
01ef58e314351d9858e68a7b1d7ad33193202a620b87c05756e
bdbca9dc4b1aa2ac8f119c6d3ce545c806040eddc0ad

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
9a559db1bf983133c8220aef17543807c9e9f965e49e5e1d0991
9fe382006d5d51d047d277b1ba99d286bf57a99f1a96

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-11 02:00:13.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSTRUMAQ2022 SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
53d2d8b2337e59c706a46a8cb2832495d3fb6317bbaf4eb5903
11d7555906eda8677625d75150bff3104415e5112ba50

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-12 02:27:44.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSTRUMAQ2022 SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE106Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-10 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
01ef58e314351d9858e68a7b1d7ad33193202a620b87c05756e
bdbca9dc4b1aa2ac8f119c6d3ce545c806040eddc0ad**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**CUDE:
ca7bd61b7c4913778026518a34bfc09f16951ce164a76fe68999f
f69c0d934a9a1550d3f16bc1d83b8f7851adc3726c9PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-12 02:28:00.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSTRUMAQ2022 SAS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANDOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTOEl interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 8/12/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



**CONSTRUMAQ2022 SAS**

NIT: 901611470-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

Kra. 23 No. 75-248 Edf. La Insula, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3124156070

Email. marycar0826@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764031346749 válida desde 2022-07-18 hasta 2023-07-18 rango desde FE101 hasta FE301.

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO
EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS

NIT: 890803239
Dirección: CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 8867080
Email: gerencia@empocaldas.com.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 10/08/2022
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE106

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:27:53
FECHA FIRMADO: 10/08/2022 12:27:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	08	2022	10	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	ALQCASE	RETROCARGADOR CASE SUPER M ALQUILER	C39	42,00	\$105.000,00	19,00	0,00	\$4.410.000,00

Notas:	Subtotal:	\$4.410.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cinco millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos pesos)	IVA:	\$837.900,00
CUFE: 01ef58e314351d9858e68a7b1d7ad33193202a620b87c05756ebdbca9dc4b1aa2ac8f119c6d3ce545c806040eddc0ad	Total:	\$5.247.900,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.410.000,00	19,00%	\$837.900,00

Firma Digital:

OoF8E6u7h+hNdWn8tdWnkSKEEvB18eqdUFDZ8vTx8e7Krn5slmTJBZATyVbRVbutsfYcEubufsseGUNR3s+Ab7gpQuBFWBkQDSZO+ROW5bArVm
TqKYC7FZAFaH4epRThGz1rHeHbNhpCOo8e0YN3H4YpultTrHRmE2uWF6NYbX/E4riAURSTqvn16McdB4YleBYHW1qEB4oNP1bcO9ABnytsiHuuU/
6ikyoz+YSkHpiBMpIDYxjszV87Dv/1nzQP3JzB9XCzvJBjOZhLXLKYPkaq/QwUp0Fpgu3208ewH4WlkuQ3GbrCy6era3pP1+laNms2x0UrhCclQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL ARAUCA

CONTRATO No.:	ACTO 038 DEL 01 DE JULIO DE 2022	ACTA No.:	ACTA 01 y FINAL	FECHA CORTE:	8 DE JULIO DE 2022
OBJETO CONTRATO:	CONTRATACION DE RETROEXCAVADORA CON LLANTAS POR DESVIACION DEL CAUCE EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA LA PRADERA EN LA ADUCCION DE ARAUCA	FECHA INICIACION:	1 DE JULIO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO:	8 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSTRUMAQ 2022 S.A.S	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	ING. ZONA	FECHA:	8 DE JULIO DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA	
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
1	Retroexcavadora de Llantas	HORA	44	\$ 105.000	\$ 4.620.000	42	\$ 4.410.000	42	\$ 4.410.000	
COSTO TOTAL					\$ 4.620.000		\$ 4.410.000		\$ 4.410.000	
COSTO DIRECTO					\$ 4.620.000		\$ 4.410.000		\$ 4.410.000	
IVA SOBRE UTILIDADES					\$ 877.800		\$ 837.900		\$ 837.900	
COSTO TOTAL					\$ 5.497.800		\$ 5.247.900		\$ 5.247.900	

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCETE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
Valor Acta 1 y final
Saldo No ejecutado
SUMAS IGUALES

5.497.800	\$ 5.247.900
	\$ 249.900
\$ 5.497.800	\$ 5.497.800

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA
SUPERVISOR

MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ
R.L CONSTRUMAQ 2022 SAS
CONTRATISTA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	8/07/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-----------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	038-2022
Objeto:	CONTRATACION DE RETROEXCAVADORA CON LLANTAS POR DESVIACION DEL CAUCE EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA LA PRADERA EN LA ADUCCION DE ARAUCA
Nombre Contratista:	CONSTRUMAQ 2022 SAS
Fecha del contrato:	1 DE JULIO DE 2022
Plazo de ejecución:	8 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 5.497.800
Fecha de iniciación:	1 DE JULIO DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	8 DE JULIO DE 2022
Nueva fecha de terminación:	N.A.
Adición (en valor):	N.A.
Prórroga (en tiempo):	N.A.
Supervisor:	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades

-Alquiler de retro cargador CASE 580 Súper M, para la recuperación de orillas mediante jarillón lateral con material pétreo de gran diámetro y garantizar recuperación de la bocatoma (42 horas maquinaria).

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ARAUCA	ALQUILER RETROCARGADOR (HR)	0

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	8 DIAS CALENDARIO
Tiempo total transcurrido:	8 DIAS CALENDARIO
Avance Porcentual:	100 %

1.4 Registro fotográfico

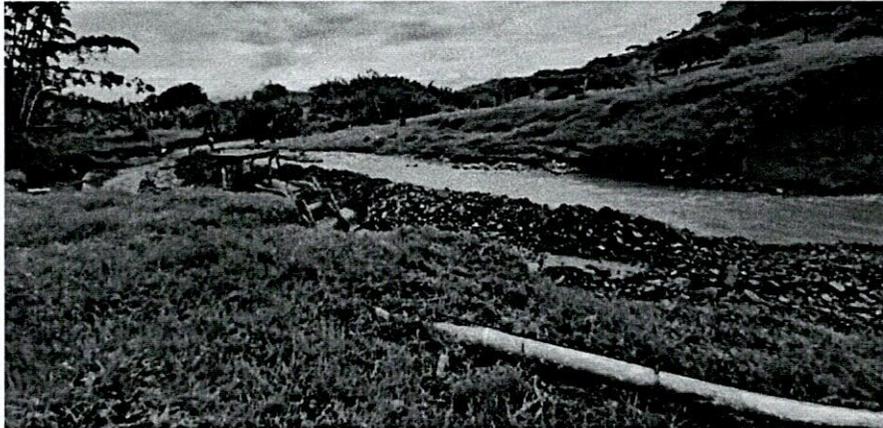


Foto 1: construcción jarillon lateral con material pétreo de la quebrada La Pradera



Foto 2: intervención del retrocargador CASE 580 Super M



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5 Problemáticas en la obra:

- Fuertes y permanentes lluvias a lo largo de la temporada de ejecución de la obra
- Daños de algunos tramos con necesidad de recuperación nuevamente
- Daños en los baldes de la maquinaria por efecto de la fuerza de la corriente

1.1. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 5.497.800
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 5.247.900
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %
Inversión total ejecutada:	\$ 5.247.900
Porcentaje total ejecutado:	100 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

N.A.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Todos los empleados de obra	X	X	X	X	NA

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

El contratista aporta la declaración juramentada de paz y salvo y la planilla de pago de seguridad social del periodo de ejecución de la obra.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCÓ	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	NA	A	A	NA	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

Adjunto al acta de obra UNICA y Final 01 en trámite la preacta o compendio de las cantidades de obra derivadas de cada una de las actividades ejecutadas hasta la fecha de corte.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

1 operario (empleo directo)

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Suscriptores del servicio Arauca y Km 41

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
-----------------------------------------------------------------------------	---

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE


FIRMA DEL SUPERVISOR

Periodo del Julio 01 al Julio 30 de 2022

NOMBRE	CÉDULA	SALARIO	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	DESCUENTO A EMPLEADO		TOTAL A PAGAR	FIRMA
					SALUD	PENSIÓN		
 CONSTRUMAQ 2022 S.A.S.								
Jennifer Ochoa Serna	1.059.784.692	\$ 1.000.000	30	\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 40.000	\$ 1.037.000	<i>Jennifer Ochoa</i>
SUMAS TOTALES				\$ 1.000.000	\$ 117.172	\$ 40.000	\$ 1.037.000	


MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ
 Representante Legal
 CONSTRUMAQ 2022 S.A.S.
