	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2022-08-03

# CONTRATO Y AÑO	241 DE JULIO 5 DE 2023	Acta N°	2-PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$	628.958.921,00
				2. VALOR ADICION	\$	-
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	628.958.921,00
NIT O CC:	16.078.315			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	161.600.247,00
CDP (#, rubro y fecha)	20230569 DE JUNIO 5 DE 2023.			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	243.657.187,00
RP (#, rubro y fecha)	772 DE JULIO 5 DE 2023.			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	223.701.487,00
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO VI, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA (PANTALLA PASIVA 9X8 M).					
TIPO DE RECURSOS	EMPRESTITO DAVIVIENDA 22.000 MILLONES	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Giraldo R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

26/09/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	Ing. SUPERVISOR ZONA	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0550488419437436	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	B	MEHOS DE 200 COTIZANTES	CALDAS	CRA 24 27 40	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI					
Periodo		Tipo		Clave		Limites		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
2023-08 / 2023-09		E		9456067820		2023/09/04		2023/09/07		BANCO DAVIVIENDA		1		\$1.173,600			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
				Código	Dias	Código	Dias	Código	Dias	Código	Dias	Tarifa	Dias	Exonerab. SENA e ICBF		
SUCURSAL: CALDAS (31 Afiliados)																
Centro de Trabajo: BELALCAZAR (2 Afiliados)																
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																
1	CC	75092371	DOMINGO GOMEZ ANDRES FELIPE	X	23000	2	EP5002	2	CCF11	2	14-11	2	6.940%	2	SI	
2	CC	75104348	BOJAS BOJAS CARLOS MARINO	X	23000	2	EP5002	2	CCF11	2	14-11	2	6.940%	2	SI	
Centro de Trabajo: CHIMCHIMA (5 Afiliados)																
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (5 Afiliados)																
3	CC	105498039	ALZATE AMARGO JOHN EDISON	X	23000	6	EP5002	6	CCF11	6	14-11	6	6.522%	6	SI	
4	CC	105499765	CALDERON GONZALEZ JONGE STEFANA	X	24344	6	EP5002	6	CCF11	6	14-11	6	6.522%	6	SI	
5	CC	1054995947	CRUZ ANDRADE IRONI JHON	X	23000	6	EP5002	6	CCF11	6	14-11	6	6.522%	6	SI	
6	CC	15462045	JARAMILLO OSORIO OSCAR ALBERTO	X	23000	6	EP5002	6	CCF11	6	14-11	6	6.522%	6	SI	
7	CC	103061649	OSORIO OSPINA SANDRA MELENIA	X	23000	6	EP5002	6	CCF11	6	14-11	6	6.522%	6	SI	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)																
8	CC	75092457	LOZADA SALAZAR JAMIE ALEJANDRO	X	23000	5	EP5002	5	CCF11	5	14-11	5	6.940%	5	SI	
9	CC	1026103354	PEREZ MORENO ANDRES FELIPE	X	23000	30	EP5002	30	CCF11	30	14-11	30	6.940%	30	SI	
10	CC	1053843460	PEREZ MORENO CEBTIAN CAMILO	X	23000	5	EP5002	5	CCF11	5	14-11	5	6.940%	5	SI	
11	CC	1053847392	VALENCIA SCHEVERRY RUBEN JHON	X	23000	30	EP5002	30	CCF11	30	14-11	30	6.940%	30	SI	
Total		Afiliados		11												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1407815		VALENCIA MARQUEZ CARLOS ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALDAS	CRA 24 27 40	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	9456067820	E	2023/09/06	2023/09/07	BANCO DAVIVIENDA	1	\$1,173,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COL PENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$644,000	\$800	\$0	\$644,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$37,200	\$100	\$0	\$37,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	11	\$606,800	\$700	\$0	\$607,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$205,900	\$300	\$0	\$206,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$205,900	\$200	\$0	\$161,300
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$161,100	\$200	\$0	\$161,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$400	\$100	\$0	\$9,400
TOTAL				11	\$1,172,100	\$1,700	\$0	\$1,173,800

RAZON SOCIAL :	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
IDENTIFICACION:	CC-16078315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-06
FECHA DE PAGO:	2023-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27412431
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27412431
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000	\$ 300.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.100	\$ 384.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 167.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 11.300	\$ 851.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/10/2023
----------------------------------	------------

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica: 4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

Razón Social: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ

Identificación: 16078315-9

Teléfono: 3104158968

Dirección: CALLE 71 NO. 4-71 PORTAL DE LA FLORIDA CASA 79, Villamaría, Caldas, Colombia.

Número: FE-22

Fecha: 25/09/2023 11:38

Fecha Vto.: 25/09/2023

Forma de pago: Crédito

Condición IVA: IVA

Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Dirección: Carrera 23 No.75-82, .

Pais: Colombia

NIT: 890803239-9

Tel: 606 8867080

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Manizales

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		COSTO DIRECTO	ACTA PARCIAL No.2 CORRESPONDIENT E AL CONTRATO DE OBRA 241 DEL 2023.	1.00	Und	0%	180,553,677.00	0.00	180,553,677.00
2		ADMINISTRACION	29%	1.00	Und	0%	52,360,566.00	0.00	52,360,566.00
3		UTILIDAD-3	5%	1.00	Und	19%	9,027,684.00	0.00	9,027,684.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal: 241,941,927.00

Descuento: 0.00

Total Bruto: 241,941,927.00

IVA 19%: 1,715,259.96

Fecha y hora de validación: 25/09/2023 11:46

CUFE: 5be56c663003bf6ac440a251ead2cf7824eb832a11d1989fab82494f10d3c7e79c540b775aa089c19a3a841c3a318010

Valor a Pagar: \$ 243,657,186.96

Firma Digital: EJgnfygztaEWGIlpG4q5EXNRQxOgGIJyAbQIG6H37smQXePKp03ugd0tkatGn1TTPidYloComlFIHxngvPQ+q5QAxDRrL3NcmNZ0/n/zrqOnpTf0YIVaiLSNuMmmhHx

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764056386796 del 2023-09-19 al 2024-03-19. Rango: FE-20 al FE-100.



HECHO EN XUBIO.com

Página 1 / 1

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

INFORME TÉCNICO DE OBRA

1. INTRODUCCIÓN

Durante el contrato de cambio de material filtrante planta campo alegre, mantenimiento general, aplicación de pintura sobre fachadas en la planta, construcción estructura y cubierta en tanques de filtro en la Planta Campo Alegre. De igual manera construcción de estructura de cubierta en tanque de filtro planta los cuervos, obras de estabilidad del talud perimetral, planta de tratamiento agua potable los cuervos, municipio de Chinchiná – Caldas, además (pantalla pasiva 9x8 m).

En el presente informe se describen ítems desarrollados en el periodo de ejecución.

Las obras civiles contempladas dentro del presente contrato comprenden retiro, suministro e instalación de material filtrante, mantenimiento general y aplicación de pintura sobre fachadas, carpintería de aluminio, obra blanca, replanteo, demoliciones, movimientos de tierra, excavaciones, llenos, Concretos, en pantalla pasiva y canal de aguas, entre otros.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	ACTO 241 DEL 2023.
Objeto:	"CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA (PANTALLA PASIVA 9X8 M).
Nombre Contratista:	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VALENCIA MONTES S.A.S
Fecha del contrato:	JULIO 27 DE 2023.
Plazo de ejecución:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO.
Valor inicial Obra	\$ 628.958.921,°°
Valor total:	\$ 628.958.921,°°
Valor ejecutado:	\$ 243.657.187,°°
Saldo contrato:	\$ 223.701.487,°°
Fecha de Iniciación:	JULIO 27 DE 2023.
Fecha de Terminación contractual:	NOVIEMBRE 23 DEL 2023
Supervisor:	Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA



**AVANCE DEL CONTRATO
AVANCE FÍSICO**

Avance físico del periodo	38.74%
Avance físico Acumulado	64.43%

AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada: obra	\$ 628.958.921,°°
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 243.657.187,°°
Porcentaje ejecutado en el periodo:	38.74%
Inversión total ejecutada:	\$ 405.257.434,°°
Porcentaje total ejecutado:	64.43%

AVANCE EN TIEMPO

Plazo de ejecución:	120 días
Tiempo total transcurrido:	61 días
Avance Porcentual:	50.83%

ANTECEDENTES:

La obra que se adelanta en las plantas de campo alegre y los cuervos, perteneciente al municipio de Chinchiná – Caldas, se realiza retiro, suministro e instalación de material filtrante, mantenimiento general y aplicación de pintura sobre fachadas, carpintería de aluminio, obra blanca, replanteo, demoliciones, movimientos de tierra, excavaciones, llenos, Concretos, en pantalla pasiva y canal de aguas.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- Se realizan retiro de material filtrante, retiro de material al hombro hasta el acceso vehicular, disposición final en vehículo automotor.
- Suministro de material filtrante, gravas de 1" a 3/14", de 3/14" a 1/2", de 1/2" a 1/4", de 1/8" a 2 mm malla 10; de arenas te 0,7 - 0,9 mm, de te 0,45 - 0,55 mm, y de antracita te 0,8 - 1,2 mm.
- Instalación de material filtrante en el municipio de Chinchiná – caldas, planta de tratamiento de agua potable campo-alegre.




CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA – CALDAS.



SE REALIZAN RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE, RETIRO DE MATERIAL AL HOMBRO HASTA EL ACCESO VEHICULAR, DISPOSICIÓN FINAL EN VEHÍCULO AUTOMOTOR




SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE. GRAVAS DE 1" A 3/14", DE 3/14" A 1/2", DE 1/2" A 1/4", DE 1/8" A 2 MM MALLA 10; DE ARENAS TE 0,7 - 0,9 MM, DE TE 0,45 - 0,55 MM, Y DE ANTRACITA TE 0,8 - 1,2 MM.

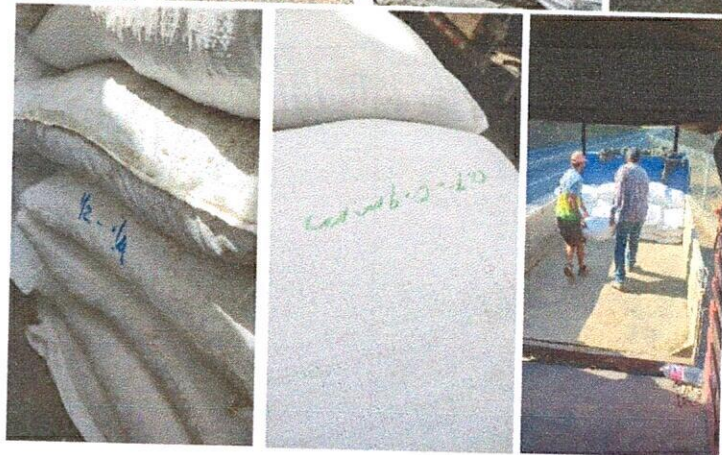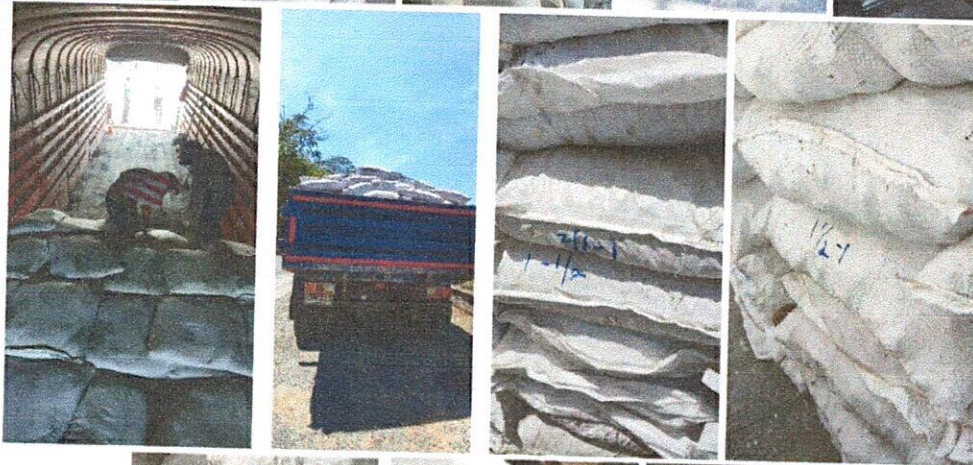
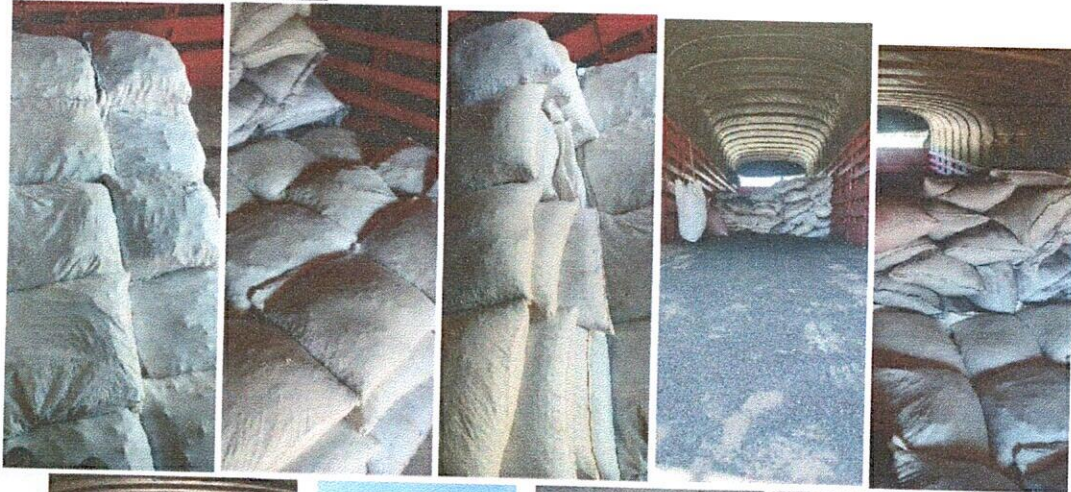




INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE

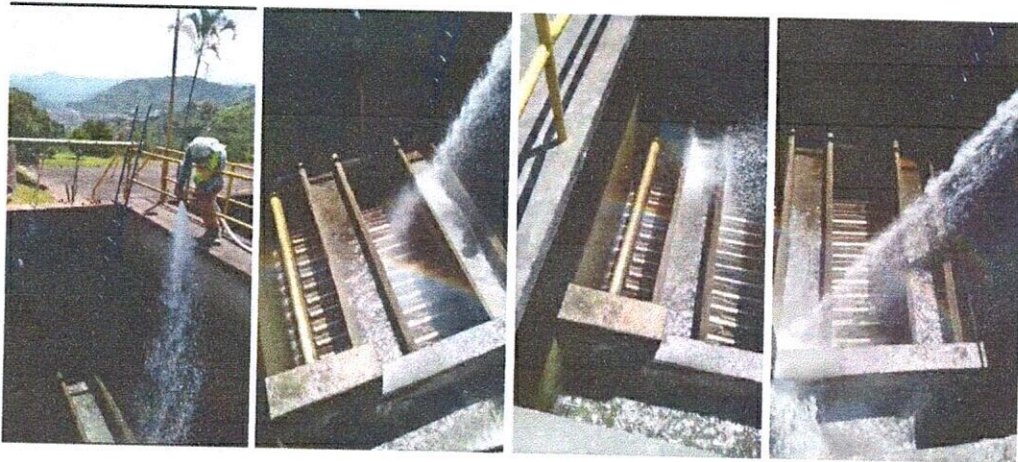



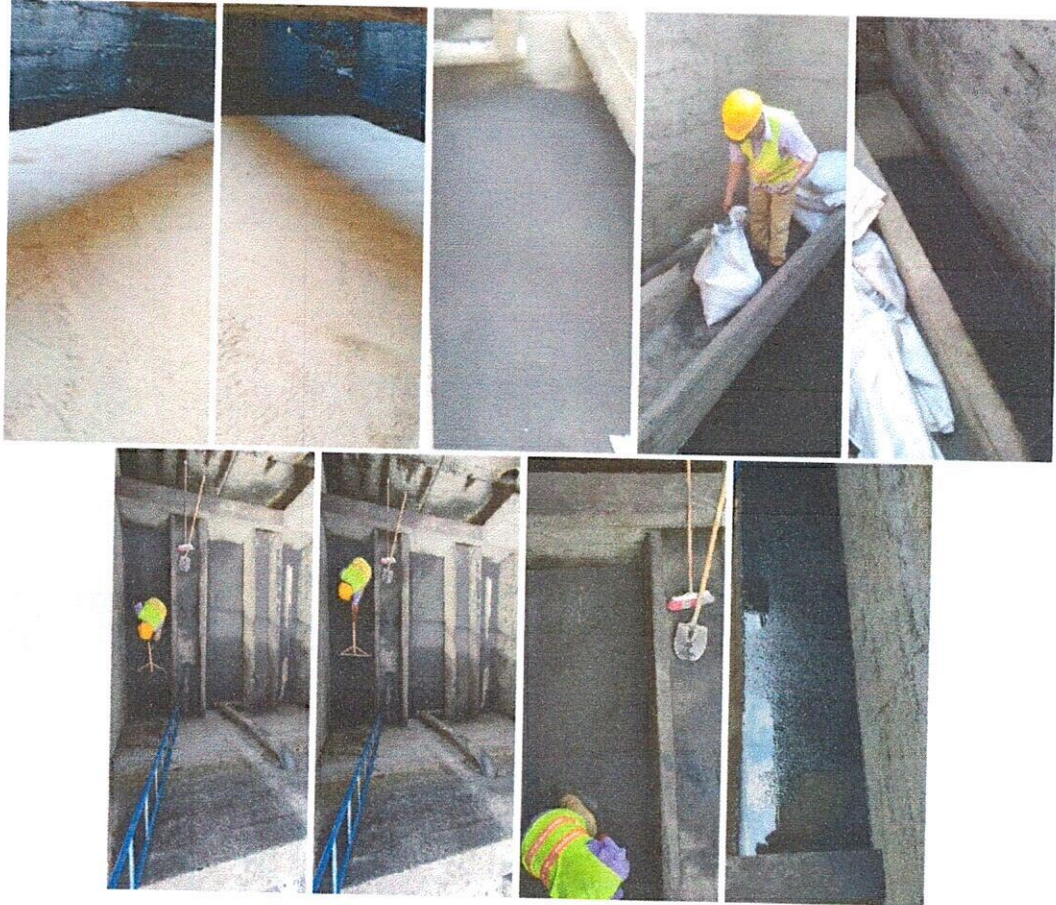

Ing. CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
Contratista



NOMINA 1-09-2023 AL 15-09-2023

N°	EMPLEADOR	CIUDAD/REGIONAL/ FRENTE	CARGO	CC	NOMBRES	Banco	Asignaciones							Deducciones			Monto por pagar en Bancos	Firma del empleado
							Salario Básico Mensual	Horas Extras	Días laborados	Salario	Auxilio (horas extra)	Incapa cidades	Auxilio de transporte	Subtotal 1	EPS (4%)	Pensión 4%		
1	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	CHICHINA PANTALLA CUERVOS	AYUDANTE	10408920	ALDATE, ANDRÉS DOMESTICACION	DIAVALENCIA	1100000		15	\$ 500000	0	\$ 70303	\$ 650303	23.200	\$ 23.200	\$ 48.400	\$ 603.903	Ante A.
2	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	CHICHINA PANTALLA CUERVOS	AYUDANTE	10408920	CAJEDON, GONZALEZ, ESTEBAN	DIAVALENCIA	1100000		15	\$ 500000	0	\$ 70303	\$ 650303	23.200	\$ 23.200	\$ 48.400	\$ 603.903	Calderon
3	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	CHICHINA PANTALLA CUERVOS	AYUDANTE	10408920	CRUZ ANDRADE, JHON ANDR	DIAVALENCIA	1100000		15	\$ 500000	0	\$ 70303	\$ 650303	23.200	\$ 23.200	\$ 48.400	\$ 603.903	Thon Guibo Cruz
4	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	CHICHINA PANTALLA CUERVOS	AYUDANTE	10408920	MARQUEZ, GONZALEZ, ALBERTO	DIAVALENCIA	1100000		15	\$ 500000	0	\$ 70303	\$ 650303	23.200	\$ 23.200	\$ 48.400	\$ 603.903	[Signature]
5	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	CHICHINA PANTALLA CUERVOS	AYUDANTE	3030108	OSORIO, GONZALEZ, SANDRA BELEDA	DIAVALENCIA	1100000		15	\$ 500000	0	\$ 70303	\$ 650303	23.200	\$ 23.200	\$ 48.400	\$ 603.903	sandra

\$ 3.019.515


CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
 C.C. 16.078.315 de Manizales
 Email: ingpa@valencia@gmail.com
 Manizales - Caldas



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	Septiembre 25 del 2023	Acta Parcial	X	Acta final	
----------------	----	-------------------	------------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	241 DEL 2023.
Objeto:	"CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA (PANTALLA PASIVA 9X8 M).
Nombre Contratista:	CARLOS ALEBRTO VALENCIA MARQUEZ
Fecha del contrato:	JULIO 5 DE 2023.
Plazo de ejecución:	CIENTO VIENTE (120) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial Obra	\$ 628.958.921,00
Adición No.1	\$ 0,00
Valor total:	\$ 628.958.921,00
Valor Ejecutado Acta No.1	\$ 161.600.247,00
Valor Ejecutado Acta No.2	\$ 243.657.187,00
Valor Total Ejecutado:	\$ 405.257.434,00
Saldo Del Contrato:	\$ 223.701.487,00
Fecha de Iniciación:	JULIO 27 DE 2023
Fecha de Terminación Inicial:	NOVIEMBRE 23 DEL 2023
Supervisor:	Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA.

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	38.74%
Avance físico Acumulado	64.43%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	120
Tiempo total transcurrido:	61 días
Avance Porcentual:	50.83%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5. Problemáticas con la obra

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

Durante el contrato de cambio de material filtrante planta campo alegre, mantenimiento general, aplicación de pintura sobre fachadas en la planta, construcción estructura y cubierta en tanques de filtro en la Planta Campo Alegre. De igual manera construcción de estructura de cubierta en tanque de filtro planta los cuervos, obras de estabilidad del talud perimetral, planta de tratamiento agua potable los cuervos, municipio de Chinchiná – Caldas, además (pantalla pasiva 9x8 m).

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- Se realizan retiro de material filtrante, retiro de material al hombro hasta el acceso vehicular, disposición final en vehículo automotor.
- Suministro de material filtrante, gravas de 1" a 3/14", de 3/14" a 1/2", de 1/2" a 1/4", de 1/8" a 2 mm malla 10; de arenas te 0,7 - 0,9 mm, de te 0,45 - 0,55 mm, y de antracita te 0,8 - 1,2 mm.
- Instalación de material filtrante.

SE REALIA RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE, RETIRO DE MATERIAL HASTA ACCESO VEHICULOS Y DISPOSICIÓN FINAL EN VEHICULO AUTOMOTOR.






F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE, GRAVAS DE 1" A 3/14", DE 3/14" A 1/2", DE 1/2" A 1/4", DE 1/8" A 2 MM MALLA 10; DE ARENAS TE 0,7 - 0,9 MM, DE TE 0,45 - 0,55 MM, Y DE ANTRACITA TE 0,8 - 1,2 MM.

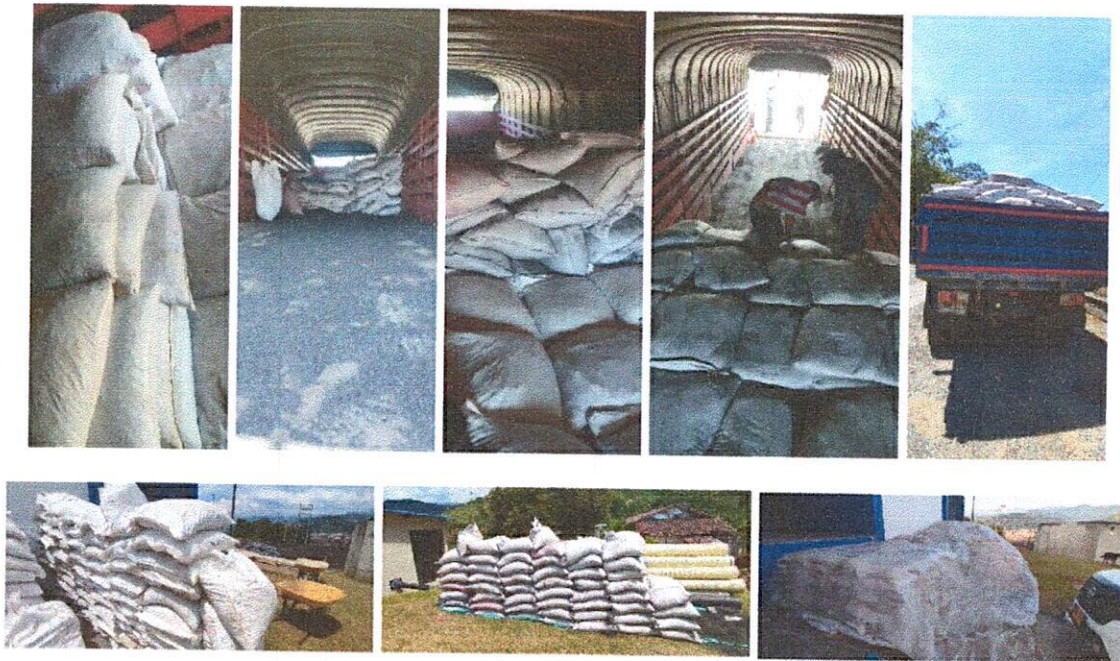





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE.

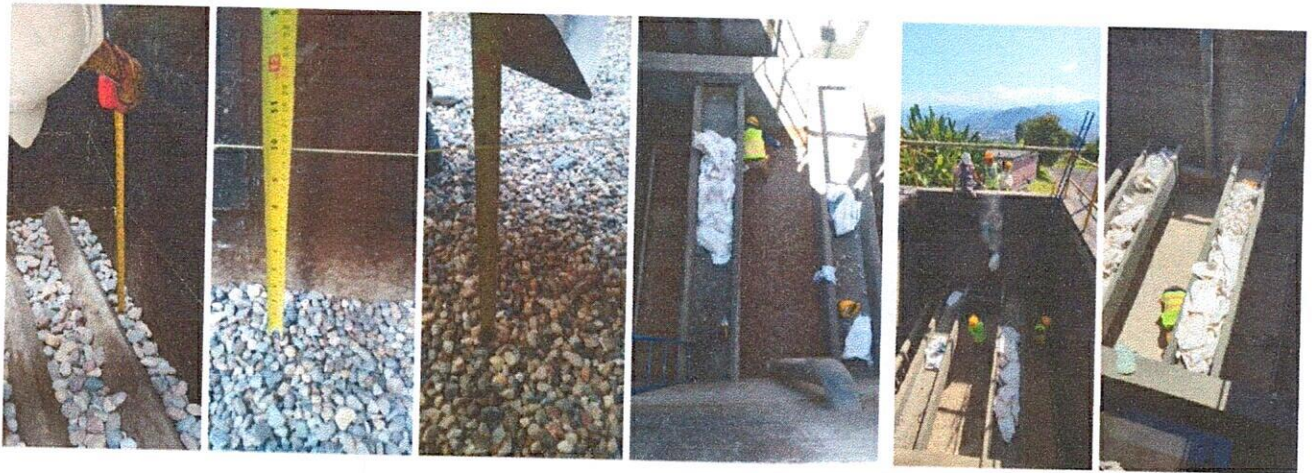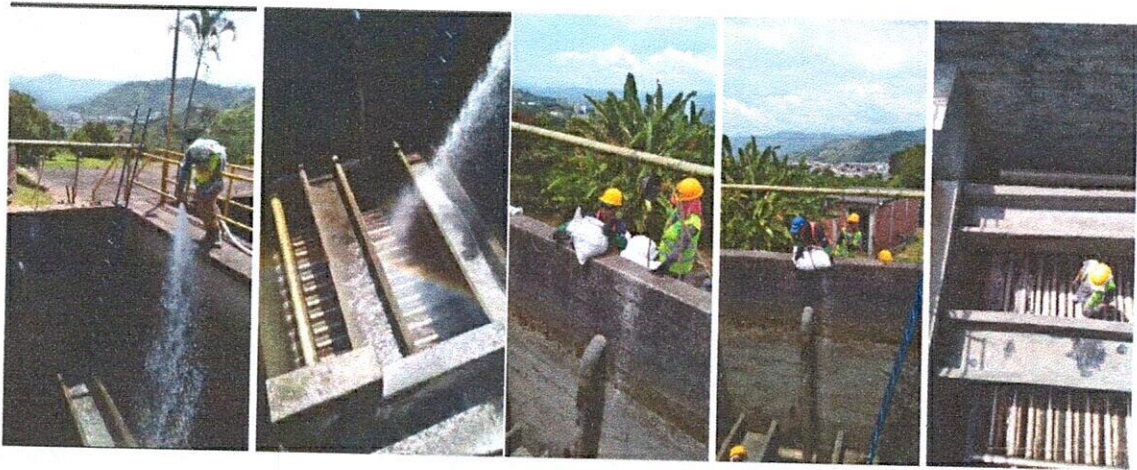



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada: obra	\$628.958.921,00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$243.657.187,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	38.74%
Inversión total ejecutada:	\$405.257.434,00
Porcentaje total ejecutado:	64.43%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	S. del estado	42-45-101056908	27/07/2023	24/02/2024	\$188,687,676.30
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	S. del estado	42-45-101056908	27/07/2023	24/11/2026	\$125,791,784.20
Estabilidad de Obra	S. del estado	42-45-101056908	27/07/2023	26/07/2028	\$125,791,784.20
Responsabilidad Civil	S. del estado	42-40-101043659	27/07/2023	24/02/2024	\$188,687,676.30

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	N	X
Oficial	X	x	x	x	X
Ayudantes	X	x	x	x	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

Para el presente periodo se presenta Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO ^A	OVEROL ^{N/A}	GUANTES ^A	BOTAS ^A	CARNET ^A	CHALECO ^{N/A}	SEÑALIZACIÓN ^A	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ^A
Junio 30 de 2023	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexan con el acta parcial en el paquete de cobro del Acta Final 01.

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	SI	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA
	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	NA	NA	NA
	Negritudes	NA	NA	NA
	Madres cabeza de familia	NA	NA	NA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Personal con limitaciones físicas	NA	NA	NA
TOTALES				

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

El personal que se utilizó en la ejecución de la obra en su mayoría residen en Chinchina- Caldas, tanto calificado como no calificado, la profesional social si era externa.

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entomo		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

El pago del FIC se realizará una vez se halla terminado el presente contrato, por lo anterior se anexará en el acta final de todos los periodos.

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Contrato	241-2023
Acta Número	2 Y PARCIAL

Pág. 1 De. 1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	O						
206002	Chinchiná Acueducto	1301034	Mantenimiento Rutinario		241.941.927,00	1.715.260,00	243.657.187,00	ACUEDUCTO	243.657.187,00	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1					241.941.927,00	1.715.260,00	243.657.187,00		243.657.187,00	-
TOTAL FACTURA					241.941.927,00	1.715.260,00	243.657.187,00		243.657.187,00	-

Fecha de Presentación 25/09/2023

Páginas 1 Fin

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA CENTRO-NORTE	
NOMBRE	CARGO	



EMPICALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CENTRO-NORTE

CONTRATO No. 241 DEL 2023
ACTA No. 2 - Paralel
FECHA CORTE: 29/09/2023

GRUPO W. CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHICHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHICHINA (PANTALLA PASIVA 902 IN).
MUNICIPIO: CHICHINA
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARGOZ
FECHA INICIACIÓN: JULIO 27 DE 2023
VALOR CONTRATADO: \$ 678.958.921.00
FECHA VENCIMIENTO INICIAL: NOVIEMBRE 23 DEL 2023
VALOR ADICION:
FECHA: 26-09-2023

DESCRIPCION	UMD	CONDICIONES CONTRACTUALES				ADICION No.1				PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO	
		CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	NESECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL			
OBRA 1: CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHICHINA - CALDAS.															
PRELIMINARES															
RETRO DE MATERIAL FILTRANTE	M3	163,70	\$ 154.950,00	\$ 22.091.315,00	0,00				26,50	3.576.175,00	16,19%	26,50	\$ 3.576.175,00	16,2%	
RETRO DE MATERIAL AL HOMBRO HASTA EL ACCESO VEHICULAR	M3	163,70	\$ 50.000,00	\$ 8.185.000,00	0,00				26,50	1.325.000,00	16,19%	26,50	\$ 1.325.000,00	16,2%	
DISPOSICION FINAL EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	163,70	\$ 60.720,00	\$ 9.941.173,00	0,00				26,50	1.600.732,00	16,19%	26,50	\$ 1.600.732,00	16,2%	
SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE															
SUMINISTRO GRAVA DE 1" A 3/4"	M3	15,00	\$ 1.279.320,00	\$ 19.189.800,00	0,00				15,00	19.189.800,00	100,00%	15,00	\$ 19.189.800,00	100,0%	
SUMINISTRO GRAVA DE 3/4" A 1/2"	M3	15,00	\$ 1.279.320,00	\$ 19.189.800,00	0,00				15,00	19.189.800,00	100,00%	15,00	\$ 19.189.800,00	100,0%	
SUMINISTRO GRAVA DE 1/2" A 1/4"	M3	7,50	\$ 1.279.320,00	\$ 9.594.900,00	0,00				7,50	9.594.900,00	100,00%	7,50	\$ 9.594.900,00	100,0%	
SUMINISTRO GRAVA DE 1/4" A 1/8"	M3	7,50	\$ 1.279.320,00	\$ 9.594.900,00	0,00				7,50	9.594.900,00	100,00%	7,50	\$ 9.594.900,00	100,0%	
SUMINISTRO GRAVA DE 1/8" A 2 MM MALLA 10	M3	7,50	\$ 1.279.320,00	\$ 9.594.900,00	0,00				7,50	9.594.900,00	100,00%	7,50	\$ 9.594.900,00	100,0%	
SUMINISTRO DE ARENA TE 0.7 - 0.9 MM	M3	15,00	\$ 1.279.320,00	\$ 19.189.800,00	0,00				15,00	19.189.800,00	100,00%	15,00	\$ 19.189.800,00	100,0%	
SUMINISTRO DE ARENA TE 0.45 - 0.50 MM	M3	30,00	\$ 1.279.320,00	\$ 38.379.600,00	0,00				30,00	38.379.600,00	100,00%	30,00	\$ 38.379.600,00	100,0%	
SUMINISTRO ANTRACITA TE 0.8 - 1.2 MM	M3	66,20	\$ 1.659.860,00	\$ 109.894.052,00	0,00				66,00	109.552.660,00	98,70%	66,00	\$ 109.552.660,00	98,7%	
INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE	M3	163,70	\$ 107.960,00	\$ 17.673.692,00	0,00				26,50	2.860.940,00	16,19%	26,50	\$ 2.860.940,00	16,2%	

OBRA 2: MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA CAMPOLEGRE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHICHINA, CALDAS.														
DESCRIPCION	UMD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	NESECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	% OBRA EJECUTADO				
PRELIMINARES														
PROCESO DE REMOCION DE OXIDO EN SUPERFICIA METALICA DE PUERTAS Y VENTANAS CON ACIDO MURATICO Y MEDIOS MANUALES APLICACION DE RESINA EN FIBRA DE VIDRIO PARA CURADO, LIJADO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO. INCLUIE ANCLAVOS Y TRABAJO EN ALTURA DE 5 A 10 MTS.	MT2	30	\$ 34.425,00	\$ 1.032.750,00	97,66	3.361.946,00	0,00%	97,66	\$ 3.361.946,00	325,52%				
DEMOLICION ALERIAS EN PREFABRICADAS INCLUIE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	MTL	15	\$ 17.225,00	\$ 258.375,00	27,00	465.075,00	0,00%	27,00	\$ 465.075,00	180,0%				
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACION ESTUCCO PLASTICO SECADO,1 SOBRE Muros RECTADOS (PROCESO 20 DIMS	M2	148	\$ 33.353,00	\$ 4.936.244,00	168,10	5.606.639,00	0,00%	168,10	\$ 5.606.639,00	113,6%				
DEMOLICION DE ESCALERA RIA TIPO GATO SOBRE FACHADA POSTERIOR INCLUIE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	CBL	1	\$ 438.429,00	\$ 438.429,00	1,00	438.429,00	0,00%	1,00	\$ 438.429,00	100,0%				
REVOQUE PANETE E-1-12, FLOS Y DILATACIONES EN MRL ESTIADO.	MTL	29	\$ 24.954,00	\$ 722.866,00	36,00	913.316,00	0,00%	36,00	\$ 913.316,00	128,2%				

[Handwritten signature]



EMPICALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CENTRO-NORTE

CONTRATO No. 241 DEL 2023

ACTA No.: 2 - Parcial

FECHA CORTE: 25/06/2023

GRUPO VI. CAMBIO DE MATERIAL EL TRAMITE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACION DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRIBUCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA (PANTALLA PASIVA 939 B).
MUNICIPIO: CHINCHINA
FECHA INICIO: JULIO 27 DE 2023
FECHA VENCIMIENTO INICIAL: NOVIEMBRE 23 DEL 2023
VALOR CONTRATO: \$ 929.958.921.00
VALOR ADICION: -

SUPERVISOR: Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
FECHA: 25-06-2023
GRUPO VI. CAMBIO DE MATERIAL EL TRAMITE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACION DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRIBUCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA (PANTALLA PASIVA 939 B).

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		ADICION No.1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR PARCIAL	% EJEC.	CANTIDAD	VR TOTAL		
PRELIMINARES													
Fabricación e instalación perfiles en perfiles de 200x100x4 mm, platinas y pernos de conexión y aislantes. Alta mínima pernos 4m	UN	6.00	\$ 12.814.627.00	\$ 76.887.762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Instalación e instalación con base de cubierta en perfil de 150x50x2, platinas y pernos de conexión	un	40.00	\$ 1.234.763.00	\$ 49.381.770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Suministro e instalación tela estándar asera calibre 26, ancho 50cm, altura pantalla 3.8m, color nail 9002, sencilla	M2	280.00	\$ 90.180.00	\$ 25.250.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Suministro e instalación canal aguas lluvias calibre 26, desarrollo 60cm, con bocas de 4"	m	27.50	\$ 213.221.00	\$ 5.864.889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Suministro e instalación tubo pvc 4" dejando aguas lluvias	m	24.00	\$ 97.389.00	\$ 2.337.336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
OBRA 4: CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA CUERVOS													
Fabricación e instalación perfiles en perfiles de 150x100x3mm, platinas y pernos de conexión y aislantes.	Un	4.00	\$ 3.898.090.00	\$ 15.596.360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Fabricación e instalación pernos de conexión	Un	12.00	\$ 1.296.959.00	\$ 14.483.506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Suministro e instalación tela fijocemento #8 cinco canales	M2	83.20	\$ 74.222.00	\$ 6.175.270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Fabricación e instalación baranda en tuberia 1 1/2x3mm	m	16.00	\$ 337.375.00	\$ 5.398.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
Suministro e instalación rejilla en ángulo de 1 1/2 x 1/8 y varilla 1/2	m	6.00	\$ 377.860.00	\$ 2.267.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.0%
PRELIMINARES													
Recepción e instalación, sin retiro	m2	220.00	\$ 3.204.00	\$ 704.880.00	279.00	893.916.00	279.00	893.916.00	0.00	0.00	279.00	\$ 893.916.00	126.8%
Conformación de taludes con sistema manual, en tierra (No incluye retro de sobranes)	m3	36.00	\$ 47.322.00	\$ 1.703.592.00	36.00	1.703.592.00	36.00	1.703.592.00	0.00	0.00	36.00	\$ 1.703.592.00	100.0%
Conformación de taludes con sistema manual, en conglomerado (No incluye retro de sobranes)	m3	54.00	\$ 51.373.00	\$ 2.774.142.00	53.76	2.751.812.00	53.76	2.751.812.00	0.00	0.00	53.76	\$ 2.751.812.00	99.6%
Excavaciones en zanja hasta 2m de profundidad, en conglomerado (No incluye retro de sobranes)	m3	12.00	\$ 63.682.00	\$ 764.184.00	13.08	824.851.00	13.08	824.851.00	0.00	0.00	13.08	\$ 824.851.00	109.0%
Excavaciones en roca con carga hidráulica (incluye compresor y 3 perforaciones)	m3	12.00	\$ 265.889.00	\$ 3.190.668.00	12.00	3.185.888.00	12.00	3.185.888.00	0.00	0.00	12.00	\$ 3.185.888.00	100.0%
Conformación con cobales de fibra y asbo ormano (10:1), con material de la zona	m3	5.00	\$ 349.856.00	\$ 1.749.280.00	2.85	997.390.00	2.85	997.390.00	0.00	0.00	2.85	\$ 997.390.00	57.0%
Anero de Refuerzo Fry 4300 MPA (enrollados pasivos D=3/4", 12', longitud 36' @ 15cm)	kg	1.580.00	\$ 11.086.00	\$ 17.534.840.00	1.687.53	18.728.298.00	1.687.53	18.728.298.00	0.00	0.00	1.687.53	\$ 18.728.298.00	106.5%

DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES		ADICION No. 1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO		
		CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL			
Confirmación y nivelación de taludes con agua cementada 12:1	m3	3,00	\$ 454.315,00	\$ 1.362.945,00			14,18	6.442.187,00	0,0	0,00%	14,18	\$ 6.442.187,00	472,7%	
Suministro y colocación de tuberías 4" A.L.L. Para anclajes	m	39,00	\$ 42.300,00	\$ 1.269.090,00			30,00	1.269.090,00	0,0	0,00%	30,00	\$ 1.269.090,00	100,0%	
Perforación de oros y anclajes pasivos con equipo mecánico (Residual y Conglomerado)	m	117,60	\$ 153.945,00	\$ 17.996.092,00			0,00	0,0	0,0	0,00%	0,00	\$ -	0,0%	
Perforación de oros y anclajes pasivos con equipo mecánico (Roca)	m	50,40	\$ 274.425,00	\$ 13.831.070,40										
Inyección de lechada AC=0,45, con bomba 700PS	m	138,00	\$ 57.921,00	\$ 7.993.068,00										
Concreto para pantalla pasiva de 3000psi e=12cm	m2	72,00	\$ 143.656,00	\$ 10.343.232,00										
Soleto en concreto de 10,5 Mpa	m3	1,50	\$ 767.157,00	\$ 1.150.735,50										
Suministro y colocación de tubería perforada 7" S. Para drenes	m	30,00	\$ 32.630,00	\$ 984.600,00										
Suministro y colocación de tubería perforada 7" S. Para drenes	m	6,00	\$ 43.833,00	\$ 262.998,00										
Suministro, transporte e instalación de concreto para zanja colectora de 3000 psi	m3	1,50	\$ 1.100.438,00	\$ 1.650.657,00										
Suministro, transporte e instalación de concreto para Canal de Rapidas con Trafo de 3000 psi	m3	4,50	\$ 1.189.095,00	\$ 5.350.762,00										
Aterraje al fondo fuerte pendiente	m3-1m	10,00	\$ 119.202,00	\$ 1.192.020,00										
Suministro, transporte y construcción de brinchos en guardia, Pasadizo asfáltico, con adoquines de asociacat, tabulatas (Azarim)	m	30,00	\$ 70.410,00	\$ 2.112.300,00										
Caja en concreto simple de 3000psi (60x60xcm), incluye lepa y cañalúa	un	2,00	\$ 590.538,00	\$ 1.181.076,00										
Pedro de material sobrante en valiqueta, cargue manual	m3	30,00	\$ 69.732,00	\$ 2.076.960,00										

CONTRATO No. 241 DEL 2023	ACTA No. 2 - Parcial	FECHA CORTE: 25/09/2023
GRUPO VI, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHIRCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACION DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRA DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DE CHIRCHINA (PANTALLA PASIVA B18 M)	FECHA INICIACION: JULIO 27 DE 2023 VALOR CONTRATO: \$ 628.958.921,00	FECHA VENIMIENTO INICIAL: NOVIEMBRE 23 DEL 2023 VALOR ADICION
EMPONCALDAS A.S. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL CENTRO-NORTE		
SUPERVISOR: Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSCALERA		
GRUPO VI, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHIRCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACION DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRA DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DE CHIRCHINA (PANTALLA PASIVA B18 M)		

CONDICIONES CONTRACTUALES	ADICION No. 1	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA		
CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL
\$ 464.088.118	\$ -	\$ -	\$ 199.533.877	\$ -	\$ 303.361.915	
135.159.754	\$ -	\$ -	52.960.596,00	\$ -	87.867.555,00	
23.303.404	\$ -	\$ -	9.027.684,00	\$ -	15.075.066,00	
624.531.274	\$ -	\$ -	241.941.927	\$ -	402.404.566	
4.427.647	\$ -	\$ -	1.715.260,00	\$ -	2.952.869,00	
628.958.921	\$ -	\$ -	243.657.187,00	\$ -	465.257.434,00	
628.958.921	\$ -	\$ -	243.657.187,00	\$ -	465.257.434,00	

COSTO DIRECTO	29,00%
ADMINISTRACION	5,00%
UTILIDADES	
SUMA ANTES IVA	
I.V.A.	19
VALOR TOTAL OBRA	
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE MILLOONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLOONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 465.257.434,00) mda.





CONTRATO No. 241 DEL 2023		ACTA No. 2 - Parcial		FECHA CORTE: 25/09/2023	
GRUPO VI. CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHICHINCHA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHICHINCHA (PANTALLA PASIVA 8X8 M).		FECHA INICIACIÓN: JULIO 27 DE 2023		VALOR ADICIÓN: \$ 628.958.971,00	
MUNICIPIO: CHICHINCHA		SUPERVISOR: Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA		FECHA: 25-09-2023	
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ		GRUPO VI. CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHICHINCHA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHICHINCHA (PANTALLA PASIVA 8X8 M).		FECHA: 25-09-2023	

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		ADICION No. 1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EECUFADO
			VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL		
<p>CONTRATO No. 241 DEL 2023</p> <p>GRUPO VI. CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHICHINCHA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHICHINCHA (PANTALLA PASIVA 8X8 M).</p> <p>MUNICIPIOS: CHICHINCHA</p> <p>CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ</p>													

EMPICALDAS A.S. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL CENTRO-NORTE		EMPICALDAS A.S. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL CENTRO-NORTE	
CONTRATO No. 241 DEL 2023		ACTA No. 2 - Parcial	
FECHA CORTE: 25/09/2023		FECHA CORTE: 25/09/2023	
GRUPO VI. CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHICHINCHA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHICHINCHA (PANTALLA PASIVA 8X8 M).		FECHA INICIACIÓN: JULIO 27 DE 2023	
MUNICIPIOS: CHICHINCHA		VALOR ADICIÓN: \$ 628.958.971,00	
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ		SUPERVISOR: Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:		VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 628.958.971,00	
Valor Adición No. 01		VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: 19/09/2023)		\$ 161.602.247,00	
		VALOR ACTA No. 02 PARCIAL (Fecha: 24-09-2023)		\$ 243.057.167,00	
		VALOR ACTA No. 03 PARCIAL (Fecha:)		\$ 405.297.434,00	
Suma		VALOR ACTA No. 03 PARCIAL (Fecha:)		\$ 223.701.487,00	
Sitio del Contrato		SUMAS IGUALES		\$ 628.958.971,00	
Nombre: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ		Nombre: Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA		\$ 628.958.971,00	
Contratista:		INGENIERO SUPERVISOR			
		EMPICALDAS S.A. E.S.P.			



CONTRATO No.	241 DE 2023	PRE-ACTA	No 2- Parcial
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	FECHA INICIACIÓN	JULIO 27 DE 2023.
SUPERVISOR	Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 23 DEL 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE	M3	0,00	26,50	26,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
18	9						26,50			RETIRO DE MATERIAL GRAVAS, ARENAS Y ANTRACITA FILTRO No.1
									CANTIDAD DE PAGO	26,50



ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	RETIRO DE MATERIAL AL HOMBRO HASTA EL ACCESO VEHICULAR	M3	0,00	26,50	26,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
18	9						26,50			RETIRO DE MATERIAL GRAVAS, ARENAS Y ANTRACITA FILTRO No.1
									CANTIDAD DE PAGO	26,50



ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	DISPOSICIÓN FINAL EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	0	26,50	26,50


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
18	9						26,50			RETIRO DE MATERIAL GRAVAS, ARENAS Y ANTRACITA FILTRO No.1
									CANTIDAD DE PAGO	26,50




ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	SUMINISTRO GRAVA DE 1" A 3/4"	M3	0	15,00	15,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
20	9						15,00			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	15,00



EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS				CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO							
CONTRATO No. 241 DE 2023				PRE-ACTA: No 2- Parcial							
CONTRATISTA CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ				FECHA INICIACIÓN: JULIO 27 DE 2023.							
SUPERVISOR: Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA				FECHA TERMINACION: NOVIEMBRE 23 DEL 2023							
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	SUMINISTRO GRAVA DE 3/14" A 1/2"							M3	0	15,00	15,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
20	9						15,00			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	
									CANTIDAD DE PAGO	15,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	SUMINISTRO GRAVA DE 1/2" A 1/4"							M3	0	7,50	7,50
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
20	9						7,50			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	
									CANTIDAD DE PAGO	7,50	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	SUMINISTRO GRAVA DE 1/4" A 1/8"							M3	0	7,50	7,50
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
20	9						7,50			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	
									CANTIDAD DE PAGO	7,50	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	SUMINISTRO GRAVA DE 1/8" A 2 MM MALLA 10							M3	0	7,50	7,50
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
20	9						7,50			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	
									CANTIDAD DE PAGO	7,50	





CONTRATO No. 241 DE 2023 PRE-ACTA: No 2- Parcial
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ FECHA INICIACIÓN: JULIO 27 DE 2023.
SUPERVISOR: Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA FECHA TERMINACION: NOVIEMBRE 23 DEL 2023

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	SUMINISTRO DE ARENA TE 0.7 - 0.9 MM	M3	0	15,00	15,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
20	9						15,00			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	15,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	SUMINISTRO DE ARENA TE 0.45 - 0.55 MM	M3	0	30,00	30,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
20	9						30,00			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	30,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	SUMINISTRO ANTRACITA TE 0.8 - 1.2 MM	M3	0	66,00	66,00



FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	m3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
20	9						66,00			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS 6 FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	66,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE	M3	0	26,50	26,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
20	9						26,50			INSTALACION DE MATERIAL DE MATERIAL PARA EL FILTRO No.1 PLANTA CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
									CANTIDAD DE PAGO	26,50


FIRMA CONTRATISTA
Ing. CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ

FIRMA SUPERVISOR
Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

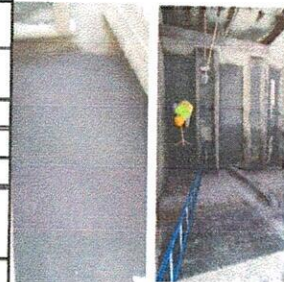

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

25-09-2023 25-09-2023 FE FE22 16075315 Factura electrónica 890603239 CARLOS ALBERTO V... EMIPOCALDAS S.A. E.... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$243,657,167

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2022-08-03

# CONTRATO Y AÑO	241 DE JULIO 5 DE 2023	Acta N°	2-PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 628.958.921,00
				2. VALOR ADICION	\$ -
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 628.958.921,00
NIT O CC:	16.078.315			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 161.600.247,00
CDP (#, rubro y fecha)	20230569 DE JUNIO 5 DE 2023.			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 243.657.187,00
RP (#, rubro y fecha)	772 DE JULIO 5 DE 2023.			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	\$ 223.701.487,00
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO VI, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA DE CAMPO ALEGRE, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPO ALEGRE, CONTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTRO PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERIMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA (PANTALLA PASIVA 9X8 M).				
TIPO DE RECURSOS	EMPRESTITO DAVIVIENDA 22.000 MILLONES	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 26/09/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
Ing. JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	Ing. SUPERVISOR ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
O550488419437436	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

26-09-23
2.11.23
