	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	CONTRATO DECLARATORIA DE EMERGENCIA 032 DE 24 DE JULIO DE 2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	16.850.640
				2. VALOR ADICION	
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	16.850.640
NIT O CC:	900.037.096-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	20230655- 2320101001030812 28/06/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	15.945.005
RP (#, rubro y fecha)	835 - 26/07/2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	905.635
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS				
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		
3- Pagos al FIC	✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.	✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	✓	
15- Acta parcial o final del contrato.	✓	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	✓
Acta parcial o final del contrato.	✓
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	✓
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	✓
Copia del registro presupuestal	

Handwritten signature and date:
2023-12-23
2:45 PM

Fecha de presentación

10/10/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO	ING. ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0 87069996517	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**


PERSONA JURÍDICA

Yo **ÁLVARO CASTAÑO PINEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **10.252.823** de Manizales caldas, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUTOP INGENIERÍA S.A.S.**, identificado con Nit **900.037.096-1** certifico bajo la gravedad de juramento, que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, el consorcio ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales - Caldas, a los 21 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente;



ÁLVARO CASTAÑO PINEDA
R/te legal
CC. 10.252.823 de Manizales

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

100356659

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

304178694

29/11/2023

Número de Identificación

900037096

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

1

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE

Localización

Nacional

Correo electrónico

construtopingeneria@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

032

Nombre Obra

MARQUETALIA

Fecha Terminación Obra

22/08/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

7

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,312 7652283

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

032

Fecha Inicio Obra

24/07/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

MARQUETALIA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

58000.00

Valor del Pago

58000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	100356659	304178694	29/11/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900037096**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.159.54.111**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 58,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 58,000.00	COP\$ 58,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

97275942

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

183717807

27/09/2023

Número de Identificación

900037096

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

1

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE

Localización

Nacional

Correo electrónico

construtopingeneria@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

032

Nombre Obra

emergencia

Fecha Terminación Obra

15/08/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

8

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,312 7652283

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

032

Fecha Inicio Obra

01/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

marquetalia

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

87000.00

Valor del Pago

87000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	97275942	183717807	27/09/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900037096**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.159.54.111**

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado **\$ 87,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 87,000.00	COP\$ 87,000.00

CONSTRUTOP INGENIERIA SAS

Regimen Común NIT. 900037096 -1
Calle 58 A No 24 - 28 Tel: 8914477 Cel 320-6939832
construtopingeneiria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ACP250

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS SA ESP		13/12/2023	\$ 15.945.005,00
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 23 75-82			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	13/12/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309501	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023	1	\$ 11.815.491,00		\$ 11.815.491,00
41309502	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023	1	\$ 3.308.337,00		\$ 3.308.337,00
41309504	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023	1	\$ 590.775,00		\$ 590.775,00
41309503	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023	1	\$ 118.154,75		\$ 118.154,75

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 15.832.757,75	CxC # 1	Vence: 13/12/2023	\$ 15.945.005,00
IVA liquidado	\$ 590.775,00	19,00%	\$ 112.247,25			
VALOR TOTAL :			\$ 15.945.005,00			

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%) Resolución DIAN: 18764060451217. Prefijo: ACP. Rango: 243 al 300. Vigencia: 23/11/2023 hasta 23/11/2024.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 13/12/2023.
Somos Retenedores y Autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Manizales, Resolución 0055 del 10 de Octubre de 2022.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:
KaZpe8TLko5F4C1fSjQ90fAjlsgjALXpLsK0oFjzXbgwA3bzaz2NVqCd+cwq11VXgpiPYwRHfYWZ5rSvxWtfgouO1wkbHXJgJyDC0KwtFWTWPSRXT9pVOzT44eQXOP3SZ/Gd6MgSwBX50NH3CivEfrL/NK9TMRAWUBD1srR0ABcGd1aanvq4Sxvp4N1yrg+f5jjiHS7iivdNqX5YKcZorOUvoeKD790n4mjOSn32Natr8IZiUEd33ghDuX5qngZEqybNdabD9/ulu5E0aUhxB1eCdUq996yayhA0s/VnDBWBoZ41vOGJ13n/53N/s4BItBwvROnUxq0d7riuVQqA==

CUFE: 3f22affa65e8088e7e733eea41a7bcce804403e1b65a6dcb0deb66296fcd71e4663ba0f5a460f22be6c5ced8cbfd85a6
Fecha emisión: 2023-12-13 17:53:06 Fecha validación DIAN: 2023-12-13 17:53:15-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSTRUTOP INGENIERIA SAS

Regimen Común NIT. 900037096 -1
Calle 58 A No 24 - 28 Tel: 8914477 Cel 320-6939832
construtopingeneiria@gmail.com

Nota crédito de la factura electrónica de
venta

No. ACPC194

FECHA

13/12/2023

CLIENTE

EMPOCALDAS SA ESP

NIT : 890803239-9 DIRECCION : Cra. 23 75-82

CIUDAD : MANIZALES

VALOR

\$ 15.945.005,00

CUENTA	GG./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERGERO	DEBITO	REDITO
41309502	1P021	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023		EMPOCALDAS SA ESP	\$ 3.308.337,00	
41309504	1P021	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023		EMPOCALDAS SA ESP	\$ 590.775,00	
41309503	1P021	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023		EMPOCALDAS SA ESP	\$ 118.154,75	
41309501	1P021	ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO ACTO 032 DEL 24 DE JULIO DE 2023		EMPOCALDAS SA ESP	\$ 11.815.491,00	
24080290		IVA liquidado - Nota crédito electrónica VP CADENA: ACPC194	-\$ 590.775,00	EMPOCALDAS SA ESP	\$ 112.247,25	
23659006		Autorretención especial a título de renta - Impuesto CREE 1.1% (devolución venta) - Nota crédito ele	-\$ 15.832.757,75	EMPOCALDAS SA ESP	\$ 174.160,34	
13559006		Autorretención especial a título de renta - Impuesto CREE 1.1% (devolución venta) - Nota crédito ele	-\$ 15.832.757,75	EMPOCALDAS SA ESP		\$ 174.160,34
13050501		Nota crédito de ingresos Amortiza CxC a 890803239		EMPOCALDAS SA ESP		\$ 15.945.005,00
TOTALES					\$ 16.119.165,34	\$ 16.119.165,34

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

RECIBIDO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

LCUI7Q33k3BGb4HjZoV+WEIFrXf2ywbk2ibrZp55m9wsx3BZyNqrvfqZ6ogmazUxjV0L4BMui8i72EH+mWRUT3wT02a9NSiXTaknPukMq8ZPysyT1kr+obDh
Gi5CUJRsb6LQ7dDkSf+OPr1dCRYgRNs3WibNwHRcDVoRP46RgQhZ9mrv0lmvOST8F3IV3a/AqBKkVUs9NIPzjkZ2mMuM8qd5EqJqocllZ3h7lrataBGJ4ixkd
JLvrWt7gunCbYil3/1KIQNDrvGLCdh5DbnrN6S6RswJUGTG5UGGko8DK7uRanrv17K6lYkt6ELbEOr7mpcjHHPAuOrkU54zDBbg==

CUDE: 4ed10d45985e60db1561d730cd0daee4afbf2a46b2660fa483a8a677211cb9bf016c5d91dc972e2e9316173f1d2534f5

Fecha emisión: 2023-12-13 17:49:32

Fecha validación DIAN: 2023-12-13 17:49:40-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FACTURA REFERENCIADA:

Fecha emisión:

CUFE:

FRM-552V

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME MENSUAL DE OBRA

PERIODO:

24 DE JULIO DE 2023 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 ✓

**CONTRATO DECLARATORIA DE EMERGENCIA 032 DE 24 DE
JULIO DE 2023**

OBJETO:

**"REPARACION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA
MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS"**

**CONTRATISTA:
CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.**

**SUPERVISOR:
ING. OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**

22 DE AGOSTO DE 2023

INDICE

1.	Introducción	3
2.	Descripción del proyecto y localización de la obra	4
2.1	Descripción del proyecto	4
2.2	Localización general de la zona del proyecto	4
3	Contrato de Obra	4
3.1	Información general del contrato de Obra	4
3.2	Trabajos ejecutados a la fecha	4
3.3	Recursos humanos	5
3.3.1	Recursos humanos del contratista	5
3.3.2	Maquinaria usada por el contratista	6
4	Programación de obra e inversión	6
5	Registro fotográfico	7

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe consta de 5 capítulos tal como se expone a continuación:

La primera parte consta de una breve descripción del proyecto para exponer en que consiste el desarrollo del contrato, indicando los beneficios que conlleva realizar este tipo de obra.

La segunda parte nos entramos al contrato de obra, para indicar su avance y como se ha venido desarrollando cada una de las actividades del contratista.

La tercera parte consta de una descripción de la localización del frente de trabajo con el fin de conocer más a fondo el campo de acción del proyecto.

La cuarta división se trata de la programación e inversión de la obra, con el fin de conocer como es el avance de obra.

La quinta etapa es el registro fotográfico de la obra para esquematizar el proceso constructivo que se emplea para ejecutar y cumplir con las actividades del contrato de obra.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto Consiste en: **"REPARACION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS"**

Se realizaron excavaciones manuales, instalación de tubería novafort de 12 ", cámaras de inspección y llenos compactado correspondientes para estas, se realizan labores de retiro de material, limpieza del sitio de la obra, instalación de concreto para trafico peatonal.

2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA:

Contrato No.: CONTRATO DECLARATORIA DE EMERGENCIA 032 DE 24 DE JULIO DE 2023

Contratista: CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.

Objeto: "REPARACION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS"

Valor del Contrato : \$ 16.850.640

4

Fecha de Suscripción del Contrato : 24 DE JULIO DE 2023 ✓
Fecha de Orden de Iniciación : 24 DE JULIO DE 2023 ✓
Plazo del Contrato : 1 MES DIAS: (30 DÍAS) ✓
Fecha terminación : 22 DE AGOSTO DE 2023 ✓

3.2 TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

- ✓ Excavaciones
- ✓ Llenos compactados
- ✓ Cámaras de Inspección
- ✓ Concreto

3.3 RECURSO HUMANO USADO EN OBRA

3.3.1 RECURSOS DEL CONTRATISTA

CUADRO No. 1 RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

CARGO	MES 01	Nombre
Ing. Residente de Obra	1	GERMAN EDO. CEBALLOS CASTAÑO
Profesional SST	1	EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ
Profesional Social	1	MARIA EUGENIA RAMIREZ
Maestro de Obra	2	JUAN BAUTISTA PINEDA GAVIRIA
Oficial de Obra	1	CLAUDIO ALVARO ROMO ROSERO
Ayudante de Obra	10	

3.3.2 MAQUINARIA USADA POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA

5

CUADRO No. 2 MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DE MATERIALES	1
2	CONCRETADORA (1 SACO - ¼ SACO)	1
3	VIBRADOR PARA CONCRETO	2
4	CORTADORA	1
5	VIBROCOMPACTADORA (RANA)	1
6	CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	1

4. PROGRAMACIÓN DE OBRA E INVERSIÓN

PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
\$16.850.640	\$16.585.271	\$265.369
100%	98,43%	1,57%

Nota: los valores del cuadro anterior corresponden a la semana 4 del contrato; no se presenta atraso a la fecha.

De los sectores que se encuentran en ejecución, el porcentaje físico de avance aproximado es el siguiente:

UBICACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS	98,97%

Las actividades en la obra son: excavaciones manuales, se realizan labores de retiro de material, limpieza del sitio de la obra, se instala tubería de 12", se hacen cámaras de inspección, se realizan llenos compactado, instalación de concreto para trafico peatonal.


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA.


**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR
MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS**

EXCAVACIONES



EXCAVACIONES ZANJA, INSTALACION FOTRMALETA CAMARAS

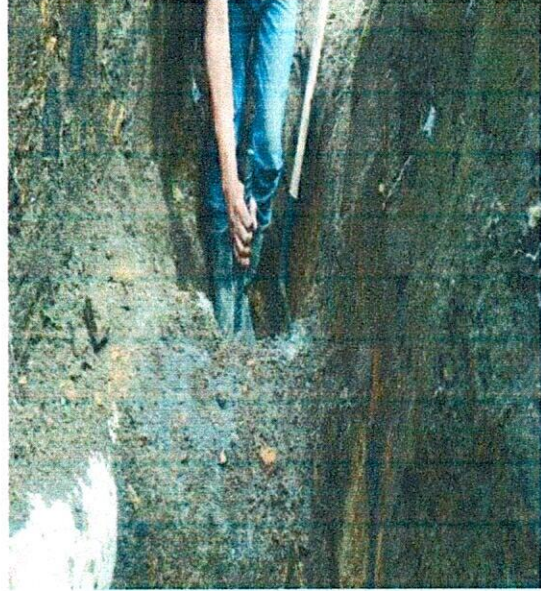

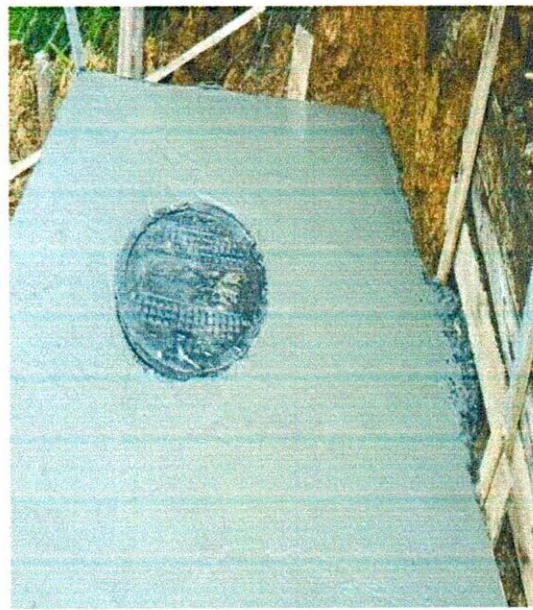



GERMAN EDUARDO CEBALLOS C.
Ingeniero Residente

Nomina # 1

PERIODO DE PAGO: ASISTENCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2023

FECHA: DOMINGO 30 DE JULIO DE 2023

OBRA: MARQUETALIA

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	INGRESA SALARIO TRABAJADOR	SALARIO	SUBSIDIO TRANSPORTE	AUX RODAMIENTOS	TOTAL DEVENGADO	TOTAL SALARIO INCLUIDO HORAS EXTRAS	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	RECIBI
										PENSION	SALUD	TOTAL		
1 CESAR AUGUSTO CAÑON	75.085.081	OF	7,0	\$ 1.987.600	\$ 466.083	\$ 32.808	\$ 38.216	\$ 537.107	\$ 537.107	\$ 18.643	\$ 18.643	\$ 37.286	\$ 500.000	Cesar Cañon
4 JOSE JAVIER GALLEGO	5.928.410	AY	7,0	\$ 1.160.000	\$ 270.667	\$ 32.808		\$ 303.475	\$ 303.475	\$ 10.827	\$ 10.827	\$ 21.654	\$ 282.000	Javier Gallego
TOTAL NOMINA MARQUETALIA										\$ 840.582	\$ 29.470	\$ 58.940	\$ 782.000	
ASISTENCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2023										\$ 781.642	\$ 358			

ELABORO:
ANGÉLICA MARÍA GRANADA R
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

APROBO:
ALVARO CASTAÑO PINEDA
GERENTE GENE



Consultas y Extractos > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Empresa: CONSTRUTOP INGENIERIA SAS
 Usuario: ALVARO CASTANO PINEDA

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
 Número de producto: *****6517

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 9.314.000,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 31/08/2023
 Hora: 10:24:13

Número de documento: 54158186

Pago Marcela Lina y Victoria

Registros 1 a 16



Total Registros: 1

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6206	ALVARO ANDRES MARTINEZ LOPEZ	\$ 604.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6291	BRYAN STEVEN QUICENO	\$ 609.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0277	CARLOS ARIEL LOPEZ LOPEZ	\$ 604.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0547	CRISTIAN FELIPE MANJARRES	\$ 323.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3378	DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN	\$ 604.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8838	FABIAN ANDRES RUIZ RUIZ	\$ 604.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6733	FREDDY FERNANDO PEREZ LOPEZ	\$ 121.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7584	GEIMAR ANDRES RUIZ ROJAS	\$ 604.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8154	HERNANDO HERRERA TORRES	\$ 604.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1723	JOSE FERNANDO GOMEZ JIMENEZ	\$ 202.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2108	JORGE ELIECER GUTIERREZ OSPINA	\$ 604.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****4477	JOSE LUIS ZAPATA RINCON	\$ 990.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6557	PEDRO ANGEL CORTES GARCIA	\$ 609.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2831	NOEL SOTO	\$ 1.400.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6003	UBER ANTONIO TORRES ZAPATA	\$ 132.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0662	YESJCA TATHANA ROZO CORTES	\$ 700.000,00	Pago Exitoso	

<< Primero < Atrás | 1 de 1 | Siguiente > Último >>

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior



Construtop Ingenieria S.A.S. NIT 900.037.096-1

Nomina # 2

PERIODO DE PAGO:

NÓMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

FECHA:

MARTES 15 DE AGOSTO DE 2023

OBRA: MARQUETALIA

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	DIAS INCAPACIDAD	INGRESA SALARIO TRABAJADOR	SALARIO	SUBSIDIO TRANSPORTE	AUX RODAMIENTOS	TOTAL DEVENGADO	TOTAL SALARIO INCLUIDO HORAS EXTRAS	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI			
											PENSION	SALUD					
1 GEIMAR ANDRES MORENO	1.002.597.062	AY	15,0	0,0	\$ 1.160.000	\$ 580.000	\$ 70.303	\$ 44.918	\$ 695.221	\$ 695.221	\$ 23.200	\$ 23.200	\$ 46.400	\$ 649.000			
2 JOSE ALCIDIEZ RUIZ	75.000.498	AY	8,0	0,0	\$ 1.160.000	\$ 309.333	\$ 37.495	\$ 54.000	\$ 400.828	\$ 400.828	\$ 12.373	\$ 12.373	\$ 24.746	\$ 376.000			
3 NOEL SOTO	10.240.928	OF	15,0	0,0	\$ 1.397.500	\$ 998.750	\$ 70.303	\$ 405.838	\$ 1.474.891	\$ 1.474.891	\$ 39.950	\$ 39.950	\$ 79.900	\$ 1.475.000			
4																	
5																	
TOTAL NOMINA, MARQUETALIA										\$ 2.570.940	\$ 75.523	\$ 75.523	\$ 151.046	\$ 2.500.000			
TOTAL NOMINA, MARQUETALIA										\$ 1.868.083	\$ 178.101	\$ 155.000	\$ 2.570.940	\$ 75.523	\$ 75.523	\$ 151.046	\$ 2.456.894

ELABORO:

ANGÉLICA MARÍA GRANADA R
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

APROBO:

ALVARO CASTAÑO PINEDA
GERENTE GENE



Saldos Consolidados [Consultas y Extractos](#) > [Transacciones a Través del Portal](#)

Comprobante de Transacción

- Transacciones a Través del Portal
- Movimientos y Extractos
- Detalle de Saldos por Producto
- Chequeras
- Cheques Devueltos
- Certificaciones y Paz y Salvos
- Planes Institucionales

Descripción de la transacción:

Empresa: CONSTRUTOP INGENIERIA SAS
Usuario: ALVARO CASTANO PINEDA

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6517

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 3.342.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 15/08/2023
Hora: 18:36:57

Número de documento: 53900235

Registros 1 el 5

Victoria y Manueta Total Registros

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7984	GEIMAR ANDRÉS MORENO	\$ 649.000,00	Pago Exitoso	/
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2931	NOEL SOTO	\$ 1.475.000,00	Pago Exitoso	/
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8822	CARLOS ADRIAN ALCIDES RUIZ	\$ 376.000,00	Pago Exitoso	/
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0682	JESICA TATIANA ROZO CORTES	\$ 380.000,00	Pago Exitoso	/
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****4477	JOSE LUIS ZAPATA	\$ 462.000,00	Pago Exitoso	/

Formatos de descarga:

Líneas Empresariales
 - Bogotá 3 27 83 80
 - Bogotá 7 42 59 80
 - Desde Otras Ciudades de Colombia
 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
 - Banco DAVIVIENDA
 - Información sobre Seguridad
 - Catálogo Productos y Servicios
 - Catálogo Davipuntos
 - Educación Financiera
 - Información para Inversionistas
 - Compras Virtuales
 - Información sobre el Banco

¿QUIERE AQUÍ CAMBIAR SUS ANOMALIAS?

¡NOCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VENIR OTROS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ!

SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

¿Sabe que, el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaclopali?

¡Empieza a crear usuarios aquí!

Construtop Ingenieria S.A.S. NIT 900.097.096-1

Nomina # 3

PERIODO DE PAGO: ASISTENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

FECHA:

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	DÍAS LABORADOS	DÍAS INCAPACIDAD	INGRESA SALARIO TRABAJADOR	SALARIO	SUBSIDIO TRANSPORTE	AUX. VIVIENDA	DCTO. PRESTAMO	TOTAL DEVENGADO	HORAS EXTRAS DIURNAS	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	EXTRAS FESTIVOS	BONIFI. TOTAL	TOTAL SALARIO INCLUIDO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	RECIBI	
																PENSION	SALUD	TOTAL			
1 GEIMAR ANDRES MORENO	1.002.987.062	AY	7,0	0,0	\$ 1.160.000	\$ 270.667	\$ 32.808			\$ 303.475					\$ 303.475	\$ 10.827	\$ 10.827	\$ 21.654	\$ 282.000		
4 NOEL SOTO	10.240.928	OF	7,0	0,0	\$ 1.997.990	\$ 466.083	\$ 32.808	\$ 185.000		\$ 653.891					\$ 653.891	\$ 18.643	\$ 18.643	\$ 37.286	\$ 654.000		
TOTAL NOMINA, MARQUETALIA																\$ 957.366	\$ 29.470	\$ 29.470	\$ 58.940	\$ 938.000	
ASISTENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023																\$ 935.426				\$ 574	

ELABORO:
ANGÉLICA MARIA GRANADA R
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

APROBO:
ALVARO CASTAÑO PINEDA
GERENTE GENERAL

Alvaro Castaño Pineda
ALVARO CASTAÑO PINEDA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número		Fecha del informe	24/08/2023	Acta parcial		Acta final	X
----------------	--	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	CONTRATO DECLARATORIA DE EMERGENCIA 032 DE 24 DE JULIO DE 2023
Objeto:	REPARACION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA MARQUETALIA SALIDA A VICTORIA SECTOR MINITAS
Nombre Contratista:	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA
Fecha del contrato:	Julio 24 de 2023
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Valor inicial:	16.850.640
Fecha de iniciación:	24 DE JULIO DE 2023
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	22 DE AGOSTO DE 2023
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO

1. AVANCE DEL CONTRATO

- Avance físico

Avance físico del periodo	98.43%
Avance físico Acumulado	98.43%

- Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	0.19

- Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	30
Avance Porcentual:	100%

- Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Avance financiero

Inversión Contratada:	\$16.850.640
Inversión ejecutada en el periodo:	\$15.945.005
Porcentaje ejecutado en el periodo:	94.63%
Inversión total ejecutada:	94.63%
Porcentaje total ejecutado:	94.63%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
AMPARO	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-10104383 1	24/11/2023	07/03/2024	5.055.192
ESTABILIDAD	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-10105710 3	24/07/2023	24/08/2028	11.795.448

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
CESAR AUGUSTO CAÑÓN	X	X	X	X	X
GEIMAR ANDRES MORENO	X	X	X	X	X
JOSE JAVIER GALLEGO	X	X	X	X	X
NOEL SOTO	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A		A	A		A	A	A



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

COMPONENTE	UN	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
PRELIMINARES				
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE PLANO RECORD	MTS	24,00	20,00	83,33%
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA YUTE VERDE DE DE H 2 PARALES EN GUADUA Y CINTA PLASTICA	MTS	60,00	50,00	80,00%
EXCAVACIONES				
EXCAVACION EN ZANJA MATERIAL COMUN DE 0 A 2 M	M3	60,00	61,38	100,00%
RELLENO COMPACTOS				
RELLENOS COMPACTOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION	M3	55,00	54,72	100,00%
SUSTITUCIONES BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
AFIRMADO PARA ANDENES Y ZONAS DURAS COMPACTOS CON RANA	M3/COMP	2,00	3,42	100,00%
SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA PARA TUBERIA	M3	3,60	3,42	100,00%
ALCANTARILLADO				
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 12" PARA ALCANTARILLADO	ML	24,0	19,00	100,00%
CAMARA DE INSPECCION D=1,20 CONCRETO 21 MPA	ML	2,6	2,60	100,00%
BASE Y CAÑUELA CAMARA DE 1,20 M 3.000 PSI	UND	1,0	1,00	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ARO TAPA EN HF D= .68 M PARA CAMARA DE INSPECCION	UND	2,0	2,00	100,00%
OBRAS EN CONCRETO				
CONCRETO 21 MPA PARA ANDENES Y/O ESTRUCTURAS	M3	1,0	1,02	100,00%
ACERO DE REFUERZO FY 60.000 PSI	KG	57,00	114,00	100,00%
SOBREACARREOS				
SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3/HM	3,0	3,00	100,00%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

- EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	X		
	Negritudes	X		
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

- POBLACIÓN BENEFICIADA: 60 PERSONAS APROXIMADAMENTE.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

13-12-2023 13-12-2023 ACP ACP250 Factura electrónica 900037096 CONSTRUTOP INGEN... 890803239 EIMPOCALDAS SA ESP Aprobado con notificación Factura Electrónica \$15,945,005
