

CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES COLECTORES SECTOR PIO XII Y LOS CHORROS PSMV
RISARALDA CALDAS.

USO DE EPP



CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES COLECTORES SECTOR PIO XII Y LOS CHORROS PSMV
RISARALDA CALDAS.



Bitácora de obra

- Contrato #: N° 0209 "Continuación
construcción interceptores-colectores
sector Pioxil y los charros. PSMV
Riscalda, caldas"
- Contratista: Jemag ingeniería S.A.S.
- Valor: Cuatrocientos cincuenta y cuatro
millones setecientos veintiseis mil cua-
cientos sesenta y cuatro pesos MIL
(\$454.726.464,00)
- Residente Obra: Ing. Ricardo Otero Ríos
Ricardo Otero Ríos
- Supervisor Obra: Ing. Luis Fernando Arias

1

02-10-2019

- Personal:

1 Residente obra, 1 Maestro obra, 2 oficiales
y 1 ayudante

- Clima: mañana lluviosa - tarde soleada

- Herramientas y equipo: Herramientas menor

- Actividades: se da inicio a la actividad de rocería y limpieza con el fin de despejar la zona donde se iniciarán excavaciones para instalación de tubería.

- Observaciones: Ninguna



Ricardo Arboles

03 - 10 - 2019

- personal 8

1 residente obra, 1 maestro obra, 2 oficiales y 4 ayudantes

- Clima : soleado

- Herramientas y equipo : Herramienta menor

- Actividades : se continua con la actividad de rocería y limpieza despejando la zona donde esterío ubicadas las Recameras 65, 66 y 67 ; se hace la instalación de hiladeros para el chequeo de profundidad de los recameres según topografía y para tener el trazado de la tubería de alcantarillado.

- observaciones : se realiza recorrido de la zona a intervenir en compañía de la supervisión del contrato verificando los puntos de ubicación de los esteríos y el trazado de la tubería a instalar.

Raul Orellana

05-10-2019

- Personal

1 Residente obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 7 ayudantes

- clima soleado
- herramienta y equipo: Herramienta menor
- Actividades: se despeja tramo a intervenir con los excavadores para los recorridos y tubería, se continúa con los excavadores para los recorridos SG, SB, SA, SB y SS
- observaciones: se realiza nuevamente conteo de palos de caña que se han ido cortando para el paso paralelo se instala la tubería

Ramón Pachón

Jueves 7 de Octubre de 2019

Se realiza inspección al sitio de trabajos a la fecha el contratista ha realizado excavación manual solo de canales C67, C65, C64, C63, C60, C58, C59

8.

- Personal:

1. Residente obra, 1 maestro obra, 2 oficiales y 7 ayudantes

- Clima: soleado

- Actividades: se secundaria con la excavación para recargas, se continua con la instalación de hiladeros.

Observaciones: se realiza vigila de obra por parte de la supervisión, se llevan recomendaciones para inicio de actividades de excavación de tanques e instalación de tubería para evitar instabilidad en el terreno, se acatan las recomendaciones hechas por parte de la supervisión.

Firma: *Ricardo Pérez*

10/12/2014

9

08 - 10 - 2019

- Personal:

1. Residente obra, 1 maestro obra, 2 oficial
y 7 ayudantes.

- Clima: soleado

- Herramienta y equipo's. Herramienta menor


- Actividades: se continua ejecutando la actividad de excavación para sanza, se toman nubes para respetar la pendiente indicada entre las recomendaciones, la tanza tiene un ancho de 70cm segun las especificaciones técnicas y la recomendación hecha por el supervisor del proyecto.

- Observaciones: Nos encontramos con una tubería de acero drenaje de 12 pulgadas a la cual se le pasara por debajo con la que se instalará, se trabaja con mucha precision en el punto donde está la tubería.

Rafael Ríos

10


Registro Fotográfico 08-10-2019

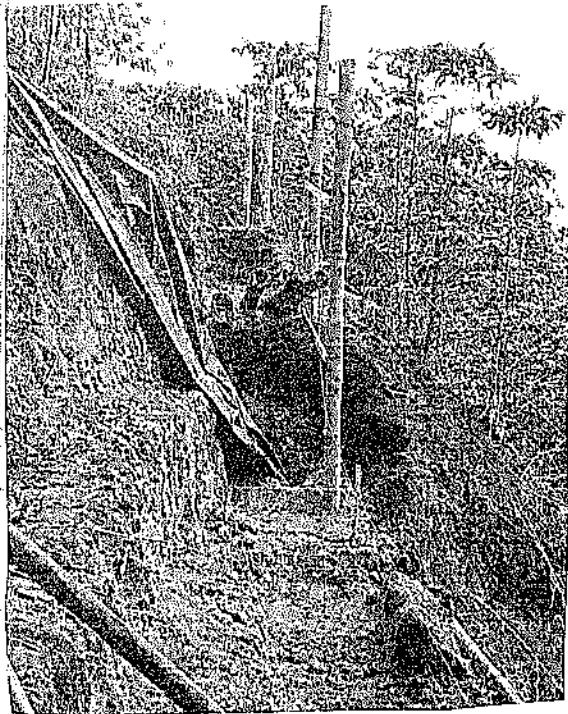

11
09-10-2019



- Personal B.
 - 1 Residente obra, 1 maestro obra, 2 Oficiales y 7 Ayudantes
 - Clima B. mañana soleada; tarde lluviosa.
 - Herramienta y Equipo B. Herramienta menor
- Actividades B. se continua con la excavación de zanjas de 70 cm para posterior instalación de tubería de 12", se hacen trinchos en guadua para evitar que el material de excavación se fregue por las lluvias.
- Observaciones B. se descargan 24 tubos novofort de 12" para ser instalados en el proyecto; alcer 4:00 PM se deben suspender actividades a causa de las fuertes lluvias que caen en el sector.

Ramón Chuban



R

Registro Fotográfico 09-10-2019

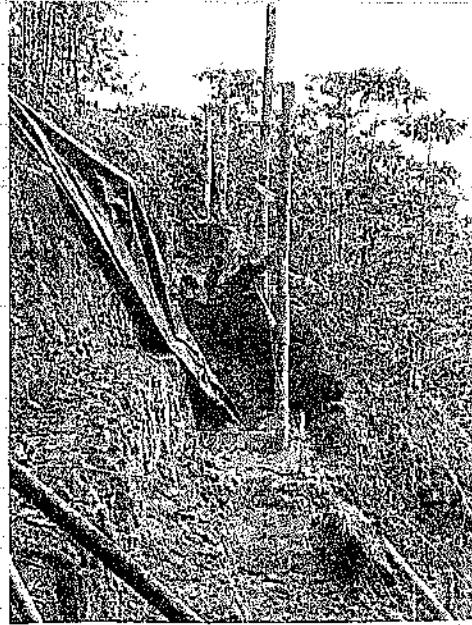

10 - 10 - 2019

- Personal &

1 residente obra, 1 maestro obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

- Clima & Nublado sin lluvias

- Herramienta y equipo & Herramienta menor

- Actividades & se continua con la construcción de anclar en grados para sostener tierra de las excavaciones para la brecha de la tubería y continua con las excavaciones para brecha de 70cm. para instalación de tubería Naufort.

- Observaciones & se descargan 24 tubos de 12"

de 6m. para instalar en el proyecto

Ramón Peral

11 - 10 - 2019

- Personal &

1 maestro obra, 1 residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

- Clima & fuertes lluvias mañana y tarde

- Herramienta y equipo & Herramienta menor

14

- Actividades s. se continua con la construcción de trinchos en suelo, se continua con excavaciones para brechas para instalación de tubería.
- Observaciones s. se suspenden actividades en horas de la mañana por fuertes lluvias durante 2 horas, en horas de la tarde la lluvia obliga la suspensión de actividades por 3 horas.

Ramón Duran

12-10-2019

PERSONAL

1 Residente obra, 1 maestro obra, 2 oficiales y 7 ayudantes

- Clima s. soleado

- Herramientas y equipo s. Herramientas menores

- Actividades s. se continua con la excavación para brechas para instalación de tubería de 12" se instala tubería entre los reembarcos 69a, 65 y 65 a 66

15

Observaciones: Ninguna

Ramón Pérez

15 - 10 - 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
2 oficiales, 7 Ayudantes.

Miercoles 23 de 2019

Se realizo inspección al sitio de trabajo
Se queda en el sitio con 1 Ing. Residente,
1 maestro, 1 oficial de obra y 7 ayudantes.
a la fecha se realizan actividades de
excavación para instalación de tubería este
camaras 55 y 60. se supervisan muy bien
preocupación por el avance de obra ya
que es lento, no se cuenta con tableros
para estibados por lo que el contratista
sea el responsable en caso de derribo.
no se autoriza excavaciones a más de
dos metros de profundidad su estibado
tipo 2, se solicita retomar actividades

16

en los sitios donde se hicieron excavaciones y oda fecha se encuentran abovedadas (comisas) entre 63 y 64) por lo que se solventa retomar actividades, se encuentran bocchas obiertas y demás o mero excavación comisas; no se reconocían claramente estos canales y tanques ya que estos estaban cubiertos por en pozamientos de agua. Debido a la operación del acueducto Regional de occidente estos canales 63 y 64; se hace necesario re replante y redimension del colector y por esto una nueva comisa. Se requiere que en el sitio copia de la seguridad Social de los trabajadores.

A los Precio los años han sido 2 maestros de obra y 3 ingenieros, el jueves 11 de octubre el día 21 de octubre.

Empacados

15-10-2019

Clima: se presentó un día sin lluvia.

Actividades: se construyó trinchos en gradas.

17

se excava brechas para la instalación de la tubería.

herramienta y equipo: herramienta menor.

~~contratista interventoría~~

Miercoles, 16 de Octubre de 2019.

personal: 1 ingeniero, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 7 Ayudantes.

clima: no se evidencian lluvias fuertes, se evidencia un dia soleado.

herramienta y equipo: herramienta menor.

ACTIVIDADES: se excavo brechas, se construyo trinches en gundua.

~~contratista interventoría~~

Jueves, 17 de octubre de 2019.

personal: 1 ingeniero, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 7 Ayudantes.

clima: no se evidencia lluvias fuertes, se evidencia un clima templada.

herramienta y equipo: herramienta menor.

ACTIVIDADES: se excavo brechas, se constu.

18

yo Trinchos en guardia.

~~Siglo XXI~~

contratista intervención

Viernes, 18 de octubre de 2019.

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra,
2 oficiales, 7 ayudantes.

clima: no se evidencian lluvias fuertes, se evidencia
un clima templado.

herramienta y equipo: herramienta menor.

Actividades: se excava brechas para instalación
de tubería, se construye Trinchos en guardia.

contratista intervención

Sábado, 19 de octubre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra,
2 oficiales, 7 ayudantes.

clima: no se evidencian lluvias fuertes, se evidencia un
clima soleado.

herramienta y equipo: herramienta menor.

Actividades: se excava brechas para instalación
de tubería, se construye Trinchos en guardia para
contener la tierra excavada de las brechas.

~~Siglo XXI~~

19

25/10/19

Personal en oficina Residen Te, Maestros, Oficial y siete ayudantes.

Se continuaron realizando excavaciones e instalación de tubería en la fecha no se ha realizado el suministro de tableros para entibado.

Monro Aguirre Constable Empacaladas

lunes, 21 de octubre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 7 ayudantes.



Clima se presentaron lluvias fuertes de

1-5 pm.

herramienta y equipo: herramienta menor.

ACTIVIDADES: se excava brechas para instalación de tubería, se construye thinkos en cuadra para contener la tierra excavada de la brecha, se verificaron niveles de terreno y de excavación, a la obra

llegó el ingeniero Leandro Benítez Gutiérrez como nuevo residente de oficina.

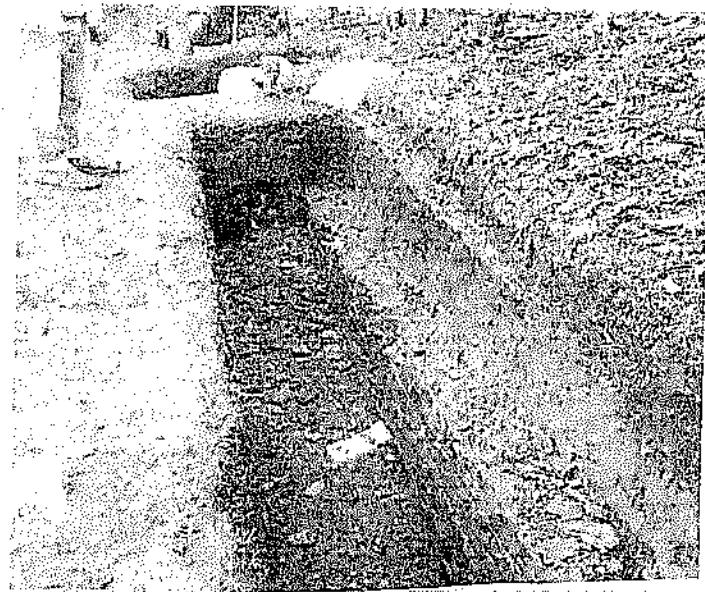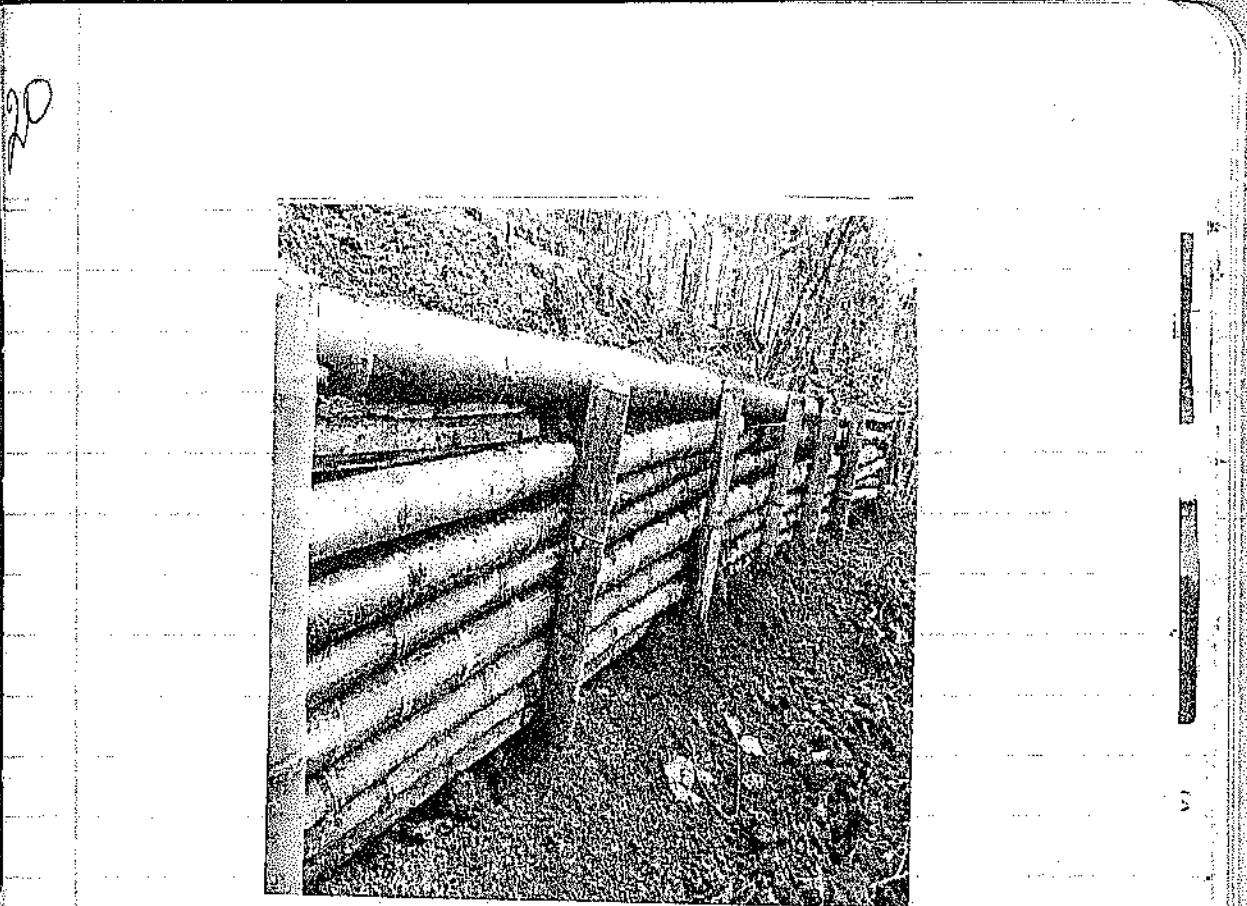

21

Martes 22 de octubre de 2019

personal: 4 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 5 ayudantes.


clima: se presentaron lluvias fuertes de 23:00-3:30 pm.


herramienta y equipo: herramienta menor.

Actividades: se excava por la vía con signo a la obra, para encontrar el tubo de acueducto y que interfiera en el trazo do del alcantarillado, se excava brechas para excavación de tubería, se construyó trinchos para sostener la tierra sacada de las brechas.



contratista interventoría



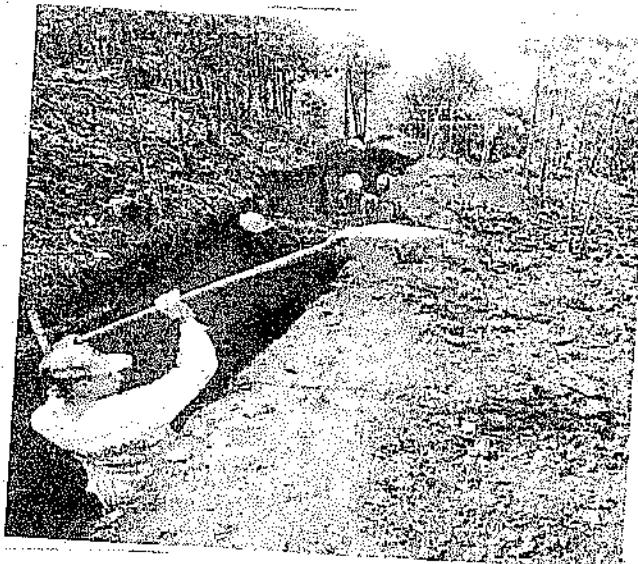

Miercoles 23 de octubre de 2019.
personalidad ingeniero residente, 1. maes no de
obra, 1. oficial, 6 ayudantes.
climas se presentaron lluvias fuertes de 3:00 -
5:00 pm

herramienta y equipo: herramienta menor.
Actividades; se excavo brechas para instalacion
de tuberia, se localizo la cota donde va la
batera del tubo, se construyo trinches en
guadua.



CONTINSA intervencion

73

Jueves, 24 de octubre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 7 Ayudantes.
clima: se presentaron lluvias fuertes en la madrugada.
herramienta y equipo: herramienta menor.
actividades: se instaló Tubería Novafor de 12" de diámetro con sus respectivos enlaces, se atraco la tubería en palma. de a, se realizaron excavaciones de tubería se instaló la tubería en las cotas mostradas en los planos, se realizaron llenos compactado con el material retirado de la excavación, se extendió el encamado en arena para la instalación de la tubería.

VIA

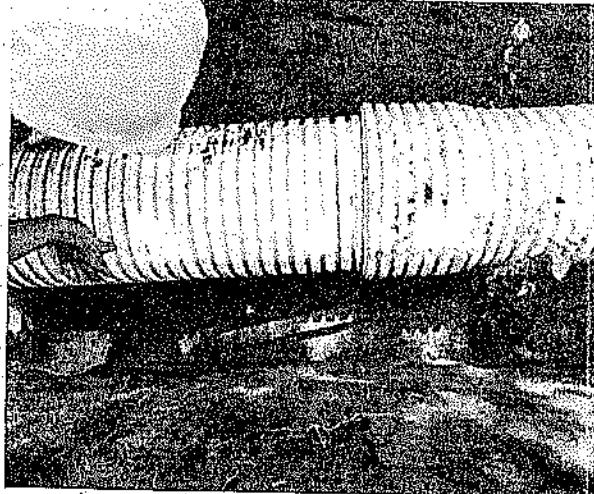

24



contratista interventoría

Viernes, 25 de octubre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 7 Ayudantes.

clima se presentaron lluvias fuertes, en la noche
dugada y de 2:30-4 pm.

Herramienta y equipo: herramienta menor.

Actividades: se extendió arena para encamado, se instaló tubería Novonor 12", se hicieron llenos con el material excavado de la brea. Con estos llenos fueron compactados, se realizó tacera para acopiar los materiales.

25

les y equipos en un jardín contiguo a la obra, se realizaron excavaciones de brechas, los tramos donde se instaló tubería fueron los tramos de las cambras de inspección 59-60 y 60-61.

~~25~~

contratista intervención



sábado 26 de octubre de 2019
personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 7 ayudantes
clima: se presentaron lluvias fuertes en la madrugada

herramienta y equipo: herramienta menor.
Actividades: se verificó pendientes de tubería entre la CI 58 y la CI 59,
se realizó excavación de brechas de tubería, se realizó el cerco del jardín cercano ^{los} materiales de acopio, se realizó llenos con material de la excavación de las brechas.

~~26~~

contratista intervención

6

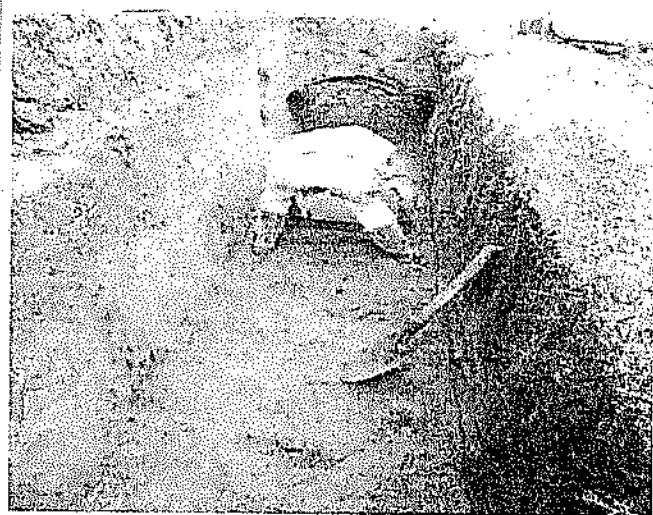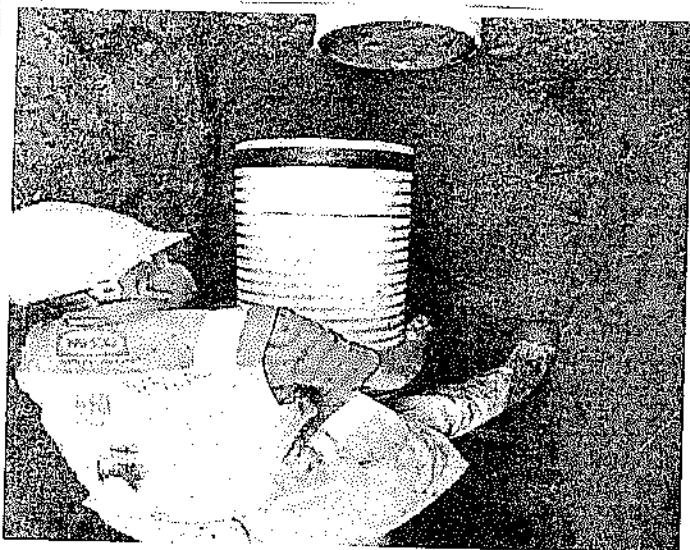

600000

2X

Jueves 28 de Octubre de 2009
Se solicita inspección del Sifón de
Fibrosojo o la fecha se cuestione con
maestro tapador y trabajadores. Mejorar
se solicita al contratista dar certeza de
los trabajos ya que a la fecha solo
ha instalado 4 tubos y al norte de
45m. esto entre conos 58, 59 y 60.
El dia de hoy se evidencia un
desmorinamiento entre conos 58 y 59
por lo que nuevamente se
solicita realizar estabilizado. No se
quieren excavaciones con profundidad de
2 metros o más sin estabilizado; el
contratista viene asumiendo el riesgo
por lo que sera el responsable de la
integridad de los trabajos.
Se solicita nuevamente rehacer excavaciones
entre conos 63 e inicio del viaducto
ya que estas excavaciones se encuentran
abandonadas (en excavaciones abiertas que
sobren de empozamiento con riesgo de

B

deslizamientos, Deposados,

sección de la carretera



Lunes 25 de octubre de 2019.

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 7 ayudantes.

clima: se presentaron lluvias fuertes en la madrugada.

herramientas y equipo: herramienta menor.

actividades: se excavó brecha entre el 58 y el 59, se protegió la brecha con estibadores, se chequeo niveles y pendientes de la tubería a instalar, se extendió encamado de arena entre la el 58 y el 59, se hicieron tirinchas en goma dura.

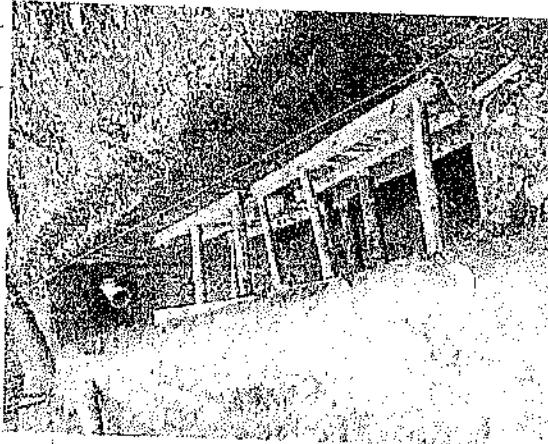

29

~~Siglo XXI~~

contratista intervención

martes 29 de octubre de 2019.


personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
y oficial, 10 ayudantes.

clima: se presentaron lluvias fuertes en la zona
frugada, estas lluvias están generando retrasos
en la obra.

herramienta y equipo: herramienta menor.

Actividades: se excava brecha entre el C.I. 58
y C.I. 59, se protegió la brecha con entibados,
se extendió arena para el encajado,
se instaló tubería en el tramo C.I. 58 y C.I.
59, se protegieron las brechas con entibados
se realizaron excavaciones entre la C.I.
63 hasta el inicio del conducto, al final
de la tarde el anclaje que sostenía un
empalme de la tubería se fracturó y des-
plazó; causando que el empalme de
la tubería contigua se despegara causan-
do un derrame de agua importante, per-
sonal de empocaldas realizó la inspeción

oculto al sitio; planteando posibles soluciones al problema; se cerro la valvula y no hubo mas afloramientos de agua.

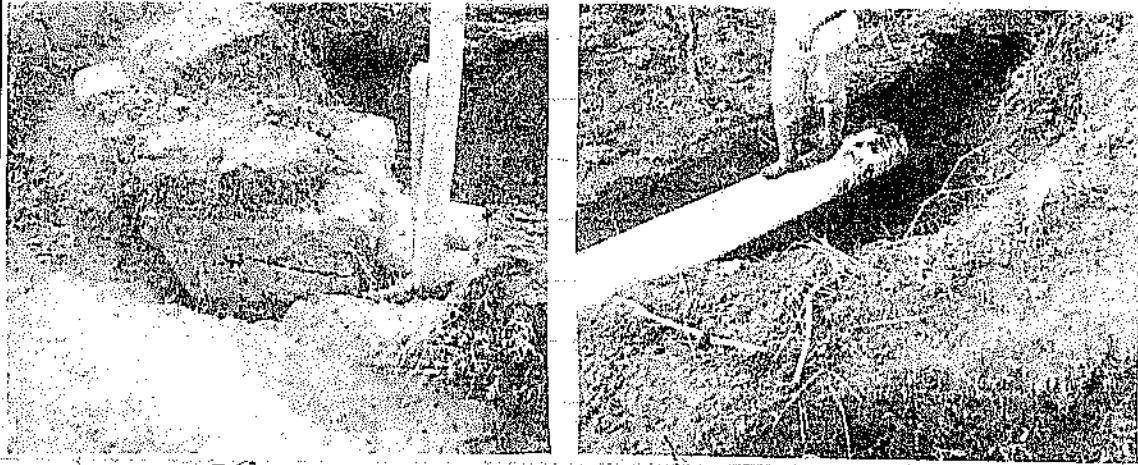

S. Díaz
CONTRATISTA

H. Gómez
INTERVENTORIA

Miercoles 30 de 2019.

Se desplaza personal de Aseminec y Municipio para reparación de la fuberia de 12" del cañerío reginal de occidente en el sector de Pizamo. El dia de ayer se presento este daño cerca a las excavaciones de la comuna 63, excavación que se encontraba abierta desde el inicio del cañerío; se procede a reparar.

31

por el personal de Empalme de S una vez reparado se debe construir un cojín en concreto reforzado al sonido en la curva vertical el cual genera la afectación.


Miercoles, 30 de octubre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 11 Ayudantes, 1 oficial.

clima: se presentaron lluvias fuertes en la m drugada.

herramienta y equipo: herramienta menor. Actividades: se extiende encamado de arena se entiba la brecha con tableros, personal nico de empalmes se desplaza al sitio para reparar el daño en la tubería con sus respectivos accesorios, se le colabora a empleados con personal para ayudar a desmontar el tubo afectado, se instala tubería entre CI 58 y CI 59, se realizan llenos con material común entre las brechas CI 58 y CI 59, se compacta el material extendido en la brecha.

37

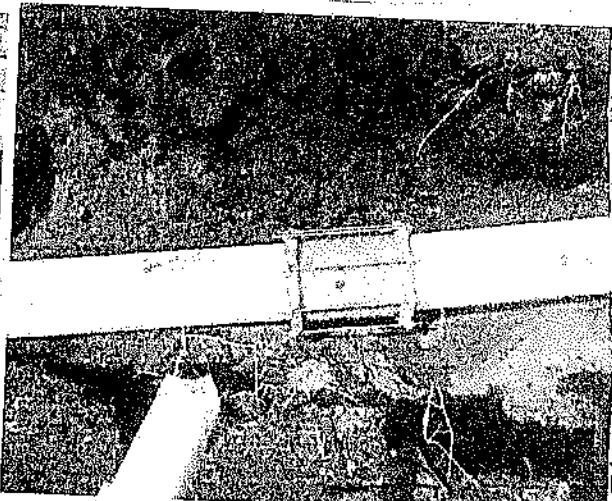

~~8:00~~
contingencia

intendencia

JUEVES, 31 de octubre de 2019
personal, ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1
oficial, 11 ayudantes.


clima: se presentaron lluvias fuertes en la madrugada.

herramienta y equipo: herramienta menor, 1
con destornillador, 1 corredor.

actividades: se recogió material petrificado exten-
dido por el agua por parte de los trabajado-
res de la obra, se excavó pilotes para anclajes,
se instaló acero para pilote, se vació pilote
con concreto acelerado en proporción 1:18:1½

37

se hicieron llenos con material de la excavación; estos llenos se realizan con la compactación requerida, se realiza el repique del material extendido por el agua.

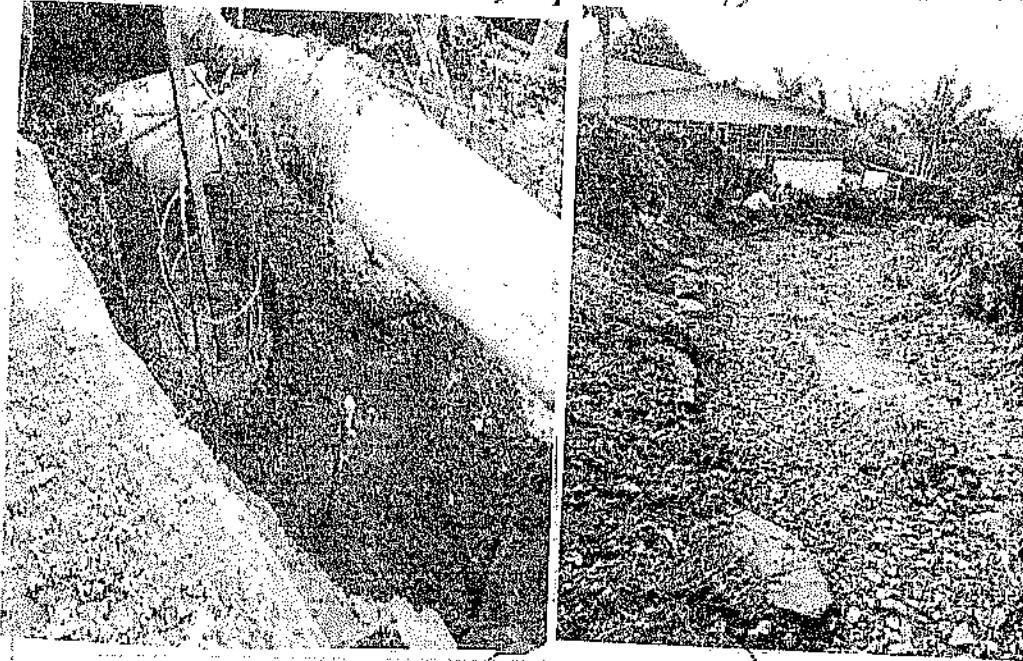

~~Contraloría~~

Interventoría

Viernes, 04 de noviembre de 2019.


personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 10 Ayudantes.

clima: se presentaron lluvias fuertes en la mañana.

34

herramienta y equipo hermano menor, J. Corrida.

Actividades: se formalizó anclaje en la zona del codo, se hicieron llenos con material de la excavación de las brechas entre C.I.58 y C.I.59, se instaló acero en el anclaje, el cual tocó soltar pde se evidenció una pequeña fuga de agua en el sector codo, esta fuga se reparó por personal técnico de Empaladas, y se tuvo que realizar las respectivas excavaciones y llenos por el personal de la obra nuevamente.

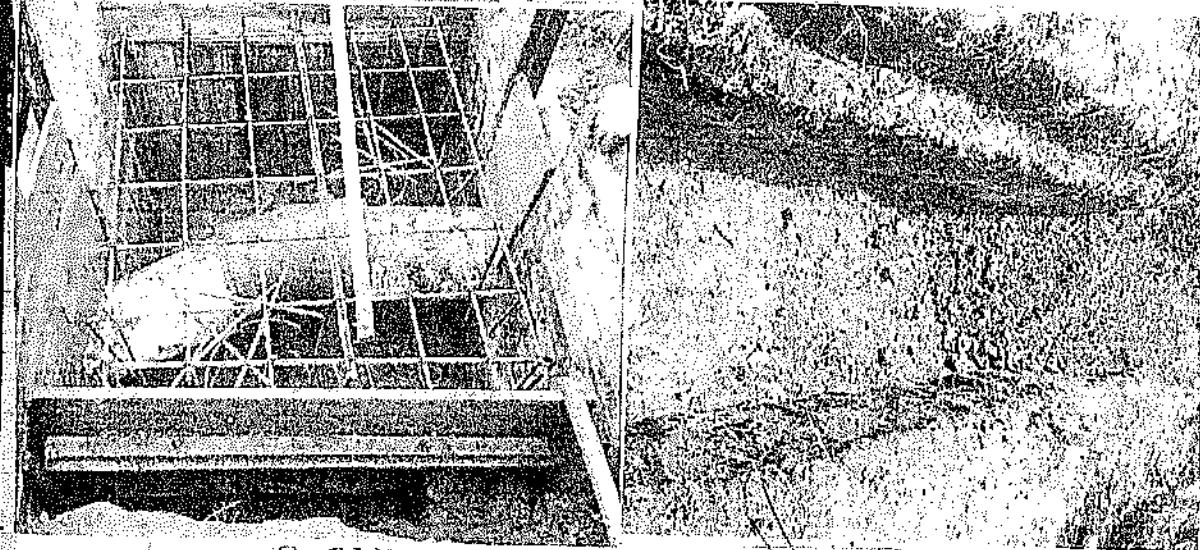

Contratista

interventoría

Sabado, 23 de noviembre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra,
1 oficial, 3 ayudantes.

clima: se presentaron lluvias fuertes en la madrugada, lo que generó retrasos en la obra, herramienta menor y equipo: herramienta menor
1 concretadora, 1 cortadora.


Actividades: se revisó el acero del anclaje, personal técnico de empocaldas visita el sitio de la obra sugiriendo un posible cambio en el trazado de la tubería de aluminio, se visitó la obra en parte del contratista y personal técnico de empocaldas observando las afectaciones que se pudieren presentar, dandole soluciones a los dueños de las viviendas y lotes contiguos, se vacró anclaje con concreto acelerado en proporción 1:2:2.

~~CONTRATISTA INTERVENCIÓN~~

Lunes, 25 de noviembre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 3 ayudantes.

36

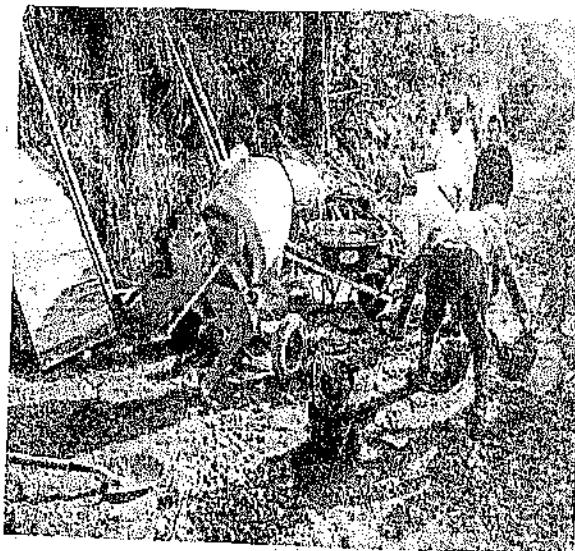


clima; se presentaron lluvias fuertes en la mañana y el fin de semana; Tal situación me está generando retrasos en la obra, herramienta menor y equipo, herramienta menor, y concretadora.

Actividades: se hicieron llenos con material del sitio en los alrededores del anclaje, estos llenos fueron compactados, se construyó trinchos en esterilla y guadua, se construye un canal en concreto para el manejo de aguas de escorrentía que llegan de la vía.

~~contralista~~ intervención

3X

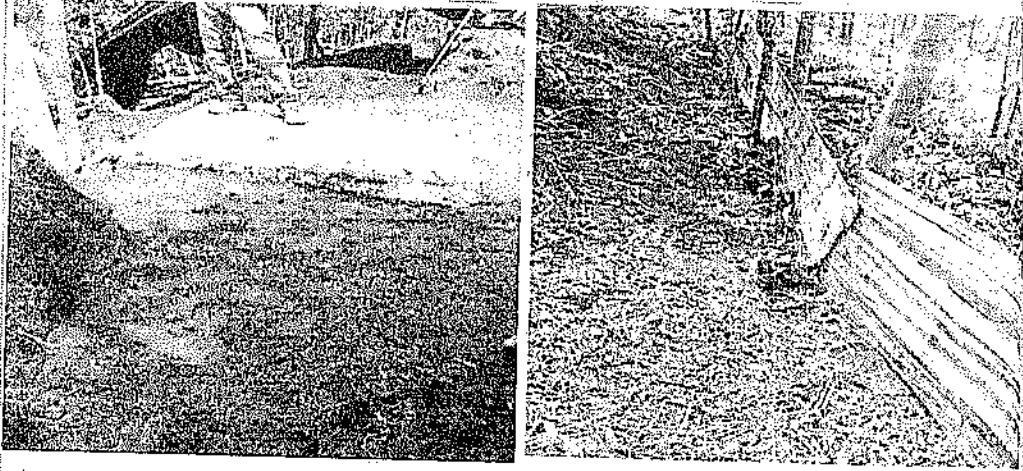

Martes, 5 de Noviembre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 10 ayudantes.

clima: se presentaron lluvias fuertes en la mañana


gorda.

herramienta y equipo: herramienta menor, 1 concreadora, formacón metálica.

actividades: se vacio C.I 60, se realizo excavación de brecha entre tramas C.I 57 y C. 58, se realizo acarreo de tierra y arena al punto de vaciado, se construyeron pilares en estrella y cuadrado.

~~contratista~~ interventoría

38

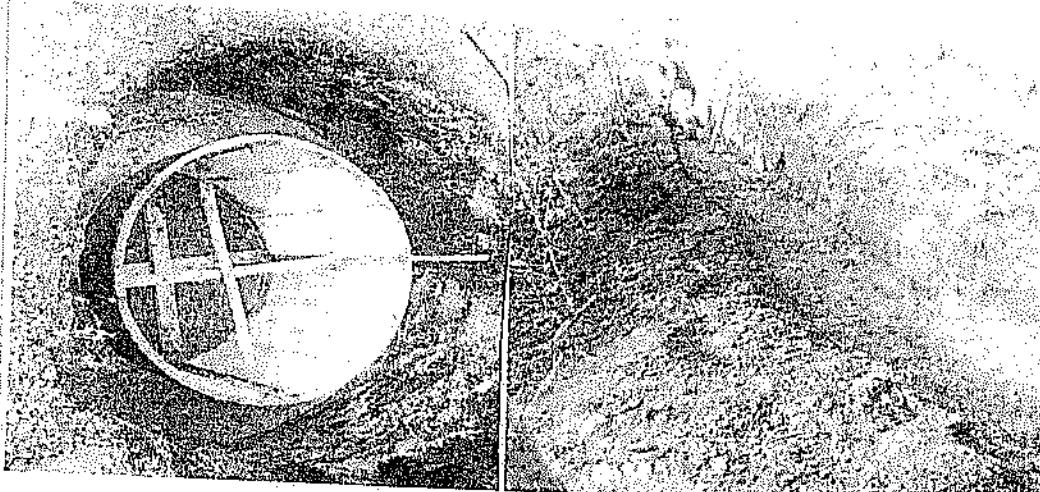

Jueves 7 de noviembre
Personal Maestro, dos oficiales,
Trece ayudantes
Continuan labores de excavacion
de zanjas para excavacion de
Tuberia. Se han vaciado dos
camaras. Se ha estado utilizando
grasa para untar la Tuberia.
Se debe utilizar lubricante pavco
o Mafco conocido.

Alfonso Aguirre
Contratista Empacadora

29

Jueves 8 de noviembre 2019

Se realiza inspección al sector de trabajo, se realiza prueba el tramo de entre comuna 61 y Comuna 64 intersección Vía; este reemplazo debe ser fijado en naves e inlados para apabullar entre comunas
Se ha mencionado nuevo al encargado regional de Obras por lo que se debe entregar medidas para no afectar su funcionamiento, el contratista realizó actividades de instalación de fibra entre comunas 61 y Comuna 50, a la fecha el contratista no ha呈eñado la volva oclusiva a la obra y a la fecha van 45% en tiempo de obra ya que esto no se reconoce pago si no se instala el próximo martes 12 de noviembre o sea jueves en cuenta proporcional al tiempo de instalación. Para protección de fibra.

(P)

entre comarcas 56 y 57 y entre
comarcas 55, 56 se debe
constituir muchos en gradua que
garantien al menos 30 días de
cobertura de lluvia.

temporales

miércoles, 6 de noviembre de 2019
personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de
obra, 2 oficiales, 11 ayudantes
clima: se presentaron lluvias fuertes en la
mañana temprano.

herramienta y equipo: herramienta menor, 1
concretadora, formalete metalico.

Actividades: se instaló encamado de arena y
tubería de 12", se realizaron excavaciones
en brecha, se formó lecho cono de camata,
se vino sobre de camata de alcantarillado



contratista interventoría

Jueves, 7 de noviembre de 2019
personal: 1 ingeniero, 1 maestro, 2 oficiales,
12 ayudantes.

24

clima se presentaron lluvias fuertes en la maz
dragón.

Actividades: se realizaron excavaciones para
instalación de tubería, se inicio corte de can
ta, se formó el cuerpo de camata.

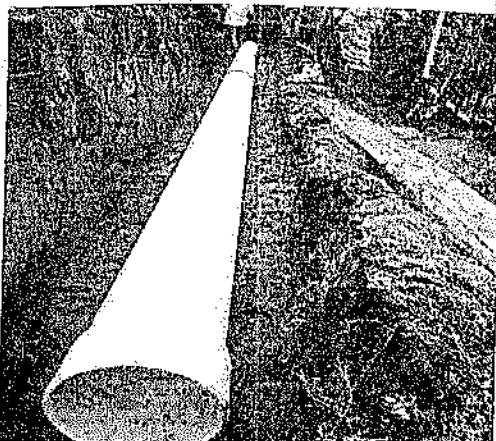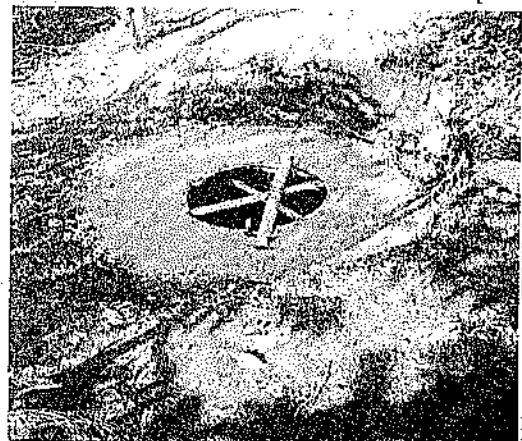

~~Selma~~ ~~X~~
contralista intervención

Viernes, 22 de noviembre de 2019


personal: 1 ingeniero residente 1 maestro de ob
2 obradores, 13 Ayudantes.


clima se presentaron lluvias fuertes en la ma
gada lo que impide el normal desarrollo de las
obras de la obra.

Actividades: se realizan excavaciones para
corte de can.

42

Instalación de Tubería, se realizaron entibados a los biecas excavadas, se empalmaron las tuberías con lubricante berfor, se formó el tubo de camión de alcantarillado, se extendió en camado de arena y se instaló tubería de 12", llegaron al sitio de los obra 30 tubos de 12" en el trazado del alcantarillado se encuentra de nuevo el tubo regional de acueducto lo cual hace necesario profundizar las excavaciones. Se constituyeron thinkos en vadún.

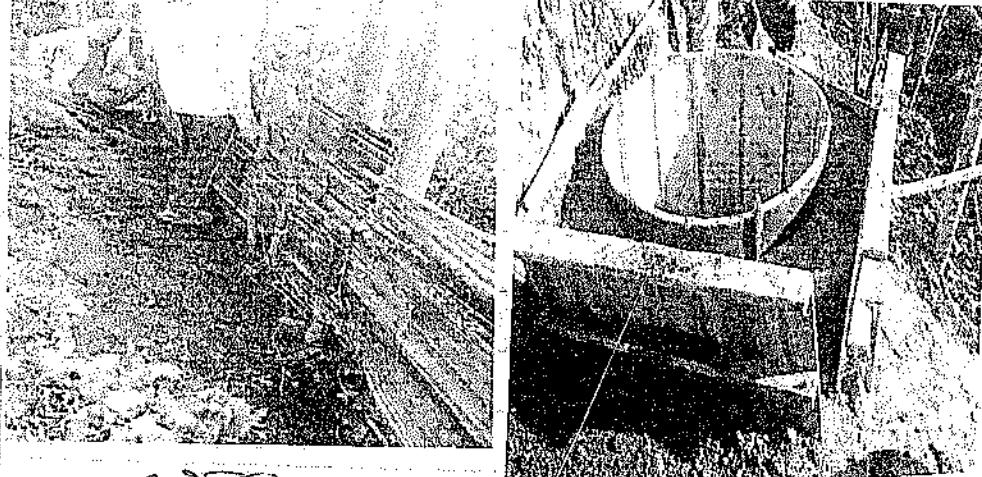

 
contratista intervención
cabado, 9 de noviembre de 2019.
personal; 1 ingeniero residente, 1 maestro ole,

213

2 Oficiales, 12 Ayudantes.

Clima: se presentó un dia sin lluvia
bombardeo y equipo: herramienta menor, 1
concretadora, formaleta metálica,

Actividades: se excavo brechas para instalar
tubería, se entubo brechas excavadas, se rell
garon llenos compactados con material de
la excavación, se construyeron pinchos en
grava, se extendió arena para encamado y se
instala tubería, se construyen pinchos en
grava para que la tubería no quede en la
tierra superficialmente,



contramisra



interrvensión

2124

Martes 12 de noviembre de 2019.

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 14 Ayudantes

clima se presentaron lluvias fuertes en la madrugada, de 7-9:30 am de 1:45-3:30 pm, de 4:5pm estas lluvias estan dificultando el normal desarrollo de las actividades.

herramienta y equipo; formateca metalica, actividades; se realizaron excavaciones de los caminos de inspección, se realizaron excavaciones en zanja, se formateo y se inicio camino de inspección, se construyeron trinches en profundura, se construyeron bacheos.

~~contratista intervencionista~~

Miercoles, 13 de Noviembre de 2019,


personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 15 Ayudantes.

clima se presentaron lluvias fuertes en la madrugada, de 7-11 am y de 2-4 pm.

herramienta y equipo; formateca metalica, y concretadora, herramienta menor.

245

Actividades: se realizan excavaciones en zona, se extiende encamado de arena, se instala tubería de 12", se marca base de camata de inspección, se marca verpo de camata de inspección se constituyen trinchos en que

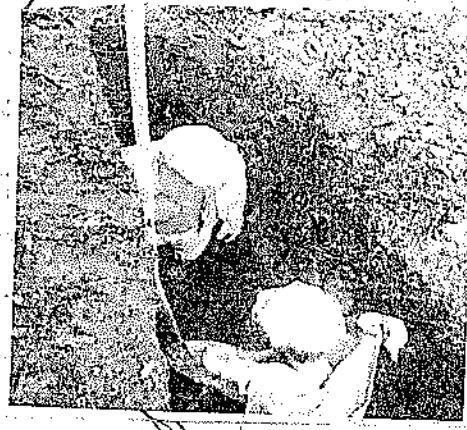

contrapista

interventoria

jueves, 14 de noviembre de 2019

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 4 ayudantes.

clima: se presentaron lluvias fuertes en la mañana.

herramienta y equipo: formateja metálica, y concretadora, herramienta menor.

Actividades: se realizan excavaciones en

116

Zona, se realizo excavación de cámara de inspección, se instaló tubería de 12", se realizaron excavaciones en zona en los bordes de la vía para mejorar el drenaje del agua en la vía, se extendió encamado de arena.

~~8:00~~

contratista interventor

viernes, 15 de noviembre de 2019
personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 15 ayudantes.



clima: se presentaron lluvias fuertes en la madrugada y en horas de la noche este fenómeno natural a retrasado las actividades de obra.

herramienta y equipo: formaleta metálica, 1 concreadora, herramienta menor.

actividades: se realizaron excavaciones en zona, se realizó excavación de cámara de inspección, se construyeron entubados, se formó la cámara de inspección, se extendió arena para encamado y se instaló tubería de 12", se hicieron

217

Lemos compactados con el material de la excavación.

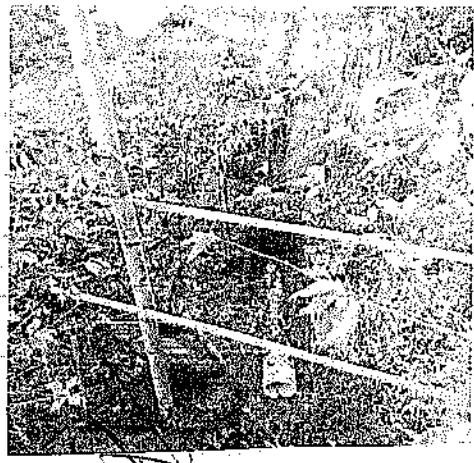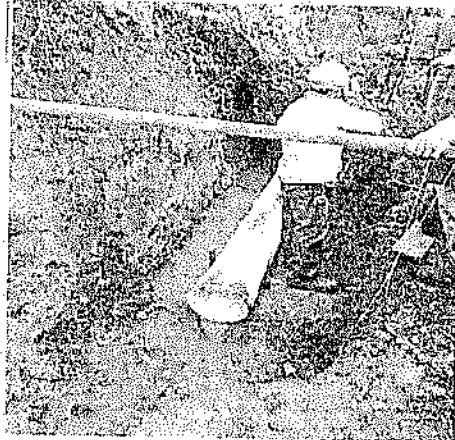

~~8/8/08~~
continúa intervención.

Sabado, 16 de Noviembre de 2008

personal 11 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 4 ayudantes,

clima: se presentaron lluvias fuertes en la madrugada.


equipamiento y equipos: formateja metálica, 1 concretadora, herramienta menor.

Actividades: si se realizan excavaciones en Zanja, se hicieron lemos compactados con material de la excavación, se

construyeron trinches en gavuña, se

48

entibaron brechas donde se realizaron fosas, excavaciones, se formo lecho y se unio el cuerpo de la camata, se construyeron trinchos y se continuo el llenado de los zanjas.

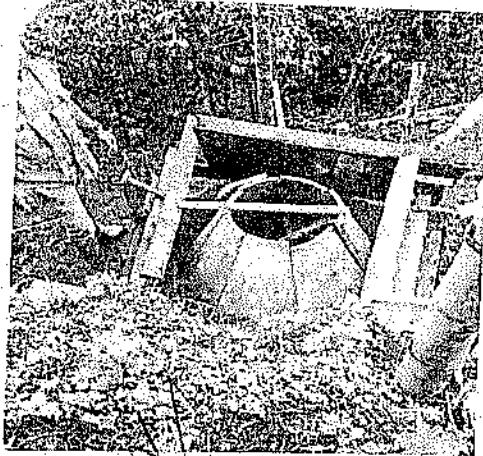

~~CONTINUA~~ INTERVENTORIA.

Lunes, 13 de noviembre de 2014

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 9 ayudantes.

clima: se presentaron lluvias fuertes en horas de la noche.

maquinaria y equipo: herramienta menor.

actividades: se realizaron excavaciones en Zan. J^a, se comenzó a excavar y replantear el río que pasa por la vía, se hicieron llenos

219

Miercoles, 20 de noviembre de 2019

Se realiza Supervision por parte de Empocaldas, el contratista a la fecha realiza actividades de excavacion e instalacion de tuberia entre canales C61 y C62, entre C62 y C63 en este momento se encuentra interviniendo el cruce por la vía verde (el), se solicita hacer entrega del acta de socalizaciones a la comuna, a la fecha no se han iniciado actividades de instalacion de vía verde acorde a diseño aprobado por Empocaldas S.A; se realiza toma de medidas de forma conjunta con el maestro de obra, se debe mejorar los o mejo el uso de los elementos de protección personal, (personas, material).

Con material comun, se extiende en camas de arena y se instala tuberia de 12" mallas, 19 de noviembre de 2019
personalia ingeniero residente y maestro de obra, 1 oficial, 93 ayudantes,

50

dimas se presentaron lluvias fuertes en la madrugada, de 1:30 a 12:00 m y de 2:30-3:30 estns. Lluvias impiden el normal desarrollo de la obr. Actividades: se realizo replanteo en el tramo que pasa por la vía, se realizan llenos compactados con material de la excavación; se extiende encamado de arena en el fondo de la zanja y se instala tubería de 42", se construyen entibados en las zanjas, se realizan excavaciones en zanja en un tramo de la vía.



~~Contraloría~~

interventoría

miércoles, 29 de noviembre de 2017

personal: 1 ingeniero residente, 1 mestizo de

5)

obra, 1 oficial, 14 Ayudantes.

clima; se presentó un dia seco.

herramienta y equipo: 4 concretadora, herramienta menor.

Actividades; se hicieron llenos con maletas de la excavación, se construyeron estibados en las zanjas, se realizó excavación en zanja, se desmoronó la pared de la zanja pero gracias a los estibados no generaron inconvenientes a la integridad de los trabajadores.

~~contratista intervención.~~

Jueves, 21 de Noviembre de 2019.

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 14 Ayudantes.


clima; se presentó un dia seco.

herramienta y equipo: herramienta menor, fiambrera metálica, 1 concretadora.

Actividades; se extendió encamado destrona, se instaló tubería de 42", se torció JETTO y se vació cuerpo de camisa de

52

Inspección, se realizó material de excavación.
Tipo concreto lomerendo con dimensiones de piedra
de 20, 30 y 40 cm; dicho material se encuentra
tm entre las c̄s 63 y 64.

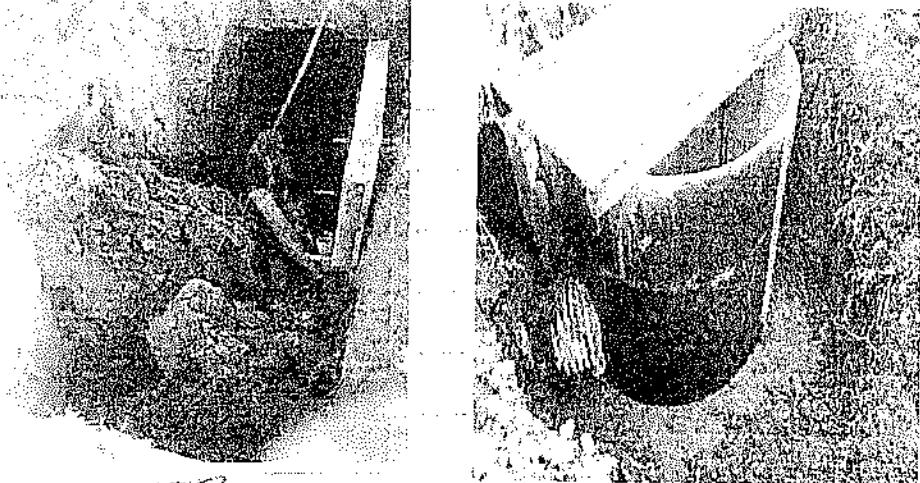

contratista intervención.

viernes, 22 de noviembre de 2019.

personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de
obra, 1 oficial, 12 Ayudantes.

Observación: se presentó un dia sin lluvia.

herramienta y equipo: bencamisa, casco,
formatela metálica, 1 concretadora.

actividades: se vaciaron cuerpos de contra-
de inspección, se extendió encajado de

57

arena para tubería y se instaló tubo
de 12", se excava cámara de inspec-
ción, se retira piedra conglomerada de
la zona del tramo que pasa por la lin-
se vacío cono de camatas de inspección

~~Contratista~~

interventoría

viernes, 23 de noviembre de 2019

personal: 1 maestro de obra, 1 oficinal, 4
Ayudantes.


Clima: se presentó un día sin lluvia.
herramienta y equipo: herramienta menor,
1 concreto, ladrillo, formaleta metálica.

Actividades: se formó el tío, se vacío
cono de cámara de alcantarillado, se hicieron
llenazos compactados con material de
la excavación, se drenó agua provin-
te de la cuneta para no afectar el talud
se excava para cámara de inspección

~~Contratista~~

interventoría

54

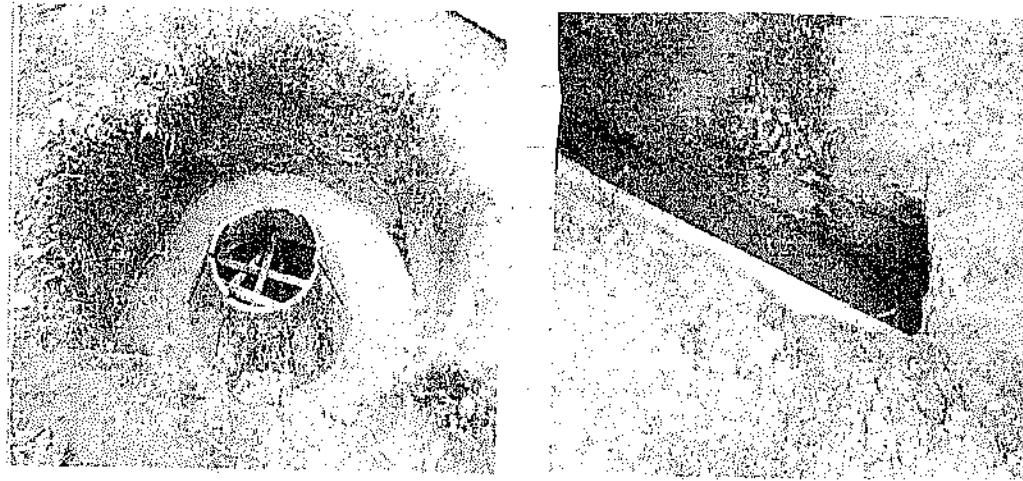

November 26 of 2019.

Se recubren inspección al sitio de trabajo
se recubren fotos de mediciones de fondo
conjunto con el Ing. Res. Jefe de Obra,
se continua con actividades de excavación
este cavaos 62 y 64. Se solicita q/
contratista da: puntos o varas de los
comarcas que están a un costado de la
vía. A la fecha el contratista no ha
instado la valla informativa de la
obra, estás se cancelan proporcionar
al tiempo de duración de la Obra.

~~Empero~~ ddas. 5.

65

Nov 29 2019
Personal) en obra Maestro, residente
un oficial y 14 ayudantes.
Se continua el proceso de
excavación entre camara 64 y 65
Se encuentra la tubería intacta
hasta la cámara 64.

Aldo Aguirre F.
Contraloría Interventoría.

Dic 4 2019
Personal: Maestro de obra, residente
de obra, 2 oficiales y 10
ayudantes
El personal se encuentra realizando
movimiento de tierras correspondiente
a un deslizamiento ocurrido el
día viernes 29/10/19, junto a
la vía, justo al lado de la
cámara 64, producto del
colapso del talud con altas pendientes

56

y un material suelto y algo contenido
de materia orgánica.

Además continúan el proceso de
excavación entre camaras 48 y 49,
así como la construcción de cañuelas
en algunas de las cámaras ya
vacíadas.

En la cámara 62 se continua en
colección de agua de 30 cm. para
mitigar la cadera presente.

Mario Aguirre F.

Contraloría Interventoria.

Diciembre 4/2019.

Se realiza inspección al sitio; se
evidencia un nuevo deslizamiento este f9
cara 64 y Cara 65. Desde el
centro de obra el controlador fue
excavando abiertos sin intervenir

entre camara 40 y Cama 64. Este
ha hecho caer una a la otra
de forma prioritaria este fono; ya que
se podrían presentar o activar procesos

57

de mesfobilia de terreno o
desvenciones, tambien tiene exponencial
de cavernas abiertas sin realizar
recorridos, teniendo como los mas criticos
la camera 63 y camera 62.

Situacion que genera riesgo por
deslizamientos ya que estas si se pone
el equipamiento de aguas; quedandose
solicta el contratista reponer o
continuar con las actividades entre
camara 40 y 62. Se regresa el
permiso de explotacion del que dura ya
que el contratista viene realizando
la explotacion de un quiebel (calle q
la obra) ~~(empacado)~~

Lunes 25 de noviembre de 2019
personal: 1 ingeniero residente, 1 mues
tro de obra, 1 eticoal, 11 ayudantes.
climis se presento un dia sin lluvia.
herramienta y equipo: herramienta me
tromateca metalica

Actividades: el contratista de la estructura metálica hizo reconocimiento de campo en los puntos donde va apoyada la estructura metálica. Tipe cercha, se realizaron actividades de descapote, limpieza y nivelación en los puntos que va apoyada la estructura metálica, se formó el cuerpo de camita de inspección, se construyeron trinchos en guardia, se hicieron lodos compactados en 192m. da de la vía.

~~S.D.P~~
Contralista Interventoría

Martes 26 de noviembre de 2019

Personal: 1 ingeniero residente, 1 Maestro de Obra, 2 oficiales, 11 Ayudantes

clima: se presentó un día sin lluvia.

herramienta y equipo:

CONTRATISTA:	2	JEMAG INGENIERIA SAS, NIT: 901.042.344-7
OBJETO:		CONTINUACION CONSTRUCCION INTERCEPTORES - COLECTORES SECTOR PIO XII Y LOS CHORROS PBMV RISARALDA, CALDAS.
CONTRATO:		209
PERIODO:		16 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	No. DIAS DE VENGADO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBIDA CONFORMIDAD
1	GUSTAVO CALLE VALENCIA	MAESTRO	\$1.500.000	15	\$750.000	\$48.516	\$498.984	\$60.000	\$1.238.500 ¹	Quispe - 21/10/15
2	CARLOS ARTURO HENAO NAVAROS	OFICIAL	\$828.116	10	\$228.039	\$32.344	\$41.503	\$22.084	\$428.200 ²	X (Carlos Henao)
3	ANDRES ESTIVEN ACEVEDO	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$0	\$33.124	\$429.450 ³	Andres Estiven Acevedo
4	FELIPE ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$0	\$33.124	\$429.450 ⁴	X Felipe de Antonio Vargas
5	LUIS FERNANDO ARIAS GONZALEZ	AYUDANTE	\$828.116	14	\$386.454	\$45.282	\$0	\$30.916	\$400.850 ⁵	X Luis Fernando Arias G
6	SEBASTIAN ESPINOZA GOMEZ	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$0	\$33.124	\$429.450 ⁶	X Sebastian Espinoza G
7	JUAN CAMILO CASTAÑEDA BERMUDEZ	AYUDANTE	\$828.116	9	\$248.435	\$29.110	\$0	\$19.874	\$257.672 ⁷	X Juan Camilo Castaneda
8	CARLOS MAURICIO ECHEVERRY	AYUDANTE	\$828.116	1	\$27.504	\$3.234	\$0	\$2.208	\$24.650	
9	WILMAR OBANDO ERAZO	AYUDANTE	\$828.116	12	\$331.246	\$38.813	\$0	\$26.500	\$345.600 ⁸	X Wilmar Obando Erazo
10	JUAN DAVID VILLADA HOYOS	AYUDANTE	\$828.116	13	\$358.350	\$42.047	\$0	\$28.708	\$372.200 ⁹	X Juan David Villada Hoyos
11	CARLOS MARIO OSSA GONZALEZ	AYUDANTE	\$828.116	3	\$82.812	\$9.703	\$0	\$6.624	\$85.900 ¹⁰	X Carlos Mario Ossa G
12	OSCAR DAVID IBARRA ORTIZ	AYUDANTE	\$828.116	2	\$55.208	\$6.469	\$28.000	\$4.416	\$65.300 ¹¹	X Oscar David Ibarra Ortiz
13	DIEGO FERNANDO AMAYA FERNANDEZ	AYUDANTE	\$828.116	2	\$55.208	\$6.469	\$28.000	\$4.416	\$65.300 ¹²	X Diego Fernando Amaya
14	GILBERTO DE JESUS ARIAS	AYUDANTE	\$828.116	2	\$55.208	\$6.469	\$28.000	\$4.416	\$65.300 ¹³	X Gilberto De Jesus Arias
										TOTAL \$ 4.698.822

CANCELADO

CONTRATISTA:				JEMAG INGENIERIA SASI NIT: 901,042,344-7				
1 OBJETO:				CONTINUACION CONSTRUCCION INTERCEPTORES - COLECTORES SECTOR FIO XII Y LOS CHORROS PSMV RISARALDA, CALDAS.				
CONTRATO:				209				
PERIODO				1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019				
código	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	No. DIAS DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
1	JOSE RAUL HERNANDEZ	MAESTRO	\$1,380,000	15	\$48.516	\$459,984	\$55,200	\$1,143,300
2	ARCADIO MERCHAN	OFICIAL	\$628,116	15	\$414,058	\$48.516	\$220,560	\$650,000
3	JUAN PABLO SUAREZ	OFICIAL	\$628,116	15	\$414,058	\$48.516	\$220,550	\$651,400
4	ANDRES ESTIVÉN ACEVEDO	AYUDANTE	\$628,116	13	\$358,850	\$42,047	\$0	\$28,708
5	CARLOS MARIO OSSA GONZALES	AYUDANTE	\$628,116	12	\$331,246	\$38,813	\$0	\$26,550
6	FELIPE ANTONIO VARGAS	AYUDANTE	\$628,116	15	\$414,058	\$48.516	\$0	\$33,124
7	LUIS FERNANDO ARIAS	AYUDANTE	\$628,116	14	\$388,454	\$45,282	\$0	\$30,916
8	SEBASTIAN ESPINOSA	AYUDANTE	\$628,116	14	\$386,454	\$45,282	\$0	\$40,860
9	SANTIAGO OSSA GARCIA	AYUDANTE	\$628,116	12	\$331,246	\$38,813	\$0	\$26,550
10	JUAN CAMILO CASTAÑEDA BERMUDEZ	AYUDANTE	\$628,116	13	\$358,850	\$42,047	\$0	\$28,708
TOTAL								\$ 166,050

CANCELADO

3	CONTRATISTA:	
	OBJETO:	
	CONTRATO:	CONTINUACION CONSTRUCCION INTERCEPTORES - COLECTORES SECTOR PIO XII Y LOS CHORROS PSMV RISARALDA, CALDAS.
	PERIODO:	209

JEMAG INGENIERIA SAS; NIT: 901.042.344-7

CONTRATO:

PERIODO:

1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBO CONFORMIDAD
1	GUSTAVO CALLE VALENCIA	MAESTRO	\$1.500.000	15	\$750.000	\$48.516	\$489.984	\$80.000	\$1.235.500	X Gustavo Calle
2	CARLOS ARTURO HENAO NAVARROS	OFICIAL	\$628.116	15	\$414.058	\$48.516	\$276.030	\$33.124	\$705.500	X Carlos Arturo Henao
3	JAVIER ALONSO SALINAS	OFICIAL	\$828.116	10	\$276.039	\$32.344	\$147.034	\$22.084	\$433.350	X Javier Alonso Salinas
4	ANDRES ESTHEN ACEVEDO	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$36.228	\$33.124	\$465.700	X Andres Esthen Acevedo
5	FELIPE ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ	AYUDANTE	\$828.116	8	\$220.831	\$25.875	\$3.450	\$17.666	\$222.500	X Felipe Vargas
6	LUIS FERNANDO ARIAS GONZALEZ	AYUDANTE	\$828.116	14	\$306.454	\$48.516	\$36.228	\$30.918	\$437.050	X Luis Fernando Arias
7	SEBASTIAN ESPINOZA GOMEZ	AYUDANTE	\$828.116	14	\$300.454	\$48.516	\$36.228	\$30.918	\$437.050	X Sebastian Espinoza Gomez
8	WILMAR OBANDO ERAZO	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$36.228	\$30.918	\$437.050	X Wilmar Obando Erazo
9	JUAN DAVID VILLADA HOYOS	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$36.228	\$33.124	\$425.450	X Juan David Villada Hoyos
10	OSCAR DAVID IBARRA CORTIZ	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$36.228	\$33.124	\$465.700	X Oscar David Ibarra Cortiz
11	DIEGO FERNANDO AMAYA FERNANDEZ	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$36.228	\$33.124	\$465.700	X Diego Fernando Amaya Fernandez
12	GILBERTO DE JESUS ARRIAS	AYUDANTE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	\$36.228	\$33.124	\$428.450	X Gilberto De Jesus Arrias
13	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	AYUDANTE	\$828.116	14	\$308.454	\$48.516	\$36.228	\$33.124	\$429.450	X Jose Alejandro Rodriguez Gomez
14	JUAN PABLO MONTOYA PEREZ	AYUDANTE	\$828.117	10	\$276.039	\$32.344	\$0	\$30.918	\$400.050	X Juan Pablo Montoya Perez
15	JUAN DAVID MONTOYA VILLADA	AYUDANTE	\$828.116	8	\$220.831	\$25.875	\$0	\$17.666	\$286.300	X Juan David Montoya Villada
16	JHON FREDDY RENDON OSPIRA	AYUDANTE	\$828.119	9	\$248.436	\$29.110	\$0	\$19.874	\$237.700	X Jhon Freddy Rendon Ospira
17	JOSE FERNANDO MONTOYA VILLADA	AYUDANTE	\$828.120	3	\$82.012	\$8.703	\$0	\$6.624	\$85.880	X Jose Fernando Montoya Villada
18	KEVIN DAVID GUAPACHA VARGAS	AYUDANTE	\$828.121	4	\$104.148	\$12.838	\$0	\$8.834	\$114.550	X Kevin David Guapacha Vargas
19	DUAN SANTIAGO ZAPATA LEDESMA	AYUDANTE	\$828.122	3	\$82.812	\$8.703	\$0	\$6.624	\$85.880	X Duan Santiago Zapata Ledesma
										TOTAL \$ 7.659.550

CANCELADO

CONTRATISTA:	
Objeto:	
Nº CONTRATO:	
Período	

JEMAG INGENIERIA SAS, NIT: 901.042.344-7

CONTINUACION CONSTRUCCION INTERCEPTORES - COLECTORES SECTOR PTO XII Y LOS CHORROS-PSMAY RISARALDA, CALDAS.

4

209

16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	NO. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBIDA CONFORMIDAD
1	GUSTAVO CALLE VALENCIA	MAESTRO	\$1.500.000	15	\$750.000	\$48.516	\$48.516	\$60.000	\$1.238.500	<i>✓ G. Calle Valencia 0217.6966</i>
2	CARLOS ARTURO HENAO NAVARRO	OFICIAL	\$626.116	15	\$14.056	\$46.516	\$276.036	\$33.124	\$705.500	<i>✓ Carlos S. Henao 0217.6966</i>
3	LUIS FERNANDO BUENO TORO	OFICIAL	\$628.116	5	\$138.019	\$16.172	\$92.010	\$11.042	\$235.200	<i>✓ Luis Fernando B. 040.307</i>
4	ANDRES ESTIVEN ACEVEDO	AYUDANTE	\$328.116	15	\$14.056	\$48.516	\$0	\$35.124	\$429.450	<i>✓ Andres Estiven 1.059.787.330</i>
5	LUIS FERNANDO ARIAS GONZALEZ	AYUDANTE	\$328.116	12	\$331.245	\$36.813	\$0	\$20.500	\$343.600	<i>✓ Luis A. Arias 1.059.784.785</i>
6	WILMAR ORLANDO ERAZO	AYUDANTE	\$328.116	13.5	\$372.552	\$43.554	\$0	\$29.812	\$368.550	<i>✓ Wilmar Orlando E. 1.004.773.881</i>
7	JUAN DAVID VILLADA HOYOS	AYUDANTE	\$328.116	13	\$358.380	\$42.047	\$0	\$28.708	\$372.200	<i>✓ Juan David V. 1.059.786.721</i>
8	OSCAR DAVID BARRA ORTIZ	AYUDANTE	\$328.116	15	\$414.056	\$48.516	\$0	\$33.124	\$428.450	<i>✓ Oscar David B. 1.059.788.855</i>
9	DIEGO FERNANDO AMAYA FERNANDEZ	AYUDANTE	\$328.116	13	\$359.880	\$42.047	\$0	\$28.708	\$372.200	<i>✓ Diego Amaya D. 1.061.048.307</i>
10	GILBERTO DE JESUS ARAS	AYUDANTE	\$328.116	15	\$414.056	\$48.516	\$0	\$33.124	\$429.450	<i>✓ Gilberto Aras 9.922.059</i>
11	JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	AYUDANTE	\$328.116	14	\$386.484	\$45.282	\$0	\$30.918	\$400.800	<i>✓ Jose Rodriguez J. 1.193.516.594</i>
12	JUAN FABIO MONTOYA PEREZ	AYUDANTE	\$328.116	14	\$386.484	\$45.282	\$0	\$30.918	\$400.800	<i>✓ Juan Montoya P. 1.053.824.437</i>
13	JUAN DAVID MONTOYA VILLADA	AYUDANTE	\$328.116	10	\$276.039	\$22.344	\$0	\$22.084	\$288.300	<i>✓ Juan David M. 1.059.784.983</i>
14	JOSE FERNANDO MONTOYA VILLADA	AYUDANTE	\$328.116	10.5	\$288.841	\$33.961	\$0	\$23.180	\$300.650	<i>✓ Jose Montoya V. 1.002.856.524</i>
15	KEVIN DAVID GUAPACHA VARGAS	AYUDANTE	\$328.116	14	\$386.484	\$45.282	\$0	\$30.918	\$400.800	<i>✓ Kevin Guapacha V. 1.059.788.4490</i>
16	DILAN SANTIAGO ZAPATA LEDESMA	AYUDANTE	\$328.116	13	\$358.380	\$42.047	\$0	\$28.708	\$372.200	<i>✓ Dilan Zapata L. 1.059.787.101</i>
17	SANTIAGO CARDONA HERNANDEZ	AYUDANTE	\$328.116	10	\$276.039	\$22.344	\$0	\$22.084	\$288.300	<i>✓ Santiago Cardona H. 1.007.737.674</i>
										TOTAL
										\$ 7.390.050

CANCELADO

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
 NTC APLICABLE : NTC 3722-3
 REFERENCIA : 12" 315 mm Serie S8
 LOTE : 9572N
 FECHA DE PRODUCCIÓN : 13/11/2018

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO
	Mínimo	Máximo	Unidad	OBTENIDO
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6020
Diámetro interior	270	-	mm	284,62
Diámetro exterior	313,2	316	mm	314,61
Espesor de valla	1,9	-	mm	2,12
Diámetro de campana	316	-	mm	316,51
Longitud de acoplamiento	62	-	mm	112
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	Cumple
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	10.05
Rigidez del tubo (5%)	57	-	psi	58,2
Hermeticidad bajo presión interna	7,25	-	psi	Cumple
Presión negativa interna de aire	8,9	-	In-Hg	Cumple
Resistencia al Impacto	188,29	-	Julios	Cumple


 ANTONY ALFONSO HINCAPIE
 Coordinador de calidad

CONTRATO N°	070406-2015	MUNICIPIO	REGIÓN CALDAS
-------------	-------------	-----------	---------------

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LARGO(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	CONTENIDO TUBERIA ANTERIOR (m³)
1	SANITARIO	COLECTORES	DESDE CÁMARA 48 HASTA LA CÁMARA 63A	12"	209.76	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	NTC	3722-N	DURMAN		18/10/2019			

MEMBRE SUPERVISOR /INTERVENTOR	LUIS FERNANDO ASSTAY VASQUEZ
FIRMA SUPERVISOR /INTERVENTOR	<i>Luis Fernando Asstay Vasquez</i>

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
CERTIFICADOR AGENDUTO
