	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2022-08-03

# CONTRATO Y AÑO	205 de 2023	Acta Nº	1 LIQUIDACIÓN	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 261.391.010
CONTRATISTA	JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	901.709.735-8			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 261.391.010
CDP (#, rubro y fecha)	No.20230577, Rubro 2320101001030865 05 de junio de 2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 0
RP (#, rubro y fecha)	No.712, Rubro 2320101001030865 14 de junio de 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 261.272.973
				6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	\$ 118.037

OBJETO DEL CONTRATO: GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

TIPO DE RECURSOS	RECURSOS POIR - EMPRESTITO DAVIVIENDA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------------------------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	NA	
3- Pagos al FIC	x	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	
5- Informe de actividades o Bitácora.	x	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	x	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	x	
8- Ensayos de densidad.	NA	
9- Diseño de Mezclas.	NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	x	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	x	
15- Acta parcial o final del contrato.	x	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	x	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Giraldo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	x
Acta parcial o final del contrato.	x
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	x
Copia del registro presupuestal	x

*Dr. PATM  
25-10-2023  
4:02 PM*

Fecha de presentación 20 de octubre de 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
108900345621	CUENTA AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**  
**NIT 901.709.735-8**

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICAN QUE:

**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**  
**NIT 901.709.735-8**

Se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses con el sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por todo concepto con los aportes parafiscales de acuerdo a los requerimientos del Artículo 50 de la Ley 789 – 02.

En constancia, se firma en Manizales, a los 13 días del mes de octubre de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**  
**M. P. No. 17202 – 66562 CLD**  
**C.C. No. 10.280.643 de Manizales**  
**R.L. JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**  
**NIT. 901.709.735-8**

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA DORIS GARCIA PAREJA**  
**Contador M.P No. 31081 – T**  
**C.C No. 30.296.807 de Manizales**

MULTIPLAZA EL CABLE – CARRERA 21 N°64 A 33 OF. 1408 CEL. 310 455 8948  
Correo electrónico: [jj.ingenieriasas@hotmail.com](mailto:jj.ingenieriasas@hotmail.com)  
MANIZALES - CALDAS

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

405EFB9030045180

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA DORIS GARCIA PAREJA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30296807 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 31081-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**31081-T**

MARIA DORIS  
GARCIA PAREJA  
C.C. 30296807

RESOLUCION INSCRIPCION 2089 FECHA 19/12/1991  
UNIVERSIDAD FINO UNIV. DE MANIZALES

PRESIDENTE

*Mauricio Español León*

**MAURICIO ESPAÑOL LEON** 38629




REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO  
**30.296.807**

GARCIA PAREJA  
APELLIDO

MARIA DORIS  
NOMBRES



*Maria Doris Garcia Pareja*

PIRAMA DEL TITULAR 81462

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

**DUPLICADO**

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1964

FILADELFIA  
(CALDAS)



LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ F

ESTATURA 4.5.111 SEXO

12-DIC-1983 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EMISION

A-000150-41 158415-F-0010296807-20070531 00470 07 1330 02 229687843



# SuAporte |

AUTOLIQUDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-07, 09:53:20 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 65596157  
 Período Cotización: agosto de 2023 / Período Servicio: septiembre de 2023

## PAGADO 06/09/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	Nombre Sucursal	EMPOCALDAS NEIRA 240	Código Sucursal	01
Documento	N1901709735	Dirección	CR 21 #64 A - 33 ED MULTIPLAZA EL CABLE		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6068934273		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS		
Representante Legal	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS	Identificación	CC 10280643		
Total Afiliados	18	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado		Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales			Total										
	Apellido y Nombre	Tipo Cotización	Administrador	ICB Pensión	Aporte Pensión	Administradora	ICB Salud	Aporte Salud	Tarifa	ICB Riesgo	Aporte Riesgo	Administradora	ICB Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP		Aporte Ministe	Total								
CC 1002609789	HORSER ESTEBAN PARRA DAZ	01	00	X	X	0	17	17	17	230301) PORVENIR	\$ 105,200	\$ 18,800	\$ 193,700	\$ 26,300	EP0307) NUEVA EPS	\$ 697,334	6,980	\$ 697,334	\$ 45,900	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 118,000	\$ 118,000	\$ 27,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204,700	
CC 1002789308	EDER GONZALEZ HENAO	01	00	X	X	0	3	3	3	230301) PROTECCION	\$ 116,000	\$ 4,700	\$ 116,000	6,980	EP0605) EPS SANTIAS	\$ 116,000	6,980	\$ 116,000	\$ 11,000	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 118,000	\$ 118,000	\$ 4,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38,100	
CC 10172041	HENRY ALBERTO BANGOSA BELTRAN	01	00	X	X	0	3	3	3	230301) PROTECCION	\$ 199,700	\$ 29,400	\$ 249,100	6,980	EP0307) NUEVA EPS	\$ 199,700	6,980	\$ 199,700	\$ 11,000	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 159,700	\$ 159,700	\$ 6,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,300	
CC 10308205	DUBERNY VALENCIA	01	00	X	X	0	13	13	13	230301) PROTECCION	\$ 118,000	\$ 18,800	\$ 136,800	\$ 1,128,897	EP0607) SALUD TOTAL EPS	\$ 1,128,897	0	\$ 0	\$ 0	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 1,128,897	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190,300
CC 10382825	DUBERNY VALENCIA	01	00	X	X	0	17	17	17	230301) PROTECCION	\$ 147,334	\$ 23,600	\$ 170,934	6,980	EP0607) SALUD TOTAL EPS	\$ 147,334	6,980	\$ 154,314	\$ 102,800	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 147,334	\$ 95,000	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 458,400
CC 10394789	LHON EDISON ALVAREZ BERNAL	01	00	X	X	0	8	8	8	230301) PORVENIR	\$ 348,000	\$ 55,700	\$ 403,700	\$ 348,000	EP0607) NUEVA EPS	\$ 348,000	6,980	\$ 354,980	\$ 24,300	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 348,000	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,000
CC 1039817508	MAURICIO ORCIZO ORCIZO	01	00	X	X	0	17	17	17	231001) COLFONDOS	\$ 657,334	\$ 105,200	\$ 762,534	\$ 657,334	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 657,334	6,980	\$ 664,314	\$ 45,900	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 657,334	\$ 28,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203,600
CC 1039818144	RUBEN ANDRES GALVEZ QUINTERO	01	00	X	X	0	9	9	9	231001) COLFONDOS	\$ 348,000	\$ 55,700	\$ 403,700	\$ 348,000	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 348,000	6,980	\$ 354,980	\$ 24,300	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 348,000	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,000
CC 1039819756	HON EDISON BUITRAGO GALLEGO	01	00	X	X	0	3	3	3	230301) PROTECCION	\$ 116,000	\$ 18,800	\$ 134,800	\$ 116,000	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 116,000	6,980	\$ 122,980	\$ 8,100	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 116,000	\$ 121,000	\$ 4,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,300
CC 1039820751	DIVAN ALBERTO AGUIVEDO FLOREZ	01	00	X	X	0	3	3	3	230301) PORVENIR	\$ 116,000	\$ 18,800	\$ 134,800	\$ 116,000	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 116,000	6,980	\$ 122,980	\$ 8,100	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 116,000	\$ 121,000	\$ 4,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,100
CC 1039821086	HON EDISON BUITRAGO VALENCIA	01	00	X	X	0	17	17	17	230301) PORVENIR	\$ 697,334	\$ 105,200	\$ 802,534	\$ 697,334	EP0607) SALUD TOTAL EPS	\$ 697,334	6,980	\$ 704,314	\$ 45,900	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 697,334	\$ 28,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204,700
CC 1039827049	HON EDISON BUITRAGO VALENCIA	01	00	X	X	0	3	3	3	230301) PROTECCION	\$ 116,000	\$ 18,800	\$ 134,800	\$ 116,000	EP0607) SALUD TOTAL EPS	\$ 116,000	6,980	\$ 122,980	\$ 8,100	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 116,000	\$ 121,000	\$ 4,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,100
CC 103984889	HELDORDO GRANJALES GRANJALES	01	00	X	X	0	17	17	17	230301) PORVENIR	\$ 697,334	\$ 105,200	\$ 802,534	\$ 697,334	EP0647) FAMBANAR EPS	\$ 697,334	6,980	\$ 704,314	\$ 45,900	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 697,334	\$ 28,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203,600
CC 76303728	RUBEN DAVID GALVEZ SOTO	01	00	X	X	0	3	3	3	230301) PORVENIR	\$ 116,000	\$ 18,800	\$ 134,800	\$ 116,000	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 116,000	6,980	\$ 122,980	\$ 8,100	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 116,000	\$ 121,000	\$ 4,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,100
CC 76531937	LHON EDISON DE FLOREZ CEBALLOS	01	00	X	X	0	8	8	8	230301) PROTECCION	\$ 348,000	\$ 55,700	\$ 403,700	\$ 348,000	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 348,000	6,980	\$ 354,980	\$ 24,300	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 348,000	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,000
CC 79162519	HON EDISON VALENCIA MARULANDA	01	00	X	X	0	8	8	8	231001) COLFONDOS	\$ 309,334	\$ 50,900	\$ 360,234	\$ 309,334	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 309,334	6,980	\$ 316,314	\$ 21,000	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 309,334	\$ 12,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95,800
CC 84432771	JESUIR ALBERTO AGUIVEDO GARCIA	01	00	X	X	0	8	8	8	230301) PORVENIR	\$ 493,200	\$ 79,800	\$ 573,000	\$ 493,200	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 493,200	6,980	\$ 500,180	\$ 29,900	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 493,200	\$ 17,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131,300
CC 8944300	RUBEN CARVAJAL SALAZAR	01	00	X	X	0	4	4	4	231001) COLFONDOS	\$ 154,897	\$ 24,600	\$ 179,497	\$ 154,897	EP0647) NUEVA EPS S.A.	\$ 154,897	6,980	\$ 161,877	\$ 10,800	COF(11) COMPAÑIA NUES DE CALDAS	\$ 154,897	\$ 8,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48,300



**III. TOTALES**

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 8.015.238	\$ 8.015.238	\$ 8.015.238	\$ 8.092.103	\$ 1.283.100	\$ 276.400	\$ 480.300	\$ 279.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.316.900	\$ 0	\$ 2.316.900



SuAporte |

AUTOLIQUDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-09, 03:21:18 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 65891006

Periodo Cotización: septiembre de 2023 / Período Servicio: octubre de 2023

PAGADO 09/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Table with columns: Razón Social, Documento, Tipo de Empresa, Tipo Persona, Ciudad, Representante Legal, Total Afiliados. Values include JI INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, EMPOCALDAS NEIRA 240, and POSITIVA DE SEGUROS.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Main table with columns: Identificación, Apellidos y Nombres, Tipo Cotización, Saldo Cotización, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains detailed financial data for various employees.



Página 1 de 2

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	97340212	186252164	28/09/2023

**Número de Identificación**

901709735

**Primer Apellido (si es Persona natural)****Dígito de Verificación (Si es persona**

8

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 21 64A 33 OF 1408

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

jj.ingenieriasas@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

REP. ADUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCA

**Fecha Terminación Obra**

30/10/2023

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

8

**Costo Total Mano de Obra**

8015238.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,310 4558948

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

205 - 240

**Fecha Inicio Obra**

01/08/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

NEIRA

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

948561507.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

18

**Aporte FIC**

522000.00

**Valor del Pago**

522000.00

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	97340212	186252164	28/09/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901709735**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.249.225.178**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 522,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 522,000.00	COP\$ 522,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	98336036	225544891	18/10/2023

**Número de Identificación**

901709735

**Primer Apellido (si es Persona natural)****Dígito de Verificación (Si es persona**

8

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 21 64A 33 OF 1408

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

jj.ingenieriasas@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

REP. ADUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCA

**Fecha Terminación Obra**

30/10/2023

**Tipo FIC**

Mensual ✓

**Mes Periodo a Pagar**

9 ✓

**Costo Total Mano de Obra**

24042538.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS ✓

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,310 4558948

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

205 - 240 ✓

**Fecha Inicio Obra**

01/08/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

NEIRA

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

948561507.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

24 ✓

**Aporte FIC**

696000.00

**Valor del Pago**

696000.00

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	98336036	225544891	18/10/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901709735**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.28.87.71**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 696,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 696,000.00	COP\$ 696,000.00



# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Nit: 901709735-8



CR 21 64 A 33 OF 1408 ED. MULTIPLAZA EL CABLE  
Tel: 8934273 - Cels.: 3104558948 - Manizales - Colombia  
E-mail: JJ.INGENIERIASAS@HOTMAIL.COM

RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4290

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEJJ1

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764050785802 de 22.Jun.2023 hasta 22.Jun.2024 Rango del FEJJ1 al FEJJ100

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/OCT/2023 10:09:24 a. m.

CUFE: 25247b2ec496681567e45017b0419a6f3a707a5de14378ac741a8a3b370cbafe2b059b08d721153068e3bbabe874dcb9

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Octubre 20 / 2023  
10:09:13 a. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

8 Días

Vence: Oct.28 / 2023

Dirección: CRA 23 75 82

Ciudad: Manizales

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	ADMIN	ADMINISTRACION (29%)	1	UND	56,146,100		0%	0	56,146,100
2)	COSTO	COSTO DIRECTO	1	UND	193,607,242		0%	0	193,607,242
3)	UTILIDAD	UTILIDAD (5%)	1	UND	9,680,362		19%	1,839,269	9,680,362

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Bruto: 259,433,704

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 259,433,704

+Impuestos: 1,839,269

Subtotal: 261,272,973

-Retenciones: 0

TOTAL 261,272,973

### RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	249,753,342	0
19	9,680,362	1,839,269

### NOTA

ACTA DE OBRA No. 01 y LIQUIDACION CONTRATO No. 205-2023  
REPOS. ADUCCION NEIRA

BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No. 108900345621

Firma Digital :  
m6GC6UzWIAwop5DA/RSeVnQ5XL3m7ZAwcG1rl+23p0CsjW0sc0  
3qQbJvZY26dKxdO+kxQ5Sye0wbDlkjBkIPWlqo1X+Ua/3neEzYc  
3/cfBkx1qAvidmJjVYVGF6g5rUP8q2Rh28f26UXc3bHEZ3MB5vp  
x0Jf80VXGrGDImQqaJoT9gbKVGU9/9E3iBe1DvLokuzm/tiligD  
KrrzWCj1cy/2lfeZcrJLxEEFpk3R2d4PrjGsr4MD+Un1SatktuKqldJ  
QD7L2NwYXFwhxfAKXm8xCSl0T+j1ob558tN5lhc0Mq7ezwH018  
Q4DmJDFHfxVMA151dI3VA==

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

***“GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.”***

**CONTRATO No. 205-2023**

**CONTRATISTA:  
JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**

**INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 Y FINAL**

**Octubre de 2023**

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA
  - 2.1 GENERALIDADES
  - 2.2 AVANCE DEL CONTRATO
    - 2.2.1 Avance físico
    - 2.2.2 Avance financiero
3. INFORME CONTRATO DE OBRA
  - 3.1 FRENTES DE OBRA
  - 3.2 ASPECTOS DE DISEÑO
  - 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
  - 3.4 PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FÍSICO
    - 3.4.1 Avance Físico del Proyecto
    - 3.4.2 Seguridad industrial
    - 3.4.3 Aspectos logísticos

## ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO No. 1	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO No. 2	PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL



## 1. INTRODUCCIÓN

La EMPOCALDAS S.A. E.S.P. dio viabilidad al proyecto **“GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS”**. Se realizó el proceso de Contratación para la ejecución del proyecto, lo cual dio como resultado el **Contrato de Obra No. 205 de 2023** celebrado entre **EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 22 de agosto y el 13 de octubre de 2023.

## 2. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se ejecutó mediante el contrato de Obra N° 205 de 2023, **"GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS"**.

### 2.1 GENERALIDADES

TABLA No. 1  
DATOS BÁSICOS CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO:	205 - 2023
OBJETO	GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT	890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158
CONTRATISTA	JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT	901.709.735-8
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
C.C.	10.280.643
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA
FECHA DEL CONTRATO	14 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE (\$261'391.010.00).
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE (\$261'391.010.00).
CDP	20230577 DEL 5 DE JUNIO DE 2023
RP	712 DEL 14 DE JUNIO DE 2023 RUBRO 2320101001030865
FECHA DE INICIACIÓN	22 de agosto de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 de octubre de 2023

## 2.2 AVANCE DEL CONTRATO

### 2.2.1 Avance físico

TABLA No. 2  
AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA

Avance Físico Acumulado	44,2 %
-------------------------	--------

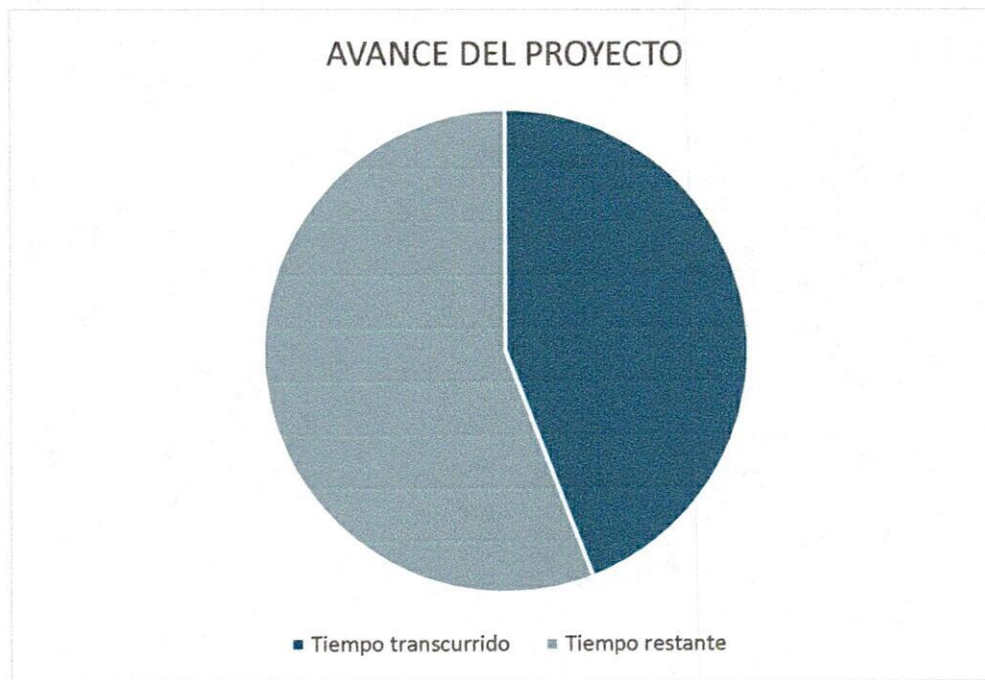


TABLA No. 3  
AVANCE EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA

Plazo de ejecución	Hasta 19 de diciembre de 2023
Tiempo total transcurrido	53 días
Tiempo Restante	67 días
Avance Porcentual	44.2 %

Al corte del presente informe han trascendido 53 días a partir de la fecha de firma del acta de inicio, con lo cual, el tiempo de ejecución del contrato fue del 44,2 % del plazo de ejecución.

### 2.2.2 Avance financiero

El acta de inicio del proyecto se suscribió el 22 de agosto de 2023, de esta manera, durante el periodo del presente informe el Contratista culminó las actividades de localización y replanteo, excavación en zanja, instalación de tubería de 10" de polietileno, relleno compacto con material seleccionado y dispersión de sobrantes, culminando las actividades del contrato. El avance financiero a la fecha de finalización es del 100%.

**TABLA No. 4**  
**AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Contratada	\$ 261'391.010.00
Inversión ejecutada en el periodo	\$ 261'272.973.00
Porcentaje ejecutado en el periodo	100 %
Inversión total ejecutada	\$ 261'272.973.00
Porcentaje total ejecutado	100 %

### **3. INFORME CONTRATO DE OBRA**

#### **3.1 FRENTES DE OBRA**

El acta de inicio del proyecto se suscribió el 22 de agosto de 2023, durante el período del presente informe, el Contratista culminó las actividades de localización y replanteo, excavación en zanja, instalación de tubería de 10" de polietileno, relleno compacto con material seleccionado y dispersión de sobrantes.

La supervisión realizó acompañamiento a estos procesos mediante visitas técnicas para la verificación de las condiciones contractuales.

#### **3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES**

##### **3.2.1 Visitas de Interventoría**

El contratista en compañía de la supervisión ha realizado acompañamiento a estos procesos mediante personal permanente en obra y visitas técnicas para la revisión de los aspectos administrativos del contrato.

##### **3.2.2 Control de pólizas y reservas presupuestales**

Una vez firmado el contrato, el contratista entregó las pólizas a EMPOCALDAS S.A E.S.P.

#### **3.3 PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FÍSICO**

##### **3.3.1 Avance físico del proyecto**

Durante el período del presente informe, se culminaron las actividades, dando por terminado el Contrato de Obra.

De igual manera, el contratista ha cumplido con los compromisos de carácter administrativo, como personal mínimo, plan de ejecución y socialización, según los términos establecidos.

##### **3.3.2 Seguridad y salud en el trabajo**

El contratista cumplió con todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo del personal, suministrando oportunamente los elementos necesarios al personal para su seguridad, teniendo en obra un profesional en salud ocupacional realizando las capacitaciones y el cumplimiento de la normatividad al respecto.

##### **3.3.3 Aspectos logísticos**


Durante la ejecución del contrato, el Contratista cuenta con el personal necesario para la ejecución de las obras.

##### **Personal Técnico y Administrativo:**

Se cuenta con Ingeniero director de obra, Ingeniero residente, Profesional en salud ocupacional y, además, cuenta con un equipo de trabajo en oficina como secretaria, contadora, etc.

TABLA No 5  
RELACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRA

Nombre	Cargo
Ing. Javier de Jesús García Pareja	Director de obra
Ing. Daniela García Osorio	Residente de obra
Leidy Carolina Gallego Benjumea	Profesional SST
Duberney Valencia	Maestro de obra

  
\_\_\_\_\_  
JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.  
R.L. JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

ANEXO 1  
REGISTRO FOTOGRÁFICO

AVANCE DE OBRA – GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.




*Imagen 1.-* Descargue y acarreo de tubería de polietileno de 10” hasta lugar de almacenamiento



*Imagen 2.-* Acopio de tubería de polietileno de 10” en área de intervención



**Imagen 3.-** Trazabilidad de tubería de polietileno de 10' instalada

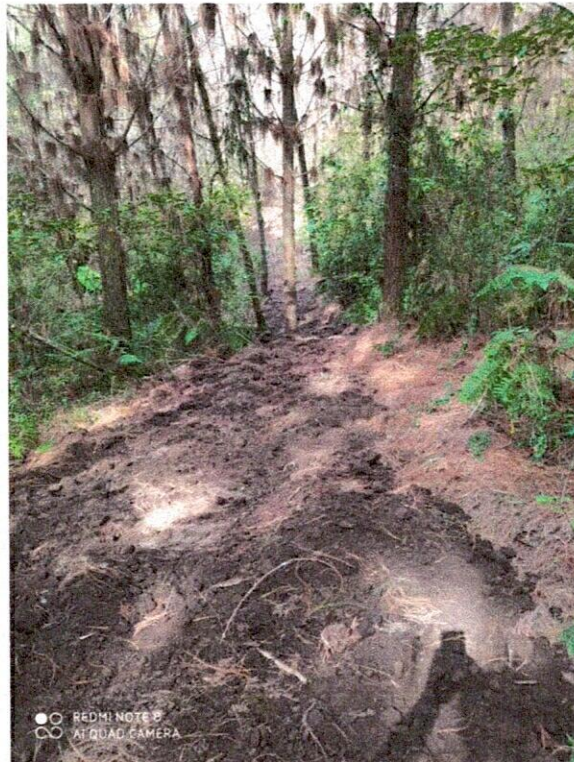

**Imagen 4.-** Localización y replanteo en zona de intervención.





**Imagen 5.-** Excavación en zanja en material común para instalación de tubería de polietileno de 10"



**Imagen 6.-** Instalación de tubería de polietileno de 10".



**Imagen 7.-** Instalación de tubería de polietileno de 10",  
según localización



**Imagen 8.-** Instalación de tubería de polietileno de 10",  
según localización.



**Imagen 9.-** Instalación de tubería de polietileno de 10",  
según localización



**Imagen 10.-** Instalación de tubería de polietileno de 10",  
según localización



**Imagen 11.-** Instalación de tubería de polietileno de 10",  
según localización.



**Imagen 12.-** Instalación de tubería de polietileno de 10",  
según localización



**Imagen 13.-** Excavación en zanja en material común para instalación de tubería de polietileno de 10"



**Imagen 14.-** Termofusión de tubería de polietileno de 10".



**Imagen 15.-** Termofusión de tubería de polietileno de 10”.



**Imagen 16.-** Termofusión de tubería de polietileno de 10”.



**Imagen 17.-** Termofusión de tubería de polietileno de 10”.



**Imagen 18.-** Corte de árboles caídos que interferían con la ruta de instalación de la tubería




**Imagen 19.-** Corte de árboles caídos que interferían con la ruta de instalación de la tubería.



**Imagen 20.-** Corte de árboles caídos que interferían con la ruta de instalación de la tubería.




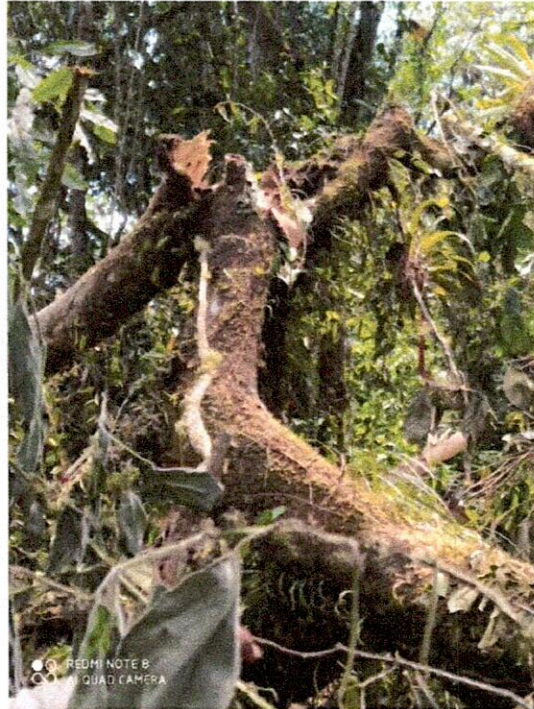

**Imagen 21.-** Corte de árboles caídos que interferían con la ruta de instalación de la tubería.



**Imagen 22.-** Corte de árboles caídos que interferían con la ruta de instalación de la tubería.

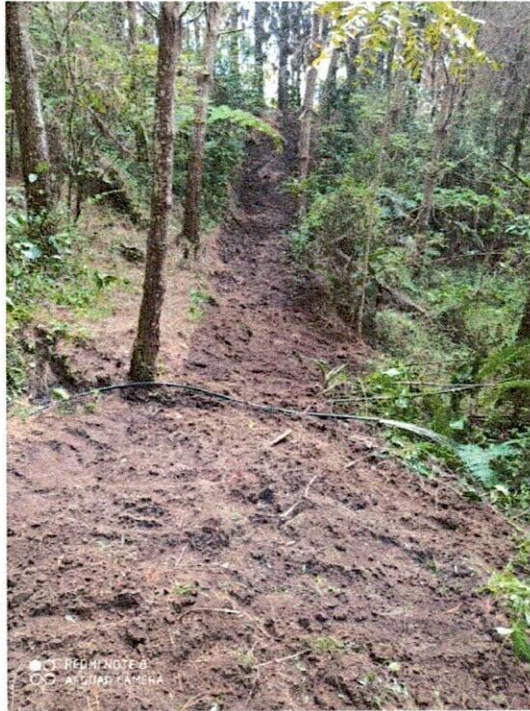

**Imagen 23.-** Rellenos compactos con material seleccionado de excavación posterior a instalación de tubería de polietileno de 10”.



**Imagen 24.-** Rellenos compactos con material seleccionado de excavación posterior a instalación de tubería de polietileno de 10”.



JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

NIT: 901.709.735-8

CONTRATO No.240 DE 2023 EMPICALDAS S.A. E.S.P.  
 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 9 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 5 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

NÓMINA No.: 02

FECHA: DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	DÍAS LAB.	VALOR QUINC.	INCAPAC. DADER	VALOR INCAP.	H.E	AJUILO ALIMEN TACION	AJUILO TRANSP	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL	RECBI CONFORME
															A PAGAR	
1 JHON FERNANDO BUITRAGO GALLEGO	1.058.819.755	AYUDANTE	1.160.000	3,00	116.000				21.749	14.061	130.061	4.640	4.640	9.280	142.530	X Jhon Fernando Buitrago
<b>TOTALES</b>															142.530	
															\$142.530	



JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

NIT: 901.709.735-8

CONTRATO No. 240 DE 2023 EIMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
CONTRATO No. 205 DE 2023 EIMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NÓMINA No.: 06

FECHA: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	DÍAS LAB.	VALOR QUINC.	INCAPACIDADES	VALOR INCAP.	H.E	AUXILIO ALIMENTACION	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL		RECIBI CONFORME											
															A PAGAR	RENTAS												
1 DUBERNEY VALENCIA	10.282.825	MAESTRO	2.800.000	15.00	1.300.000				304.000		1.300.000	82.000	52.000	104.000	1.500.000		<i>[Signature]</i>											
2 HENRY ALBERTO BARBOSA BELTRAN	10.172.041	OFICIAL	1.587.000	15.00	793.500				98.877	70.303	863.803	31.740	31.740	63.480	900.000		<i>[Signature]</i>											
3 JESUS ALBERO ACEVEDO GARCIA	8.494.377	OFICIAL	1.587.000	15.00	793.500				49.877	70.303	863.803	31.740	31.740	63.480	850.000		<i>[Signature]</i>											
4 JORGE ALBERO SEPULVEDA BECOYA	10.132.902	OFICIAL	1.895.000	15.00	847.500				148.987	70.303	917.803	33.870	33.900	67.770	1.000.000		<i>[Signature]</i>											
5 CRISTIAN FELIPE ESCOBAR SALAZAR	1.053.807.203	AYUDANTE	1.180.000	3.00	118.000					14.081	130.081	4.840	4.640	9.280	120.781		<i>[Signature]</i>											
6 DIEGO FERNANDO SANTA DELGADO	1.058.818.918	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000				38.887	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	842.570		<i>[Signature]</i>											
7 DUIVAN ALBERTO ACEVEDO FLOREZ	1.058.820.751	AYUDANTE	1.180.000	10.00	388.887				48.889	43.554	433.554	13.487	15.487	30.934	402.902		<i>[Signature]</i>											
8 EDER GONZÁLEZ HENAO	1.002.988.389	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000				34.887	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	842.570		<i>[Signature]</i>											
9 HUGO ALBERTO GALVES HENAO	1.058.818.474	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000				61.287	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	872.200		<i>[Signature]</i>											
10 JHON EDISON ALVAREZ SEPENA	1.053.847.983	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000					70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	803.903		<i>[Signature]</i>											
11 JOSE ALEXIS PULIDO MORENO	PT. 8.914.124	AYUDANTE	1.180.000	18.00	580.000				38.887	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	700.000		<i>[Signature]</i>											
12 JOSE RENEL CORREA PATIÑO	15.908.384	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000				34.887	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	842.570		<i>[Signature]</i>											
13 MAURICIO ORCIZO ORCIZO	1.058.817.559	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000				38.887	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	842.570		<i>[Signature]</i>											
14 PABLO ANDRES RENDON MARULANDA	75.105.718	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000				68.287	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	872.200		<i>[Signature]</i>											
15 WILMER JOSE GONZALEZ GONZALEZ	PT. 8.188.381	AYUDANTE	1.180.000	15.00	580.000				38.887	70.303	650.303	23.200	23.200	46.400	842.570		<i>[Signature]</i>											
<b>TOTALES</b>															208	9.457.167	0	0	0	1.028.377	904.665	10.361.732	378.287	378.287	756.574	10.634.536		

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: EDER GONZALEZ HENAO	Cédula: 1002798369
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 488436102948
Dirección: LAS PARTIDAS PUEBLO RICO - Cel.3114081635	Municipio: Neira

Liquidación No.10030 - Período Desde: 08-28-2023 Hasta: 10-06-2023

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	5		
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	1		
SALARIO ORDINARIO		193,333	
AUXILIO DE TRANSPORTE		23,434	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		30,000	
DESCUENTO EPS			7,733
DESCUENTO AFP			7,733
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>246,767</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>15,466</b>
		<b>TOTAL A PAGAR EDER :</b>	<b>\$231,301</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	38	
DIAS PARA CESANTIAS	38	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	38	
DIAS PARA VACACIONES	38	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES			
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		61,222				
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		137,286				
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		137,286				
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		1,739				
					<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA EDER :</b>	<b>\$337,533</b>

**TOTAL A PAGAR :**

**\$568,834**

**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**

901709735 - 8


**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

Nombre: EDER GONZALEZ HENAO	Cédula: 1002798369
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 488436102948
Dirección: LAS PARTIDAS PUEBLO RICO - Cel.3114081635	Municipio: Neira

**Liquidación No.10030 - Período Desde: 08-28-2023 Hasta: 10-06-2023**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

  
\_\_\_\_\_

X Eder - 1002798369  
\_\_\_\_\_  
EDER GONZALEZ HENAO  
C.C.1002798369



# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

<b>Nombre:</b> JHON EDISON BRITO BEDOYA	<b>Cédula:</b> 1088827049
<b>Cargo:</b> Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	<b>Cuenta:</b> 084800063749
<b>Dirección:</b> CR 8 13 19 B/ LA UNION - Cel.3107198485	<b>Municipio:</b> Neira

**Liquidación No.10024 - Período Desde:** 08-28-2023 **Hasta:** 09-24-2023

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DÍAS LABORADOS	9		
SALARIO ORDINARIO		348,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE		42,182	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		39,000	
DESCUENTO EPS			13,920
DESCUENTO AFP			13,920
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>429,182</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>27,840</b>
<b>TOTAL A PAGAR JHON EDISON:</b>		<b>\$401,342</b>	

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI)		1,160,000
DÍAS PARA PRIMA	27	
DÍAS PARA CESANTIAS	27	
DÍAS INTERESES A LAS CESANTIAS	27	
DÍAS PARA VACACIONES	27	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		43,500			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		97,545			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		97,545			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		878			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JHON EDISON:</b>			<b>\$239,468</b>		

*JHON EDISON*

**TOTAL A PAGAR:**

**\$640,810**

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: EDISSON YAMIL CARDENAS OSORIO	Cédula: 1058817163
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 3127976284
Dirección: VEREDA OTUN - Cel.3127976284	Municipio: Neira

**Liquidación No.10023 - Período Desde: 09-07-2023 Hasta: 09-24-2023**

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	9		
SALARIO ORDINARIO		476,100	
AUXILIO DE TRANSPORTE		42,182	
DESCUENTO EPS			19,044
DESCUENTO AFP			19,044
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>518,282</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>38,088</b>
<b>TOTAL A PAGAR EDISSON YAMIL:</b>			<b>\$480,194</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV		1,587,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI		1,587,000
DIAS PARA PRIMA	18	
DIAS PARA CESANTIAS	17	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	17	
DIAS PARA VACACIONES	17	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		37,471			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		86,380			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		81,581			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		462			

**TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA EDISSON YAMIL: \$205,894**

*Edison Yamil Cardenas*

**TOTAL A PAGAR:**

**\$686,088**

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

<b>Nombre:</b> HELIODORO GRAJALES GRAJALES	<b>Cédula:</b> 16054999
<b>Cargo:</b> Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	<b>Cuenta:</b> 488440721287
<b>Dirección:</b> VEREDA CANTADELICIA - Cel.3012037580	<b>Municipio:</b> Neira

**Liquidación No.16 - Período Desde:** 08-14-2023 **Hasta:** 09-17-2023

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	2		
SALARIO ORDINARIO		77,333	
AUXILIO DE TRANSPORTE		9,374	
DESCUENTO EPS			3,093
DESCUENTO AFP			3,093
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>86,707</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>6,186</b>
<b>TOTAL A PAGAR HELIODORO :</b>			<b>\$80,521</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	34	
DIAS PARA CESANTIAS	34	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	34	
DIAS PARA VACACIONES	34	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		54,778			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		122,835			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		122,835			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		1,392			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA HELIODORO :</b>					<b>\$301,840</b>

**TOTAL A PAGAR:**

**\$382,361**

JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: HELIODORO GRAJALES GRAJALES	Cédula: 16054999
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 488440721287
Dirección: VEREDA CANTADELICIA - Cel.3012037580	Municipio: Neira

Liquidación No.16 - Período Desde: 08-14-2023 Hasta: 09-17-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

X *Heliodoro*

HELIODORO GRAJALES GRAJALES  
C.C.16054999

**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**

901709735 - 8

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> RUBEN DARIO GALVEZ SOTO	<b>Cédula:</b> 75030728
<b>Cargo:</b> Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	<b>Cuenta:</b> 084800047619
<b>Dirección:</b> CR 8 13 09 LA UNION - Cel.3145970982	<b>Municipio:</b> Neira

**Liquidación No.12 - Período Desde: 08-28-2023 Hasta: 09-15-2023**

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	15		
SALARIO ORDINARIO		580,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE		70,303	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		38,667	
DESCUENTO EPS			23,200
DESCUENTO AFP			23,200
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>688,970</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>46,400</b>
<b>TOTAL A PAGAR RUBEN DARIO:</b>			<b>\$642,570</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI)		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	18	
DIAS PARA CESANTIAS	18	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	18	
DIAS PARA VACACIONES	18	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		29,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		65,030			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		65,030			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		390			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA RUBEN DARIO:</b>					<b>\$159,450</b>

*xRubén Dario*

**TOTAL A PAGAR:**

**\$802,020**

JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

• LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: RUBEN DARIO GALVEZ SOTO	Cédula: 75030728
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 084800047619
Dirección: CR 8 13 09 LA UNION - Cel.3145970982	Municipio: Neira

Liquidación No.12 - Período Desde: 08-28-2023 Hasta: 09-15-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*Rubén Dario 75030728*

RUBEN DARIO GALVEZ SOTO  
C.C.75030728

**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**

901709735 - 8

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> RUBEN ANDRES GALVEZ QUINTERO	<b>Cédula:</b> 1058820649
<b>Cargo:</b> Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	<b>Cuenta:</b> 084800063384
<b>Dirección:</b> CR 1B 5 61 CARLOS PARRA - Cel.3128648085	<b>Municipio:</b> Neira

**Liquidación No.11 - Período Desde:** 08-28-2023 **Hasta:** 09-15-2023 /

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	15		
SALARIO ORDINARIO		580,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE		70,303	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		38,667	
DESCUENTO EPS			23,200
DESCUENTO AFP			23,200
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>688,970</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>46,400</b>
<b>TOTAL A PAGAR RUBEN ANDRES:</b>			<b>\$642,570</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI)		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	18	
DIAS PARA CESANTIAS	18	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	18	
DIAS PARA VACACIONES	18	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		29,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		65,030			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		65,030			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		390			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA RUBEN ANDRES:</b>					<b>\$159,450</b>

*Ruben Andres Galvez Quintero*

**TOTAL A PAGAR:**

**\$802,020**

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8


## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: RUBEN ANDRES GALVEZ QUINTERO	Cédula: 1058820649
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 084800063384
Dirección: CR 1B 5 61 CARLOS PARRA - Cel.3128648085	Municipio: Neira

**Liquidación No.11 - Período Desde: 08-28-2023 Hasta: 09-15-2023**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.



RUBEN ANDRES GALVEZ QUINTERO  
C.C.1058820649



# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JUAN CAMILO CASTRILLON CUARTAS	Cédula: 1057330224
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 3107297730
Dirección: CL 7 12 A 21 B/ PANORAMA - Cel.3127541140	Municipio: Neira

**Liquidación No.10 - Período Desde: 09-04-2023 Hasta: 09-15-2023**

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	12		
SALARIO ORDINARIO		454,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE		56,242	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		38,667	
DESCUENTO EPS			18,560
DESCUENTO AFP			18,560
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>558,909</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>37,120</b>
<b>TOTAL A PAGAR JUAN CAMILO:</b>			<b>\$521,789</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTI)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI)		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	12	
DIAS PARA CESANTIAS	12	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	12	
DIAS PARA VACACIONES	12	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		19,333			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		43,354			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		43,354			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		173			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JUAN CAMILO:</b>					<b>\$106,214</b>

**TOTAL A PAGAR: \$628,003**

*Juan Camilo Castrillon C.*  
*1057330224*

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JUAN CAMILO CASTRILLON CUARTAS	Cédula: 1057330224
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 3107297730
Dirección: CL 7 12 A 21 B/ PANORAMA - Cel.3127541140	Municipio: Neira

**Liquidación No.10 - Período Desde:** 09-04-2023 **Hasta:** 09-15-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*Juan Camilo Castrillon* 1057330224

JUAN CAMILO CASTRILLON CUARTAS  
C.C.1057330224

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: OSCAR JULIAN JARAMILLO VALENCIA	Cédula: 1002566838
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 3122052440
Dirección: VEREDA EL DESCANSO - Cel.3122052440	Municipio: Neira

Liquidación No.9 - Período Desde: 09-04-2023 Hasta: 09-14-2023

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	10		
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	1		
SALARIO ORDINARIO		386,667	
AUXILIO DE TRANSPORTE		46,869	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		38,667	
DESCUENTO EPS			15,467
DESCUENTO AFP			15,467
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>472,203</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>30,934</b>
<b>TOTAL A PAGAR OSCAR JULIAN:</b>			<b>\$441,269</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	10	
DIAS PARA CESANTIAS	10	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	10	
DIAS PARA VACACIONES	10	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		16,111			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		36,128			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		36,128			
INTERESES A LAS CESANTIÁS - LIQUIDACION DEFINITI		120			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA OSCAR JULIAN:</b>					<b>\$88,487</b>

TOTAL A PAGAR:

**\$529,756**

Oscar Jaramillo

JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: OSCAR JULIAN JARAMILLO VALENCIA	Cédula: 1002566838
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 3122052440
Dirección: VEREDA EL DESCANSO - Cel.3122052440	Municipio: Neira

Liquidación No.9 - Período Desde: 09-04-2023 Hasta: 09-14-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Oscar Jaramillo cc. 1002566838

OSCAR JULIAN JARAMILLO VALENCIA  
C.C.1002566838

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JOSE ALONSO FRANCO AREVALO	Cédula: 10263506
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 488440797576
Dirección: CR 7 10 23 LAS GUACAS - Cel.3024257477	Municipio: Neira

Liquidación No.7 - Período Desde: 09-04-2023 Hasta: 09-11-2023 ✓

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	8		
SALARIO ORDINARIO		309,333	
AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		38,667	
DESCUENTO EPS			12,373
DESCUENTO AFP			12,373
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>385,495</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>24,746</b>
<b>TOTAL A PAGAR JOSE ALONSO:</b>			<b>\$360,749</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	8	
DIAS PARA CESANTIAS	8	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	8	
DIAS PARA VACACIONES	8	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		12,889			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		28,902			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		28,902			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		77			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JOSE ALONSO:</b>					<b>\$70,770</b>

**TOTAL A PAGAR:**

**\$431,519**

*X Jose Alonso Franco*

CC 10263-506

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8



## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JOSE ALONSO FRANCO AREVALO	Cédula: 10263506
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 488440797576
Dirección: CR 7 10 23 LAS GUACAS - Cel.3024257477	Municipio: Neira

**Liquidación No.7 - Período Desde:** 09-04-2023 **Hasta:** 09-11-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.



JOSE ALONSO FRANCO AREVALO  
C.C.10263506

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JUAN CARLOS FLOREZ CEBALLOS	Cédula: 75031237
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 084800061115
Dirección: CL 9 10 58 B/ CENTRO - Cel.3114381344	Municipio: Neira

Liquidación No.8 - Período Desde: 08-22-2023 Hasta: 09-10-2023 ✓

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	10		
SALARIO ORDINARIO		386,667	
AUXILIO DE TRANSPORTE		46,869	
DESCUENTO EPS			15,467
DESCUENTO AFP			15,467
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>433,536</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>30,934</b>
<b>TOTAL A PAGAR JUAN CARLOS:</b>			<b>\$402,602</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	19	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		30,611			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		68,643			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		68,643			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		435			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JUAN GARLOS:</b>					<b>\$168,332</b>

**TOTAL A PAGAR:**

**\$570,934**

*Juan Carlos Florez*  
CC 750 31 237

JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8


LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JUAN CARLOS FLOREZ CEBALLOS	Cédula: 75031237
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 084800061115
Dirección: CL 9 10 58 B/ CENTRO - Cel.3114381344	Municipio: Neira

Liquidación No.8 - Período Desde: 08-22-2023 Hasta: 09-10-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

  
JUAN CARLOS FLOREZ CEBALLOS  
C.C.75031237  
75031237



# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: YEISON ESTIVEN DIAZ VILLEGAS	Cédula: 1058821093
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 05949485457
Dirección: CL 13 8 35 B/ LA UNION - Cel.3233342143	Municipio: Neira

Liquidación No.6 - Período Desde: 08-14-2023 Hasta: 08-30-2023

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	15		
SALARIO ORDINARIO		580,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE		70,303	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		41,135	
DESCUENTO EPS			23,200
DESCUENTO AFP			23,200
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>691,438</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>46,400</b>
		<b>TOTAL A PAGAR YEISON ESTIVEN:</b>	<b>\$645,038</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIVA)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI)		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	17	
DIAS PARA CESANTIAS	17	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	17	
DIAS PARA VACACIONES	17	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		27,389			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		61,418			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		61,418			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		348			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA YEISON ESTIVEN:</b>					<b>\$150,573</b>

TOTAL A PAGAR:

**\$795,611**

*Yeison Estiven D*  
1058821093

JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: YEISON ESTIVEN DIAZ VILLEGAS	Cédula: 1058821093
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 05949485457
Dirección: CL 13 8 35 B/ LA UNION - Cel.3233342143	Municipio: Neira

Liquidación No.6 - Período Desde: 08-14-2023 Hasta: 08-30-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*Yeison Estiven D*

YEISON ESTIVEN DIAZ VILLEGAS  
C.C.1058821093

**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**

901709735 - 8

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

Nombre: ROBEIRO CARVAJAL SALAZAR	Cédula: 98454600
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 3132340896
Dirección: BARRIO LA ISABELLA - Cel.3132340896	Municipio: Neira

**Liquidación No.3 - Período Desde: 08-22-2023 Hasta: 08-25-2023**

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	4		
SALARIO ORDINARIO		154,667	
AUXILIO DE TRANSPORTE		18,747	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		28,998	
DESCUENTO EPS			6,187
DESCUENTO AFP			6,187
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>202,412</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>12,374</b>
<b>TOTAL A PAGAR ROBEIRO :</b>			<b>\$190,038</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI)		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	4	
DIAS PARA CESANTIAS	4	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	4	
DIAS PARA VACACIONES	4	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		6,444			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		14,451			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		14,451			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		19			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA ROBEIRO :</b>					<b>\$35,365</b>

**TOTAL A PAGAR:**

**\$225,403**

*Robeiro C*

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: ROBEIRO CARVAJAL SALAZAR	Cédula: 98454600
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 3132340896
Dirección: BARRIO LA ISABELLA - Cel.3132340896	Municipio: Neira

Liquidación No.3 - Período Desde: 08-22-2023 Hasta: 08-25-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*R. Robeiro C*

ROBEIRO CARVAJAL SALAZAR  
C.C.98454600

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

<b>Nombre:</b> JHOSSIE ESTEBAN PARRA DIAZ	<b>Cédula:</b> 1002608786
<b>Cargo:</b> Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	<b>Cuenta:</b> 087070108748
<b>Dirección:</b> CL 13 8 35 B/ LA UNION - Cel.3114072187	<b>Municipio:</b> Neira

**Liquidación No.4 - Período Desde:** 08-14-2023 **Hasta:** 08-30-2023

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	15		
SALARIO ORDINARIO		580,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE		70,303	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		9,872	
DESCUENTO EPS			23,200
DESCUENTO AFP			23,200
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>660,175</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>46,400</b>
<b>TOTAL A PAGAR JHOSSIE ESTEBAN:</b>			<b>\$613,775</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	17	
DIAS PARA CESANTIAS	17	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	17	
DIAS PARA VACACIONES	17	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		27,389			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		61,418			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		61,418			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		348			

**TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JHOSSIE ESTEBAN:** \$150,573

**TOTAL A PAGAR:** **\$764,348**

**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**


901709735 - 8

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES****DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> JHOSSIE ESTEBAN PARRA DIAZ	<b>Cédula:</b> 1002608786
<b>Cargo:</b> Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	<b>Cuenta:</b> 087070108748
<b>Dirección:</b> CL 13 8 35 B/ LA UNION - Cel.3114072187	<b>Municipio:</b> Neira

**Liquidación No.4 - Período Desde:** 08-14-2023 **Hasta:** 08-30-2023

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.



JHOSSIE ESTEBAN PARRA DIAZ  
C.C.1002608786

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JHON FERNANDO BUITRAGO GALLEGO	Cédula: 1058819756
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 85900003149
Dirección: CL 8 6 63 SECTOR HOSPITAL - Cel.3138178343	Municipio: Neira

**Liquidación No.2 - Período Desde: 08-22-2023 Hasta: 08-24-2023**

### NÓMINA A LIQUIDAR:

CONCEPTO	CANT	ADICION	DEDUCCION
DIAS LABORADOS	3		
SALARIO ORDINARIO		116,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE		14,061	
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		21,749	
DESCUENTO EPS			4,640
DESCUENTO AFP			4,640
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>151,810</b>	
<b>TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)</b>			<b>9,280</b>
<b>TOTAL A PAGAR JHON FERNANDO:</b>			<b>\$142,530</b>

### DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		140,606
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUTIV)		1,160,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONSTI)		1,160,000
DIAS PARA PRIMA	3	
DIAS PARA CESANTIAS	3	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	3	
DIAS PARA VACACIONES	3	

### PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		4,833			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		10,838			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		10,838			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITI		11			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JHON FERNANDO:</b>					<b>\$26,520</b>

**TOTAL A PAGAR:**

**\$169,050**

*Jhon Fernando Buitrago*

*1058819756*

# JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

901709735 - 8

## LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

### DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JHON FERNANDO BUITRAGO GALLEGO	Cédula: 1058819756
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	Cuenta: 85900003149
Dirección: CL 8 6 63 SECTOR HOSPITAL - Cel.3138178343	Municipio: Neira


**Liquidación No.2 - Período Desde: 08-22-2023 Hasta: 08-24-2023**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*Jhon Fernando Buitrago*

JHON FERNANDO BUITRAGO GALLEGO  
C.C.1058819756



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	01	Fecha del informe	13/10/2023	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	205 de 2023
Objeto:	GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS
Nombre Contratista:	JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Fecha del contrato:	14 de junio de 2023
Plazo de ejecución:	120 días calendario
Valor inicial:	\$ 261.391.010.00
Fecha de iniciación:	22 de agosto de 2023
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	19 de diciembre de 2023
Nueva fecha de terminación:	13 de octubre de 2023
Adición (en valor):	-
Prórroga (en tiempo):	-
Supervisor:	JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	\$ 261.272.973.00 (100%)
Avance físico Acumulado	\$ 261.272.973.00 (100%)

### 1.2. Informe de actividades (se anexa resumen de ejecución de la obra)

#### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

- Localización y replanteo
- Rocería y limpieza
- Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m ancho 0.5 cm y H= 0.8 cm
- Instalación de Tubería de 10" polietileno por termo fusión.



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- Termo fusión de Reducciones de 10" x 8"
- Termo fusión de portaflanches de 8"
- Empalmes a la red existente
- Sobre acarreo de tubería al hombro
- Rellenos compactos con material seleccionado de excavación
- Dispersión de sobrantes

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
NEIRA	ACUEDUCTO	1,35

#### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	120 días
Tiempo total transcurrido:	53 días
Avance Porcentual:	44.2%

#### 1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

Se presenta al final de este informe.

#### 1.5. Problemáticas con la obra

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución del contrato.

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 261.391.010.00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 261.272.973.00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.95 %
Inversión total ejecutada:	\$ 261.272.973.00
Porcentaje total ejecutado:	99.95 %
Saldo por ejecutar:	\$ 118.037.00
Porcentaje por ejecutar:	0.05 %



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Compañía mundial de seguros S.A	CMZ-100003000	22/08/2023	21/03/2024	\$78.417.303,00
Prestaciones sociales	Compañía mundial de seguros S.A.	CMZ-100003000	22/08/2023	20/12/2026	\$52.278.202,00
Estabilidad y Calidad de la obra	Compañía mundial de seguros S.A.	CMZ-100003000	13/10/2023	13/10/2028	\$52.278.202,00
Responsabilidad civil extracontractual	Compañía mundial de seguros S.A.	CMZ-100000896	22/08/2023	21/03/2024	\$78.417.303,00

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

No.	NOMBRE	ARL	EPS	AFP	PARAFIS.	FIC
1	DUBERNEY VALENCIA	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	Ok	Ok
2	HELIODORO GRAJALES GRAJALES	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	Ok	Ok
3	YEISON ESTIVEN DIAZ VILLEGAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	Ok	Ok
4	JHOSSIE ESTEBAN PARRA DIAZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
5	MAURICIO OROZCO OROZCO	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	Ok	Ok
6	ROBEIRO CARVAJAL SALAZAR	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	Ok	Ok
7	JUAN CARLOS FLOREZ CEBALLOS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	Ok	Ok
8	HUGO ALBERTO GALVEZ HENAO	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	Ok	Ok
9	JHON FERNDANDO BUITRAGO GALLEGO	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	Ok	Ok
10	JHON EDISON ALVAREZ SERNA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
11	PABLO ANDRES RENDÓN MARULANDA	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	Ok	Ok
12	JESÚS ALBEIRO ACEVEDO GARCIA	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	Ok	Ok
13	JHON EDISON BRITO BEDOYA	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	Ok	Ok
14	EDER GONZALEZ HENAO	POSITIVA	SANITAS	PROTECCIÓN	Ok	Ok



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

15	DUVAN ALBERTO ACEVEDO FLOREZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
16	RUBEN ANDRES GALVEZ QUINTERO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
17	RUBEN DARIO GALVEZ SOTO	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	Ok	Ok
18	HENRY ALBERTO BARBOSA BELTRAN	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	Ok	Ok
19	JORGE ALBEIRO SEPULVEDA BEDOYA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
20	JOSÉ ALONSO FRANCO AREVALO	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	Ok	Ok
21	OSCAR JULIÁN JARAMILLO VALENCIA	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	Ok	Ok
22	JUAN CAMILO CASTRILLON CUARTAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
23	WILMER JOSÉ GONZALEZ GONZALEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
24	JOSÉ REINEL CORREA PATIÑO	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	Ok	Ok
25	DIEGO FERNANDO SANTA DELGADO	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	Ok	Ok
26	JOSÉ ALEXIS PULIDO MORENO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
27	EDISSON YAMIL CARDENAS OSORIO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
28	CRISTIAN FELIPE ESCOBAR SALAZAR	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	Ok	Ok

- CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)  
No Aplica. El contratista es persona Jurídica
- CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

FECHA DE INSPECCIÓN	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
10 de octubre de 2023	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)  
Se anexa con el acta de obra.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS


DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA  
Supervisor

FIRMA DEL SUPERVISOR

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO:

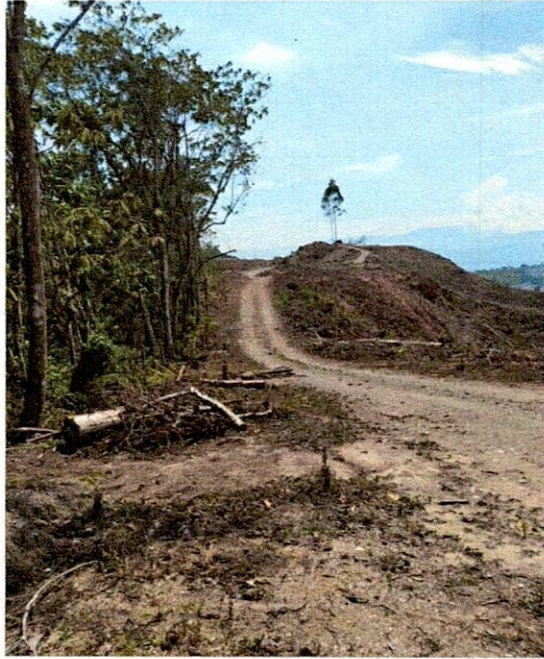

*Localización y replanteo para instalación de tubería*



*Excavación en zanja en material común*



*Almacenamiento de tubería de polietileno de 10"*



*Termofusión de tubería de polietileno de 10"*





*Corte de árboles caídos encontrados en el trayecto de instalación de tubería*



*Lleno compactado con material seleccionado posterior a instalación de tubería*



PLAZA DE  
MAYORÍA  
MAYO 2018

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION		DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR(M)
														DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			
K7-100 A K8-450	Aduccion	K7-100 A K8-450 DETRAS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALIDAS	10"	1350	Polieltieno	Instalación con apertura de zanja		SI	NTC 4585	ICONTEC	11/06/2023	EXTRUCOL	800.022.371-4	26/09/2023	8"	Asbesto cemento	1350	

CONTRATO No: 205 DE 2023

MUNICIPIO: NEREA

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENIOR: JUAN BALDORIO MORALES

FIRMA SUPERVISOR o INTERVENIOR: *[Handwritten Signature]*

NOMBRE CONTRATISTA: JI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

FIRMA CONTRATISTA: *[Handwritten Signature]*

VISTO BUENO DE RECEIBO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

## ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1


**CONTRATO N°:** 205 - 2023  
**CONTRATISTA:** JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A.E.S.P.  
**OBJETO:** GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS  
**VALOR:** \$ 261.391.010  
**RECURSOS:** RECURSOS POIR - EMPRESTITO DAVIVIENDA


En la ciudad de Manizales a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2023 se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JAVIER DE JESÚS GARCIA PAREJA como Representante Legal del Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No. 205 de 2023.


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	Suministro e instalación ventosas 1"	UN	\$150.011,00
NP2	Suministro e instalación señales en tubería 2" aguas lluvias	UN	\$51.990,00
NP3	Corte de árboles caídos	UN	\$122.800,00


Los precios son **COSTOS DIRECTOS**

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
\_\_\_\_\_  
**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**  
R.L. JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
Contratista

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA**  
Ingeniero de Zona  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Jefe de Planeación y Proyectos  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.1

CONTRATO 205 DE 2023

GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS  
K7+100 A K8+450 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS

ITEM: NP1		Suministro e instalación ventosas 1"				Unidad: UN
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. %	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
<b>MATERIALES</b>						
Silleta termofusión 2"	Un	1,00		62.900,00	62.900,00	
Válvula Bola Rosca 1/2 Pg Agua Manija Larga - Grival	Un	1,00		28.900,00	28.900,00	
Tubo PVC 1/2" presión	m	1,00		2.450,00	2.450,00	
Accesorios	Un	1,00		27.750,00	27.750,00	
SUBTOTAL MATERIALES					<b>122.000,00</b>	
<b>MANO DE OBRA</b>		Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit
M.O. AYUDANTE		43.354,00	1,85	80.205,00	7,00	11.458,00
M.O. OFICIAL		57.587,00	1,85	106.536,00	7,00	15.219,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					<b>26.677,00</b>	
<b>EQUIPO</b>						
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		26.677,00	1.334,00	
SUBTOTAL EQUIPO					<b>1.334,00</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>150.011,00</b>	

ITEM: NP2		Suministro e instalación señales en tubería 2" aguas lluvias				Unidad: UN
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. %	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
<b>MATERIALES</b>						
Tubo PVC 2" ventilación	Und	1,00		5.940,00	5.940,00	
SUBTOTAL MATERIALES					<b>5.940,00</b>	
<b>MANO DE OBRA</b>		Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit
M.O. AYUDANTE		37.239,07	1,85	68.892,00	4,00	17.223,00
M.O. OFICIAL		57.587,00	1,85	106.536,00	4,00	26.634,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					<b>43.857,00</b>	
<b>EQUIPO</b>						
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		43.857,00	2.193,00	
SUBTOTAL EQUIPO					<b>2.193,00</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>51.990,00</b>	

ITEM: NP3		Corte de árboles caídos				Unidad: UN
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. %	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
<b>MATERIALES</b>						
	Und				-	
SUBTOTAL MATERIALES					<b>-</b>	
<b>MANO DE OBRA</b>		Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit
M.O. AYUDANTE		37.239,07	1,85	68.892,00	1,50	45.928,00
M.O. OFICIAL		57.587,00	1,85	106.536,00	1,50	71.024,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					<b>116.952,00</b>	
<b>EQUIPO</b>						
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		116.952,00	5.848,00	
SUBTOTAL EQUIPO					<b>5.848,00</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>122.800,00</b>	



CONTRATO N°: 205 de 2023	ACTA N°: 1 Y DE LIQUIDACIÓN	FECHA CORTE: OCTUBRE 13 DE 2023
GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 22 DE 2023	FECHA VENCIMIENTO: DICIEMBRE 19 DE 2023
MUNICIPIO: NEIRA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 261.391.010,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 261.391.010,00
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	VALOR OBRA N°1: \$ 261.391.010,00	OBJETO OBRA GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS
CONTRATISTA: JI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA: OCTUBRE 19 DE 2023

Grupo XV Neira Reposición aducción en el sector detrás del campamento de Cementos Caldas K7+100 a K8+450 en el municipio de Neira, Caldas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJEC.	CANTIDAD		VR. TOTAL
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo	ml	1350	\$ 2.000	0,00	\$ -	1.350,00	\$ 2.720.000	101%	1.350,00	\$ 2.720.000	101%
3	Rocera y limpieza	m2	2700	\$ 4.839	0,00	\$ -	4.080,00	\$ 19.743.120	151%	4.080,00	\$ 19.743.120	151%
4	EXCAVACIONES	0			0,00	\$ -						
5	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m ancho 0.5 cm y H= 0.8 cm	m3	675	\$ 37.750	0,00	\$ -	742,56	\$ 28.031.640	110%	742,56	\$ 28.031.640	110%
6	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	660	\$ 31.745	0,00	\$ -	675,06	\$ 21.430.455	102%	675,06	\$ 21.430.455	102%
7	Dispersión de sobrantes	m3	50	\$ 30.000	0,00	\$ -	67,50	\$ 2.025.000	135%	67,50	\$ 2.025.000	135%
8	ACUEDUCTO	0			0,00	\$ -						
9	Empalmes a la red existente	Un	2	\$ 1.350.000	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.700.000	100%	2,00	\$ 2.700.000	100%
10	Instalación de Tubería de 10" polietileno por termo fusión. Incluye manejo de aguas y manipulación en el trazado	ml	1350	\$ 111.346	0,00	\$ -	1.350,00	\$ 150.317.100	100%	1.350,00	\$ 150.317.100	100%
11	Termo fusión de Reducciones de 10" x 8"	Un	2	\$ 670.000	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.340.000	100%	2,00	\$ 1.340.000	100%
12	Termo fusión de portaflanjes de 8"	Un	2	\$ 670.000	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.340.000	100%	2,00	\$ 1.340.000	100%
13	Anclajes y Tubería galv. De longitud 2 m de 2", diámetro con tortonones de alambre galv. Cal. 13	un	2	\$ 835.000	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.670.000	100%	2,00	\$ 1.670.000	100%
14	Sobre acarreo de tubería al hombro	Tubo	225	\$ 30.000	0,00	\$ -	225,00	\$ 6.750.000	100%	225,00	\$ 6.750.000	100%
15	Transporte de Tubería y accesorios desde Neira a sitio de la obra en vehículo	viajes	22	\$ 500.000	0,00	\$ -	11,00	\$ 5.500.000	50%	11,00	\$ 5.500.000	50%
16	Transporte de personal sitio	Día	45	\$ 315.000	0,00	\$ -	40,00	\$ 12.600.000	89%	40,00	\$ 12.600.000	89%
17	Profesional SISO	Mes	2	\$ 4.200.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP1	Suministro e instalación ventosas 1"	un		\$ 202.440	0,00	\$ -	5,00	\$ 1.012.200		5,00	\$ 1.012.200	
NP2	Suministro e instalación señales en tubería 2" aguas lluvias	un		\$ 70.161	0,00	\$ -	30,00	\$ 2.104.830		30,00	\$ 2.104.830	
NP3	Corte de árboles caídos	un		\$ 165.719	0,00	\$ -	12,00	\$ 1.988.628		12,00	\$ 1.988.628	

COSTO TOTAL \$ 261.391.010

\$ 261.391.010

\$ -

\$ 261.391.010

\$ 261.391.010

\$ 261.391.010

\$ 261.391.010



CONTRATO N°: 205 de 2023	ACTA N°: 1 Y DE LIQUIDACIÓN	FECHA CORTE: OCTUBRE 13 DE 2023
GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7-100 A K8+450. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 22 DE 2023	FECHA VENCIMIENTO: DICIEMBRE 19 DE 2023
MUNICIPIO: NEIRA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 261.391.010,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 261.391.010,00
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	VALOR OBRA N°1: \$ 261.391.010,00	OBJETO OBRA GRUPO XV NEIRA REPOSICIÓN ADUCCIÓN EN EL SECTOR DETRÁS DEL CAMPAMENTO DE CEMENTOS CALDAS K7+100 A K8+450. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS
CONTRATISTA: JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA: OCTUBRE 19 DE 2023

Grupo XV Neira Reposición aducción en el sector detrás del campamento de Cementos Caldas K7+100 a K8+450 en el municipio de Neira, Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	
	COSTO DIRECTO			193.694.709	0	0	193.607.242	0	193.607.242	0	
	ADMINISTRACION %	29		56.171.466	0	0	56.146.100	0	56.146.100	0	
	IMPREVISTOS %	0		0	0	0	0	0	0	0	
	UTILIDADES %	5		9.684.735	0	0	9.680.362	0	9.680.362	0	
	SUMA ANTES IVA			259.550.910	0	0	259.433.704	0	259.433.704	0	
	I. V. A. %	19		1.840.100	0	0	1.839.269	0	1.839.269	0	
	VALOR TOTAL OBRA			261.391.010	0	0	261.272.973	0	261.272.973	0	
	TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA						\$ 261.272.973		\$ 261.272.973		

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 261.391.010,0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL	\$ 261.272.973,0
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO	\$ -
SUMA Saldo del Contrato	\$ 261.272.973,0
	\$ 118.037,0
SUMAS IGUALES	\$ 261.391.010,0

JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.  
 R.L. JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA  
 Contratista

JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 Ingeniero de zona

CONTRATO N°:	205 DE 2023	PRE-ACTA:	1
CONTRATISTA:	JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	FECHA INICIACIÓN:	22 de agosto de 2023
INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA TERMINACION:	13 de octubre de 2023
FRENTE DE OBRA N°: 01			
Grupo XV Neira Reposición aducción en el sector detrás del campamento de Cementos Caldas K7+100 a K8+450 en el municipio de Neira, Caldas			

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y replanteo	m <sup>2</sup>		1360,00	1360,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
22	9			1360,00				1360,00	1360,00	
									1360,00	
									1360,00	
									1360,00	
									1360,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1360,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Roceria y limpieza	m <sup>2</sup>		4080,00	4080,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			ÁREA	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	UN	ACUMULADO	
22	9			1360,00	3		4080,00		4080,00	
									4080,00	
									4080,00	
									4080,00	
									4080,00	
									CANTIDAD DE PAGO	4080,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m ancho 0.5 cm y H= 0.8 cm	m <sup>3</sup>		742,56	742,56

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
22	9			1360,00	0,6	0,91	742,56		742,56	
									742,56	
									742,56	
									742,56	
									742,56	
									CANTIDAD DE PAGO	742,56

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m <sup>3</sup>		675,06	675,06

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
22	9			1360,00	0,60	0,91	742,56		742,56	
				-1350,00	0,05	1	-67,50		675,06	
									675,06	
									675,06	
									675,06	
									CANTIDAD DE PAGO	675,06



CONTRATO N°:	205 DE 2023	PRE-ACTA:	1
CONTRATISTA:	JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	FECHA INICIACIÓN:	22 de agosto de 2023
INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA TERMINACION:	13 de octubre de 2023

FRENTE DE OBRA N°: 01

Grupo XV Neira Reposición aducción en el sector detrás del campamento de Cementos Caldas K7+100 a K8+450 en el municipio de Neira, Caldas

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Dispersión de sobrantes	m3		67,50	67,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
22	9			1350,00	0,05	1	67,50	67,50		
								67,50		
								67,50		
								67,50		
								67,50		
									CANTIDAD DE PAGO	67,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Empalmes a la red existente	Un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			REPITE	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANT	UD	ACUMULADO	
22	9			2				2	2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Instalación de Tubería de 10" polietileno por termo fusión. Incluye manejo de aguas y manipulación en el trazado	ml		1350,00	1350,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			REPITE	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANT	ML	ACUMULADO	
22	9			1350				1350	1350	
									1350,00	
									1350,00	
									1350,00	
									1350,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1350,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Termo fusión de Reducciones de 10" x 8"	Un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			REPITE	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANT	M3	ACUMULADO	
22	9			2				2	2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

CONTRATO N°:	205 DE 2023	PRE-ACTA:	1
CONTRATISTA:	JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	FECHA INICIACIÓN:	22 de agosto de 2023
INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA TERMINACION:	13 de octubre de 2023

FRENTE DE OBRA N°: 01

Grupo XV Neira Reposición aducción en el sector detrás del campamento de Cementos Caldas K7+100 a K8+450 en el municipio de Neira, Caldas

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Termo fusión de de portaflanches de 8"	Un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
22	9			2,00				2,00	2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	Anclajes y Tubería galv. De longitud 2 m de 2". diámetro con tortonos de alambre galv. Cal. 13	un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
22	9			2,00				2,00	2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Sobre acarreo de tubería al hombro	Tubo		225,00	225,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UD	ACUMULADO	
22	9			225,00				225,00	225,00	
									225,00	
									225,00	
									225,00	
									225,00	
									CANTIDAD DE PAGO	225,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Transporte de Tubería y accesorios desde Neira a sitio de la obra en vehiculo	viajes		11,00	11,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DIAMETRO	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	pulgadas	UD	ACUMULADO	
22	9			11,00				11,00	11,00	
									11,00	
									11,00	
									11,00	
									11,00	
									CANTIDAD DE PAGO	11,00

CONTRATO N°: 205 DE 2023	PRE-ACTA: 1
CONTRATISTA: JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	FECHA INICIACIÓN: 22 de agosto de 2023
INTERVENTORIA: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA TERMINACIÓN: 13 de octubre de 2023

FRENTE DE OBRA N°: 01

**Grupo XV Neira Reposición aducción en el sector detrás del campamento de Cementos Caldas K7+100 a K8+450 en el municipio de Neira, Caldas**

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Transporte de personal sitio	Día		40,00	40,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DIAMETRO	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	pulgadas	UD	ACUMULADO	
22	9			40,00				40,00	40,00	
									40,00	
									40,00	
									40,00	
									40,00	
									CANTIDAD DE PAGO	40,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
17	Profesional SISO	Mes		0,00	0,00




FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DIAMETRO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	pulgadas	UN	ACUMULADO	
22	9								0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP1	Suministro e instalación ventosas 1"	un		5,00	5,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DIAMETRO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	pulgadas	UN	ACUMULADO	
22	9			5,00				5,00	5,00	
									5,00	
									5,00	
									5,00	
									5,00	
									CANTIDAD DE PAGO	5,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP2	Suministro e instalación señales en tubería 2" aguas lluvias	un		30,00	30,00


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DIAMETRO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	pulgadas	UN	ACUMULADO	
22	9			30,00				30,00	30,00	
									30,00	
									30,00	
									30,00	
									30,00	
									CANTIDAD DE PAGO	30,00

<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>	<b>CONTROL CANTIDADES DE OBRA</b> <b>INFORME PARA PAGO</b>	  
---	---	---

CONTRATO N°: 205 DE 2023	PRE-ACTA: 1
CONTRATISTA: JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	FECHA INICIACIÓN: 22 de agosto de 2023
INTERVENTORIA: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA TERMINACION: 13 de octubre de 2023
FRENTE DE OBRA N°: 01	
<b>Grupo XV Neira Reposición aducción en el sector detrás del campamento de Cementos Caldas K7+100 a K8+450 en el municipio de Neira, Caldas</b>	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP3	Corte de árboles caídos	un		12,00	12,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DIAMETRO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	pulgadas	UN	ACUMULADO	
22	9			12,00				12,00	12,00	
									12,00	
									12,00	
									12,00	
									12,00	
									CANTIDAD DE PAGO	12,00

  
**JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**  
 R.L. JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA  
 Contratista

  
**JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA**  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 Ingeniero de zona

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

20-10-2023 20-10-2023 FEJJ FEJJ1 Factura electrónica 901709735 JJ INGENIERIA Y CO... 890603239 EMPOCALDAS S.A. E.... Aprobado con notificación 5261,272,973 Factura Electrónica
