

F-GC-22 Versión 10 Junio 2020		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA				
# CONTRATO Y AÑO	0201 de 2019	Acta Nº	08 parcial	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	1.011.875.765	
				2. VALOR ADICION	130.044.251	
CONTRATISTA	CONSORCIO CALDAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.141.920.016	
NIT O CC:	901.313.238-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	924.021.804	
CDP (#, rubro y fecha)	00179 DE ENERO 14 DE 2020 00491 DE MAYO 29 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	111.720.031	
RP (#, rubro y fecha)	000144 DE ENERO 14 DE 2020 000512 DE JUNIO 4 DE 2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	106.178.181	
OBJETO DEL CONTRATO:	Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas					
TIPO DE RECURSOS	Credito 10,000 millones 2019	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS					<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					X	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X	
15- Acta de convenio de Precios No 2					X	
16- Copia Acta					X	
17- Preactas de obra					X	
<p>Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.</p> <p>Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.</p>						
NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FIRMA			
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA					<input checked="" type="checkbox"/>	
Factura original o Documento equivalente					X	
Acta original					X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)					X	
Fecha de presentación			9/06/2020			
DATOS DEL SUPERVISOR						
LUIS FERNANDO ARIAS		INGENIERO ZONA OCCIDENTE		LUIS FERNA		
NOMBRE		CARGO		FIRMA		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS						
37300012441		CORRIENTE		BANCOLOMBIA		
CUENTA		TIPO DE CUENTA		BANCO		

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text notes that without clear documentation, it becomes difficult to track expenses and revenues, which can lead to misunderstandings and disputes.

2. The second section focuses on the role of technology in modern record-keeping. It highlights how digital tools and software solutions have revolutionized the way data is stored and accessed. These technologies not only improve efficiency but also reduce the risk of human error and data loss. The document suggests that organizations should invest in reliable digital systems to ensure their records are secure and easily retrievable.

3. The third part of the document addresses the legal and regulatory requirements surrounding record-keeping. It explains that various industries and jurisdictions have specific rules regarding how long records must be kept and how they should be managed. Compliance with these regulations is crucial to avoid legal penalties and ensure that the organization's practices are up to date with current standards.

4. The final section discusses the importance of regular audits and reviews of the record-keeping process. It states that periodic checks help identify any gaps or weaknesses in the system and allow for timely corrections. This proactive approach ensures that the record-keeping process remains effective and continues to meet the organization's needs over time.



CONSORCIO CALDAS

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
La Ciudad

CERTIFICADO

El suscrito **EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE**, identificado con cedula de ciudadanía No 71.607.468, actuando como representante legal del **CONSORCIO CALDAS**, identificado con NIT N° 901.313.238-8, hago constar que dicho consorcio ha dado cumplimiento al pago de aportes al sistema de salud (EPS, Fondos de Pensiones y ARL) así como los aportes parafiscales (Caja de Compensación familiar) encontrándose a paz y salvo por estos conceptos al 7 de JULIO de 2020.

Atentamente,

Ing. EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
REPRESENTANTE LEGAL


CALLE 68 28 29 BARRIO PALERMO, MANIZALES

Cel. 3188382078 E-mail: fabio-ing@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sicursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENa e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social											
MTI 90131228	3	CONDORCHO CALDAS	CONDORCHO CALDAS	CONDORCHO CALDAS	CONDORCHO CALDAS	CALLE 68 NO 29	MARIQUELES-CALDAS	8709909					3
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Pila		Pila Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Plazilla	Plazilla	Limite								
202002	202002	3733605	90400465	90400465	20200370	CONDORCHO CALDAS	CONDORCHO CALDAS	10					\$586.200

Nro.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
						IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias									
1	CC 054982033	ALZATE ALVARO JOHN ERNESTO	23001	4	\$122,041	\$122,041	\$122,041	EP2002	4	\$5,200	\$5,200	CCF11	4	\$18,044	\$18,044	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	14-11	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700
2	CC 054991180	BERNIA INDIOLE JHAI BEGO	23001	7	\$115,875	\$115,875	\$115,875	EP2002	7	\$8,700	\$8,700	CCF11	7	\$23,423	\$23,423	EP2002	7	\$8,700	\$8,700	EP2002	7	\$8,700	14-11	7	\$8,700	\$8,700	EP2002	7	\$8,700	\$8,700	EP2002	7	\$8,700	\$8,700
3	CC 0561624916	CHAVEZ VARGAS ELY REDNER	23001	4	\$128,041	\$128,041	\$128,041	EP2002	4	\$5,200	\$5,200	CCF11	4	\$18,044	\$18,044	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	14-11	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700
4	CC 75146445	CARDONIA CASTAÑERA JHAI BEGO	23001	7	\$105,859	\$105,859	\$105,859	EP2002	7	\$16,300	\$16,300	CCF11	7	\$40,560	\$40,560	EP2002	7	\$16,300	\$16,300	EP2002	7	\$16,300	14-11	7	\$16,300	\$16,300	EP2002	7	\$16,300	\$16,300	EP2002	7	\$16,300	\$16,300
5	CC 80411503	DELGADO BENA MARILU AGUIA	23001	5	\$157,301	\$157,301	\$157,301	EP2002	5	\$6,300	\$6,300	CCF11	5	\$17,301	\$17,301	EP2002	5	\$6,300	\$6,300	EP2002	5	\$6,300	14-11	5	\$6,300	\$6,300	EP2002	5	\$6,300	\$6,300	EP2002	5	\$6,300	\$6,300
6	CC 804202715	HERRERA LEONARDO LEONARDO	23001	7	\$235,468	\$235,468	\$235,468	EP2002	7	\$15,500	\$15,500	CCF11	7	\$43,500	\$43,500	EP2002	7	\$15,500	\$15,500	EP2002	7	\$15,500	14-11	7	\$15,500	\$15,500	EP2002	7	\$15,500	\$15,500	EP2002	7	\$15,500	\$15,500
7	CC 104497939	HERRERA ESTEFAN JORDES ESTEFAN	23001	4	\$128,041	\$128,041	\$128,041	EP2002	4	\$5,200	\$5,200	CCF11	4	\$18,044	\$18,044	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	14-11	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700
8	CC 1417205	ROSALES GALIÑO JOSE FERNANDO	23001	4	\$122,041	\$122,041	\$122,041	EP2002	4	\$5,200	\$5,200	CCF11	4	\$18,044	\$18,044	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	14-11	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700
9	CC 105494676	EDMUNDO PINO JHAI BEGO	23001	7	\$105,859	\$105,859	\$105,859	EP2002	7	\$16,300	\$16,300	CCF11	7	\$40,560	\$40,560	EP2002	7	\$16,300	\$16,300	EP2002	7	\$16,300	14-11	7	\$16,300	\$16,300	EP2002	7	\$16,300	\$16,300	EP2002	7	\$16,300	\$16,300
10	CC 105497948	TACONILLA ENRIQUE JHAI BEGO	23001	4	\$122,041	\$122,041	\$122,041	EP2002	4	\$5,200	\$5,200	CCF11	4	\$18,044	\$18,044	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	14-11	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700	EP2002	4	\$9,700	\$9,700
Total Afiliados (10)					\$1,876,286	\$1,876,286	\$1,876,286			\$299,600	\$299,600			\$1,876,286	\$1,876,286			\$75,500	\$75,500			\$1,876,286			\$1,876,286	\$1,876,286			\$1,876,286	\$1,876,286			\$1,876,286	\$1,876,286

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOSE INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								10		\$299,600				\$2,300			\$301,900
CCPENSIONES		23-14		900,336,004	7			1		\$20,500				\$200			\$20,700
PORTAJE		230001		800,224,808	8			7		\$176,400				\$1,300			\$177,700
PROTECCION		230001		800,229,739	0			2		\$102,700				\$800			\$103,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11		690,903,790	5			10		\$130,900				\$1,000			\$131,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF11		860,806,490	5			10		\$75,500				\$600			\$76,100
COMPLEMENTOS		CCF11		860,806,490	5			10		\$75,500				\$600			\$76,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)		EPS062		900,935,126	7			3		\$19,100				\$300			\$19,400
ASMET SALUD EPS SAS		EPS044		900,097,473	5			1		\$4,100				\$150			\$4,250
MEDIMAS EPS		EPS037		900,156,264	2			4		\$35,400				\$300			\$35,700
NUOVA E.P.S.		EPS002		800,130,997	4			2		\$14,700				\$200			\$14,900
SALUD TOTAL								10		\$299,600				\$2,300			\$301,900



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sicursal Principal		Dirección		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación:	dv	Miembro Social		CONTRATO GRUPO 1000		CALLE 68 NO. 28-20		MANIZALES, CALDAS		9100460		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor			
Periodo:	2020-04	Clave:	91018979	Platilla:	2020/04/13	Pago:	2020/04/13	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Valor:	\$1,930,400		

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Dias	Aporte	Code	Dias	Aporte	Code	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	
1	CC 105498039	ALZATE MARIANO JOHN EDISON	23001	30	\$877,803	\$140,500	\$877,803	EP500	30	\$877,803	\$15,200	CEP11	30	\$17,803	\$15,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	30	\$0
2	CC 105499108	BENICIA RODRIGUEZ JESSICA	23001	30	\$877,803	\$140,500	\$877,803	EP502	30	\$877,803	\$15,200	CEP11	30	\$17,803	\$15,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	30	\$0
3	CC 1061654916	LACRUZ JESSICA EVELINER	23001	30	\$877,803	\$140,500	\$877,803	EP503	30	\$877,803	\$15,200	CEP11	30	\$17,803	\$15,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	30	\$0
4	CC 1514644X	CARBONA CASTAÑEDA JUAN MICO	23001	30	\$1,458,000	\$254,400	\$1,458,000	EP503	30	\$1,458,000	\$46,000	CEP11	30	\$1,600,000	\$46,000	14-11	30	\$1,600,000	\$114,500	30	\$0	30	\$0
5	CC 2034193X	DELGADO ROSA MARIA ROSANA	23001	30	\$877,803	\$140,500	\$877,803	EP504	30	\$877,803	\$15,200	CEP11	30	\$17,803	\$15,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	30	\$0
6	CC 110578548	GALVE GRANADA ROSARIO ANDRES	23101	28	\$819,233	\$131,100	\$819,233	EP504	28	\$819,233	\$12,800	CEP11	28	\$19,283	\$12,800	14-11	28	\$819,233	\$57,100	28	\$0	28	\$0
7	CC 104997708	HERANJUEZ VAQUEZ YHOIT LEAUBRO	23101	30	\$857,803	\$153,300	\$857,803	EP503	30	\$857,803	\$19,600	CEP11	30	\$19,603	\$19,600	14-11	30	\$857,803	\$64,700	30	\$0	30	\$0
8	CC 1604527	JARAMILLO JHON EDISON	23001	20	\$345,100	\$91,700	\$345,100	EP502	20	\$345,100	\$21,300	CEP11	20	\$19,200	\$21,300	14-11	20	\$345,100	\$40,200	20	\$0	20	\$0
9	CC 103497936	JIMENEZ RESTREPO ANDRES ESTEBAN	23001	3	\$87,781	\$14,100	\$87,781	EP507	3	\$87,781	\$3,600	CEP11	3	\$8,781	\$3,600	14-11	3	\$87,781	\$6,200	3	\$0	3	\$0
10	CC 15144303	LOPEZ MARRIQUAN CARLOS ALBERTO	23001	7	\$204,811	\$32,800	\$204,811	EP502	7	\$204,811	\$8,200	CEP11	7	\$204,811	\$8,200	14-11	7	\$204,811	\$48,300	7	\$0	7	\$0
11	CC 18999028	MONTES ZONATES ALDO CESAR	25-1A	26	\$868,542	\$153,800	\$868,542	EP504	26	\$868,542	\$34,900	CEP11	26	\$48,542	\$34,900	14-11	26	\$868,542	\$59,100	26	\$0	26	\$0
12	CC 4417405	MORALES GALLEGO JOSE FRANCISCO	25-14	30	\$877,803	\$140,500	\$877,803	EP502	30	\$877,803	\$15,200	CEP11	30	\$17,803	\$15,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	30	\$0
13	CC 411424	ORRIGO ROSA ALIBO	13001	28	\$819,283	\$131,100	\$819,283	EP502	28	\$819,283	\$12,800	CEP11	28	\$19,283	\$12,800	14-11	28	\$819,283	\$57,100	28	\$0	28	\$0
14	CC 105494679	OSORHO CHICA JUAN DAVID	23001	30	\$877,803	\$140,500	\$877,803	EP507	30	\$877,803	\$15,200	CEP11	30	\$17,803	\$15,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	30	\$0
15	CC 105447008	PASCION CHICA LUIS HOU FREDY	23001	30	\$877,803	\$140,500	\$877,803	EP502	30	\$877,803	\$15,200	CEP11	30	\$17,803	\$15,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	30	\$0
16	CC 104983347	PEREZ PEREZ ANDRES FELIPE	23002	19	\$555,942	\$89,000	\$555,942	EP505	19	\$555,942	\$22,300	CEP11	19	\$55,942	\$22,300	14-11	19	\$555,942	\$18,700	19	\$0	19	\$0
Total Afiliados (16)					\$12,673,279	\$2,028,400	\$12,673,279			\$12,673,279	\$608,000			\$12,673,279	\$608,000			\$12,673,279	\$692,600			\$0	\$0

[Handwritten signature]

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DIV	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/HORA	SALDOSE INDEBIDAS	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$2,028,400	\$1,600	\$0	\$2,030,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$131,700	\$100	\$0	\$131,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$276,300	\$200	\$0	\$276,500
PORVENIR	230201	800,224,808	8	8	\$889,900	\$700	\$0	\$890,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$731,100	\$600	\$0	\$731,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$982,600	\$700	\$0	\$983,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$682,600	\$700	\$0	\$683,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$508,000	\$400	\$0	\$508,400
CONFAMILIARES	CCF1	890,806,490	5	16	\$508,000	\$400	\$0	\$508,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	\$508,000	\$700	\$0	\$508,700
ASMET SALUD EPS SAS	ES5062	900,935,126	7	5	\$146,600	\$200	\$0	\$146,800
MEDIAS EPS	EP5044	901,097,473	5	2	\$66,000	\$100	\$0	\$66,100
MEDIAS MOVILIDAD	EP5045	901,097,473	5	2	\$56,300	\$100	\$0	\$56,400
NEUA E.P.S.	EP5037	900,156,764	2	5	\$163,500	\$200	\$0	\$163,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$73,600	\$100	\$0	\$73,700
TOTAL				16	\$3,972,600	\$3,400	\$0	\$3,976,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	SI
MT 90131228	8	CONSORCIO CALDAS	B MENOS DE 200 CONTRATANTES	CONTRATO CHINGANA	CALLE 48 NO 28 25	MANIZALES-CALDAS	8999098		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Valor		
2020-05	18799664	940501618	E	2020/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	2020/06/02	\$1,959,100		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INGRACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP ADMINISTRADORAS: 4)									
COLONOS	231001	800,227,940	6	2	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400	
COBENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$52,400	\$0	\$0	\$52,400	
PROVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$170,100	\$0	\$0	\$170,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$51,800	\$0	\$0	\$51,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$760,000	\$0	\$0	\$760,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,990	5	11	\$434,400	\$0	\$0	\$434,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
ASAFET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$73,600	\$0	\$0	\$73,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$48,500	\$0	\$0	\$48,500	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$33,100	\$0	\$0	\$33,100	
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,700	\$0	\$0	\$104,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$177,100	\$0	\$0	\$177,100	
TOTAL				11	\$1,959,100	\$0	\$0	\$1,959,100	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 901313238

Primer Nombre ó Razón Social: CONSORCIO CALDAS

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): 8

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 68 NO 28.29

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 3147949974

Correo electrónico: seguridadcaldaskronos@gmail.com

Código SIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0201

Nombre Obra: REPOSI REDES ACUEDU Y ALCANTA

Fecha Inicio Obra: 01/08/2019

Fecha Terminación Obra: 31/03/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: CHINCHINA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2020

Mes Periodo a Pagar: FEBRERO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$749,815,313.00

Costo Total Mano de Obra: \$1,870,286.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 10

Valor Intereses Moratorios: \$5,600.00

Aporte FIC: \$219,451.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$219,451.00

Total Pagado: \$225,051.00

Valor Total: \$225,100.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 02/06/2020 07:39:33 p.m.

2

2

2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 901313238

Primer Nombre ó Razón Social: **CONSORCIO CALDAS**

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): 8

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 68 NO 28 29

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 31-47949974

Correo electrónico: seguridadcaldaskronos@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0201

Nombre Obra: REPOSI REDES ACUDUCTO Y ALCANT

Fecha Inicio Obra: 01/08/2019

Fecha Terminación Obra: 31/05/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: CHINCHINA

Tipo FIC: Mensual

Año Período a Pagar: 2020

Mes Período a Pagar: MARZO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$749,815,313.00

Costo Total Mano de Obra: \$12,673,279.00

Número de Trabajadores en el Período: 16

Valor Intereses Moratorios: \$2,300.00

Aporte FIC: \$351,121.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$351,121.00

Total Pagado: \$353,421.00

Valor Total: \$353,450.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 02/06/2020 07:43:29 p.m.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 901313238

Primer Nombre ó Razón Social: CONSORCIO CALDAS

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): 8

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 68 NO 28 29

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 3147949974

Correo electrónico: seguridadcaldaskronos@gmail.com

Código SIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0201

Nombre Obra: REPOSI REDES ACUDUCTO Y ALCANT

Fecha Inicio Obra: 01/08/2019

Fecha Terminación Obra: 30/06/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: CHINCHINA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2020

Mes Periodo a Pagar: MAYO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$749,815,313.00

Costo Total Mano de Obra: \$10,911,836.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 11

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$241,396.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$241,396.00

Total Pagado: \$241,396.00

Valor Total: \$241,400.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 02/06/2020 07:45:44 p.m.



**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 896299034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET
66114257

FECHA DE EXPEDICIÓN
02 06 2020

FECHA VENCIMIENTO
07 06 2020

Nombre ó Razón Social : CONSORCIO CALDAS **Identificación :** 901313238
Dirección : CALLE 68 NO 28 **Teléfono :** 3147949974

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-20-7-1 Caldas		
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$353,450.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$353,450.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de las formulas de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeleras químicas tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6722312(3900)000000353450(96)20200607

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 66114257

Ciudad: [] [] [] Nit o Cédula: 901313238 Teléfono: []

Nombre del Pagador (Cliente): **CONSORCIO CALDAS**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL



ÁREA PARA SELLO

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899898034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
66114297		
FECHA DE EMISIÓN		
02	06	2020
FECHA VENCIMIENTO		
07	06	2020

Nombre ó Razón Social: CONSORCIO CALDAS **Identificación:** 901313238

Dirección: CALLE 68 NO 28 **Teléfono:** 3147949974

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0089000110186 FECHA: 29/06/04 HORA: 10:10:07 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 89 TOTAL EFE: \$ 241,400.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 241,400.00 NRG. FACTURA 6722316	VALOR FACTURA \$ 241,400.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$241,400.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$241,400.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada uno de ellas



(415)7707012100010(8020)6722316(3900)00000241400(96)20200607

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 66114297

Ciudad: D: M: A: Nit o Cedula: 901313238 Teléfono:

Nombre del Pagador / Cliente: **CONSORCIO CALDAS**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

11

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899599034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET		
66114204		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
02	06	2020
FECHA VENCIMIENTO		
07	06	2020

Nombre ó Razón Social : CONSORCIO CALDAS	Identificación : 901313238
Dirección : CALLE 68 NO 28	Telefono : 3147949974

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0059000118888 FECHA: 20/06/04 HORA: 10:08:37 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 82 TOTAL EFE: \$ 225,100.00 TOTAL CHG: \$ 0.00 TOTAL: \$ 225,100.00		
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS.	IMP. FACTURA 6722309	IMP. FACTURA \$ 225,100.00
	SUBTOTAL	\$225,100.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$225,100.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)6722309(3900)00000225100(96)20200607



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66114204

Ciudad	DE	AM	A	Nit o Cedula	901313238	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO CALDAS						
CHEQUE NO.	CUENTA NO.	CONCEPTO		VALOR		

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
		CHEQUE
		TOTAL

ÁREA PARA SELLO

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]



CONSORCIO CALDAS

NIT: 901.313.238-8 Responsable de IVA

Calle 68 No. 28-29 • CEL: 318 838 2078
Manizales

FACTURA DE VENTA

Nº 12

fabio-ing@hotmail.com

CONSORCIO CALDAS

DIA	MES	AÑO	CLIENTE
7	7	2020	Empocaldas S.A E.S.P
NIT.	DIRECCIÓN:		TELÉFONO
890.803.239-9	Cra 23 No 75-82		8867080
			CIUDAD
			Manizales

REF.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Acta Parcial No 6 del contrato de obra No 0201 - 2019		
	Costo Directo		82.786.240
	Administración 24%		19.868.698
	Imprevistos 5%		4.139.312
	Utilidad 5%		4.139.312
		SUBTOTAL \$	110.933.562
		I.V.A. \$	786.469
		TOTAL \$	111.720.031


Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a un Título Valor. Según Ley 1231 de Julio de 2008.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762016390720 • Fecha: 2019/08/21 • Autoriza desde el No. 1 hasta el No. 50 • Vigencia: 18 meses

Fabio Ing

CLIENTE - C.C. Nº

Vendedor - C.C. Nº

Impresos AGUARO GERRAN DE J. CARDONA VELEZ NIT: 4.471.239-9 Tel: 8840542 Manizales.



Condiciones ambientales: día seco

~~15/01~~
- Túnel: Se inicia instalación de sellos de juntas de pavimento.

Enero 25 de 2020

- Túnel: Se finaliza la instalación de sellos de junta de pavimento. 90%

Condiciones ambientales: día seco

Enero 27 de 2020

El único frente pendiente por intervenir (Calle 13 entre Carreras 7 y 4) queda suspendido físicamente pues el contratista de la Alcaldía no ha iniciado demoliciones en este frente de trabajo. Es importante mencionar que a la fecha la entidad contratante

Norma

158

1

5

6

(EMPRESAS) No ha sido respuesta a la solicitud de
suspensión redactada el día 16 de Enero de 2020

John Nelson S.

Febrero 24 de 2020.

Calle 13 entre Carreras 7 y 6; Se inician
labores de excavación en brecha para
tubo de alcantarillado de 12"

Calle 13 entre Carreras 6 y 5 (hasta bomba); el
contratista de la Alcaldía inicia labores de demolición.
Condiciones Ambientales: Tiempo Seco




Febrero 25 de 2020

Calle 13 entre Carreras 7 y 6; Continúan las labores de
excavación en brecha para el principal de alcantarillado
de 12". Se da inicio a las excavaciones para
demoliciones de alcantarillado de 6"

Calle 13 entre Carreras 6 y 5 (media cuadra); Contratista de
la Alcaldía entrega este tiempo demolido pero ocasionó
daño en red de queueducto y NO entrega reparado.

Condiciones Ambientales: Tiempo Seco

John Nelson S.

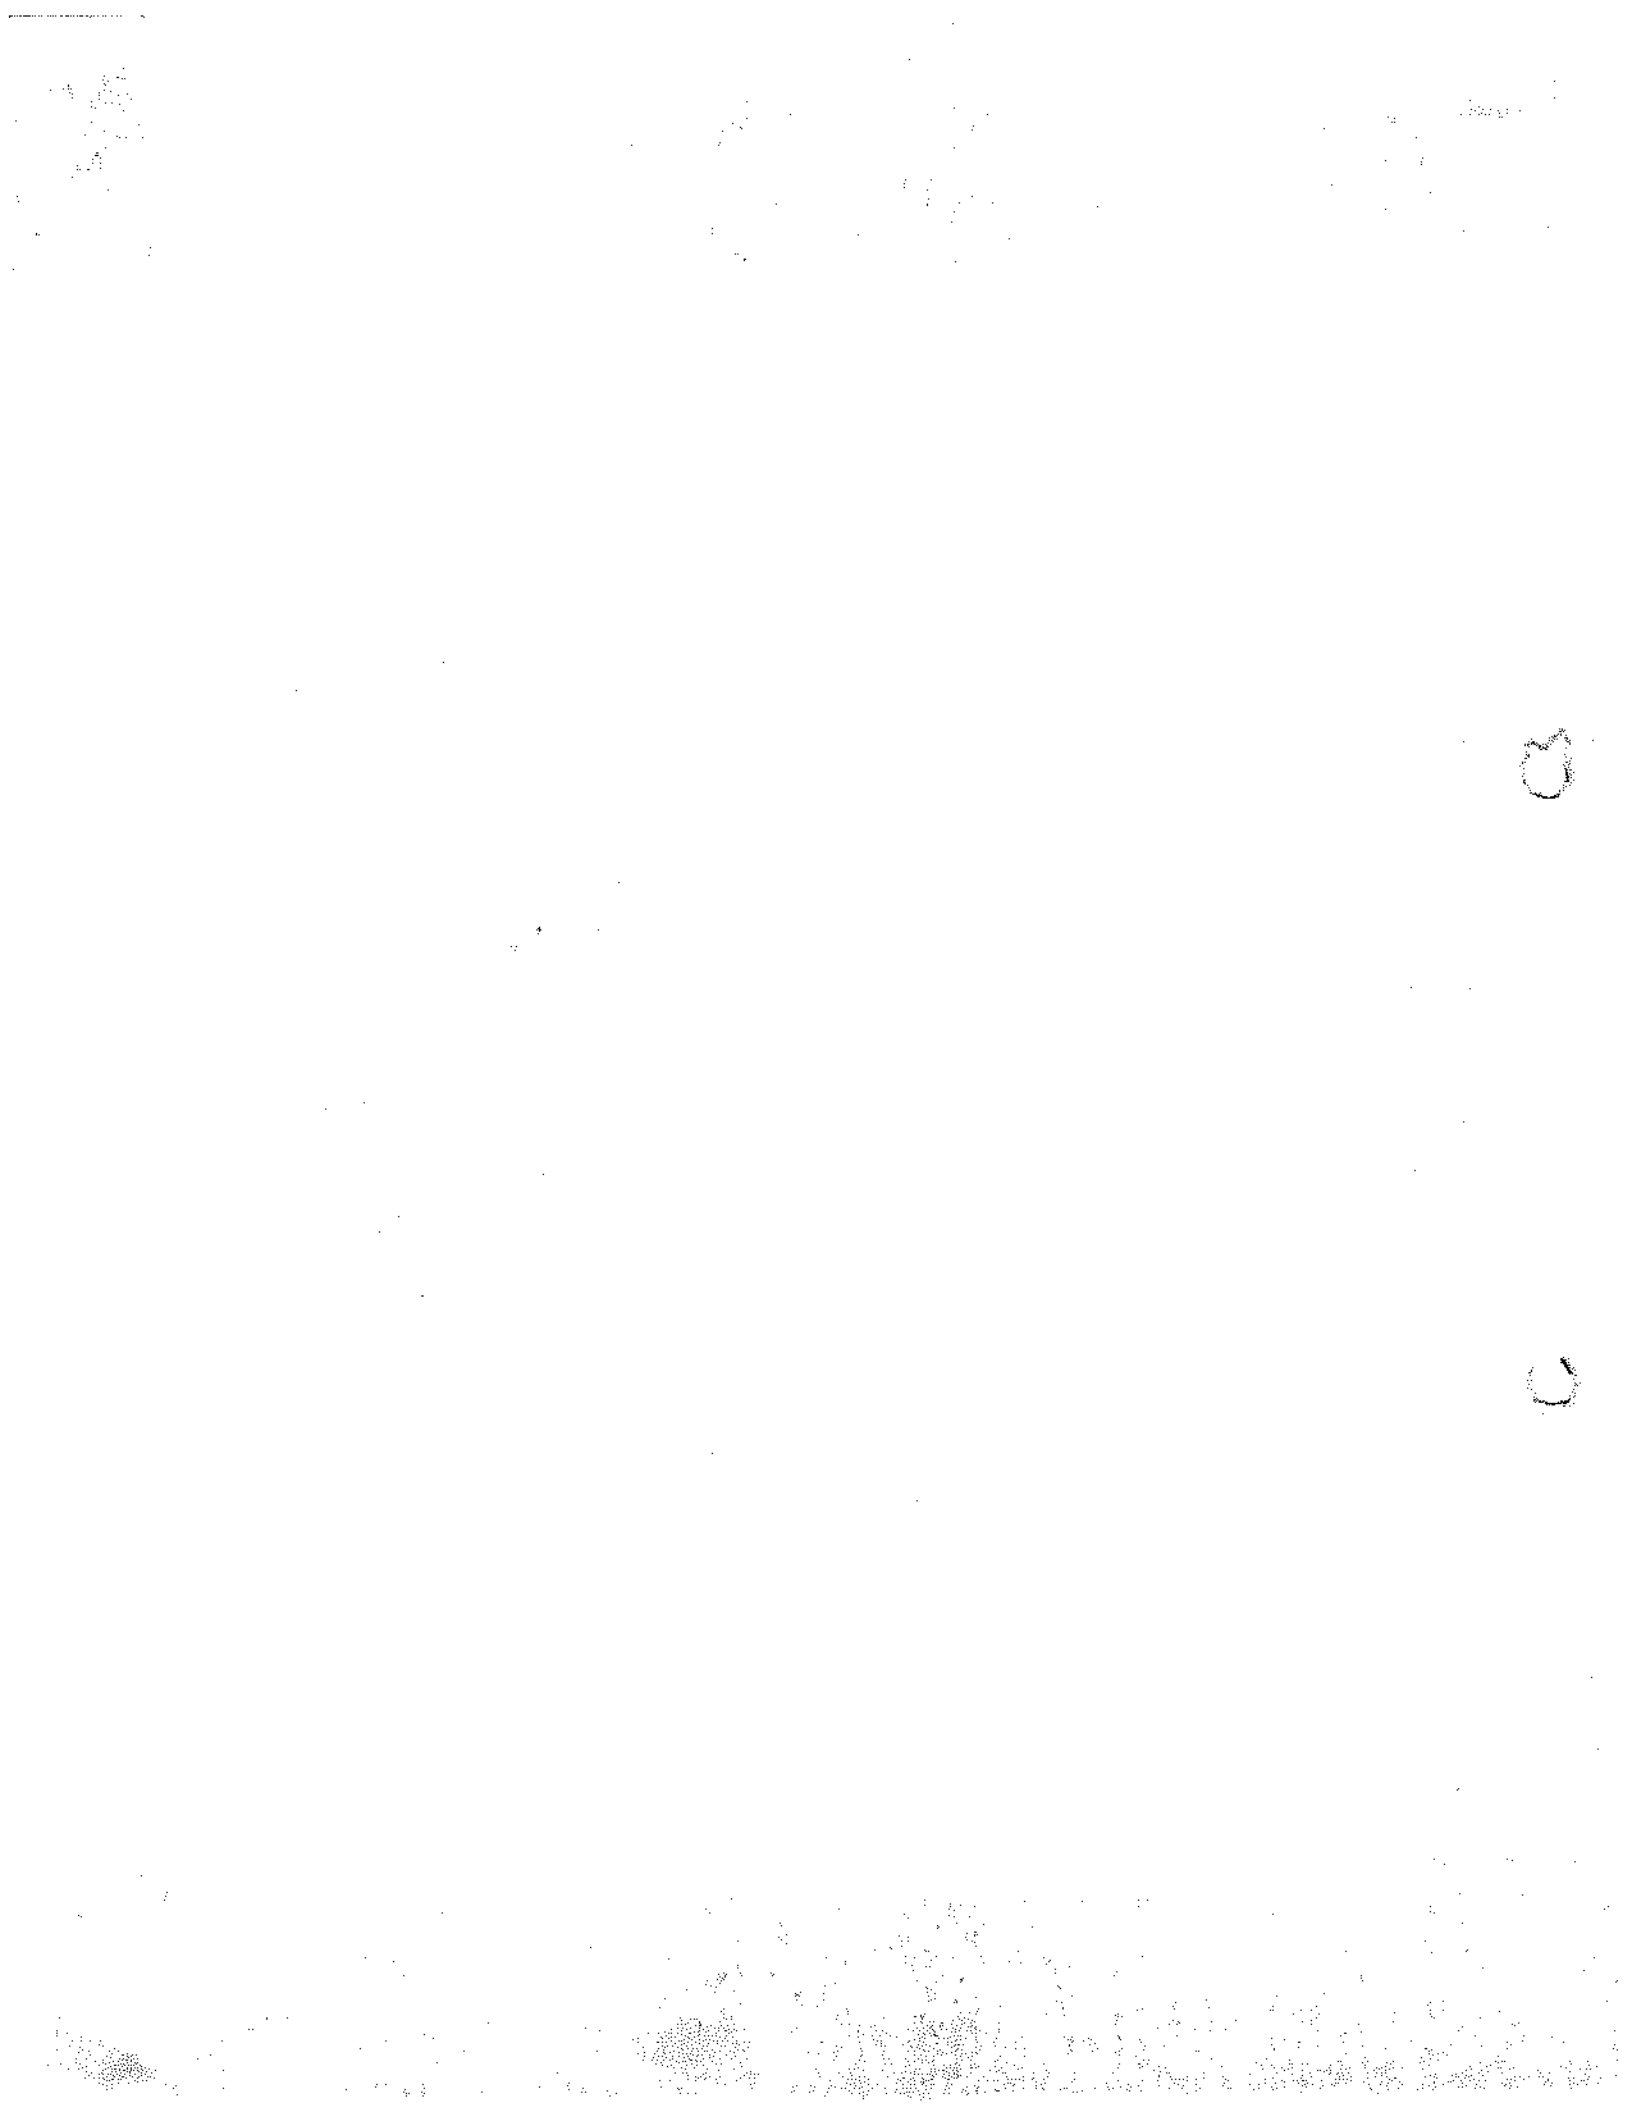


Febrero 26 de 2020:

- Calle 13 entre Carr 7 y 6: se construye puente peatonal en materia frente a Cepilladora La Palma.
Se culmina tramo de excavación sobre la red ppal, se empieza a instalar tuberías de 12" de la cámara existente sobre Calle 13 Cra 6 hacia cámara 7.
- Condiciones Ambientales: se presentan lluvias moderadas.

Febrero 27 de 2020:

- Calle 13 entre Carreras 7 y 6: Se realiza llero sobre primer tubo de 12" instalado.
Continúan los excavaciones para red principal y domiciliarias.
- Calle 13 entre Carreras 6 y 5 (media cuadra):
Se da inicio a la excavación para red principal de alcantarillado de 24".
- Condiciones Ambientales: Se presentan lluvias moderadas durante todo el día.

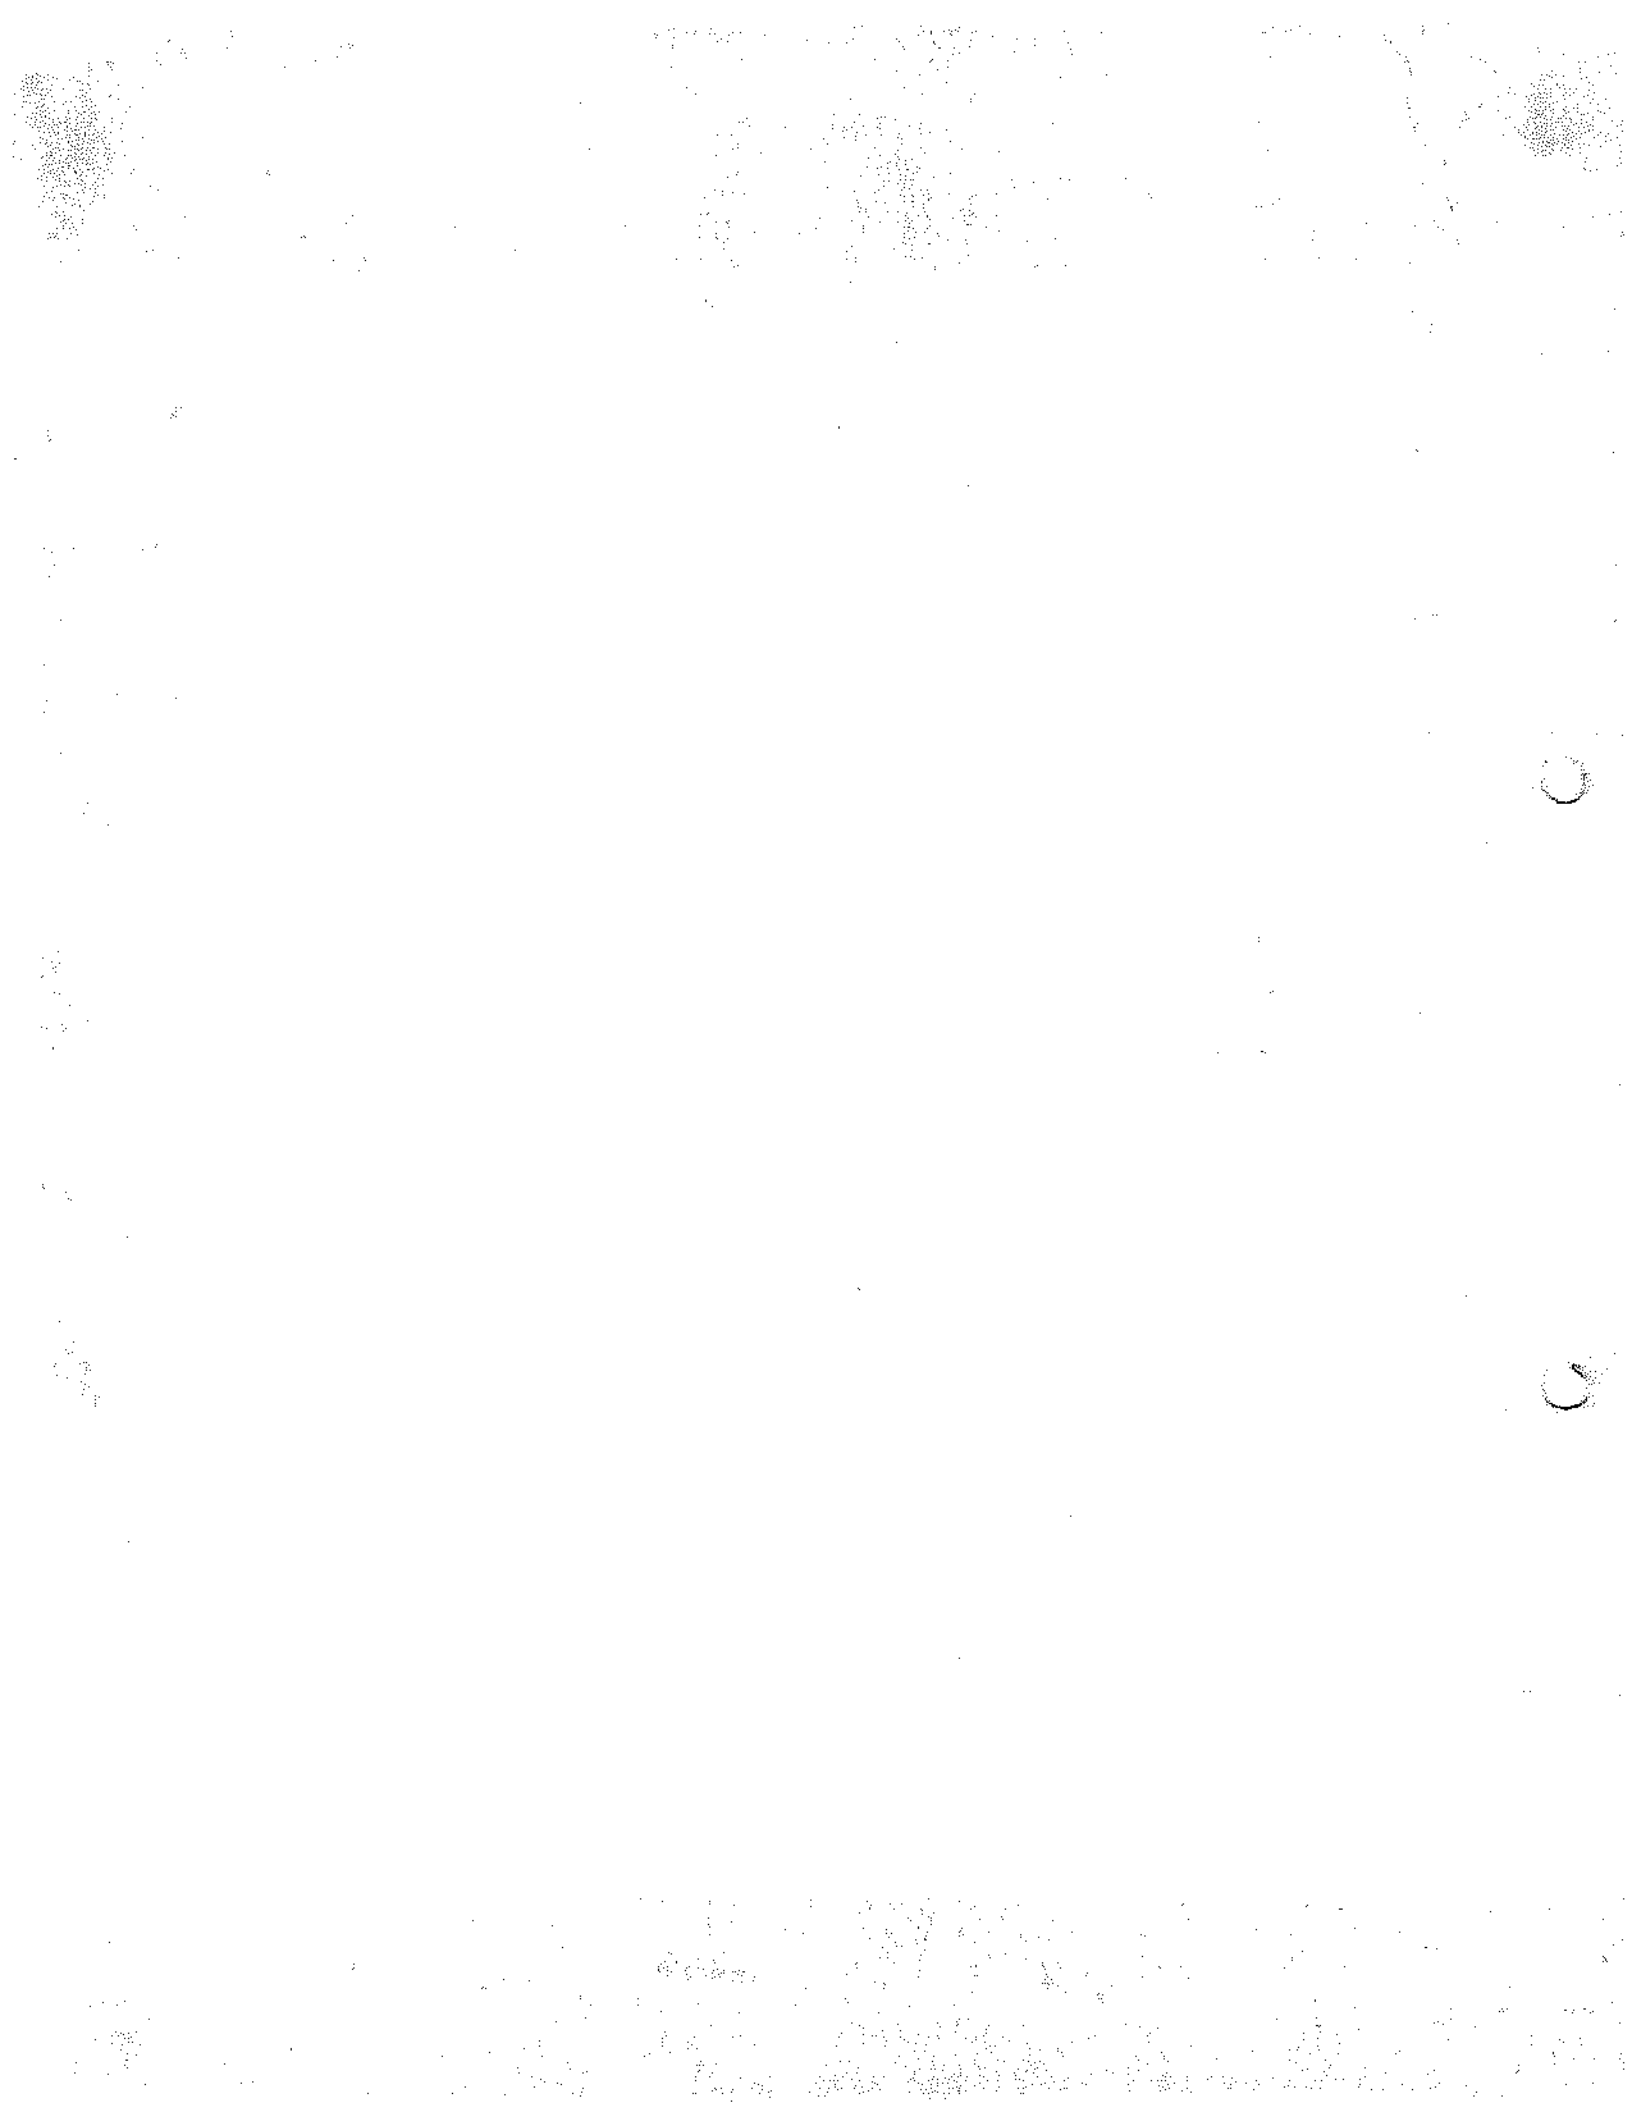

Febrero 28 2020


CL 13 entre Carreras 7 y 6: Continua la instalacion de tuberia red principal 12" haciendo sustitucion con grava de acuerdo a las instrucciones del Ing Abel Rojas, se inicia excavacion para acometidas, se instala entibado en brecha red principal.

CL 13 entre Cl 6 y 5 (media cuadra)
Continua instalacion red principal e instalacion entibado, se presenta lluvias moderadas en la tarde.

Febrero 29 de 2020

CL 13 entre Carreras 7 y 6: Continua instalacion red principal 12", continua sustitucion con grava e inicio llenos, continua excavacion para acometidas.

CL 13 entre Carrera 6 y 5 (media cuadra): continua excavacion red principal 24" e instalacion entibado. Se presentan lluvias moderadas en la mañana.

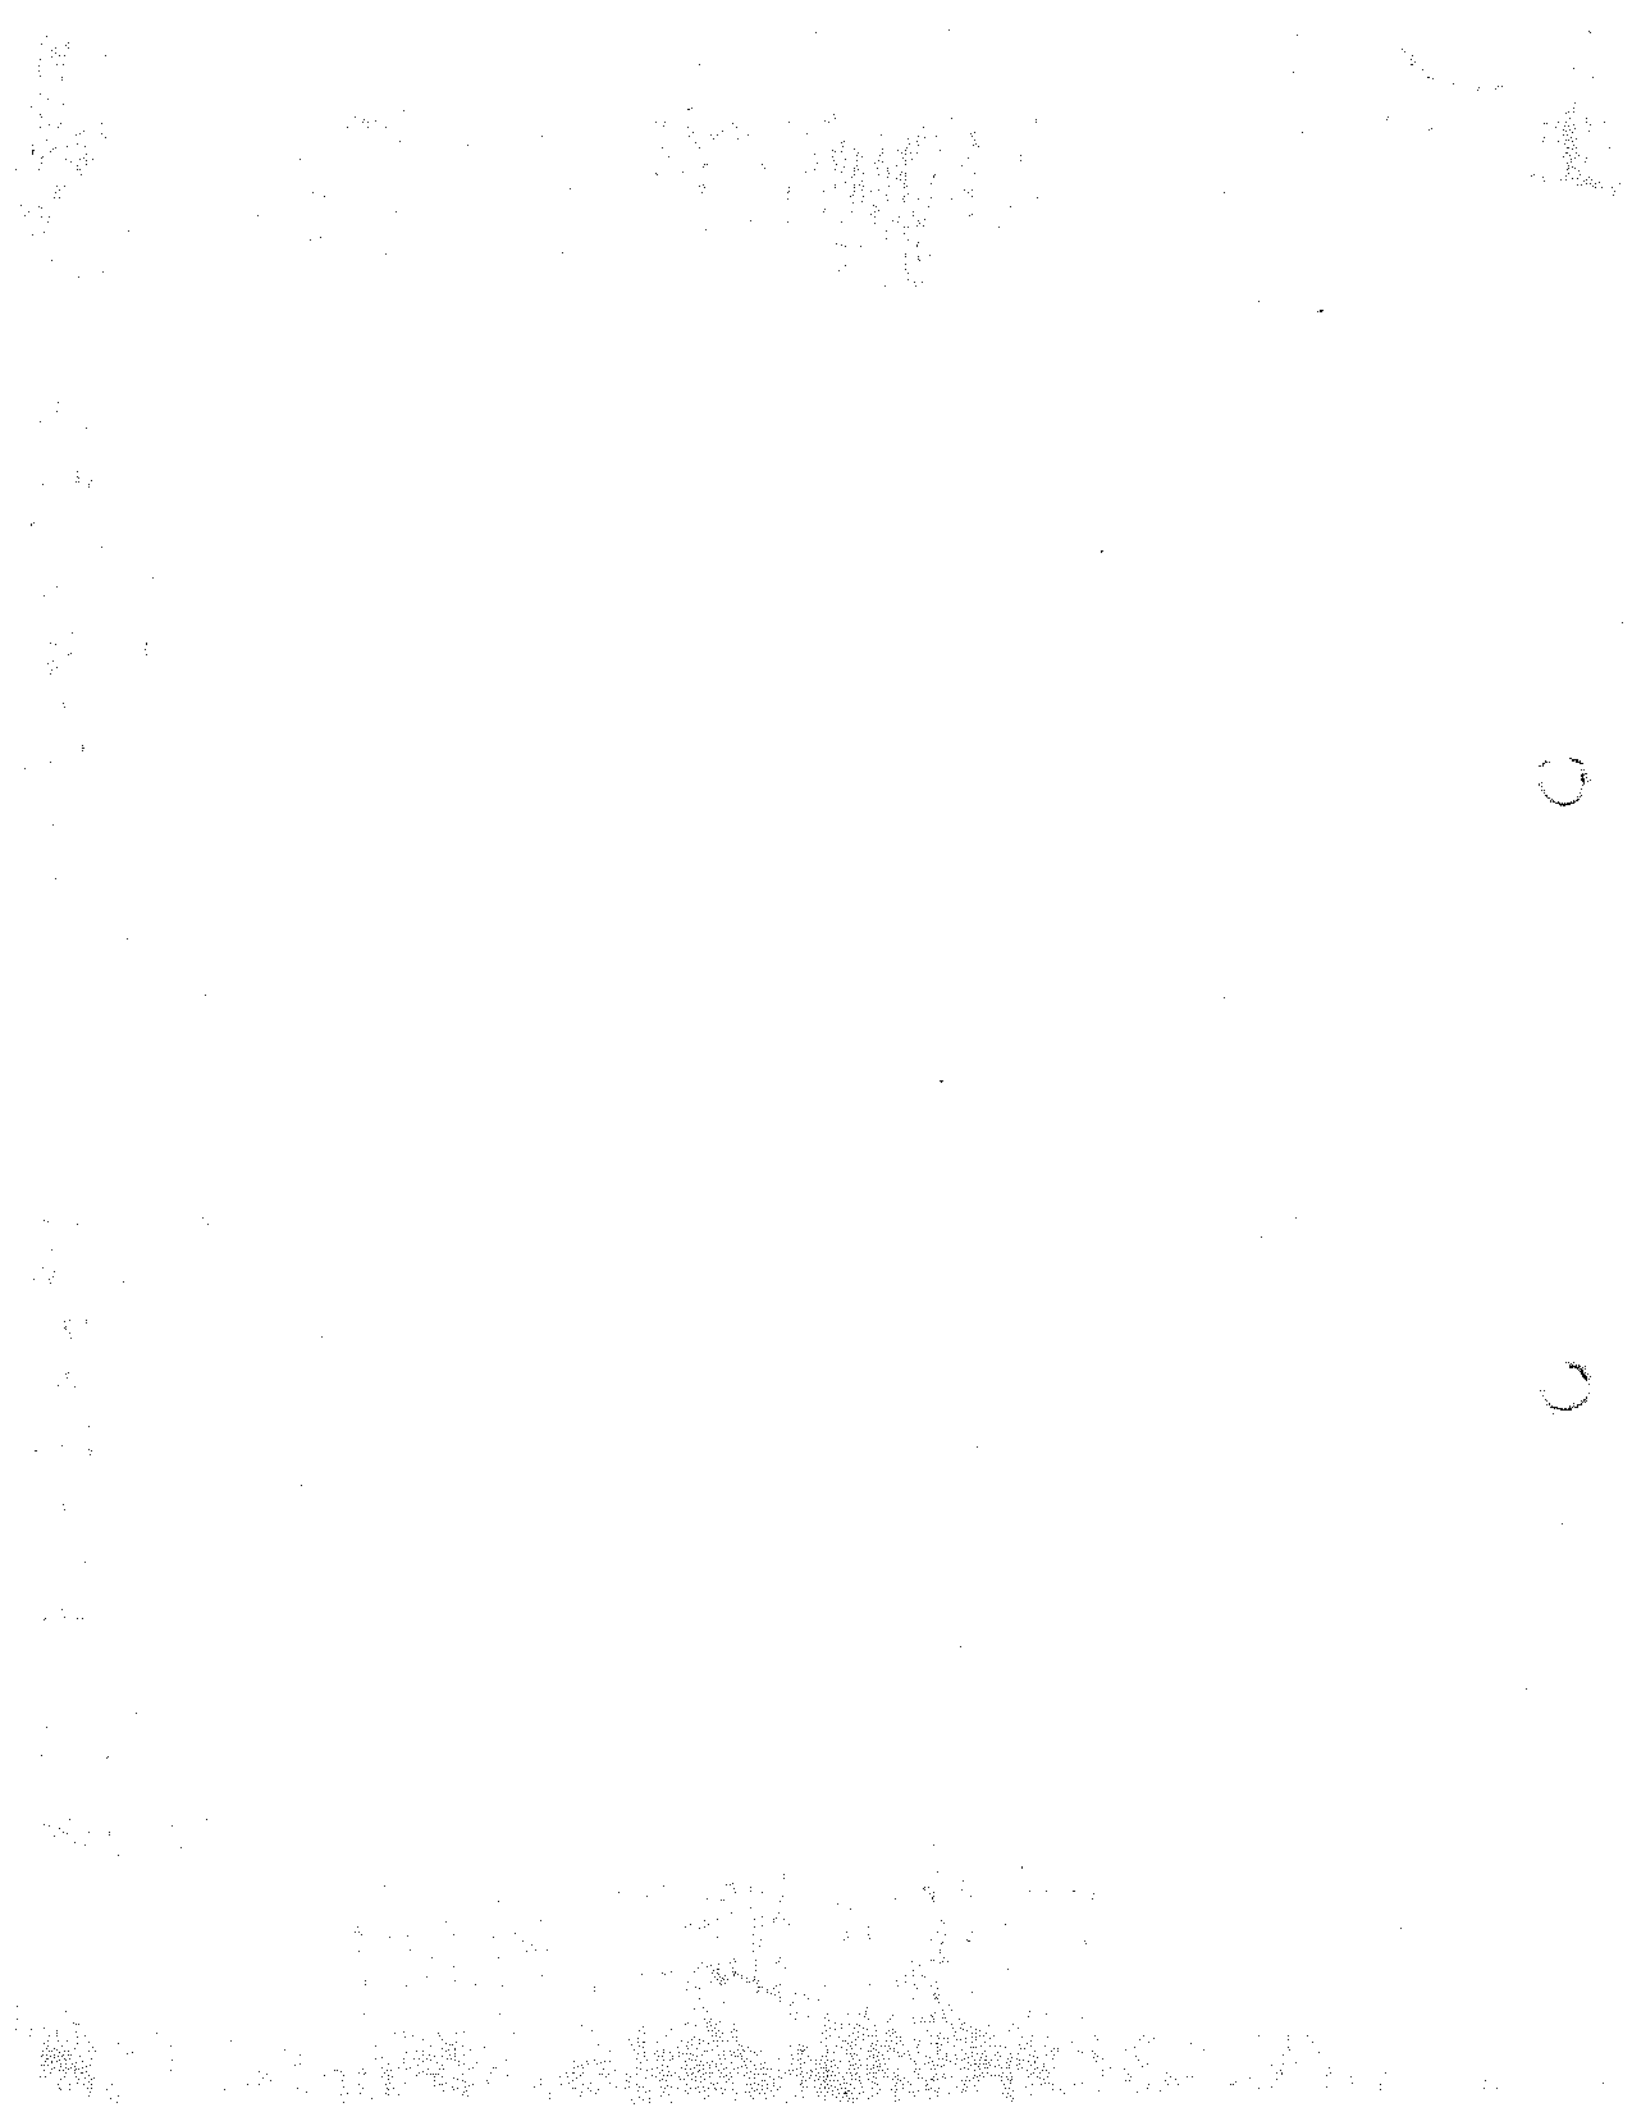

Marzo 2 de 2020

CL 13 Cr 7 y 6: Continua instalacion red principal, instalacion tuberia acortada D1 y excavacion para las siguientes lado derecho excavacion acortada lado izquierdo estacion. inicia excavacion camara de arranque cr 7. continuan llenos sobre red principal.

CL 13 cr 6 y 5: excavacion y entibado instalacion base en grava y devolucion camara cr 6 para empalme tuberia 24".

Condiciones ambientales: Tiempo seco.

200

Marzo 3 de 2020.

Calle 13 Crs 7 y 6: Continuan labores de llenos compactados sobre la red principal de 12" instalada. Continuan las excavaciones para construcion de camara de arranque sobre la carrera 7.

Calle 13 Crs 6 y 5 (medio cuadro): continuan excavaciones e instalacion de entibado para instalacion de red principal de alcantarillado en tuberia corrugada de 24".

Condiciones ambientales: tiempo soleado.

200

Marzo 4 de

Calle 13 (principal y camara de inspeccion)

Calle 13 (existente nueva red)


Se presenta La Nueva Condiciones

Marzo 5 de

Calle 13 (cajas de alcantarilla para domo)

Calle 13 (tuberia 12")

Se realiza Cr 6 con Condiciones

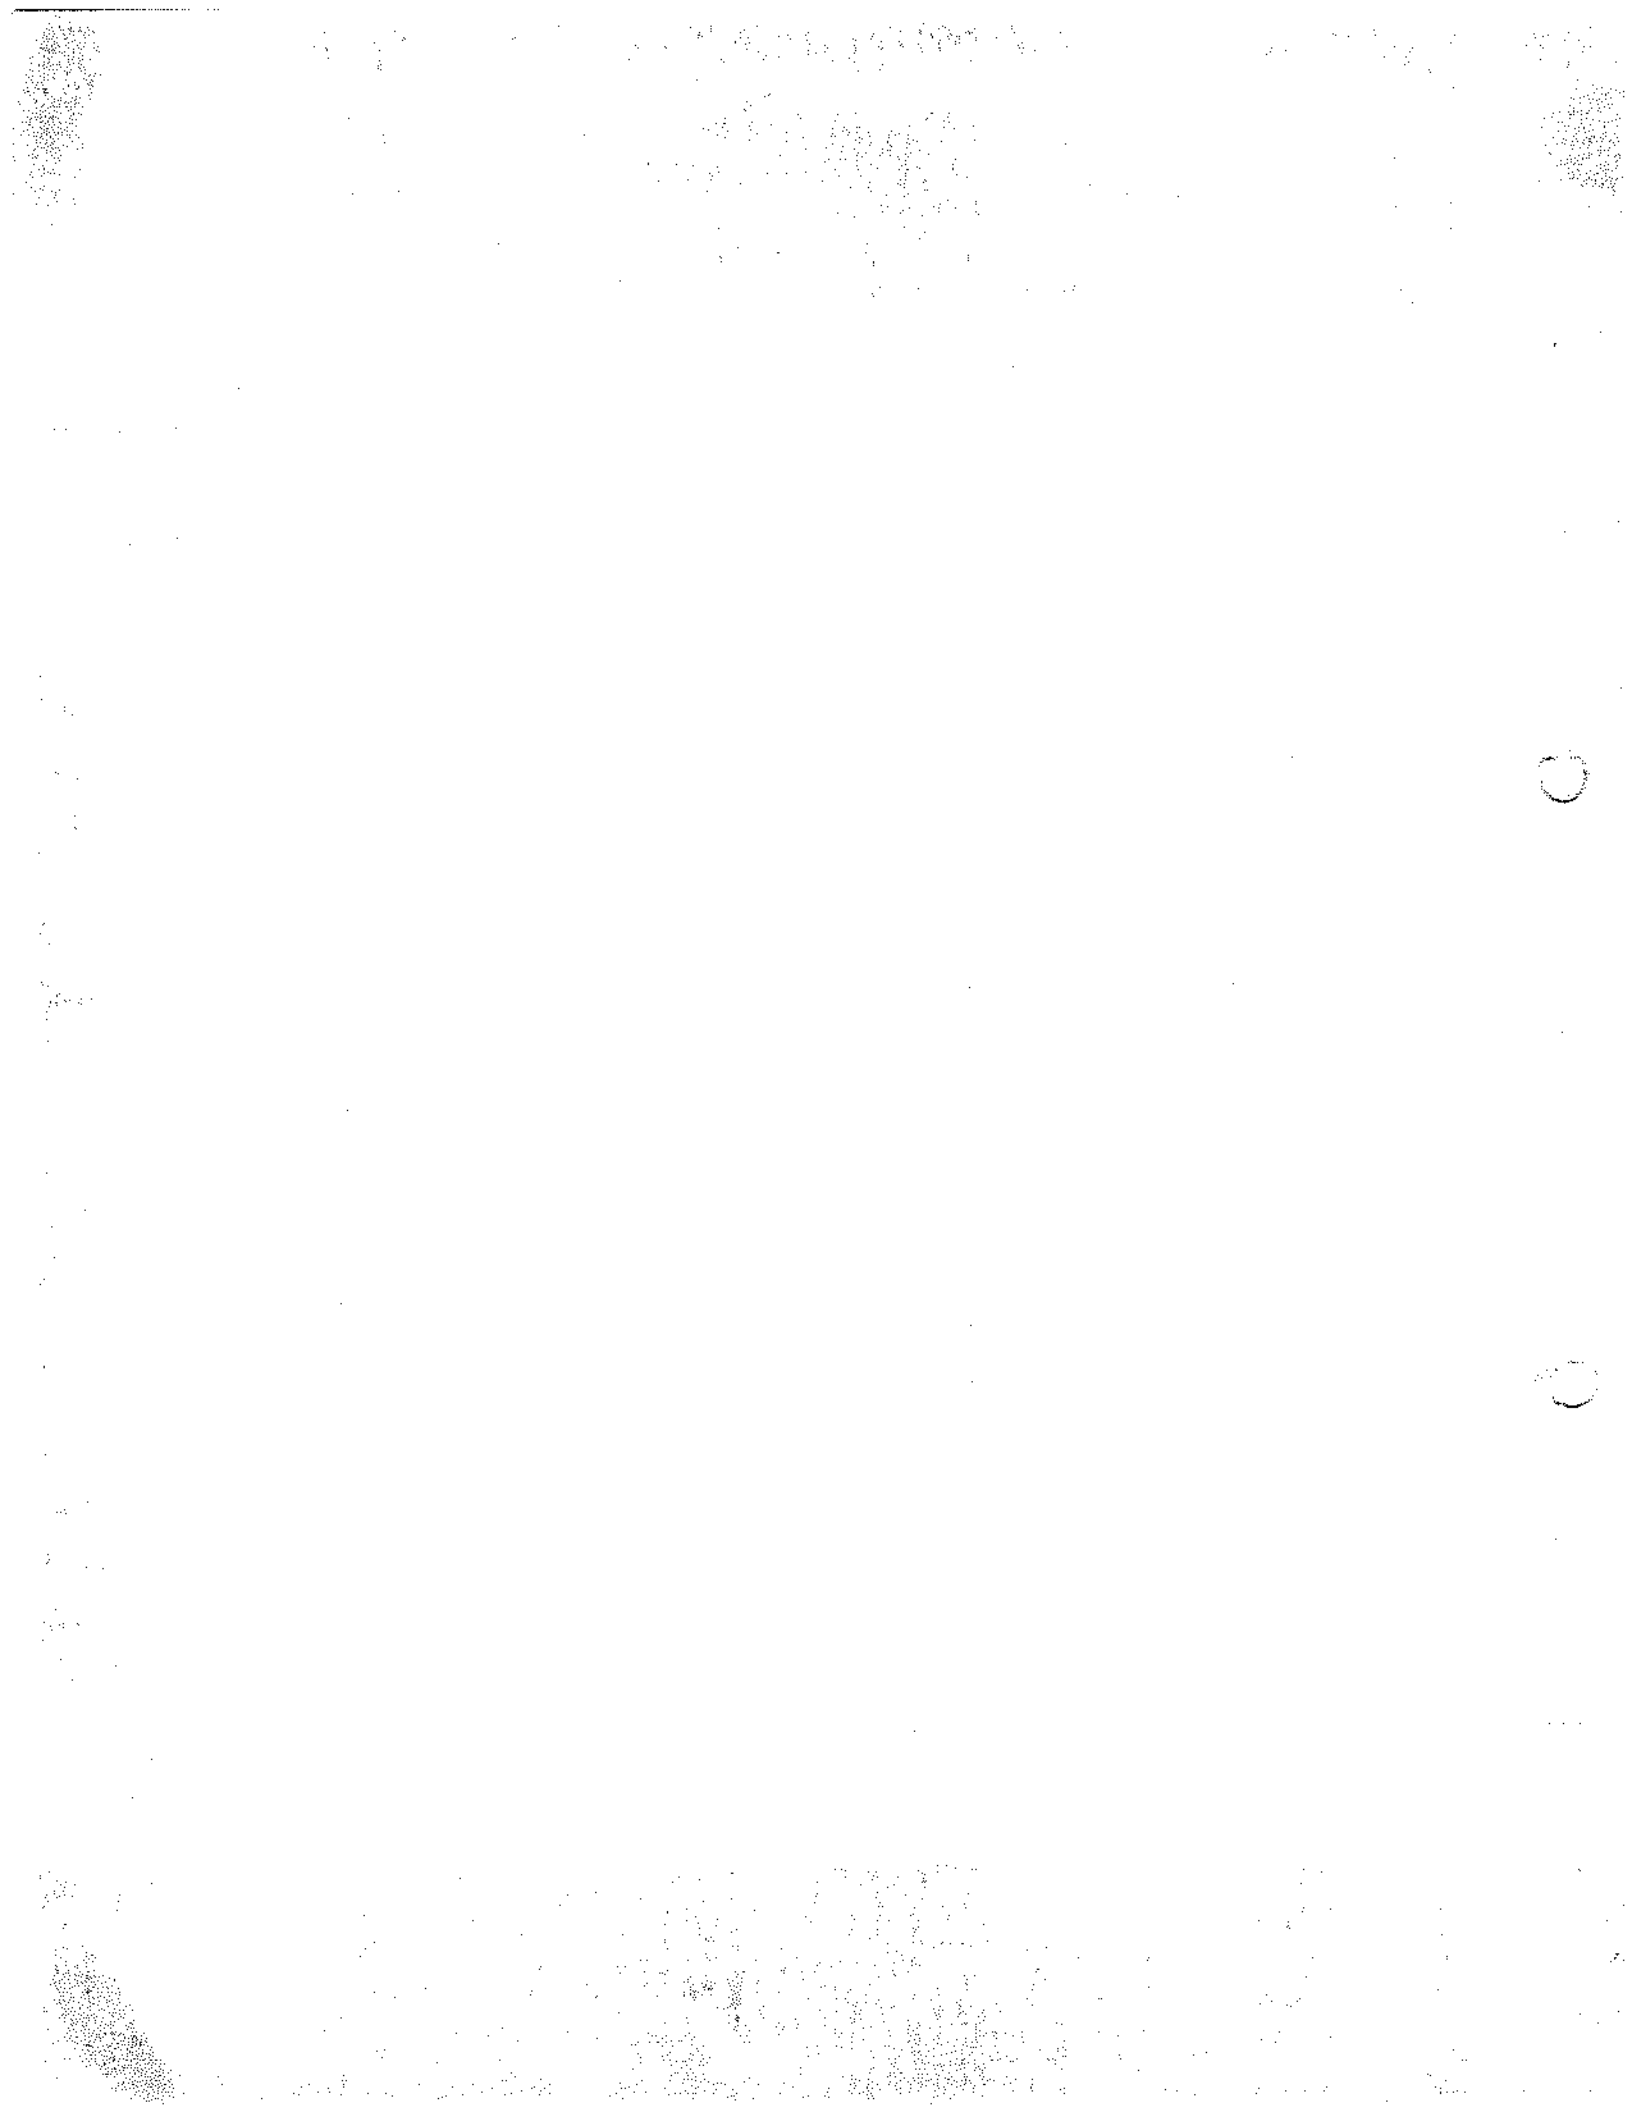

Marzo 4 de 2020

Calle 13 Carreras 7 y 6: Continúan lleros sobre red principal de 12", continúan excavaciones para construcción cámara de arranque sobre Carrera 7. Se realizan excavaciones sobre margen derecha para construcción de cajas de inspección y empalme de los domiciliarios de alcantarillado.
Calle 13 Carreras 6 y 5 (media cuadra): Se demuestró red existente de alcantarillado para la instalación de la nueva red.

Se presenta demumbo sobre bracho principal fuerte a ferretes La Nueva.

Condiciones ambientales: tiempo soleado


Marzo 5 de 2020

Calle 13 Carreras 7 y 6: Continúan excavaciones para cajas de inspección y empalme de domiciliarios de alcantarillado. Continúa la instalación de tubería de 6" para domiciliarios de alcantarillado sobre margen derecha.
Calle 13 Carreras 6 y 5: empieza la instalación de tubería microgrip de 24" para red principal de alcantarillado. Se realizan perforaciones a cámara existente sobre la Cía 6 con Calle 13 (esquina) para empalme de la nueva red.
Condiciones ambientales:

Malden

Libro Medio Oficio 80.H.

Malden

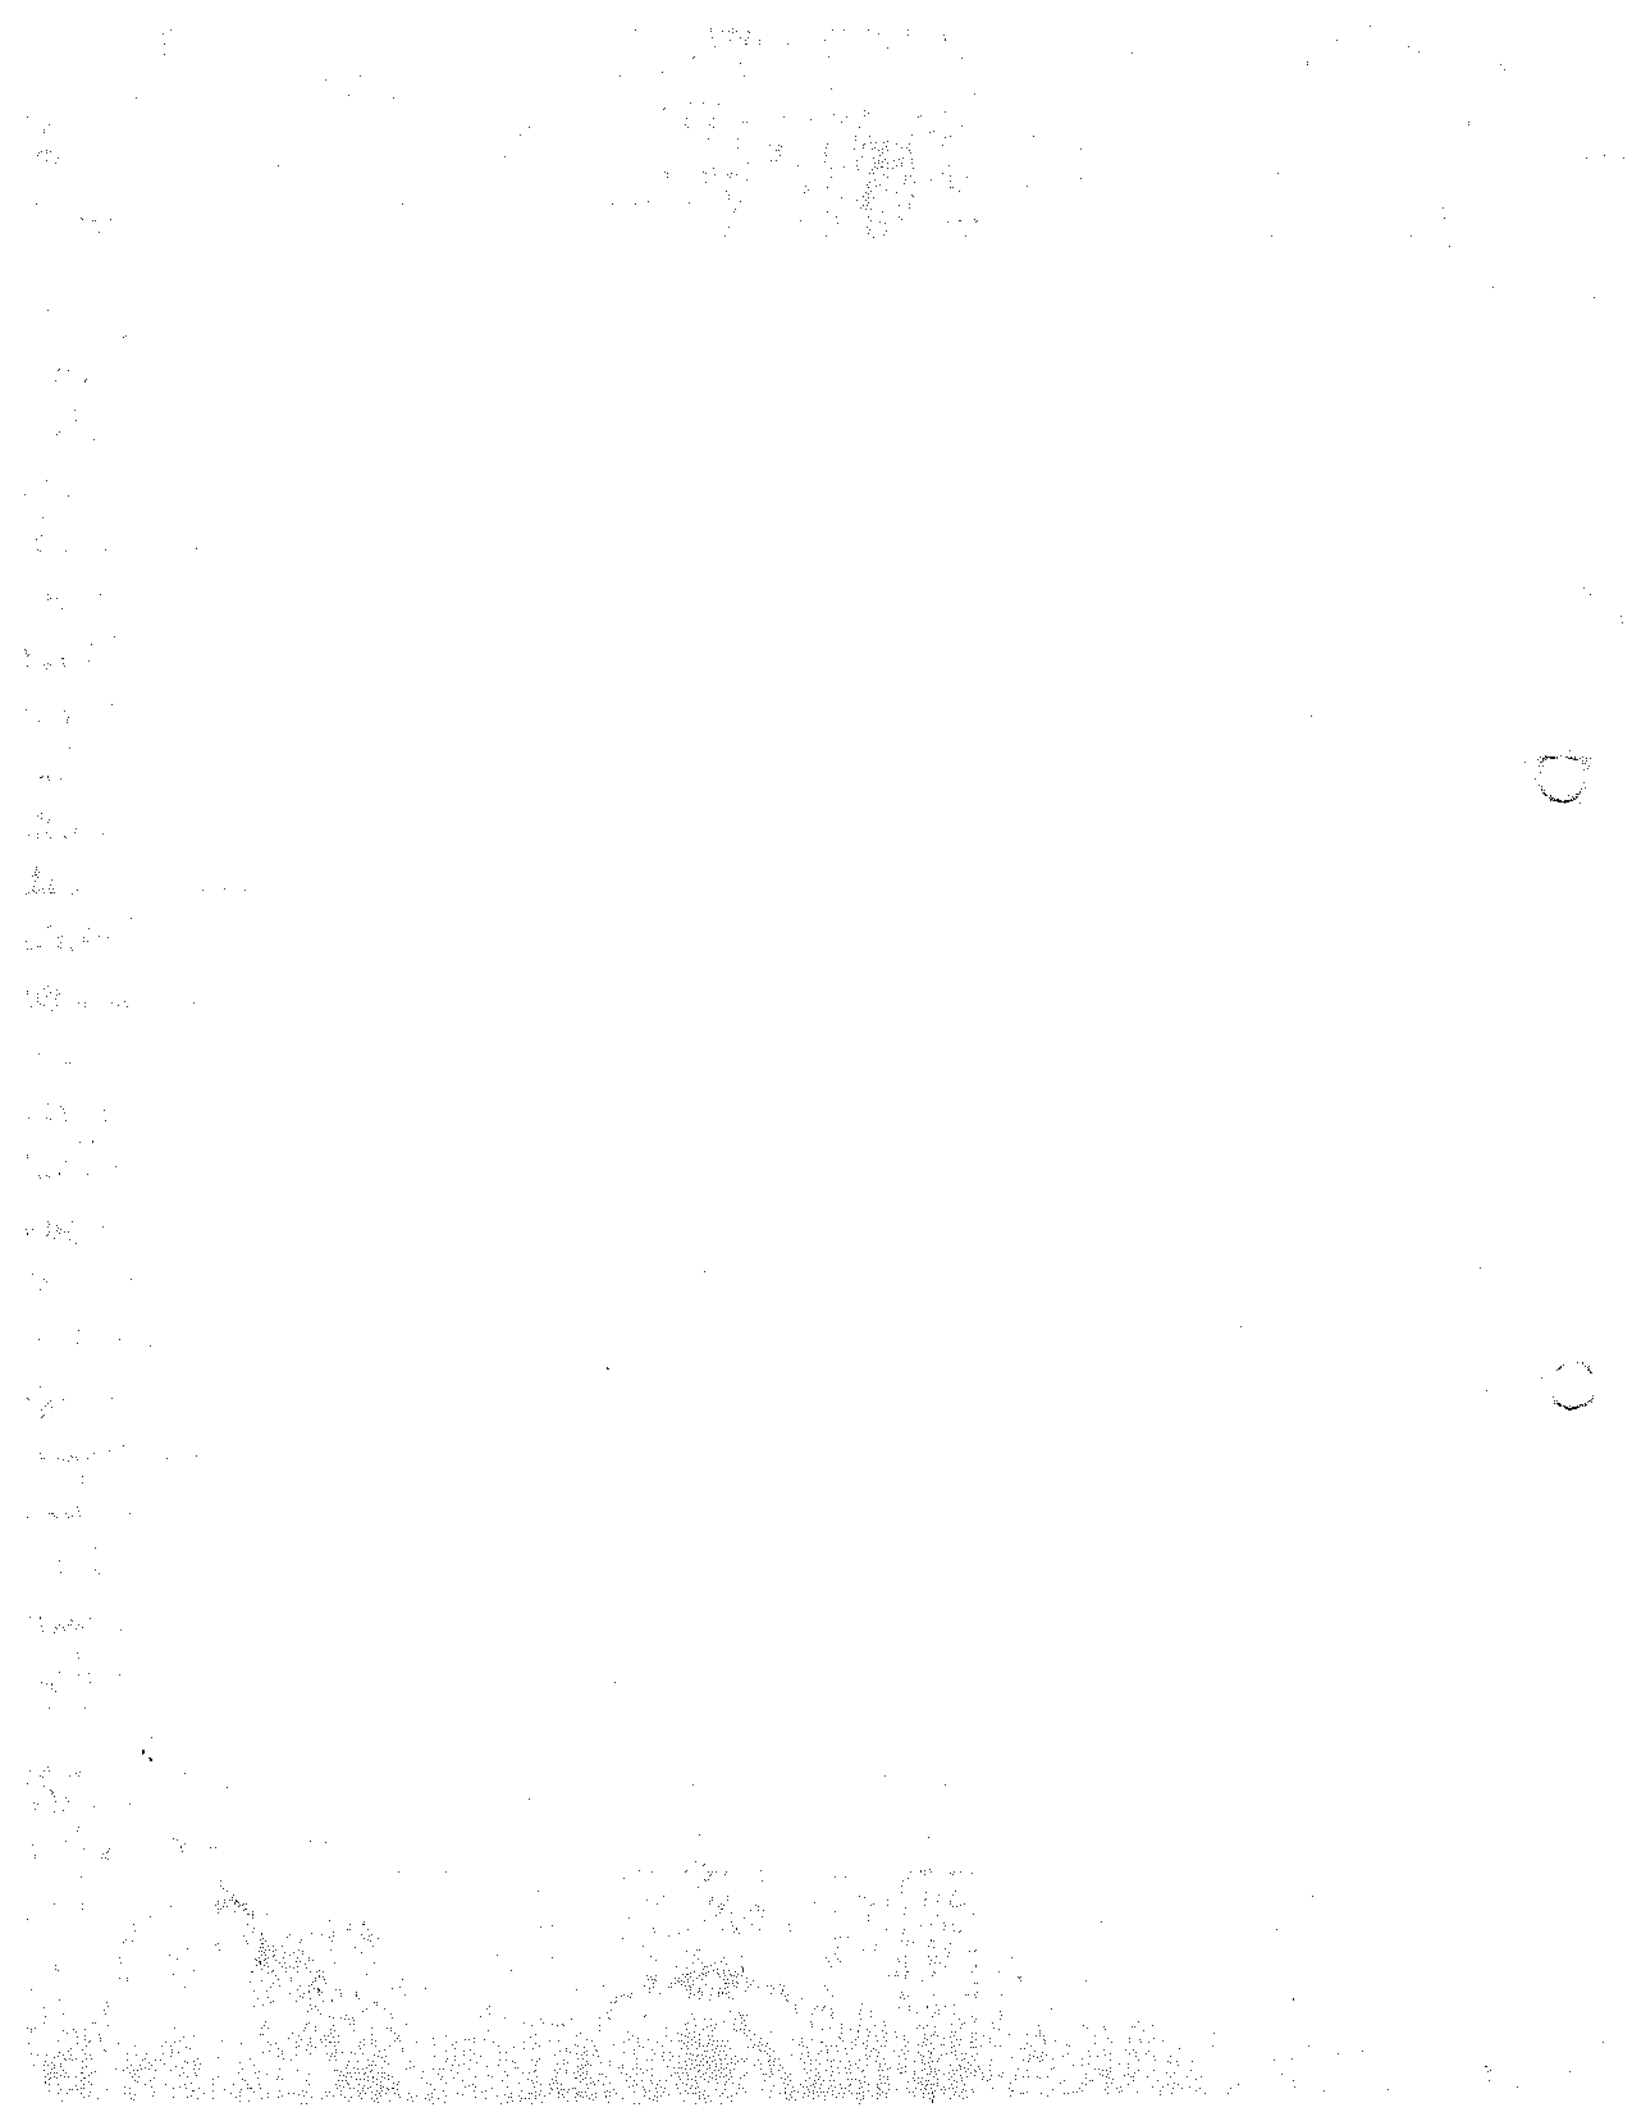

Marzo 6 de 2020:

Calle 13 Carreras 7 y 6: se culmina la excavación para construcción de cámara de arranque sobre la carrera 7. Se realizan lloros sobre los domiciliarios de alcantarillado constituidos sobre margen derecha. Se empiezan a fundir las cajas de inspección sobre margen derecha.
Calle 13 Cra 6 y 5: continúa la instalación de tubería de 24"

Condiciones Climáticas:

JPO

Marzo 7 de 2020:

Calle 13 Carreras 7 y 6: continúan la construcción de cajas y tapas para empalme de domiciliarios de 6". Continúan los lloros sobre los domiciliarios instalados. Continúan los lloros sobre la red principal de 12" instalada.
Calle 13 Carreras 6 y 5: continúan las excavaciones para instalación de red principal de 24"

Condiciones Climáticas:

JPO

Marzo 6
- Calle 13
de 12"
la b
Cra 7
Calle 13
llen e
24"
gravelle
nivel
Código
la fas
Marzo
Calle 13
de 12"
a ras
lluvia:
Se rep
su:
Calle
24" ins
siguie
Código
Libro Medi

249

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 2

CONTRATO No: No 00201 de 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS
OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.
SUPERVISOR: INGENIERO DE ZONA
RECURSOS: CREDITO 10.000 MILLONES 2019

En la ciudad de Manizales a los cinco (5) días del mes de mayo de 2020, se reunieron los señores **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ** como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, **LUIS FERNANDO ARIAS** Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A E.S.P. y supervisor del contrato 0201 de 2019 y **EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE** Representante Legal del **CONSORCIO CALDAS** como Contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato No 00201 de 2019. /


ITEM S	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Suministro transporte e instalación caja hf. y alineación medidores (incluye demoliciones y accesorios)	UN	\$ 209.533
NP.2	Suministro, transporte e instalación tapa para para agrupación medidores incluye concreto, marco tapa y contramarco en ángulo de 2* 3/16"	UN	\$ 456.862
NP3	Suministro transporte e instalación tubería PVC corrugada 12"	UN	\$ 159.386
NP4	Suministro transporte e instalación de puente provisional en madera	ML	\$ 42.461
NP5	Personal siso para implementación, puesta en funcionamiento y seguimiento al cumplimiento del protocolo.	MES	\$4.810.516
NP6	Suministro líquidos y material de desinfección, protección, y registro control.	GL	\$ 3.305.695
NP7	Gasto/trabajador por suministro líquidos y material de desinfección, protección, registro control y tiempo dedicado a la prevención de contagio por covid-19	PERSONA/DI A	\$ 10.362

Nota: Los precios incluyen AIU e IVA sobre utilidad.





Se firma por los que en ella intervinieron:



WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P



LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A.E.S.P



EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
Representante Legal
CONSORCIO CALDAS



Vo.Bo. ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



10
11
12

13

14

NÓMINA CONSORCIO CALDAS

CONTRATO DE OBRERA No. 0207-2013	CONTRATO EMP-CALDAS S.A. E.S. S.	PERÍODO DE PAGO Del 24 DE FEBRERO al 7 Marzo de 2020
OBJETO DEL CONTRATO REPOSICIÓN DE REDES DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINGHIRA		FECHA DE PAGO 7 de marzo de 2020

Nº	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANÍA	CURSO	SALARIO	AYUDERIA ALIMENTACION DIARIA	DIAS LABORADOS	TOTAL AYUDIA ALIMENTACION	PRIMA LOCALIDAD	TOTAL RÚBROS	DESCUENTO S.S. SALUD Y PENSION 8%	SALVO NETO A PAGAR	FIRMA
1	JUAN DIEGO GARDUÑA C. STANEDA	15 145 145	AYUDANTE	\$ 300.000		14		\$ 121.333	\$ 121.333		\$ 122.000	
2	MARY DAVID CEDRANO OFICA	1 054 981 180	AYUDANTE	\$ 877.803								
3	JUAN DIEGO REDOYADRIUE	1 054 981 708	AYUD	\$ 957.803								
4	YHONY LEANDRO HERNANDEZ VASQUEZ	1 054 981 708	AYUD	\$ 957.803								
5	MARIA ROSAÑA DE GADAFIOS	303 381 155	AYUDANTE	\$ 877.803								
6	YHONY FREDY TASCUNA V. PCAMA	1 054 471 980	AYUDANTE	\$ 877.803								
7	YHONY EDISON ALGATE RANGO	1 054 471 020	AYUDANTE	\$ 877.803								
8	ELY ELDER CACEROS V. AGAS	1 061 924 916	AYUDANTE	\$ 877.803								
9	ANDRES ESTEBAN JIMENEZ RESTREPO	1 054 981 830	AYUDANTE	\$ 877.803								
10	JOSE FERNANDO MADRIGAL GALLESO	4 417 106	AYUDANTE	\$ 877.803								
11	JULIO CESAR MANNES LANTAS	18 956 129	AYUDANTE	\$ 877.803								
12	CARLOS ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	71 144 103	AYUDANTE	\$ 877.803								
13	WILSON ALFONSO VILLACIA BEOYA	1 074 051 347	AYUDANTE	\$ 877.803								
14	JORGE ANDRES GARCIA GRANADA	1 105 781 438	AYUDANTE	\$ 877.803								
15	OLIBO DE JESUS SARRINOS	74 120 300	AYUDANTE	\$ 877.803								
16	FILIPPO ORRICO ROS	4 416 724	AYUDANTE	\$ 877.803								
TOTAL											\$ 121.333	\$ 122.000

Fabio Nelson Gonzalez
FABIO NELSON GONZALEZ

Elaboró:

A





CONTRATO DE OBRA
No. 0281-2019

NÓMINA CONSORCIO CALDAS

CONTRATO EMPCCALDAS S.A.E.S.P

PERIODO DE PAGO
Del 8 AL 21 Marzo de 2020

OBJETO DEL CONTRATO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCAHARRILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHIRICHINA

FECHA DE PAGO
21 de marzo de 2020

Nº	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIFICACION	CARGO	SALARIO	ALUBIA DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL SALARIO EQUICENTIA	HORAS EXTRAS # HORAS	VALOR	TOTAL SALARIO INCL. EXTRAS	DESCUENTO S.S. SALUD Y PENSION 8%	SALARIO NETO A PAGAR	FRUBA
1	JUAN DIEGO CASTAÑEDA	75.148.445	OFICIAL	\$ 977.803	\$ 47.999	14	\$ 817.999	14,0	\$ 96.250	\$ 914.249	\$ 69.300	\$ 845.000	X
2	JUAN DAVID CERRANO CHICA	1.54.994.679	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	5,0	\$ 18.288	\$ 475.927	\$ 34.234	\$ 442.000	X
3	JUAN DIEGO BERRAÑA DUQUE	1.54.991.180	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	5,0	\$ 18.288	\$ 475.927	\$ 34.234	\$ 442.000	X
4	WILSON LEANDRE HERNANDEZ VASQUEZ	1.54.997.708	AYUDANTE PRÁCTICO	\$ 567.803	\$ 47.999	14	\$ 494.973	8,0	\$ 31.927	\$ 526.900	\$ 38.312	\$ 488.000	X
5	MARIA ROSANA CELGADO ROS	30.381.655	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
6	JHON FREDY TRUJANA CHICAMA	1.54.478.989	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
7	JHON EDISON SUZATE APANGO	1.54.998.039	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
8	ELYSELDER CASARDO VARGAS	1.061.024.916	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
9	JOSE FERNANDO MORALES GALEGO	3.417.408	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
10	JULIO CESAR MONTES MONTES	10.500.929	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	14,0	\$ 51.205	\$ 508.845	\$ 38.868	\$ 472.000	X
11	JHON EDISON JARAMILLO	18.045.577	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 41.142	12	\$ 392.263	2,0	\$ 7.315	\$ 399.578	\$ 28.875	\$ 371.000	X
12	WILSON ALFONSO VALENCIA REDOYA	1.064.988.347	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 41.670	13	\$ 424.951	2,0	\$ 7.315	\$ 432.266	\$ 31.016	\$ 402.000	X
13	RODRIGO ANDRÉS GALVIS GRANADA	1.055.788.438	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
14	OLMPO DE JESUS CARRERAS	20.728.500	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
15	ALURO ORREGO ROS	4.418.224	AYUDANTE	\$ 377.803	\$ 47.999	14	\$ 467.640	2,0	\$ 7.315	\$ 484.955	\$ 33.357	\$ 432.000	X
TOTAL											\$ 6.919.980		

FABIO MELSON GONZALEZ

Elaboró:

[Handwritten signature]




NÓMINA CONSORCIO CALDAS

CONTRATO EMP/OCALDAS/ S.A. E.S.P
 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHIVA

PERIODO DE PAGO
 Del 8 AL 21 Marzo de 2020

FECHA DE PAGO
 21 de marzo de 2020

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	AYUDO PARA ALIMENTACION DIARIO	DIAS LABORADOS	TOTAL AUXILIO ALIMENTACION	PRIMA DE CALIFICACION	TOTAL AUXILIOS	DESCUENTO S.S. SALUD Y PENSION 3%	SALARIO NETO A PAGAR	FRIRIA
1	JUAN DIEGO CAROONA CASTAÑEDA	78.146.445	OFICIAL	\$ 1.650.000		14		\$ 121.333	\$ 121.333		\$ 122.000	
2	JUAN OMAR CEDENO CHICA	1.354.994.678	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
3	JUAN DIEGO BEDIA DOQUE	1.354.991.180	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
4	VICTOR LEANDRO HERNANDEZ VASQUEZ	1.354.997.708	AYUDANTE PRACICO	\$ 957.803							\$	
5	MARIA ROSAINA DELGADO ROS	30.381.555	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
6	JHON FREDY TASCUNA CHICAMA	1.054.478.999	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
7	JHON EDUINSON ALZATE ARANGO	1.054.888.088	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
8	ELYNELER CAJEDO VARGAS	1.361.924.916	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
9	JOSE FERNANDO BORRERO GALLEGO	4.417.468	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
10	JUAN CESAR MONTES MONTES	18.590.829	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
11	JHON ESTEBAN JARAMILLO	18.045.577	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
12	WALEX HALLINGS VALENCIA BEDOYA	1.354.968.347	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
13	RODRIGO ANDRES GALIAS GRANADA	1.056.788.438	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
14	OLIVIA DE REYES CARDENAS	30.728.500	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
15	ALBERTO JARA LEO REBE	4.416.224	AYUDANTE	\$ 877.803							\$	
TOTAL				\$ 14.019.242	\$		\$	\$ 121.333	\$		\$ 122.000	

Elaboró:

 FABIO NELSON GONZALEZ


✓



SC		NOMINA CONSORCIO CALDAS									
CONTRATO DE OBRA No. 0201-2018		CONTRATO ESPECIALIDAD S.A. S.A.P									
OBJETO DEL CONTRATO		REPOSICION DE REDES DE AGUENTUO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA									
		31 de mayo de 2020									
		31 de mayo de 2020									
No.	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIFICACION	CARGO	SALARIO	VALOR DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL SALARIO QUINCENAL	NOTAS EXTRAS	TOTAL SALARIO INCL. EXTRAS	PREMIOS S.S. SALUD Y PENSION	SALARIO NETO A PAGAR
1	JUAN DIEGO CARDONA CASTI BIEDA	75.146.445	OPERAL	\$ 1.650.000	\$ 44.570	13	\$ 759.570		\$ 759.570	\$ 30.963	\$ 728.607
2	EMILIA DHIANI ARISTIZABAL VAZQUEZ	30.360.283	SIENO	\$ 2.100.000		13	\$ 910.000		\$ 910.000	\$ 45.225	\$ 864.775
3	MARIA REINA DELGADO RIVERA	30.261.826	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 37.713	11	\$ 358.574		\$ 358.574	\$ 15.268	\$ 343.306
4	ARIVY FRIEDY TASCORA CHUCAHA	1.054.478.929	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 44.570	13	\$ 424.951		\$ 424.951	\$ 18.068	\$ 406.883
5	JOSHE FERNANDO ALZATE ARANZO	1.054.988.059	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 37.713	11	\$ 358.574		\$ 358.574	\$ 15.268	\$ 343.306
6	JOSE FERNANDO ALVALES GALLEGO	4.417.488	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 44.570	13	\$ 424.951		\$ 424.951	\$ 18.068	\$ 406.883
7	SEBASTIAN GONZALO HERNANDEZ	1.027.982.428	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 37.713	11	\$ 358.574		\$ 358.574	\$ 15.268	\$ 343.306
8	JUAN CESAR MONTES MONTES	10.500.828	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 37.713	11	\$ 358.574		\$ 358.574	\$ 15.268	\$ 343.306
9	RODRIGO ANDRES GALVEZ ARANDA	1.028.784.938	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 37.713	11	\$ 358.574		\$ 358.574	\$ 15.268	\$ 343.306
10	DALEFO DE JESUS CAROLINAS	70.723.500	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 37.713	11	\$ 358.574		\$ 358.574	\$ 15.268	\$ 343.306
11	MUNICIPIO RESTREPO BEDOYA	1.024.998.814	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 37.713	11	\$ 358.574		\$ 358.574	\$ 15.268	\$ 343.306
TOTAL				\$ 11.650.327	\$ 997.702		\$ 5.026.192		\$ 5.026.192	\$ 220.943	\$ 4.805.249

Verbo: *Elva Nelson*
 JUAN PABLO GONZALEZ
 JUAN PABLO GONZALEZ

[Handwritten signature]



CONTRATO DE OBRA
 No. 0281-2018
OBJETO DEL CONTRATO

NÓMINA CONSORCIO CALDAS

CONTRATO EMPROCALDAS S.A.S.P

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado en el municipio de Chiriquena

PERIODO DE PAGO
 Del 16 al 31 Marzo de 2020

FECHA DE PAGO
 31 de marzo de 2020

3 de 13 No. 10

No.	NOMBRE	CEBILIA DE CIUDADAJIA	C/300	SALARIO	AVANCE PAGO AL SEPTIEMBRE	ORD. LABORADOS	TOTAL AVANCE SEPTIEMBRE	PRIMA LICITACION	TOTAL AVANCE	DESCUENTO S.S. SALUD Y PENSION DE	CUANTIFICO A PAGAR	FIRMA
1	JUAN DIEGO GARCIA GAVIHERA	75.148.485	OFICIA	\$ 1.850.000		12	\$ 104.000	\$	\$ 104.000		\$ 104.000	
2	ALVARO DINI ARISTIZABAL VARELA	20.361.245	SI/SD	\$ 2.100.000				\$	\$		\$	
3	MARIA ROSA DEL CARMEN DEL CARMEN	30.361.555	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
4	JUAN FREDY TASCORA CHICANA	1.054.478.668	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
5	JUAN EDUARDO ALZATE ARANGO	1.054.388.030	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
6	JOSÉ FERNANDO MORALES GALLEGO	4.417.488	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
7	SEBASTIAN GONZALEZ HERNANDEZ	1.037.182.428	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
8	JULIO CESAR MONTES MONTE S	18.500.828	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
9	RATY FIGUEROA ANDRES SALVIA GONZALEZ	1.125.78.438	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
10	OLIVERO FERRER JESUS CARDENAS	70.745.600	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
11	MARCOS RESTREPO BEDOYA	1.054.388.034	AVI/ANTE	\$ 877.803				\$	\$		\$	
TOTAL											\$ 9.894.821	\$

Selva Peter G

Yago: JUAN PABLO CORDERO RIOS

Yago: PABLO NIELSON GONZALEZ



NÓMINA CONSORCIO CALDAS																
CONTRATO EMPCCALDAS S.A.E.S.P																
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINGHINA																
CONTRATO DE OBRA No. 9291-2019																
PERIODO DE PAGO Del 16 al 30 Mayo de 2020																
FECHA DE PAGO 30 de mayo de 2020																
No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	VALOR DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL SALARIO QUINCENA	HORAS EXTRAS #HORAS	VALOR	TOTAL SALARIO INCL. EXTRAS	DESCUENTO S.S. SALUD Y PENSION 4.75%	BALANCE NETO A PAGAR	FIRMA			
1	JUAN DIEGO CARDONA CASTAÑEDA	76.146.445	OFICIAL	\$ 1.650.000	\$ 51.427	15	\$ 876.427	35,0	\$ 240.628	\$ 1.117.052	\$ 50.817	\$ 1.066.235	<i>[Firma]</i>			
2	MARIA DIANI ARGISTZABAL VARGAS	20.361.243	SYSO	\$ 2.100.000		15	\$ 1.050.000			\$ 1.050.000	\$ 49.875	\$ 1.000.125	<i>[Firma]</i>			
3	MARIA ROSANA DELGADO RIOS	90.391.555	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 3.428	1	\$ 32.689			\$ 32.689	\$ 1.390	\$ 31.299	<i>[Firma]</i>			
4	JHON PREDY TASCUNA CHICAMA	1.054.979.969	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	35,0	\$ 128.013	\$ 618.341	\$ 26.928	\$ 591.413	<i>[Firma]</i>			
5	JHON EDINSON ALZATE ARANGO	1.054.989.039	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	35,0	\$ 128.013	\$ 618.341	\$ 26.928	\$ 591.413	<i>[Firma]</i>			
6	JOSE FERRANDO MORALES GALLEGO	4.417.466	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	35,0	\$ 128.013	\$ 618.341	\$ 26.928	\$ 591.413	<i>[Firma]</i>			
7	SEBASTIAN ORRALDO HERNADEZ	1.037.952.429	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	35,0	\$ 128.013	\$ 618.341	\$ 26.928	\$ 591.413	<i>[Firma]</i>			
8	JULIO CESAR MOHITES HONTES	18.940.925	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	18,0	\$ 65.835	\$ 556.164	\$ 23.975	\$ 532.189	<i>[Firma]</i>			
9	RODRIGO ANDRES GALAS GRANADA	1.105.789.438	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	35,0	\$ 128.013	\$ 618.341	\$ 26.928	\$ 591.413	<i>[Firma]</i>			
10	OLIMPO DE JESUS CARDENAS	70.728.500	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	35,0	\$ 128.013	\$ 618.341	\$ 26.928	\$ 591.413	<i>[Firma]</i>			
11	MAURICIO RESTREPO BEDOYA	1.054.989.814	AYUDANTE	\$ 877.803	\$ 51.427	15	\$ 490.329	18,0	\$ 65.835	\$ 556.164	\$ 23.975	\$ 532.189	<i>[Firma]</i>			
TOTAL																
												\$ 11.959.227	\$ 466.371	\$ 11.492.856	\$ 7.022.117	\$ 4.470.739


Yo So: FABIO NELSON GONZALEZ

Yo So: JUAN PABLO OSORIO RIOS



Yo So: [Firma]

Yo So: [Firma]




		NÓMINA CONSORCIO CALDAS		PERIODO DE PAGO Del 16 al 30 Mayo de 2020	
CONTRATO DE OBRA No. 0201-2019		CONTRATO EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		FECHA DE PAGO 30 de mayo de 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHIRICHINA			

NO.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	AYUDA PARA ALIMENTACION	DIAS LABORADOS	TOTAL AUXILIO ALIMENTACION	PRIMA LOCALIDAD	TOTAL AUXILIO	DECUENTO S.S. SALUD Y PENSION 8%	BALANCE NETO A PAGAR	PRIMA		
1	JUAN DIEGO CARDONA CASTAÑEDA	76.143.445	OFICIAL	\$ 1.650.000		15		\$ 130.000	\$ 130.000		\$ 130.000			
2	MARIA DINI ARISTIZABAL VARGAS	90.381.243	SYSO	\$ 2.100.000										
3	MARIA ROSA DELGADO RIOS	30.381.555	AYUDANTE	\$ 677.803										
4	JHON FREDY TASCURA CHICAMA	1.054.478.989	AYUDANTE	\$ 677.803										
5	JHON EDINSON ALZATE APANGO	1.054.888.039	AYUDANTE	\$ 677.803										
6	JOSE FERNANDO MARALES GALLEGO	4.417.466	AYUDANTE	\$ 677.803										
7	SEBASTIAN GERALDO HERNANDEZ	1.037.852.428	AYUDANTE	\$ 677.803										
8	JULIA CESAR MONTES MONTES	18.990.829	AYUDANTE	\$ 677.803										
9	RODRIGO ANDRES GALVIS GRANADA	1.105.785.438	AYUDANTE	\$ 677.803										
10	OLGIBO DE JESUS CARDENAS	70.726.500	AYUDANTE	\$ 677.803										
11	MAURICIO RESTREPO BEDOYA	1.054.888.814	AYUDANTE	\$ 677.803										
TOTAL											\$ 9.954.621	\$	\$ 130.000	\$

VóBo:  **FABIO NELSON GONZÁLEZ**
 VóBo:  **JUAN PABLO ESCOBAR RÍOS**



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)	X	
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

LUIS FERNANDO ARIAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR


LUIS FERNANDEZ
FIRMA DEL SUPERVISOR





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	06	Fecha del informe	JUNIO 9 de 2020	Acta parcial	x	Acta final	
-------------------	----	----------------------	--------------------	--------------	---	------------	--

Contrato de obra N°	N° - 0201
Objeto:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA
Nombre Contratista:	CONSORCIO CALDAS
Fecha del contrato:	2019
Plazo de ejecución:	105 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Valor inicial:	\$ 1'011.875.765 INCLUIDO AUI E IVA SOBRE UTILIDADES
Fecha de iniciación:	SEPTIEMBRE 04 DE 2019
Fecha de suspensión:	25 DE MARZO DE 2020
Fecha de reiniciación:	30 DE ABRIL DE 2020
Fecha de terminación inicial:	17 DE DICIEMBRE DE 2019
Nueva fecha de terminación:	18 DE JULIO DE 2020
Adición (en valor):	\$ 130.044.251
Prórroga (en tiempo):	177 DIAS
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.

6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the data collection process, including the identification of data sources, the design of data collection instruments, and the implementation of data collection procedures.

7. The seventh part of the document discusses the various methods used for data analysis, such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. It explains how these methods can be used to identify patterns and trends in the data.

8. The eighth part of the document focuses on the interpretation of data results. It discusses how to effectively communicate findings to stakeholders and how to use the data to inform strategic decision-making and organizational improvement.

9. The ninth part of the document addresses the ethical considerations of data management. It discusses the importance of obtaining informed consent, protecting personal information, and ensuring that data is used for legitimate purposes.

10. The tenth part of the document provides a final summary and concludes the report. It reiterates the key points and offers final thoughts on the importance of data management in achieving organizational success.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Sectores a intervenir

UBICACIÓN	alcantarillado	acueducto
Calle 4A con Carreras 8 y 9	x	x
Calle 3B entre Carreras 7 y 8	x	
Calle 5 entre Carreras 5 y 6	x	
Carrera 9 con Calles 6 y 7	x	x
Carrera 9 entre las Calles 7 y la 8		x
Carrera 6 entre Calles 8 y 9	x	x
Calle 13 entre Carreras 9A y 9	x	x
Calle 13 entre Carreras 9 y 8	x	x
Calle 13 entre Carreras 8 y 7		x
Calle 13 entre Carreras 7 y 6	x	x
Calle 13 entre Carreras 6 y 5	x	x
Calle 13 entre Carreras 5 y 4	x	x
Carrera 12 # 13-35 (Barrio san martin)		x
Barrio el Túnel desde la casa 25 hasta la casa 137	x	
Carrera 10 entre Calle 18 y 19 (Barrio san Francisco)	x	
Reposición de pavimento por daño de alcantarillado carrera 11 entre calle 14 y 15	x	
Calle 5 entre Carreras 7 y 6	x	





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.2. Avance físico e informe de actividades

AVANCE ACTA 06 - CONTRATO N° 0201					
FRENTE DE OBRA			Avance físico de obra		DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
UBICACIÓN	ALC.	ACU	Del periodo	ACUM.	
Calle 4A con Carreras 8 y 9	x	X	0%	100%	Reposición de alcantarillado finalizada por completo, al igual que la red de acueducto, se realiza entrega a la alcaldía de la obra para su respectiva pavimentación por parte del municipio.
Calle 3B entre Carreras 7 y 8	x		0%	100%	Obra realizada en su totalidad.
Calle 5 entre Carreras 5 y 6	x		0%	100%	Obra realizada en su totalidad.
Carrera 9 con Calles 6 y 7	x	X	0%	100%	Obra realizada en su totalidad.
Carrera 9 entre las Calles 7 y la 8		X	0%	100%	Obra realizada en su totalidad.
Carrera 6 entre Calles 8 y 9	x	X	0%	100%	Obra realizada en su totalidad y entregada al municipio para su respectiva pavimentación.
Calle 13 entre Carreras 9A y 4	x	X	30%	65%	Se realizaron obras de Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado entre carreras 7 y 6 y entre carreras 6 y 5 (media cuadra); además de las Reposiciones en las carreras 7 y 6. Se realiza suministro e instalación de cajas para contadores
Carrera 12 # 13-35 (Barrio san martin)		X	0%	100%	Se realizó reposición de tubería de acueducto 2" con sus respectivas acometidas.
Barrio el Tunel desde la casa 25 hasta la casa 137	x		0%	100%	Se realizó la adecuada pavimentación de la vía y reposición de andenes, al igual que la adecuada instalación de tapas de las cámaras.
Carrera 10 entre Calle 18 y 19 (Barrio san Francisco)	x		0%	100%	Se culmina la reposición de red de alcantarillado en su totalidad.
Reposicion de pavimento por daño de alcantarillado carrera 11 entre calle 14 y 15	x		0%	100%	Se Culmina reposición de pavimento, y reparación de red de alcantarillado en esta zona.
Calle 5 entre Carreras 7 y 6	x		0%	100%	se tiene la reposición de la red de alcantarillado completa al igual que la pavimentación desde la Carrera 7 hasta la cámara intermedia de la calle 5, en el tramo restante se realizan labores de llenos para su posterior pavimentación.

2

2



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución (días) :	282
Tiempo total transcurrido (días) :	241
Avance Porcentual:	85,46%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

Se realizan varias visitas diarias a los diferentes frentes en los que se de desarrollan actividades, en estas visitas diarias se hacen anotaciones de: actividades en ejecución, actividades terminadas, anotaciones técnicas, cantidad de personal en obra entre otros.

Los sitios intervenidos para este corte del contrato de obra N°-201 con objeto: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ son:



CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 6 (Alcantarillado)



Imagen 1 Calle 13 entre carrera 7 y 6




Imagen 2 Calle 13 entre carrera 7 y 6



Imagen 2 Calle 13 entre carrera 7 y 6



Imagen 3 Calle 13 entre carrera 7 y 6

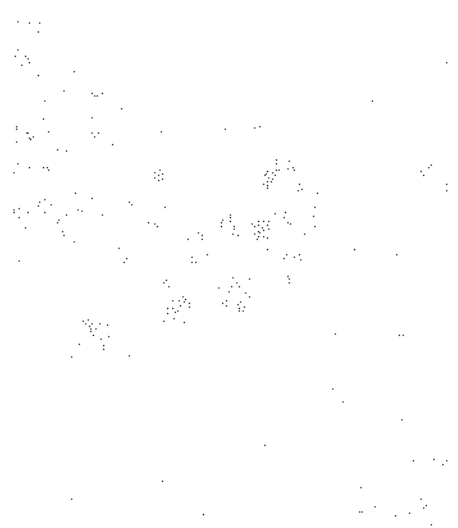

CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 6 (Alcantarillado)



Imagen 5 Calle 13 entre carrera 7 y 6

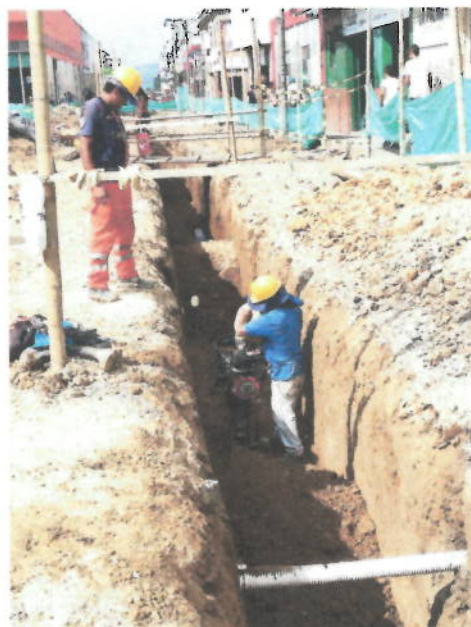


Imagen 6 Calle 13 entre carrera 7 y 6



Imagen 7 Calle 13 entre carrera 7 y 6



Imagen 8 Calle 13 entre carrera 7 y 6

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all transactions. It also discusses the importance of regular audits and the need to report any discrepancies immediately.

3. The third part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records, including the potential for fines and penalties. It also discusses the importance of training staff on proper record-keeping procedures and the need to establish a strong internal control system.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It emphasizes that all transactions should be clearly documented and that the results of the financial system should be made available to the public.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the financial system. It emphasizes that the system should be regularly reviewed and updated to ensure that it remains effective and efficient.

CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 5 (Alcantarillado)



Imagen 1 Calle 13 entre carrera 6 Y 5



Imagen 2 Calle 13 entre carrera 5 Y 6



Imagen 3 Calle 13 entre carrera 5 Y 6



Imagen 4 Calle 13 entre carrera 5 Y 6

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and it is important to choose the most appropriate method for the specific research objectives.

3. The third part of the document describes the process of data analysis. This involves identifying patterns and trends in the data, and then interpreting these findings in the context of the research objectives. It is important to be objective and unbiased in this process, and to avoid drawing conclusions that are not supported by the data.

4. The final part of the document discusses the importance of reporting the results of the research. This involves writing a clear and concise report that summarizes the findings and provides recommendations for future action. The report should be written in a way that is easy to understand and that is accessible to all relevant parties.

5. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

6. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and it is important to choose the most appropriate method for the specific research objectives.

7. The third part of the document describes the process of data analysis. This involves identifying patterns and trends in the data, and then interpreting these findings in the context of the research objectives. It is important to be objective and unbiased in this process, and to avoid drawing conclusions that are not supported by the data.

8. The final part of the document discusses the importance of reporting the results of the research. This involves writing a clear and concise report that summarizes the findings and provides recommendations for future action. The report should be written in a way that is easy to understand and that is accessible to all relevant parties.

CRUCES CALLE 13 CARRERA 7 (Alcantarillado)



Imagen 1 Calle 13 Carrera 7



Imagen 2 Calle 13 Carrera 7



Imagen 3 Calle 13 Carrera 7



Imagen 4 Calle 13 Carrera 7

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying and correcting errors in a timely manner.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and misstatements. It highlights that a strong internal control system is necessary to ensure that all transactions are properly authorized, recorded, and reviewed. The text also notes that internal controls should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and communication in financial reporting. It emphasizes that providing clear and concise information to stakeholders is essential for building trust and confidence in the organization. The text also mentions that transparency is a key component of good corporate governance and is essential for attracting investment and financing.

4. The fourth part of the document discusses the importance of compliance with applicable laws and regulations. It emphasizes that organizations must ensure that their financial reporting practices are in full compliance with all relevant laws and regulations. The text also mentions that compliance is essential for avoiding legal and financial penalties and for maintaining the organization's reputation.

5. The fifth part of the document discusses the importance of continuous improvement in financial reporting. It emphasizes that organizations should regularly review and evaluate their financial reporting processes to identify areas for improvement and to ensure that they are always up-to-date and effective. The text also mentions that continuous improvement is essential for staying ahead of the competition and for ensuring the long-term success of the organization.

CRUCES CALLE 13 CARRERA 7 (Alcantarillado)



Imagen 5 Calle 13 Carrera 7



Imagen 6 Calle 13 Carrera 7



Imagen 7 Calle 13 Carrera 7



Imagen 4 Calle 13 Carrera 7

1900

1900

1900

1900

CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 (Acueducto)



Imagen 4 Calle 13 entre carrera 7 y 5







Imagen 2 Calle 13 entre carrera 7 y 5



Imagen 5 Calle 13 entre carrera 7 y 5



Imagen 6 Calle 13 entre carrera 7 y 5

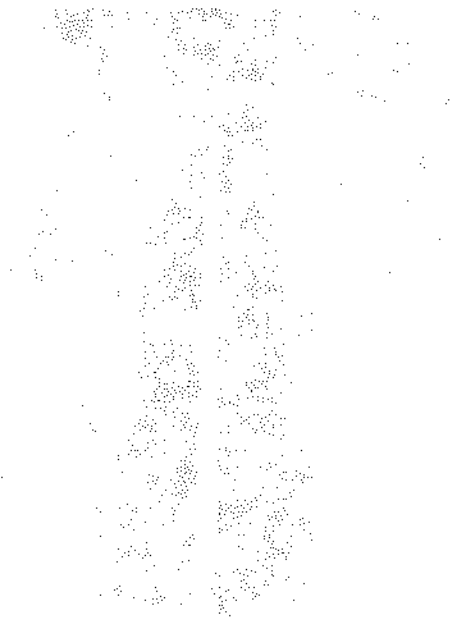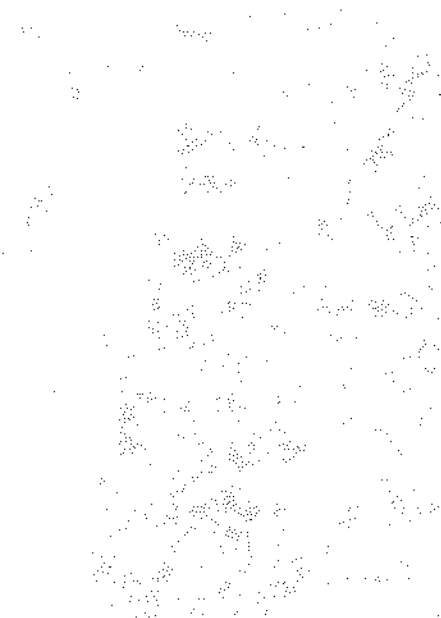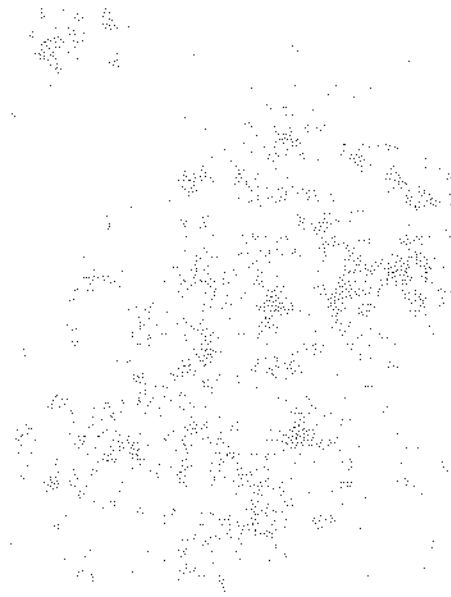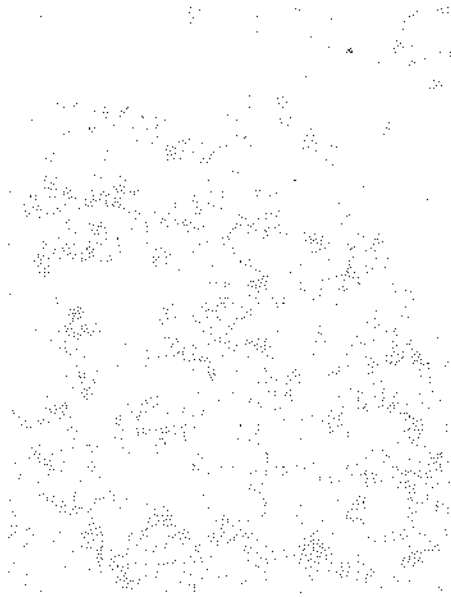

CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 (Acueducto)



Imagen 5 Calle 13 entre carrera 7 y 5



Imagen 6 Calle 13 entre carrera 7 y 5



Imagen 7 Calle 13 entre carrera 7 y 5



Imagen 8 Calle 13 entre carrera 7 y 5

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying and correcting errors in a timely manner.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and misstatements. It highlights that a strong internal control system is necessary to ensure that all transactions are properly authorized, recorded, and reviewed. The text also notes that internal controls should be designed to be cost-effective and to provide a reasonable level of assurance.

3. The third part of the document discusses the importance of segregation of duties. It explains that this principle is designed to reduce the risk of errors and fraud by ensuring that no single individual has control over all aspects of a transaction. The text also mentions that segregation of duties should be implemented in a way that is practical and does not create unnecessary inefficiencies.

4. The fourth part of the document addresses the need for regular monitoring and evaluation of internal controls. It states that internal controls should not be set and forgotten, but should be reviewed and updated as needed to reflect changes in the organization's operations and risk profile. The text also emphasizes that management should be responsible for ensuring that internal controls are effectively implemented and maintained.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Avance financiero:

Inversión Contratada:	\$1.141.920.016
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 111.720.031
Porcentaje ejecutado en el periodo:	9,78%
Inversión total ejecutada:	\$ 1.035.741.835
Porcentaje total ejecutado:	90,70%

A continuación, se presenta el seguimiento financiero del contrato en cada uno del frente de trabajo.





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

FRENTE DE OBRA		AVANCE FINANCIERO DE ACTA 6									
UBICACIÓN	OBRA	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA 01	VALOR ACTA 02	VALOR ACTA 03	VALOR ACTA 04	VALOR ACTA 05	VALOR ACTA 06	VALOR ACTA ACOMULADO	% Del periodo	% Acumulado
Calle 4A con Carreras 8 y 9	alcantarillado	\$ 30.270.298	\$ 27.332.216	\$ 2.938.329	-\$ 247	\$ 0	\$ 0		\$ 30.270.298	0%	100%
Calle 4A con Carreras 8 y 9	acueducto	\$ 13.465.688	\$ 0	\$ 12.359.628	-\$ 1.191.540	\$ 447.893	\$ 1.849.708		\$ 13.465.689	0%	100%
Calle 3B entre Carreras 7 y 8	alcantarillado	\$ 275.123.407	\$ 34.996.631	\$ 141.056.740	\$ 66.908.928	\$ 26.591.684	\$ 5.569.421		\$ 275.123.404	0%	100%
Calle 5 entre Carreras 5 y 6	alcantarillado	\$ 83.052.897	\$ 81.690.505	\$ 3.981.885	-\$ 6.743.119	-\$ 179.453	\$ 4.303.080		\$ 83.052.898	0%	100%
Carrera 9 con Calles 6 y 7	alcantarillado	\$ 68.205.894	\$ 31.657.052	\$ 29.261.076	-\$ 1.439.032	\$ 2.157.799	\$ 6.568.999		\$ 68.205.894	0%	100%
Carrera 9 con Calles 6 y 7	acueducto	\$ 20.061.195	\$ 0	\$ 13.368.711	\$ 6.065.733	\$ 0	\$ 626.752		\$ 20.061.196	0%	100%
Carrera 9 entre las Calles 7 y la 8	acueducto	\$ 9.662.021	\$ 5.247.169	\$ 2.975.662	\$ 423.853	\$ 0	\$ 1.015.338		\$ 9.662.022	0%	100%
Carrera 6 entre Calles 8 y 9	alcantarillado	\$ 20.425.893	\$ 16.224.659	\$ 3.881.994	\$ 382.711	-\$ 179.453	\$ 115.980		\$ 20.425.891	0%	100%
Carrera 6 entre Calles 8 y 9	acueducto	\$ 6.823.805	\$ 0	\$ 5.853.035	\$ 293.877	\$ 0	\$ 676.892		\$ 6.823.804	0%	100%
Calle 13 entre Carreras 9A y 4	alcantarillado	\$ 212.037.653	\$ 7.307.826	\$ 24.628.856	-\$ 827.980	\$ 0		\$ 87.960.577	\$ 119.069.279	41,48%	56%
Calle 13 entre Carreras 9A y 4	acueducto	\$ 52.325.331	\$ 4.943.925	\$ 9.542.983	\$ -146.175	0	\$ 1.015.338		\$ 39.115.525	45,41%	75%
Carrera 12 # 13-35 (Barrio san martin)	acueducto	\$ 5.341.505	\$ 0	\$ 5.011.442	-\$ 8.383	\$ 0	\$ 338.446		\$ 5.341.505	0%	100%
Barrio el Tunel desde la casa 25 hasta la casa 137	alcantarillado	\$ 216.444.998	\$ 0	\$ 85.053.947	\$ 56.207.701	\$ 59.002.277	\$ 16.181.071		\$ 216.444.996	0%	100%
Carrera 10 entre Calle 18 y 19 (Barrio san Francisco)	alcantarillado	\$ 33.504.542	\$ 0	\$ 7.022.539	\$ 20.589.745	\$ 1.079.526	\$ 4.812.732		\$ 33.504.542	0%	100%
Reposicion de pavimento por daño de alcantarillado carrera 11 entre calle 14 y 15	pavimento	\$ 9.288.219	\$ 0	\$ 7.002.964	\$ 2.003.234	\$ 0	\$ 282.019		\$ 9.288.217	0%	100%
Calle 5 entre Carreras 6 y 7		\$ 85.886.675	\$ 0	\$ 0	\$ 13.305.838	\$ 50.709.926	\$ 21.870.911		\$ 85.886.675	0%	100%
TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.141.920.016	\$ 209.399.983	\$ 353.939.791	\$ 155.825.144	\$ 139.630.199	\$ 65.226.687	\$ 111.720.031	\$ 1.035.741.835	9,78%	90,70%



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101041405	21-08-2019	18-10-2020	\$ 342.576.005
SALARIOS Y PRESTACIONES			21-08-2019	17-07-2023	\$ 228.384.003
ESTABILIDAD DE OBRA			21-08-2019	05-12-2024	\$ 228.384.003
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101031420	21-08-2019	17-10-2020	\$ 342.576.005

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X


4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural) SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
10 enero de 2020	A	N/A	A	D	N/A	A	A	A

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL		

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia	1		
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	1		
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia	1		
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES		3		
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				



GEO TRANSVIAL S.A.S.
Nít. 900976530-0
Calle #03 # 292 - 47 Alcazaves
Manizales (Caldas)

ENSAYO DE HUMEDAD INVE - 122 - 13					
OBRA:	REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA (CALDAS)				
LOCALIZACIÓN:	CHINCHINA (CALDAS)				
DIRIGIDO A :	CONSORCIO CALDAS				
FECHA :	08/06/2020				
Densidad	Profundidad (m)	W Cáp.	W Cáp. + MH	W Cáp. + MS	HUMEDAD
1		8,41	118,56	107,13	11,6
2		5,36	107,27	82,04	32,9
3		5,30	107,89	81,70	34,3
4		5,29	105,11	77,31	38,6
5		5,31	97,85	69,18	44,9
6		5,73	88,37	81,30	48,7



ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO
MP. 01111-10567 CPITV

10/2

10/3

10/4

10/5



GEOTRANSIVIAL S.A.S.
 NIT. 900376650-0
 Calle 40a # 19a - 47 B. Alcazaras
 Manizales (Caldas)

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA INV - E 161 - 13

PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA (CALDAS)
FECHA:	08/06/2020
DIRIGIDO:	CONSORCIO CALDAS
DESCRIPCIÓN:	LLENOS CON TIERRA
LOCALIZACIÓN:	CALLE 13 CON CARRERA 7 A CARRERA 5 (MEDIA CUADRA) CHINCHINA (CALDAS)

DENSIDAD PROCTOR (gr/cm³) **1,330**

PUNTO (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO INICIAL (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO FINAL (gr)	W ARENA EN EL HUECO (gr)	DENSIDAD ARENA (gr/cm ³)	VOLUMEN HUECO (cm ³)	PESO SUELO HUMEDO (gr)	HUMEDAD D (%)	PESO SUELO SECO (gr)	DENSIDAD SUELO HUMEDO (gr/cm ³)	DENSIDAD SUELO SECO (gr/cm ³)	COMPACTACIÓN (%)	LOCALIZACIÓN
1	6705	2160	2885	1,40	2061	3235	11,6	2899	1,57	1,41	105,8	ALCANTARILLADO
2	6605	2023	2922	1,40	2087	3322	32,9	2500	1,59	1,20	90,0	ALCANTARILLADO
3	6503	2509	2334	1,40	1667	3021	34,3	2250	1,81	1,35	101,5	ALCANTARILLADO
4	6678	2202	2617	1,40	2012	3392	36,6	2447	1,69	1,22	91,44	ACUEDUCTO
5	6570	2020	2880	1,40	2064	3793	44,9	2618	1,84	1,27	95,4	ACUEDUCTO
6	6483	2024	2739	1,40	1989	3728	49,7	2507	1,86	1,25	94,29	ACUEDUCTO

ING. CRISTIAN CÁMILO DELGADO
 MP. 01111-10567 CRTVC



CONTRATO No.	201	MUNICIPIO	CHIRICHIA CALDAS														
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	MIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AJAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR [m]
C3-C4	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	24"	6,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	2400091	PAVCO	860.005.050-1	2/03/2020	12	CONCRETO	6,5
C3-C4	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	24"	6,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	2900091	PAVCO	860.005.050-1	7/03/2020	12	CONCRETO	6,5
C3-C4	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	24"	6,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	2900091	PAVCO	860.005.050-1	11/03/2020	12	CONCRETO	6,5
C3-C4	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	24"	6,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	319071507-1	PAVCO	860.005.050-1	16/03/2020	12	CONCRETO	6,5
C3-C4	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	24"	6,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	319071507-1	PAVCO	860.005.050-1	20/03/2020	12	CONCRETO	6,5
1	SANITARIO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	6	5,3	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	319090304-1	PAVCO	860.005.050-1	5/03/2020	6	CONCRETO	5,3
2	SANITARIO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	6	5,3	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	319090304-1	PAVCO	860.005.050-1	9/03/2020	6	CONCRETO	5,3
3	SANITARIO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	6	5,3	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	319090304-1	PAVCO	860.005.050-1	13/03/2020	6	CONCRETO	5,3
4	SANITARIO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	6	6,0	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	319090304-1	PAVCO	860.005.050-1	14/03/2020	6	CONCRETO	6,0
5	SANITARIO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CALLE 13 ENTRE CARRERA 6 Y 5	6	0,7	PVC	Instalación con apertura de zanja	NO	-	-	319090304-1	PAVCO	860.005.050-1	17/03/2020	6	CONCRETO	0,7

[Handwritten signature]

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CALDAS
FIRMA CONTRATISTA	

NOMBRE SUPERVISOR E INTERVENIOR	JOSÉ FERNANDO ARNAS
FIRMA SUPERVISOR E INTERVENIOR	<i>[Handwritten signature]</i>

VISTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION.
 COORDINADOR ACUEDUCTO







EMPOLCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CHINCHINA-CALDAS

CONTRATO No: 0201 del 2019
ACTA No.: 6 Y PARCIAL
FECHA CORTE: 6 DE JUNIO 2020

OBJETO: Reparación De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas
FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 4 DE 2019
FECHA VENCIMIENTO: JULIO 18 DE 2020
MUNICIPIO: CHINCHINA, CALDAS.
VALOR CONTRATO: \$ 1.011.875.765
VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 1.141.920.016
REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
VALOR TRAMO: \$ 87.960.577
CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS
SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO ARIAS
FECHA: JUNIO 9 DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ADICIÓN No.1			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTA ACTA			% OBRA EFECTUADA
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. PARCIAL	SEJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
FRONTE 3: Reposición red de alcantarillado calle 13 en certeras 8 y 9a y de la 7 a la 4 en el municipio de Chinchiná Caldas												
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	365,30	5,106	1,865,222	124,20	624,165	138,30	706,160,0	262,50	1,340,325	71,86
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	309,00	13,326,00	4,117,734	0,00	0	159,10	2,120,167,0	159,10	2,120,167	51,49
4	Señal preventiva y reglamentaria	un	8,00	152,133,00	1,217,064	4,00	608,532	2,00	304,266,0	6,00	912,798	75,00
5	DEMOLICIONES											
6	Corte con disco abrasivo	ml	17,40	7,472,00	130,013	17,40	130,013	7,00	52,304,0	24,40	182,317	140,23
7	andenes, gradería y cañuelas	m²	8,00	81,587,00	652,696	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
8	EXCAVACION											
9	En material común de 0 a 2 m	m³	1261,16	25,772,00	32,502,692	234,46	6,042,513	527,58	13,596,892,0	762,04	19,639,395	60,42
10	En material común de 2,1 a 4 m	m³	519,52	30,047,00	15,610,017	0,00	0	245,47	7,375,502,0	245,47	7,375,502	47,25
11	Enlizado horizontal Tipo I	ml	220,30	30,484,00	6,715,625	0,00	0	96,40	2,938,658,0	96,40	2,938,658	43,76
12	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	199,56	32,071,00	6,400,089	1,89	60,614	129,96	4,167,887,0	131,85	4,228,501	66,07
13	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
14	Instalación e tubería PVC corrugada de 12"	ml	226,50	23,280,00	5,272,920	120,60	2,807,568	101,90	2,372,232,0	222,50	5,179,800	98,23
15	Instalación e tubería PVC corrugada de 16"	ml	104,00	31,040,00	3,228,160	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
16	Instalación e tubería PVC corrugada de 24"	ml	94,40	46,580,00	4,395,264	0,00	0	36,40	1,694,784,0	36,40	1,694,784	38,56
17	Cámara de caída D=1,2 H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchon de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	15,22	624,217,00	9,500,583	3,55	2,215,970	9,77	6,098,800,0	13,32	8,314,570	87,52
18	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm trafico pesado	Un	0,00	900,956,00	-	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
19	Bases y Cañuelas	Un	7,00	529,260,00	3,704,820	3,00	1,587,780	3,00	1,587,780,0	6,00	3,175,560	85,71
20	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	276,30	13,516,00	3,734,471	90,10	1,217,792	129,70	1,753,025,0	219,80	2,970,817	79,55
21	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	46,00	391,542,00	18,010,932	18,00	7,047,756	17,00	6,656,214,0	35,00	13,703,970	76,09
22	Instalación de silleas de 12"x6"	un	23,00	42,576,00	979,248	19,00	766,368	11,00	468,336,0	29,00	1,234,704	126,09
23	Instalación de silleas de 16"x6"	un	7,00	56,768,00	397,376	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
24	Instalación de silleas de 24"x6"	un	9,00	85,162,00	766,368	0,00	0	4,00	340,808,0	4,00	340,808	44,44
25	Empalme a cámara	un	14,00	86,443,00	1,238,202	3,00	265,329	9,00	795,987,0	12,00	1,061,316	85,71
26	LLENOS											
27	Arena para base y atraque	m³	146,74	118,159,00	17,338,480	27,23	3,217,298	69,13	8,168,282,0	96,36	11,385,581	65,87
28	Lleno compactado con material de la obra	m³	1472,72	21,673,00	31,918,285	207,95	4,507,002	654,15	14,177,427,0	862,11	18,684,428	58,54
29	Sub base para pavimento	m²	0,00	141,849,00	-	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
30	CONCRETOS											
31	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	0,00	592,947,00	-	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
32	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	0,00	805,247,00	-	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
33	ACERO											
34	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	60,00	5,799,00	347,940	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
35	ITEMS NO PREVISTOS DENTRO DEL CONTRATO											
36	Demolicion de pavimento rígido (FRONTE 14 CRA 10 CLL 18 Y 19)	M3	38,20	134,379,00	5,133,278	0,00	0	0,84	112,876,0	0,84	112,878	0,84
37	Acompañamiento social durante la Obra	Mes	2,00	1,638,504,00	3,277,008	0,00	0	1,00	1,638,504,0	1,00	1,638,504	1,00
38	ITEMS NO PREVISTOS CON ACTA DE CONVENIO											
39	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0,60cm	un	3,00	581,904	1,745,712	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
NP 3	Suministro transporte e instalación tubería PVC corrugada 12"	ml	54,00	159,386	8,606,844	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
NP 4	Suministro transporte e instalación de puente provisional en madera	ml	3,00	42,461	127,383	0,00	0	3,00	127,383,0	3,00	127,383	3,00



EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CHINCHINA- CALDAS



CONTRATO No.: 0201 del 2019
 OBJETO: Reparación de Redes de Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas
 MUNICIPIO: CHINCHINA, CALDAS.
 REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
 CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS

ACTA No.: 6 Y PARCIAL
 FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 4 DE 2019
 VALOR CONTRATO: \$ 1.011.875.765
 VALOR TRAMO: \$ 87.960.577
 SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO ARIAS

FECHA CORTE: 6 DE JUNIO 2020
 FECHA VENCIMIENTO: JULIO 18 DE 2020
 VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 1.141.920.016
 FECHA: JUNIO 9 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	UNID	ADICION No 1			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	%EJEC.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	
NP 5	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	Mes	2,00	4.810.516	9.621.032	0,00	0	1,00	4.810.516,0	1,00	4.810.516	
NP 6	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESINFECCION, PROTECCION, Y REGISTRO CONTROL.	GI	1,00	3.305.695	3.305.695	0,00	0	1,00	3.305.695,0	1,00	3.305.695	
NP 7	GASTOTRABAJADOR POR SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESINFECCION, PROTECCION, REGISTRO CONTROL Y TIEMPO DEDICADO A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19	Personaldía	500,00	10.362	5.181.000	0,00	0	250,00	2.590.500,0	250,00	2.590.500	
COSTO TOTAL					207.042.153,00		31.108.700,0		87.960.577		119.069.277	

COSTO DIRECTO		153.421.300,51	23.852,019	65.180.723,75	88.232.143,02
ADMINISTRACION %	24	36.821.131,32	5.532.465,00	15.643.229,70	21.175.714,32
IMPREVISTOS %	5	7.671.069,03	1.152.601,00	3.259.006,19	4.411.607,15
UTILIDADES %	5	7.671.069,03	1.152.601,00	3.259.006,19	4.411.607,15
SUMA ANTES IVA		205.584.649,89	30.889.706,00	87.341.365,82	118.231.071,64
I. V. A.	19	1.457.503,11	218.994,00	619.211,18	838.205,36
VALOR TOTAL OBRA		207.042.153,00	31.108.700	87.960.577,00	119.069.277,00

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA 87.960.577



EMPOLCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS

CONTRATO No: 0201 del 2019
ACTA No.: 6 Y PARCIAL
FECHA CORTE: 6 DE JUNIO 2020
OBJETO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas
FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 4 DE 2019
FECHA VENCIMIENTO: JULIO 18 DE 2020
MUNICIPIO: CHINCHINA, CALDAS.
VALOR CONTRATO: \$ 1.011.875.765
VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 1.141.920.016
REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
VALOR TRAMO: \$ 23.759.454
SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO ARIAS
CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS
FECHA: JUNIO 9 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	UNID	ADICION No.1			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA			% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
FRENTE 4: Cambio red acueducto calle 13 en carreras 8 y 9 y 4 a la 7 en el municipio de Chinchiná Caldas															
1	PRELIMINARES														
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	548,10	5.122	2.807.368	225,10	1.152.962	156,50	801.593,0	381,60	1.954.555	69,62			
3	Señal preventiva y reglamentaria	un	6,00	152.589	915.534	6,00	915.534	0,00	0,00	6,00	915.534	100,00			
4	DENOLICIONES														
5	Corte con disco abrasivo	ml	4,60	7.494	34.472	4,60	34.472	0,00	0,00	4,60	34.472	100,00			
6	andenes, gradería y cañuelas	m³	2,00	81.830	163.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	EXCAVACION														
8	En material común de 0 a 2m	m³	340,55	25.849	8.802.877	130,55	3.374.587	106,99	2.765.585,0	237,54	6.140.171	69,75			
9	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	30,17	32.168	970.589	0,17	5.549	22,71	730.467,0	22,88	736.016	75,63			
10	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO														
11	Instalación de tubería PVC de 3"	ml	548,10	5.822	3.191.038	225,10	1.310.532	156,50	911.143,0	381,60	2.221.675	69,62			
12	medidor	Un	78,00	41.169	3.211.182	52,00	2.140.788	40,00	1.646.760,0	92,00	3.787.548	117,95			
13	Instalación de Válvulas	Un	11,00	205.840	2.264.240	3,00	617.520	3,00	617.520,0	6,00	1.235.040	54,55			
14	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un	11,00	338.446	3.722.906	3,00	1.015.338	0,00	0,00	3,00	1.015.338	27,27			
15	Empalme a tubería existente	un	18,00	88.708	1.596.744	6,00	532.248	8,00	709.664,0	14,00	1.241.912	77,78			
16	LLENOS														
17	Arena para base y atraque	m³	44,89	118.514	5.320.051	14,89	1.764.631	7,82	926.570,0	22,71	2.691.201	50,59			
18	Lleno compactado con material de la obra	m³	294,63	21.738	6.404.750	114,63	2.491.910	99,17	2.155.674,0	213,80	4.647.584	72,56			
19	Sub base para pavimento	m³	0,00	142.274	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	CONCRETOS														
21	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	0,00	594.725	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Concreto para pavimento 42MPR hecho en obra	m³	0,00	807.663	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	ACERO														
24	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	60,00	5.799	347.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	OBRAS ADICIONALES CON PRECIO CONTRACTUAL /														
26	Demolicion de pavimento rígido (FRENTE 14 CRA 10 CLL 18 Y	m²		134.379	-	0,00	0,00	0,42	56.439,0	0,42	56.439				
27	ITEMS NO PREVISTOS CON ACTA DE CONVENIO														
NP 1	Suministro transporte e instalación caja hf y alineacion medidores (incluye demoliciones y accesorios	un	60,00	209.533	12.571.980	0	0	55,00	11.524.315,0	55,00	11.524.315				
NP 2	Suministro, transporte e instalación tapa para agrupacion de medidores, incluye concreto marco tapa y contramarco en angulo de 2" x 3/16"	un		456.862	-	0,00	0,00	2,00	913.724,0	2,00	913.724				
COSTO TOTAL															
					52.325.331		15.356.071		23.759.454		38.115.524				
COSTO DIRECTO					38.773.865,14		11.379.082		17.608.116,34		28.985.197,48				
ADMINISTRACION	%	24		9.905.727,63		2.730.980,00		4.225.467,92		6.956.447,40					
IMPREVISTOS	%	5		1.936.693,26		568.954,00		880.305,92		1.449.259,87					
UTILIDADES	%	5		1.936.693,26		568.954,00		880.305,92		1.449.259,87					
SUMA ANTES IVA				51.566.979,28		15.247.970,00		23.592.195,89		38.640.164,62					
I. V. A.	%	19		388.351,72		108.101,00		187.258,11		276.359,38					
VALOR TOTAL OBRA					52.325.331,00		15.356.071		23.759.454,00		39.115.524,00				
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA					23.759.454										

Handwritten signature and checkmarks on the right side of the page.

TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ACUEDUCTO

ID TRAMO	PROCESO	201	MUNICIPIO	CRINCHINA(CALDAS)	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NISH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	PLOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
2	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
3	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
4	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
5	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
6	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
7	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
8	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
9	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
10	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
11	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
12	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
13	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
14	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
15	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
16	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
17	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
18	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT001	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
19	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
20	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
21	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
22	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
23	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
24	Red Primaria o Matriz	CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 6	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
25	Red Primaria o Matriz	CRUCE SOBRE CARRERA 7 CALLE 13	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
26	Red Primaria o Matriz	CRUCE SOBRE CARRERA 6 CALLE 13	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
27	Red Primaria o Matriz	CRUCE SOBRE CARRERA 5 CALLE 13	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6
28	Red Primaria o Matriz	CRUCE SOBRE CARRERA 6 CALLE 13	PVC P	Instalación con apertura de zanja		NO				RT002	PAVCO	319080118-1	16/05/2020	3"	ASBESTO	6

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

NOMBRE CONTRATISTA
 FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

CONSORCIO CALDAS

LUIS FERNANDO ARIAS
 Luis Arias

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
 COORDINADOR ACUEDUCTO

100

1

2

3

4

Marzo 9 de 2020:

- Calle 13 Carreras 7 y 6: continúan los llenos sobre red de 12" para alcantarillado. Se empieza a construir la base-cañuela para cámara de arranque sobre Cra 7 esquina.

Calle 13 Carreras 6 y 5: se empieza a instalar lleno compactado sobre el primer tubo instalado de 24". Se empieza la adecuación con 20 cms de gravilla para sustituir material en malas condiciones y nivelar superficie para apoyo de tubería de 24".
Condiciones Climáticas: Se presentan lluvias fuertes en la tarde y durante la noche.

Marzo 10 de 2020:

Calle 13 Carreras 7 y 6: se encuentra daño sobre red de conducto principal (red de distribución existente) a causa de descontinuidad de terreno por fuertes lluvias presentadas durante la noche del 9 de marzo. Se reporta daño a EMPORALDAS para que proceba con su reparación.


Calle 13 Carreras 6 y 5: continúan llenos sobre red de 24" instalada y continúan excavación para instalar tramo siguiente de 24"

Condiciones Climáticas:

Libro Medio Oficio 80 H.

Malden

Malden

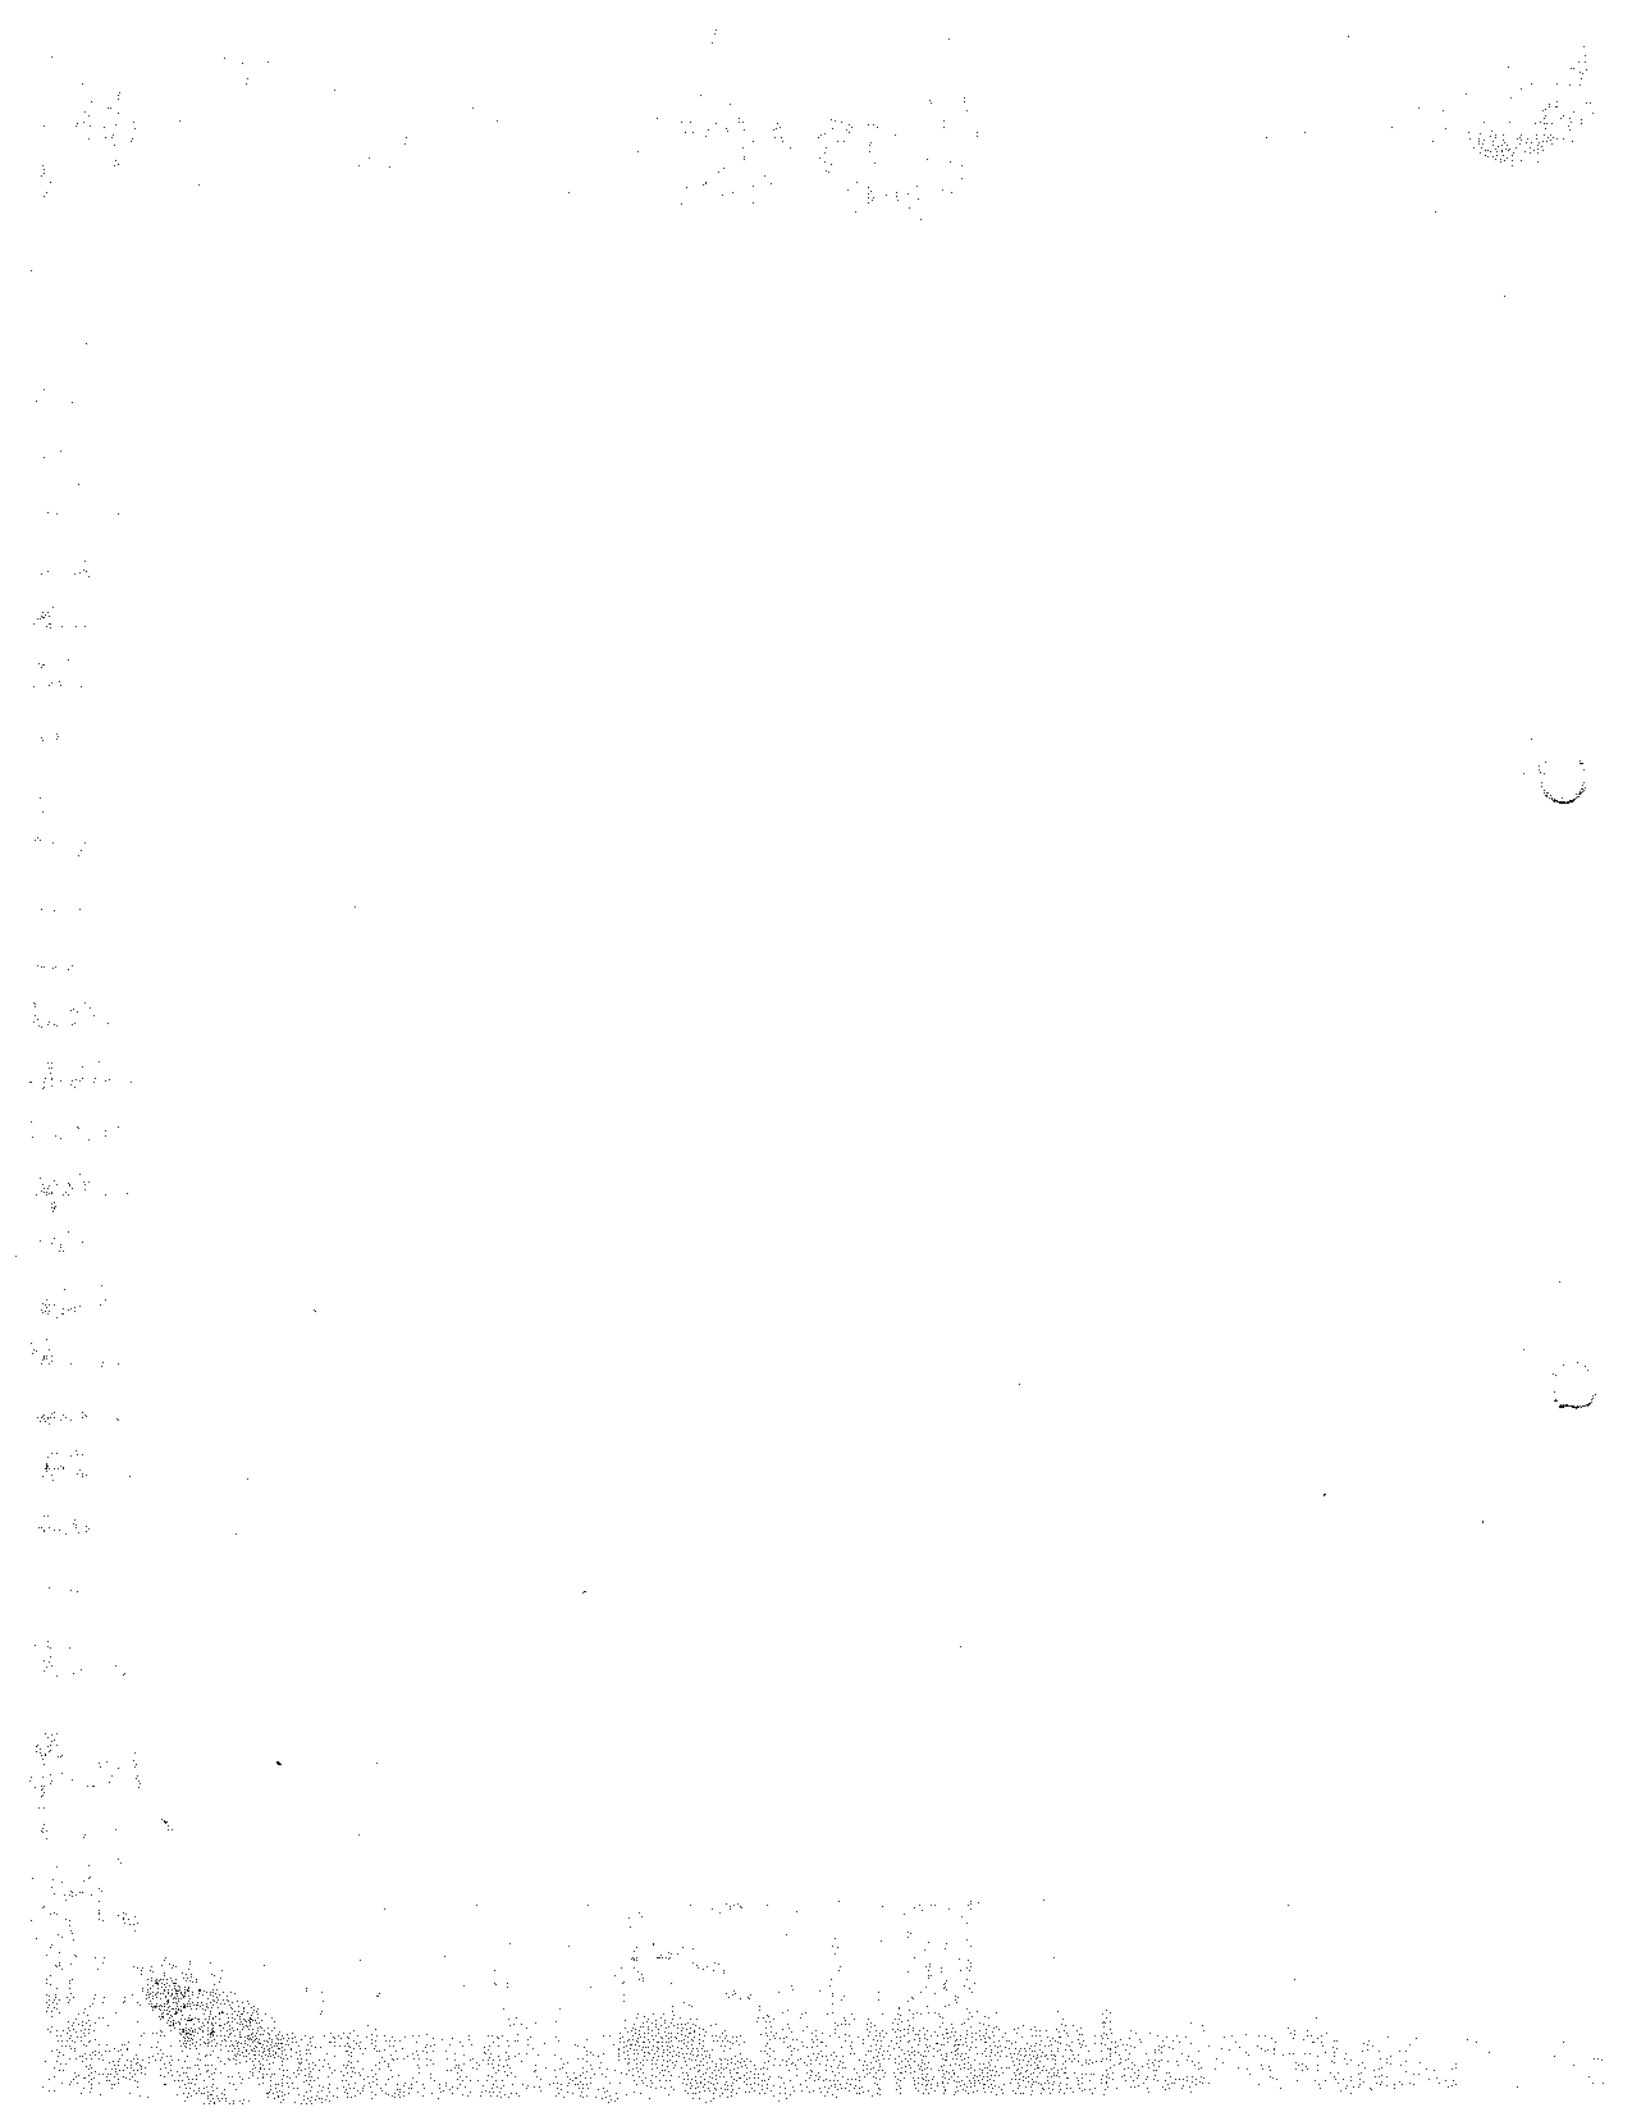

Marzo 11 de 2020 /

Calle 13 Carreras 7 y 6: Continúa líneas sobre red de 12" para alcantarillado. Se funda primer cuerpo de cámara de arranque sobre carrera 7 esquina.

Calle 13 Carreras 6 y 5: Continúa labores de instalación de tuberías de 24"

Condiciones Climáticas:

NOTA: se hace inspección de los puntos donde se deben instalar las cámaras HF para medidores solicitados por EMPARIDAS, se evidencia que el Contratista de obra de la Alcaldía de Chirichins dejó los huecos desahucados y algunos medidores quedaron decentrados respecto al espacio para instalación de caja.

Marzo 12 de 2020 /

Calle 13 Carreras 7 y 6: se desconecta primer cuerpo de cámara de arranque sobre parte 7 y se empieza a instalar formateo para segundo cuerpo.

Calle 13 Carreras 6 y 5: Se instala segundo tubo de 24" sobre cama de gravilla de 20 cms. Continúa las excavaciones para domiciliares de alcantarillado sobre margen izquierda.

Condiciones Climáticas:

Libro Medio Oficio 80 H.

Marzo 13

Calle 13 de inspección derecha

Calle 13 de esta sobre 5

instalación tapas y Condiciones


Marzo 14

Calle 13 cámara de

Se deja derecha Calle 13

tubo de Empresa de 24" Condiciones

Libro Medic

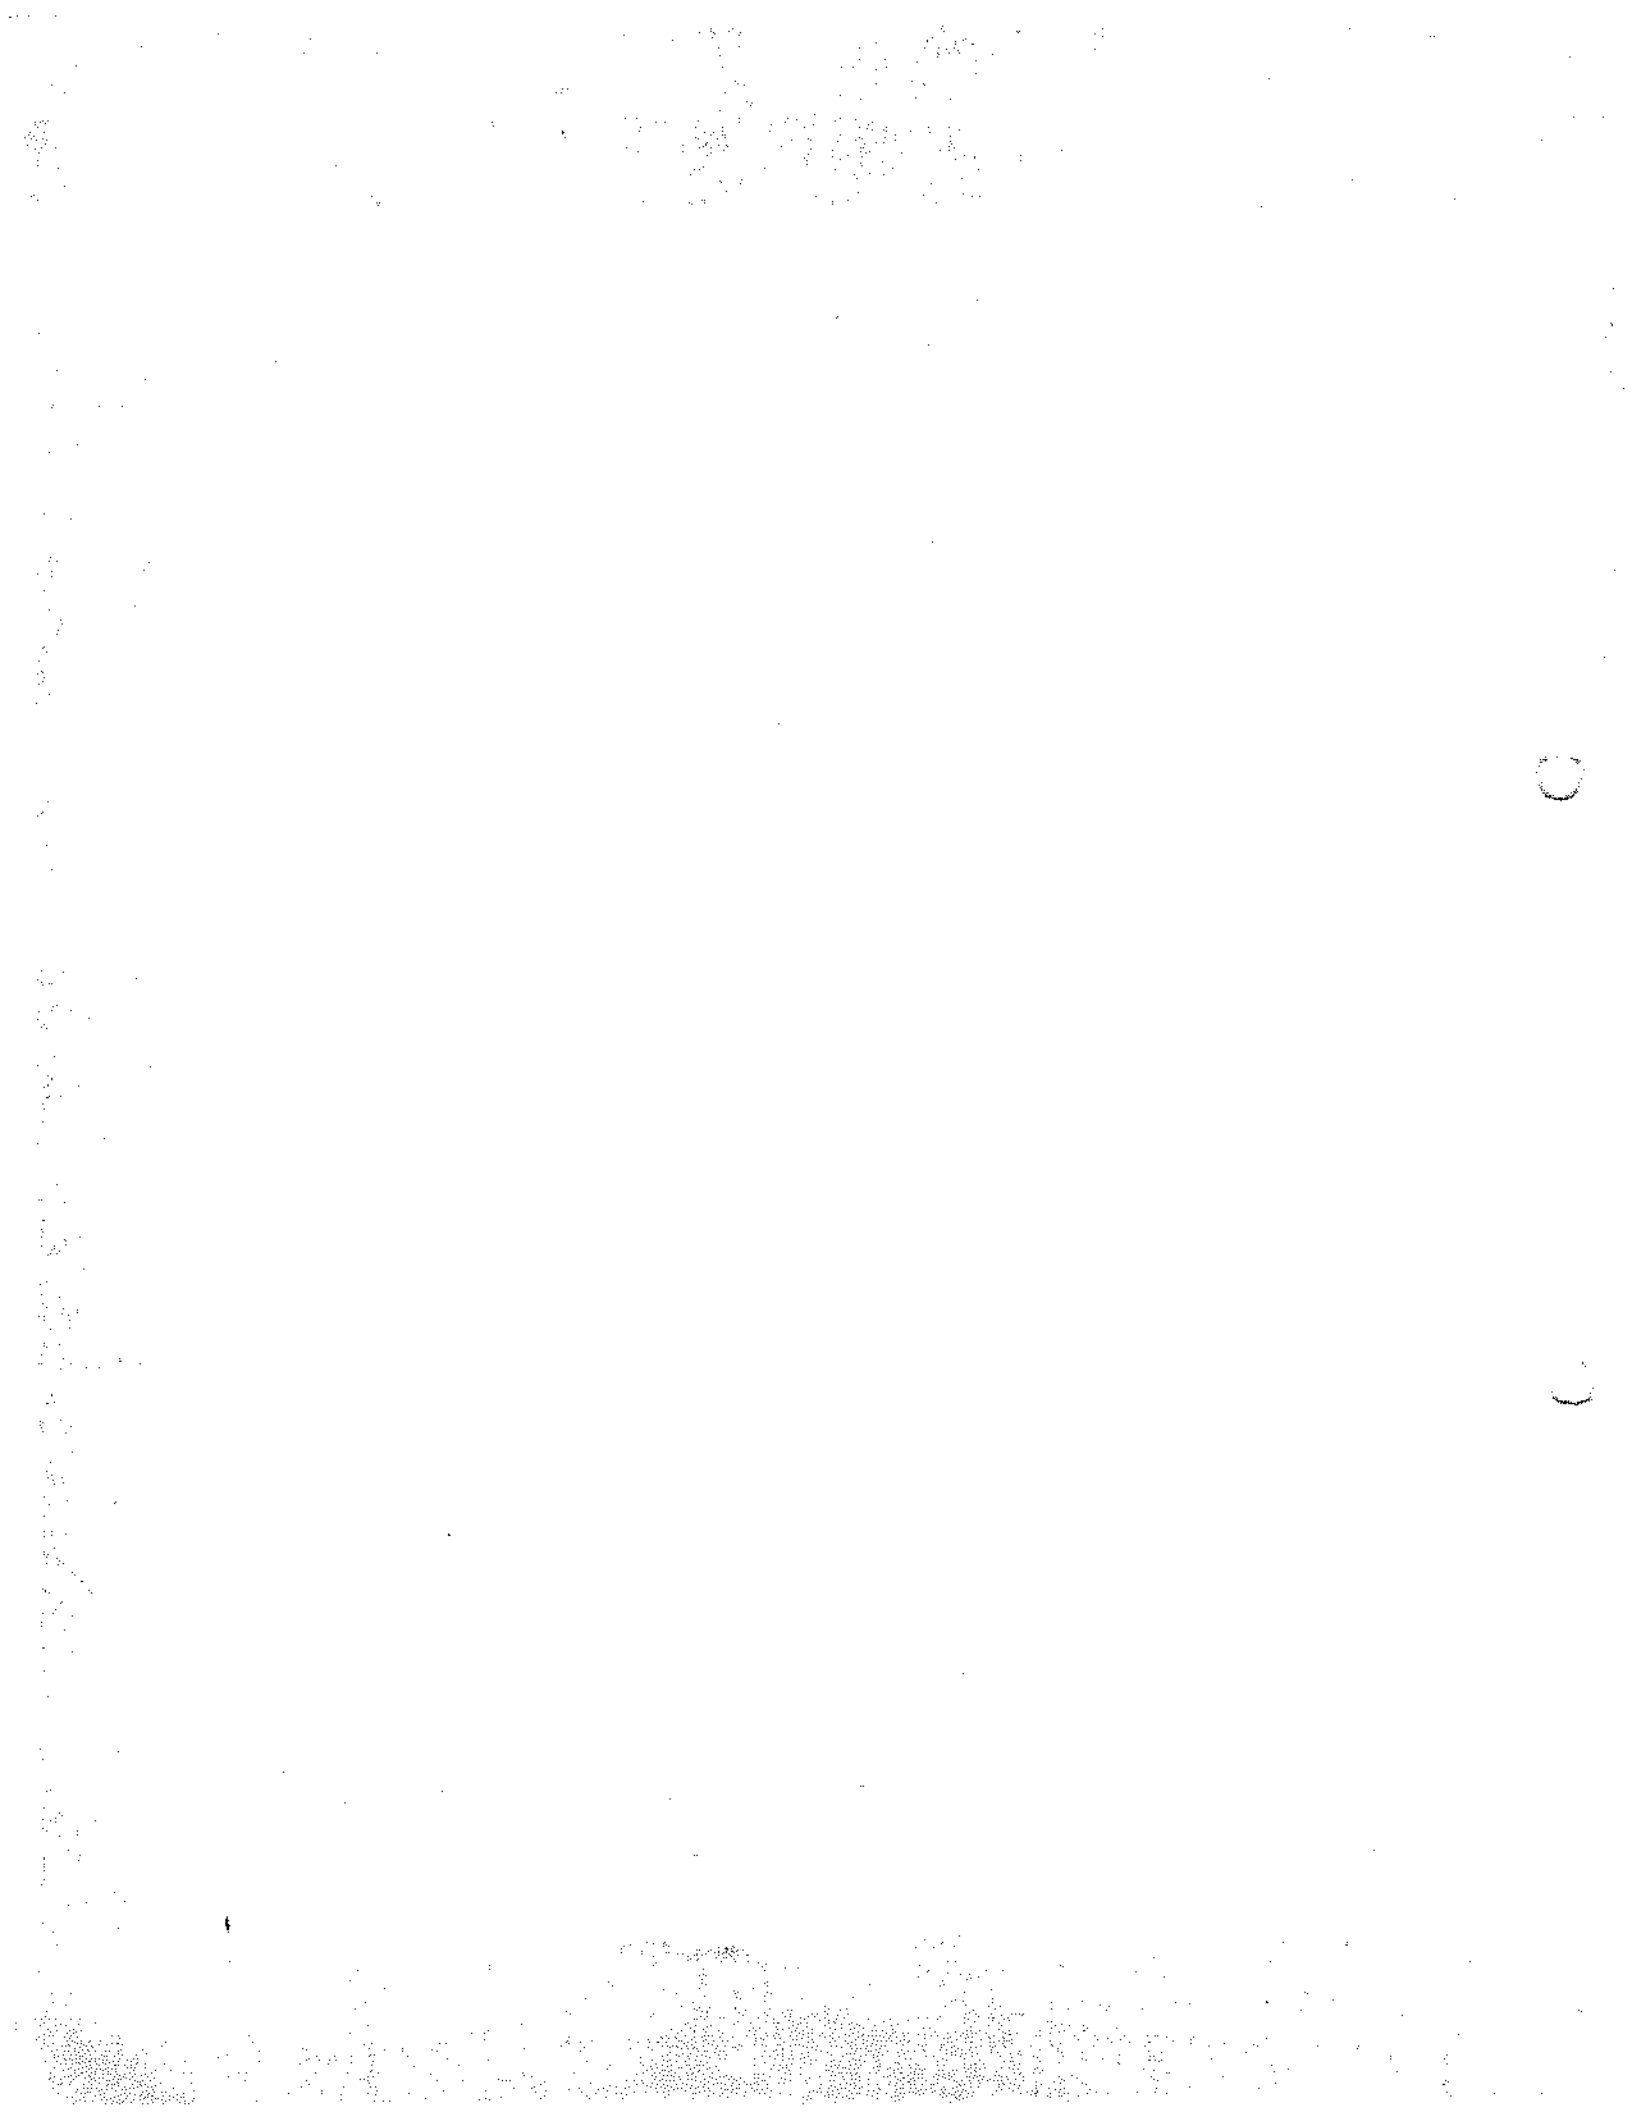

abrir red
de agua de

instalación

se deben
trabajar por
esta obra

desalineados
respecto al

trabajo

un campo de
trabajo a

tubo de
continuar
con el tubo

Marzo 13 de 2020:

Calle 13 Carreras 7 y 6: Se instalan tapas para cajas de inspección y empalme de domiciliarios sobre margen derecha.

Calle 13 Carreras 6 y 5: continúa excavación e instalación de entibado para red de 24". Se realiza lleno compactado sobre segundo tubo instalado de 24". Inicia la instalación del tercer tubo de 24". Se fabrican tapas para cajas de inspección.

Condiciones Climáticas:

Marzo 14 de 2020:

Calle 13 Carreras 7 y 6: se funda segundo cuerpo de cámara de altoparlante sobre esquina de Carrera 7

Se dejan todas las domiciliarios llenos sobre la margen derecha.


Calle 13 Carreras 6 y 5: se cubre la instalación del tercer tubo de 24" y los domiciliarios sobre margen izquierda.

Empresen excavaciones para cuarto y quinto tubo de 24". Empieza excavación para cámara cilíndrica a medio cuadro.

Condiciones Climáticas:

Marden

Marden

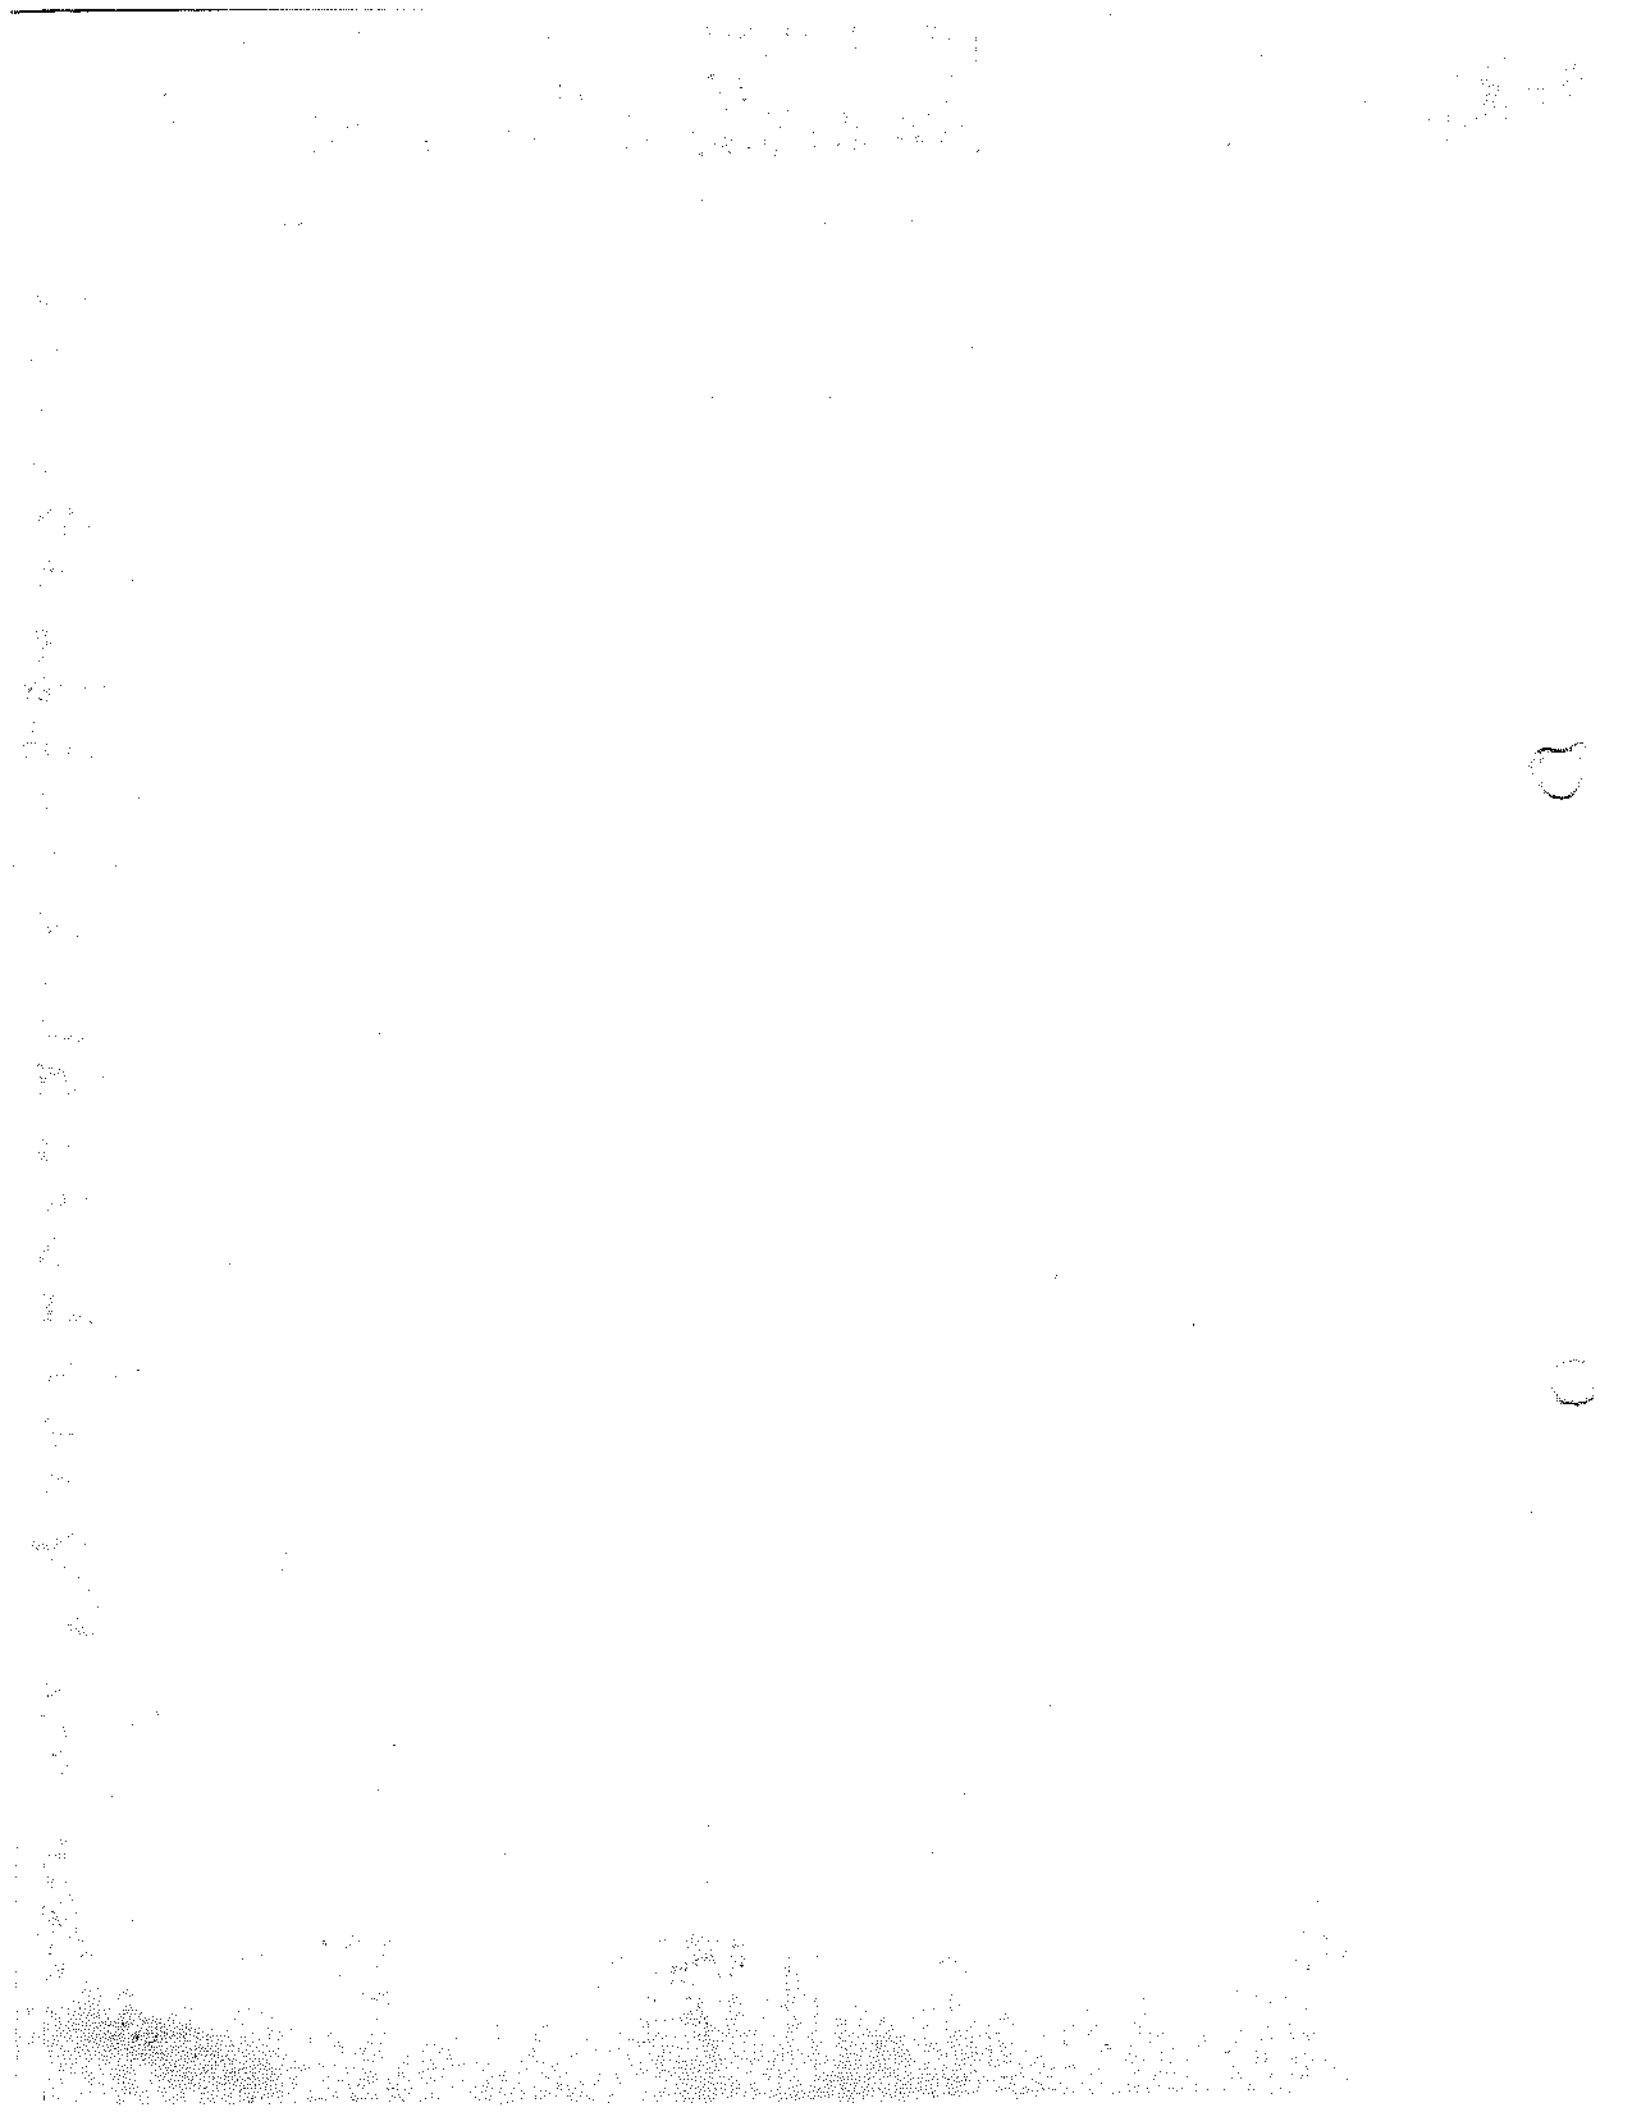

Marzo 16 de 2020: ✓

- Calle 13 Cras 7 y 6: se desarrolla segundo cuerpo y se instala formalita para fondo tercer cuerpo de cámara de anaque sobre la esquina de carrera 7.

- Calle 13 Cras 6 y 5: se empiezan a realizar llenos compactados sobre el tercer tubo de 24" instalado y sobre las domiciliarias de 6" instaladas. Continúan las excavaciones para cuarto y quinto tubo de 24".

Condiciones Climáticas:

Marzo 17 de 2020: ✓

- Calle 13 Cras 7 y 6: se fundo tercer cuerpo para cámara de anaque sobre esquina de carrera 7.

- Calle 13 Cras 6 y 5: finalizan los llenos sobre tercer tubo de 24" y de domiciliarias de alcantarillado, culmina la excavación para cuarto tubo de 24". Se realiza vaciado de cajal de inspección para domiciliarias de alcantarillado. Culmina excavación para cámara a media cuadra.

Condiciones Climáticas:

Marzo 18

Calle 13

Cámara de

carrera 7

- Calle 13

para red

lleno compact

el usado

de alcantar

para la ca

calle 13

Condiciones

Marzo 19

Calle 13

de obra

- Calle 13


para red

gravilla

de inspe

(primer

Condiciones

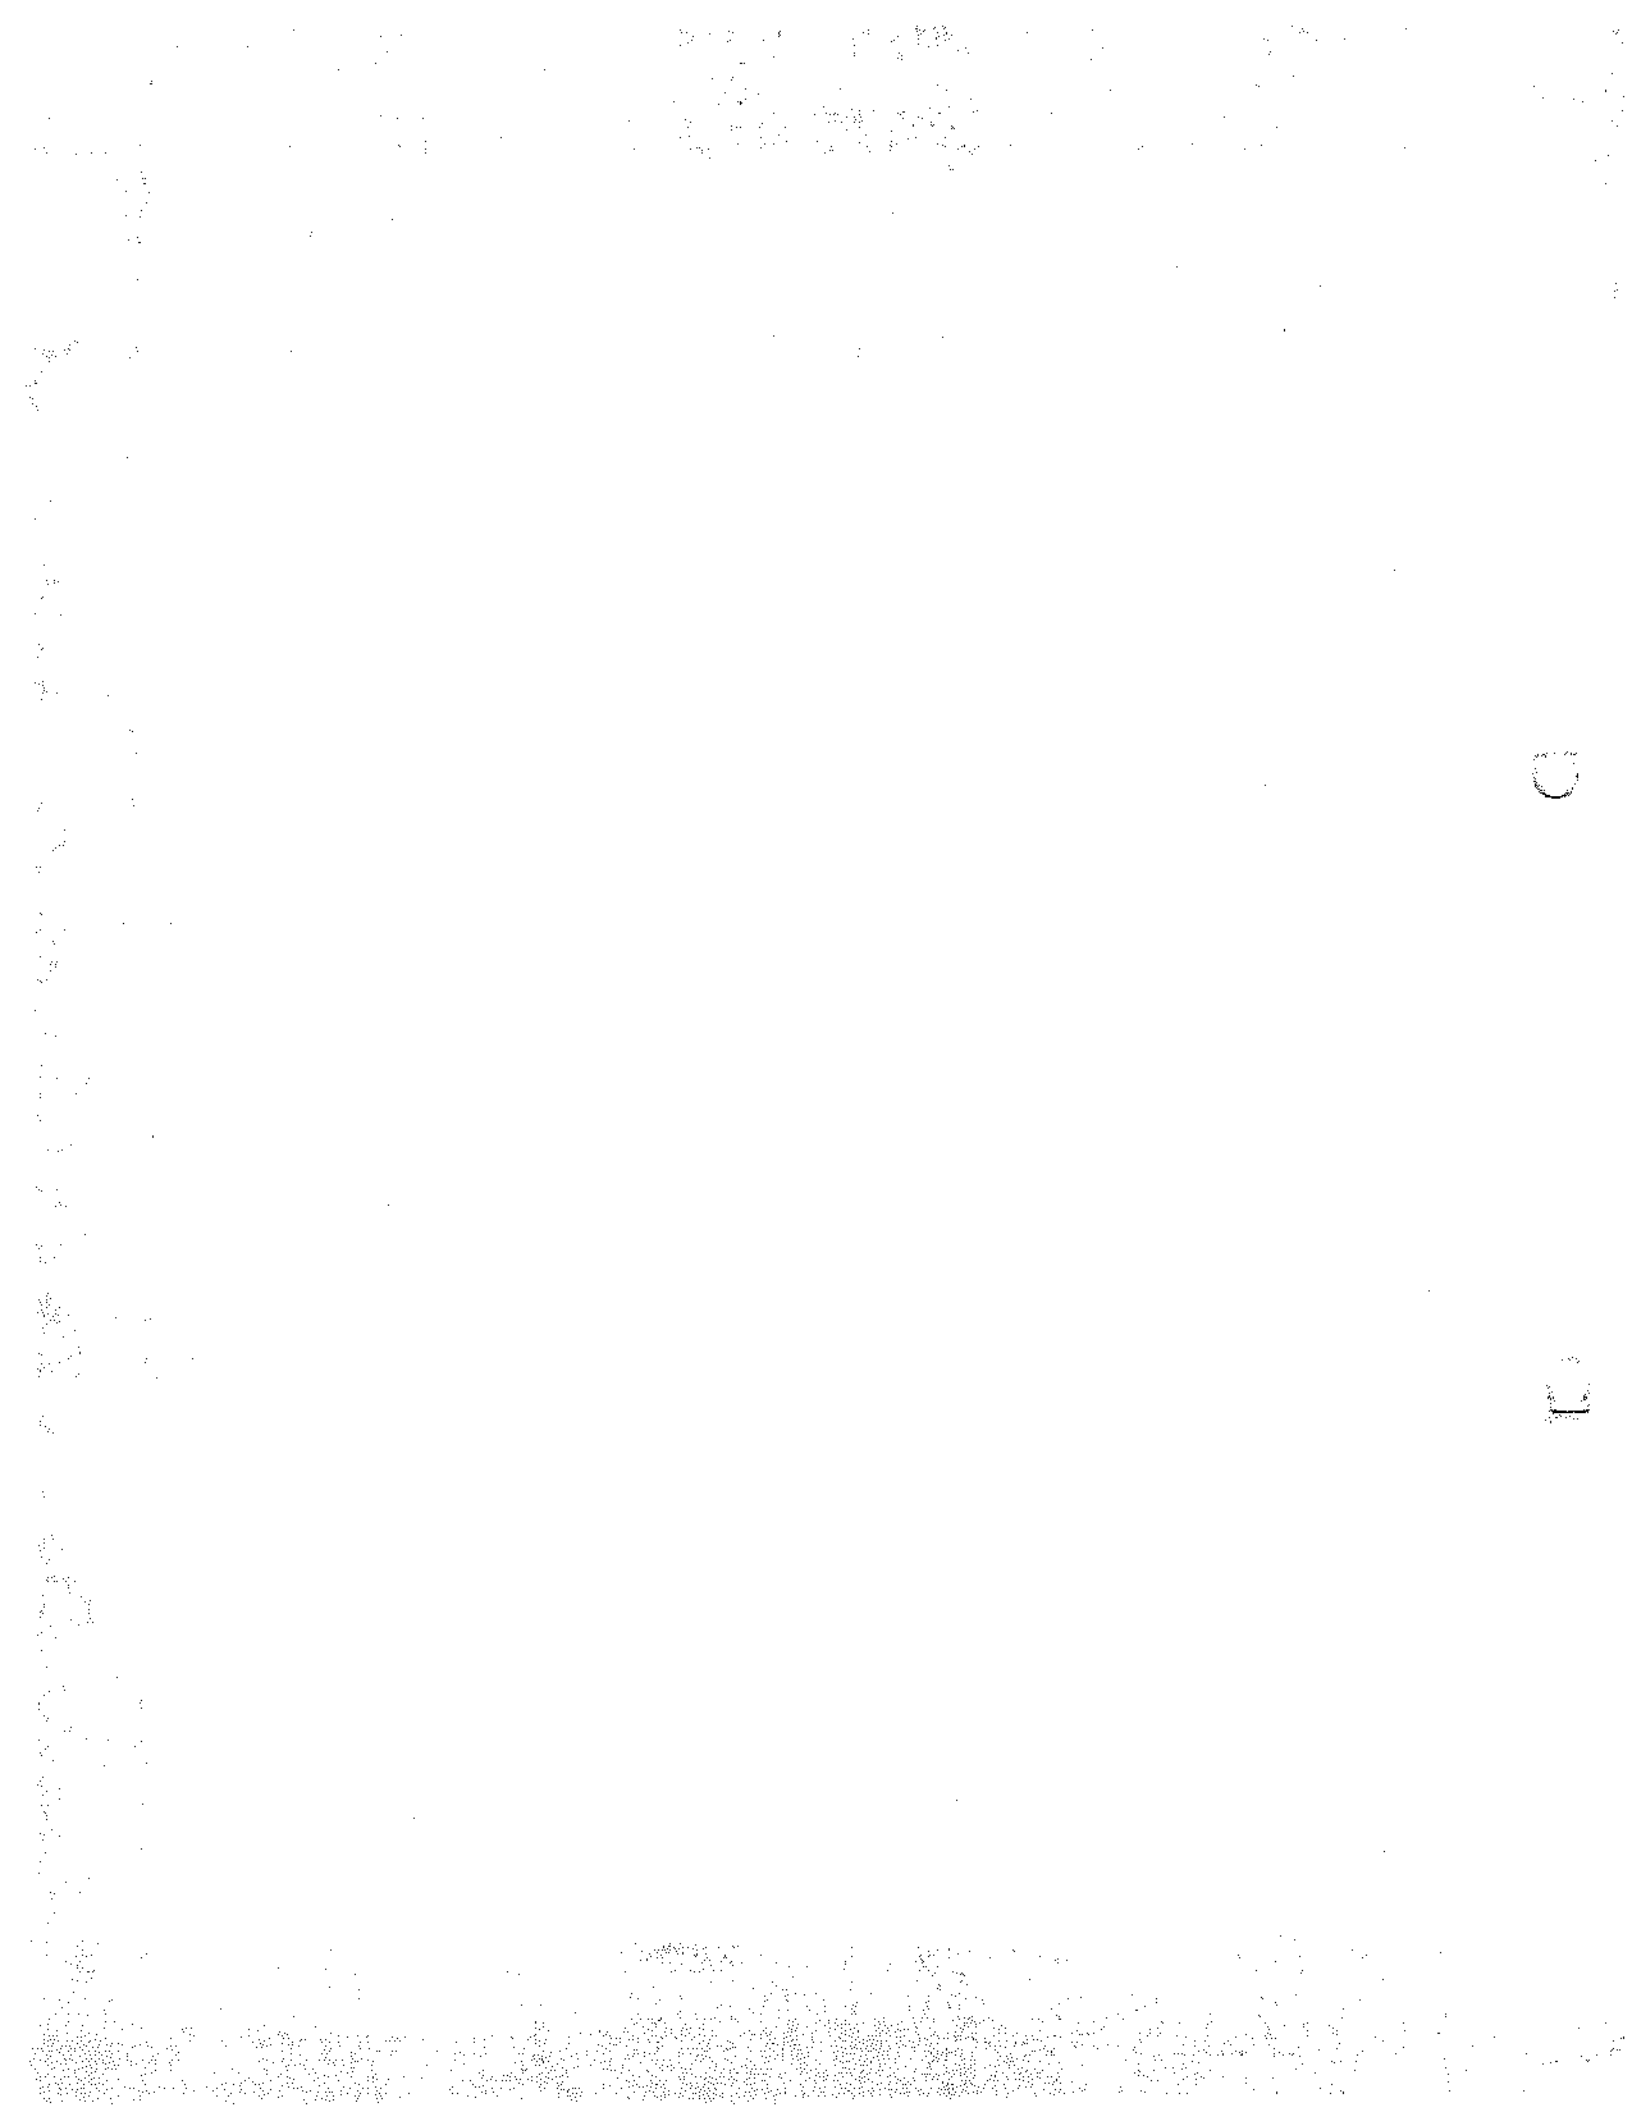

Marzo 18 de 2020:

Calle 13 Cras 7 y 6: se desarrolla tercer cuerpo de cámara de aligerar construida sobre la exigua de cámara 7.

Calle 13 Cras 6 y 5: se instala cuarto tubo de 24" para red principal de alcantarillado. Comienzan labores de lleja compactado sobre el tubo instalado. Se culmina el vaciado de cajas de inspección para domiciliarios de alcantarillado. Inicia el vaciado de base ranurada para la cámara de inspección cilíndrica ubicada sobre calle 13 a medio cuadro.


Condiciones Climáticas:

Marzo 19 de 2020:

Calle 13 Cras 7 y 6: se repone señalización y cerramiento de obra de los tramos en mal estado.

Calle 13 Cras 6 y 5: se instala quinto tubo de 24" para red de alcantarillado principal sobre cama de gravilla de 20 cms. Continúa el vaciado de cámara de inspección a medio cuadro entre carreras 6 y 5 (primer cuerpo).

Condiciones Climáticas:

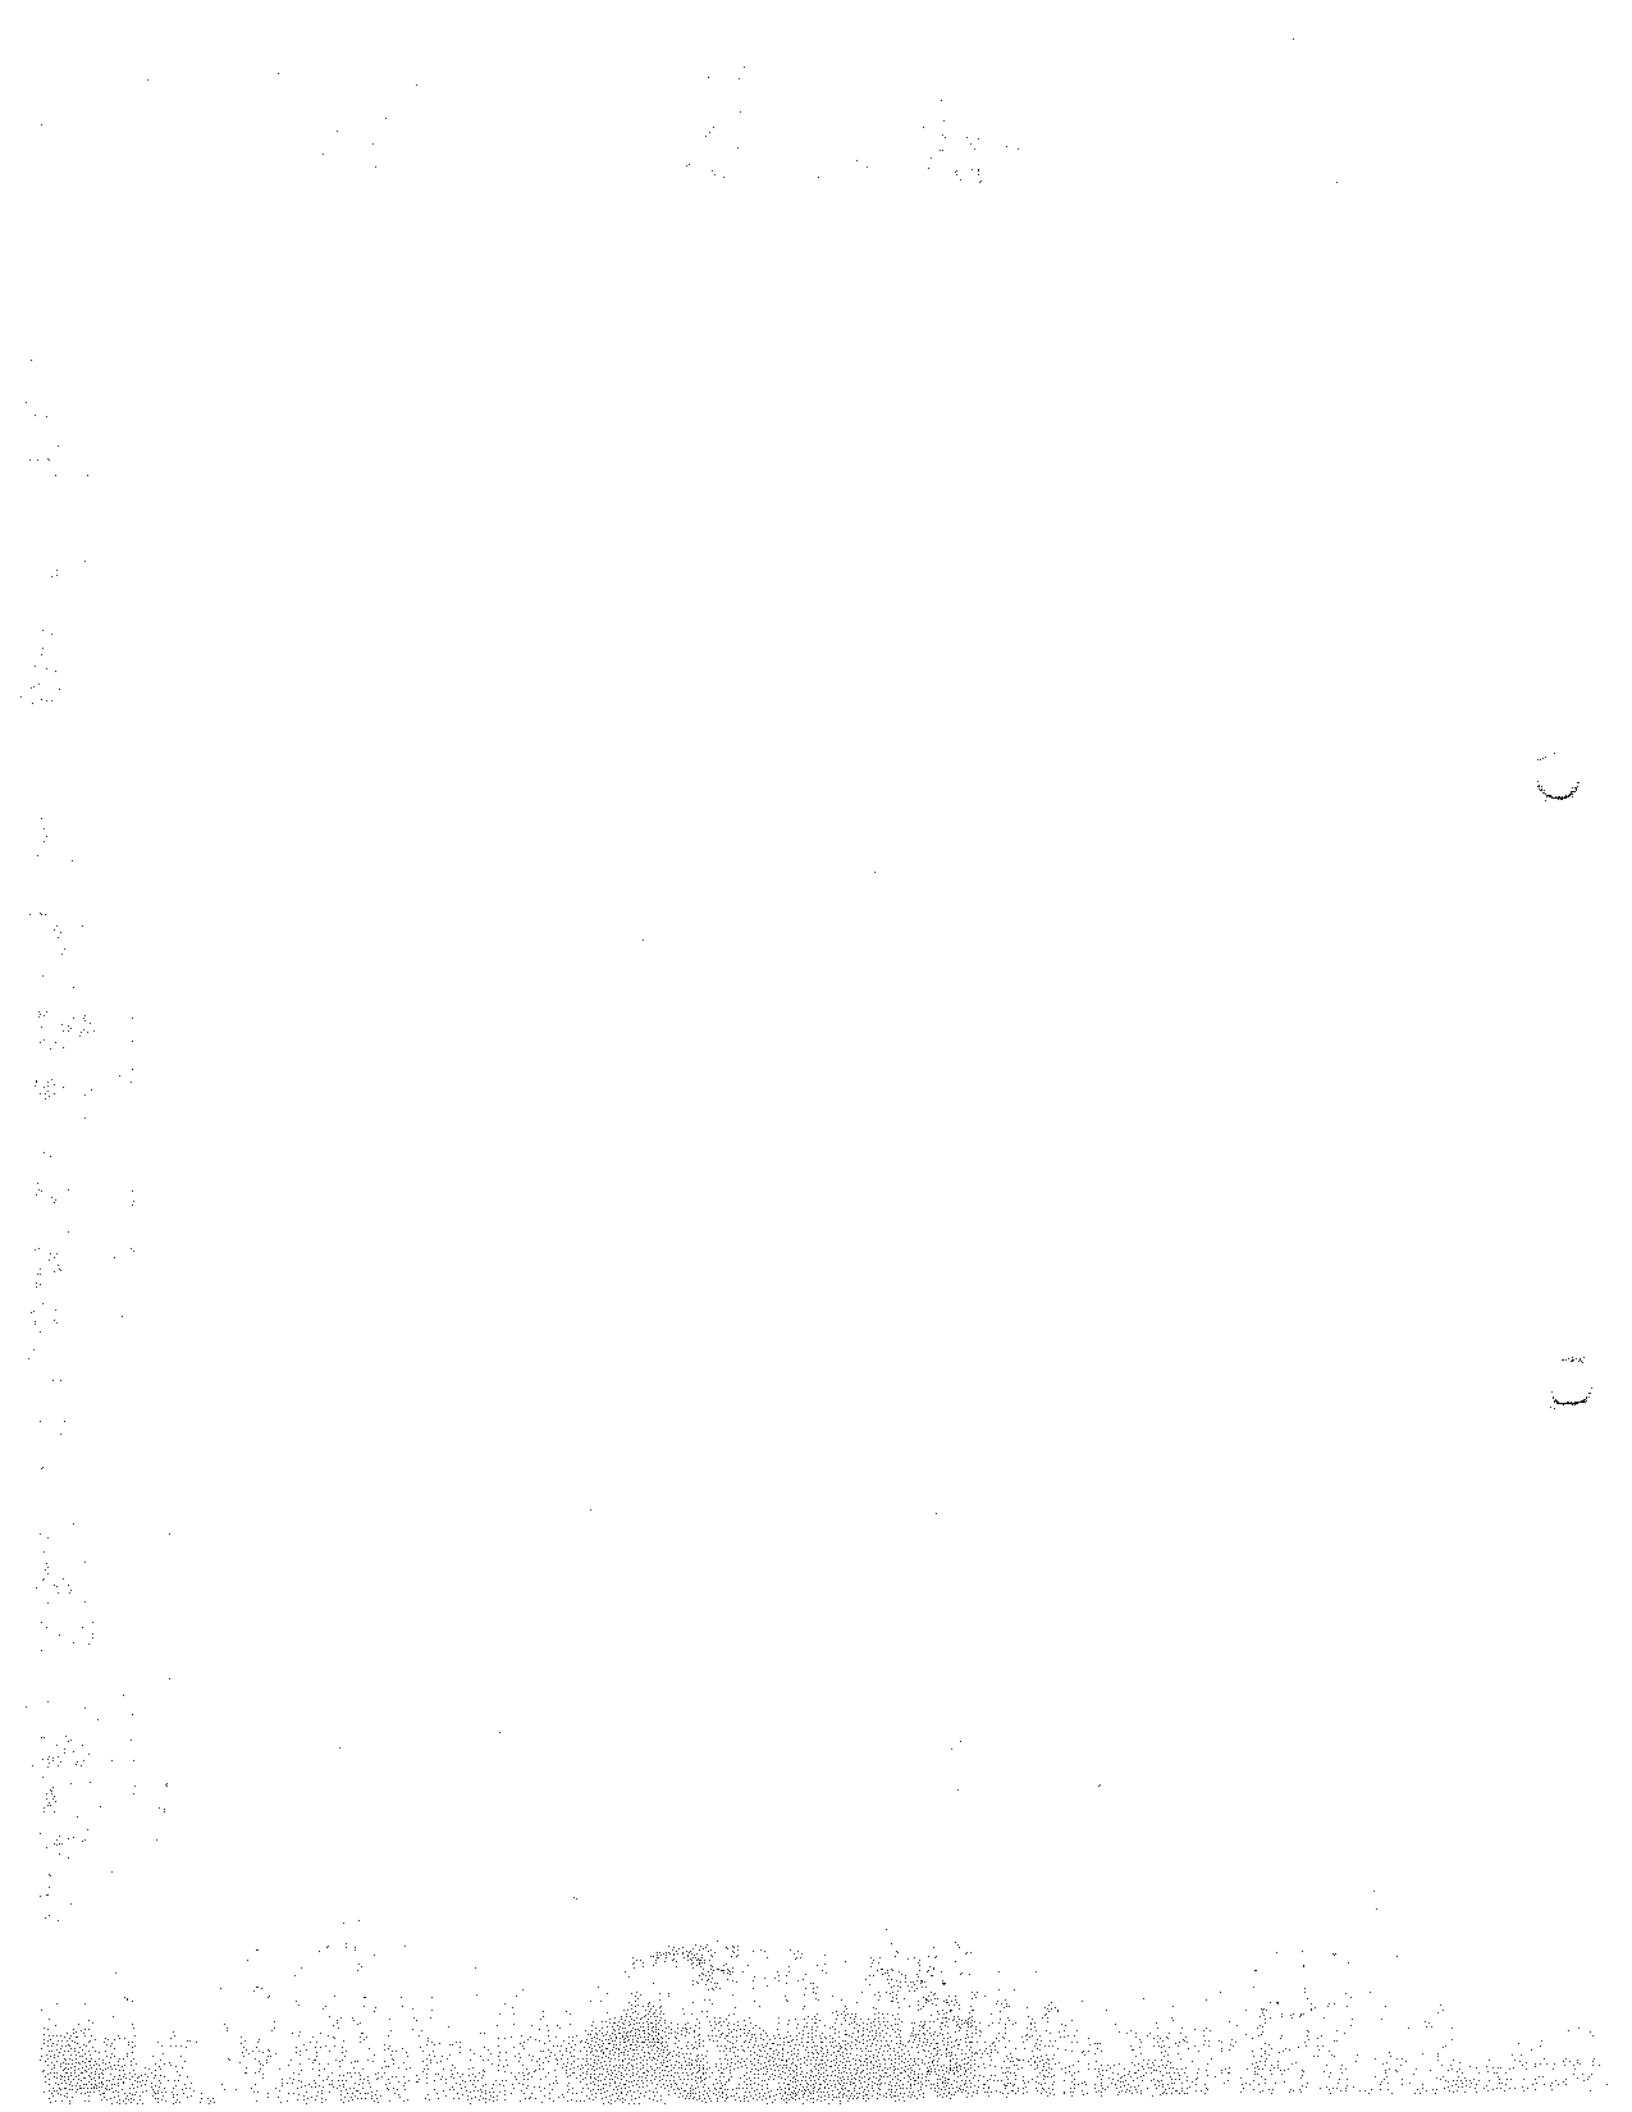

Marzo 20 de 2020:

Calle 13 Cas 6 y 5: se inicia lleno compactado sobre quinto tubo de 24" instalado. Continúa vaciado de cámara de inspección sobre calle 13 (media cuanta)

Condiciones Climáticas:

(Handwritten signature)

Marzo 21 de 2020:

Calle 13 Cas 6 y 5: culmina lleno compactado sobre el quinto tubo de 24" instalado. Se instalan tableros sobre excavaciones abiertas. Se refuerza señalización de lasteros deteriorados.

Nota: a raíz de la situación de Pandemia por presencia de Coronavirus COVID-19 se anuncia al personal que las labores quedan suspendidas hasta nuevo orden de acuerdo a las decisiones del gobierno Nacional y local. El municipio de Chinchipe está en cuarentena general. Por lo anterior el personal de obra se dedica a labores de orden y asejo de toda la obra, instalación de tableros para protección de excavaciones que puedan generar accidentes, reemplazo de señalización laboral y en mal estado para tener el día de trabajo totalmente exitoso.

(Handwritten signature)

Abril

Se elabora

biografía de

se ha

encar

Ferrocarril

Mayo

Comité

Mayo

Se in

red


se ha

proto

Comité

6 y 5

Condic

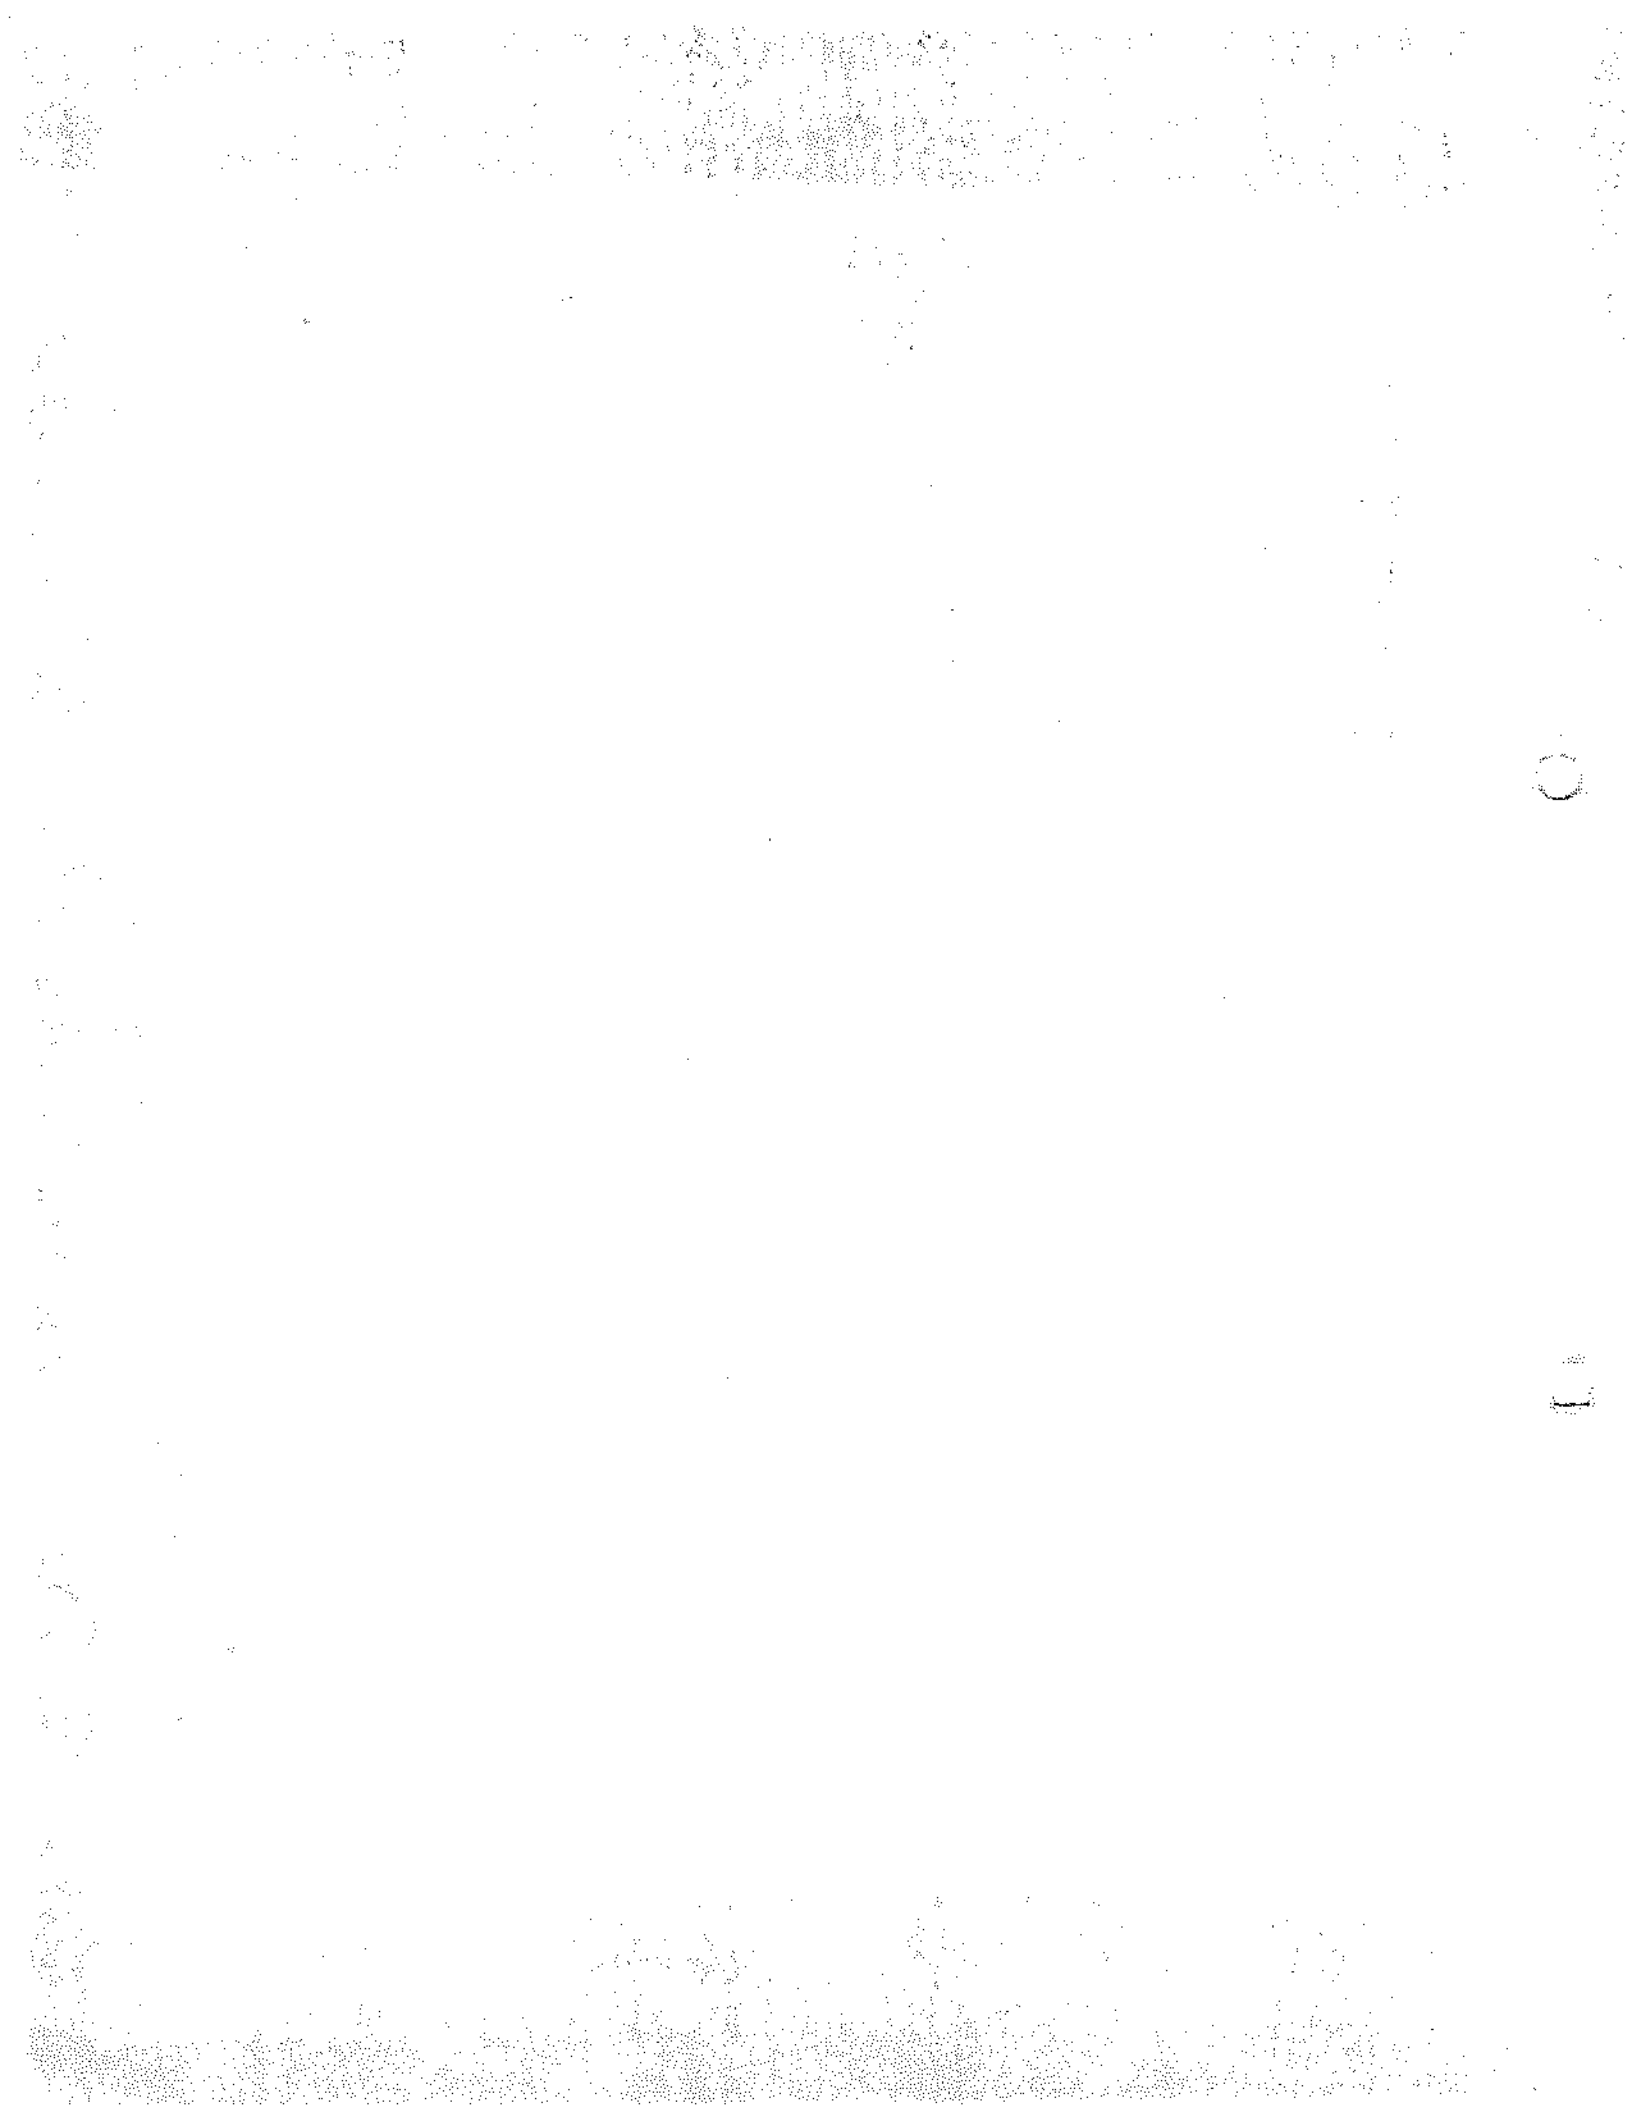

Abril 30 de 2020:


Se firma acta de renuncio luego de la elaboracion y presentacion del protocolo de bioseguridad, se inicia actividades de adecuacion de comedor, enfermeria y zona lavamanos, se hace recorrido con el nuevo supervisor encargado por empacaldas ingeniero Luis Fernando Arias.

Mayo 2 de 2020

Continuan construccion de zonas comedor, enfermeria y lavamanos.

Mayo 4 de 2020

Se inicia construccion llomos faltantes sobre red 12" en la calle 13 entre carrera 7 y 6 se terminan adecuaciones de zonas para el protocolo de bioseguridad, inicia excavacion para construccion camera en el 13 entre carrera 6 y 5 y para instalacion del tubo faltante Condiciones climaticas: tiempo seco

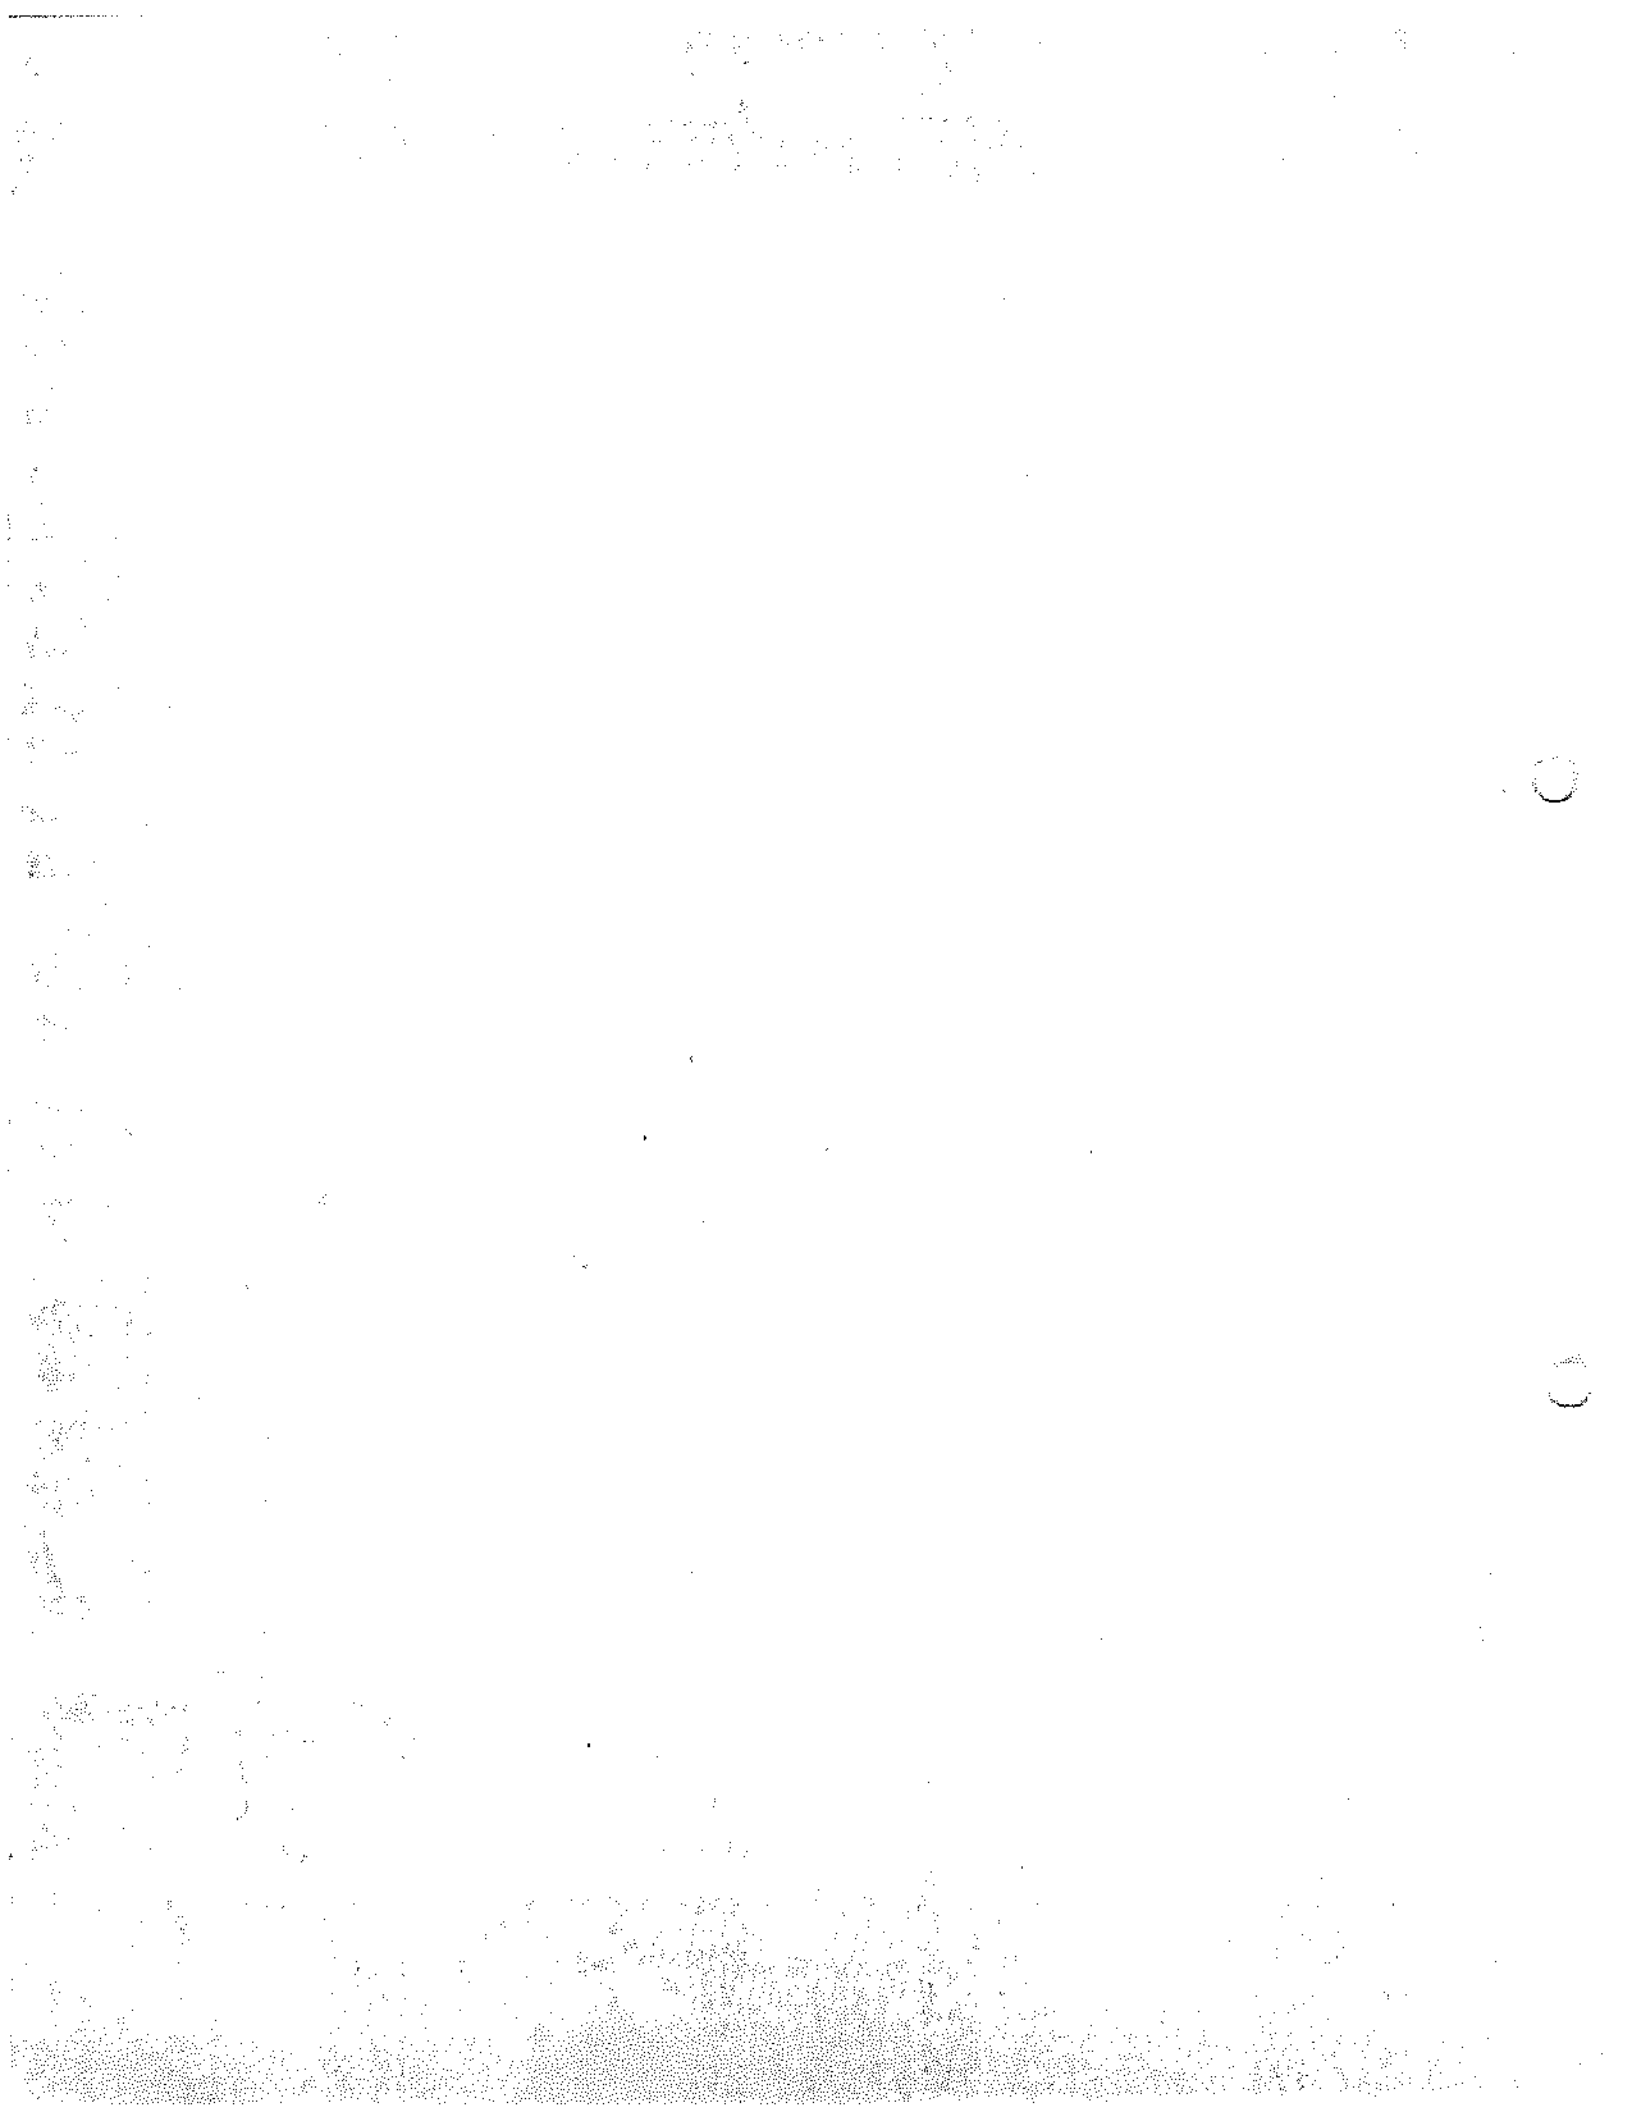

Mayo 5 de 2020

CL 13 cr 7 y 6:

Continúan llenas sobre red 12" y sobre
acomodadas, terminan adecuaciones para protocolo

CL 13 cr 6 y 5: Continua excavación para
instalación tubo faltante y para construcción
Cámara 4

Condiciones climáticas: lluvias en la tarde

Mayo 6 de 2020

Se inicia la jornada con encuestas al
personal, desinfección de bodega, equipos
y zonas de trabajo y lecturas de temperatura

Calle 13 Carrera 7 y 6: se realiza jornada
de reemplazo de cerámico y continúan
construcción llenos

Calle 13 Carrera 6 y 5: Continua excavación
para instalación tubería 24" y para Cámara
Condiciones climáticas: lluvias fuertes en la
tarde.


Mayo 7 de 2020

Inicia jornada con encuestas al personal, toma temperatura

Libro Médico Oficio 80 H.

Malden

y de
Egu
Termin
Termin
24" y
calle
Se re
el d
bodega
al u
se re
al
Condic
mañan
Mayo
inicia
de
al por
calle
para
topo
el 13
se
Libro Med

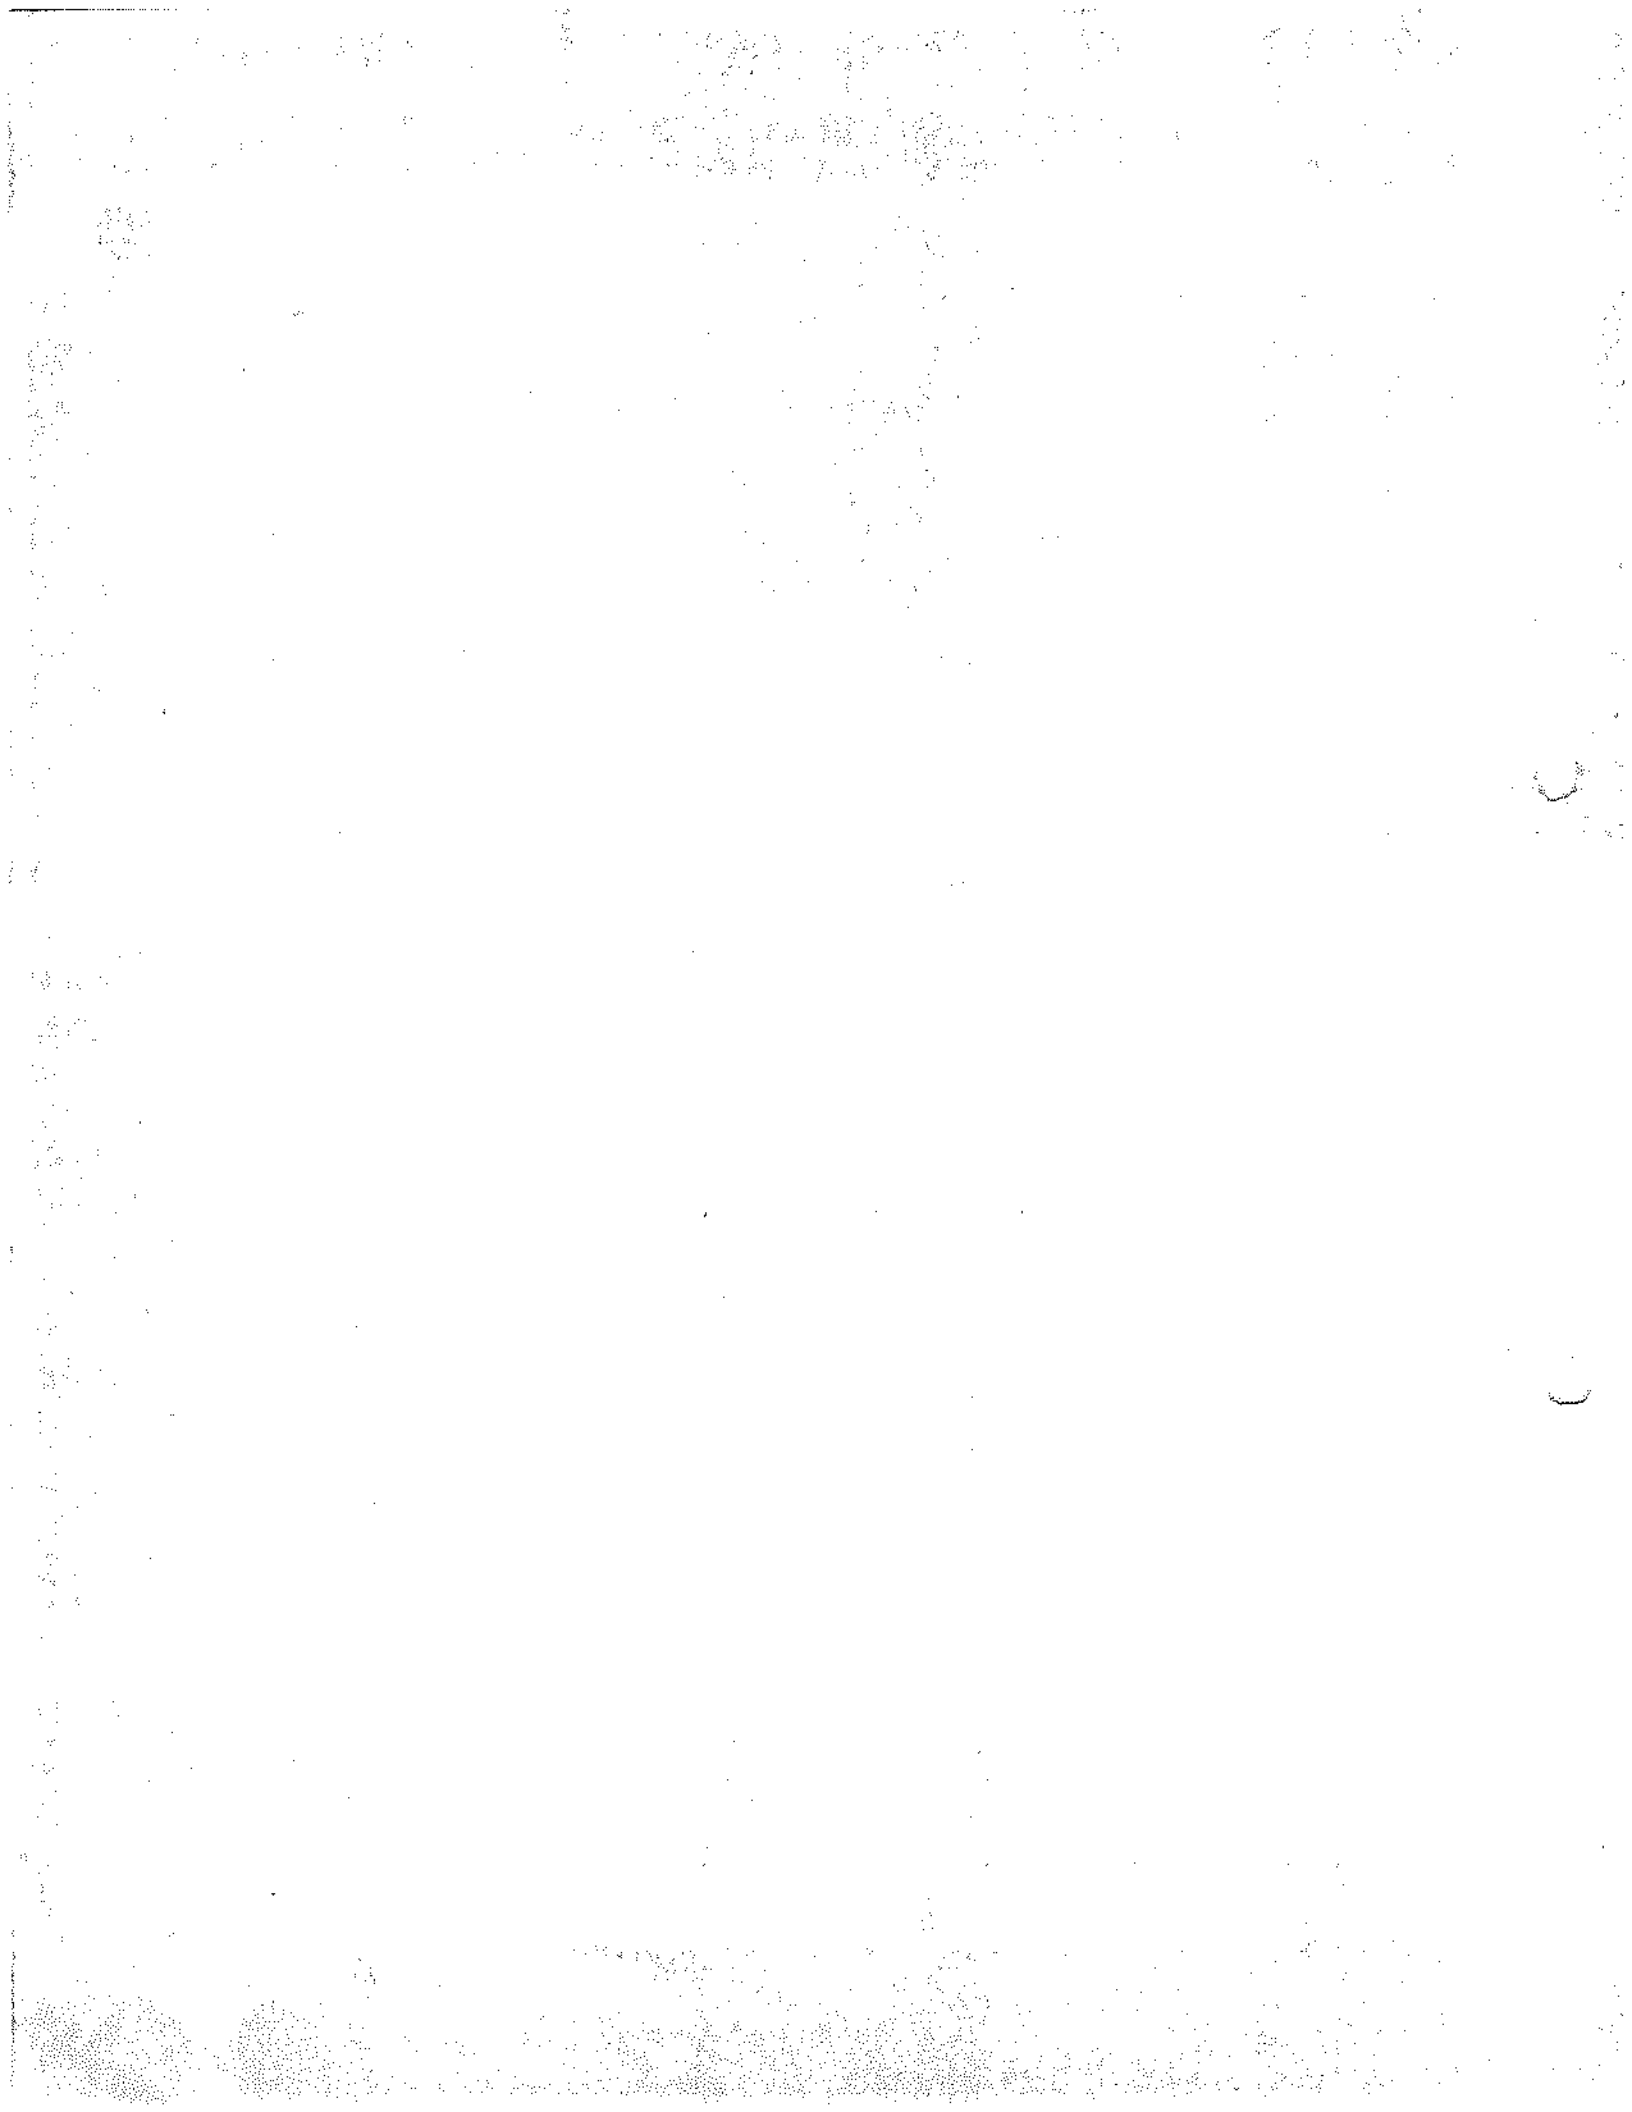

y desinfección de zonas de trabajo, bodega
equipos y herramienta.

termina llenos en calle 13 carrera 2 y 6
termina excavación para el sexto tubo de
24" y para la cámara en red principal en la
calle 13 entre carreras 6 y 5

se realiza desinfección general en todo
el frente de obra, equipos, herramientas
bodega y zonas de comedores, enfermería
al medio día y a la hora de salida.


se realiza toma de temperatura al personal
al finalizar labores.

condiciones climáticas: lluvias moderadas en la
mañana.

Mayo 8 de 2020

inicia jornada con desinfección en bodega, frente
de obra, equipos y herramienta, encuesta
al personal y toma de temperatura.

Calle 13 Carrera 2 y 6: inicia excavación
para reposición de acueducto, se realiza levantamiento
topográfico para plano record del tramo en ejecución
en la cr 6 y 5: se hace la instalación del
sexto tubo de 24", se termina excavación para

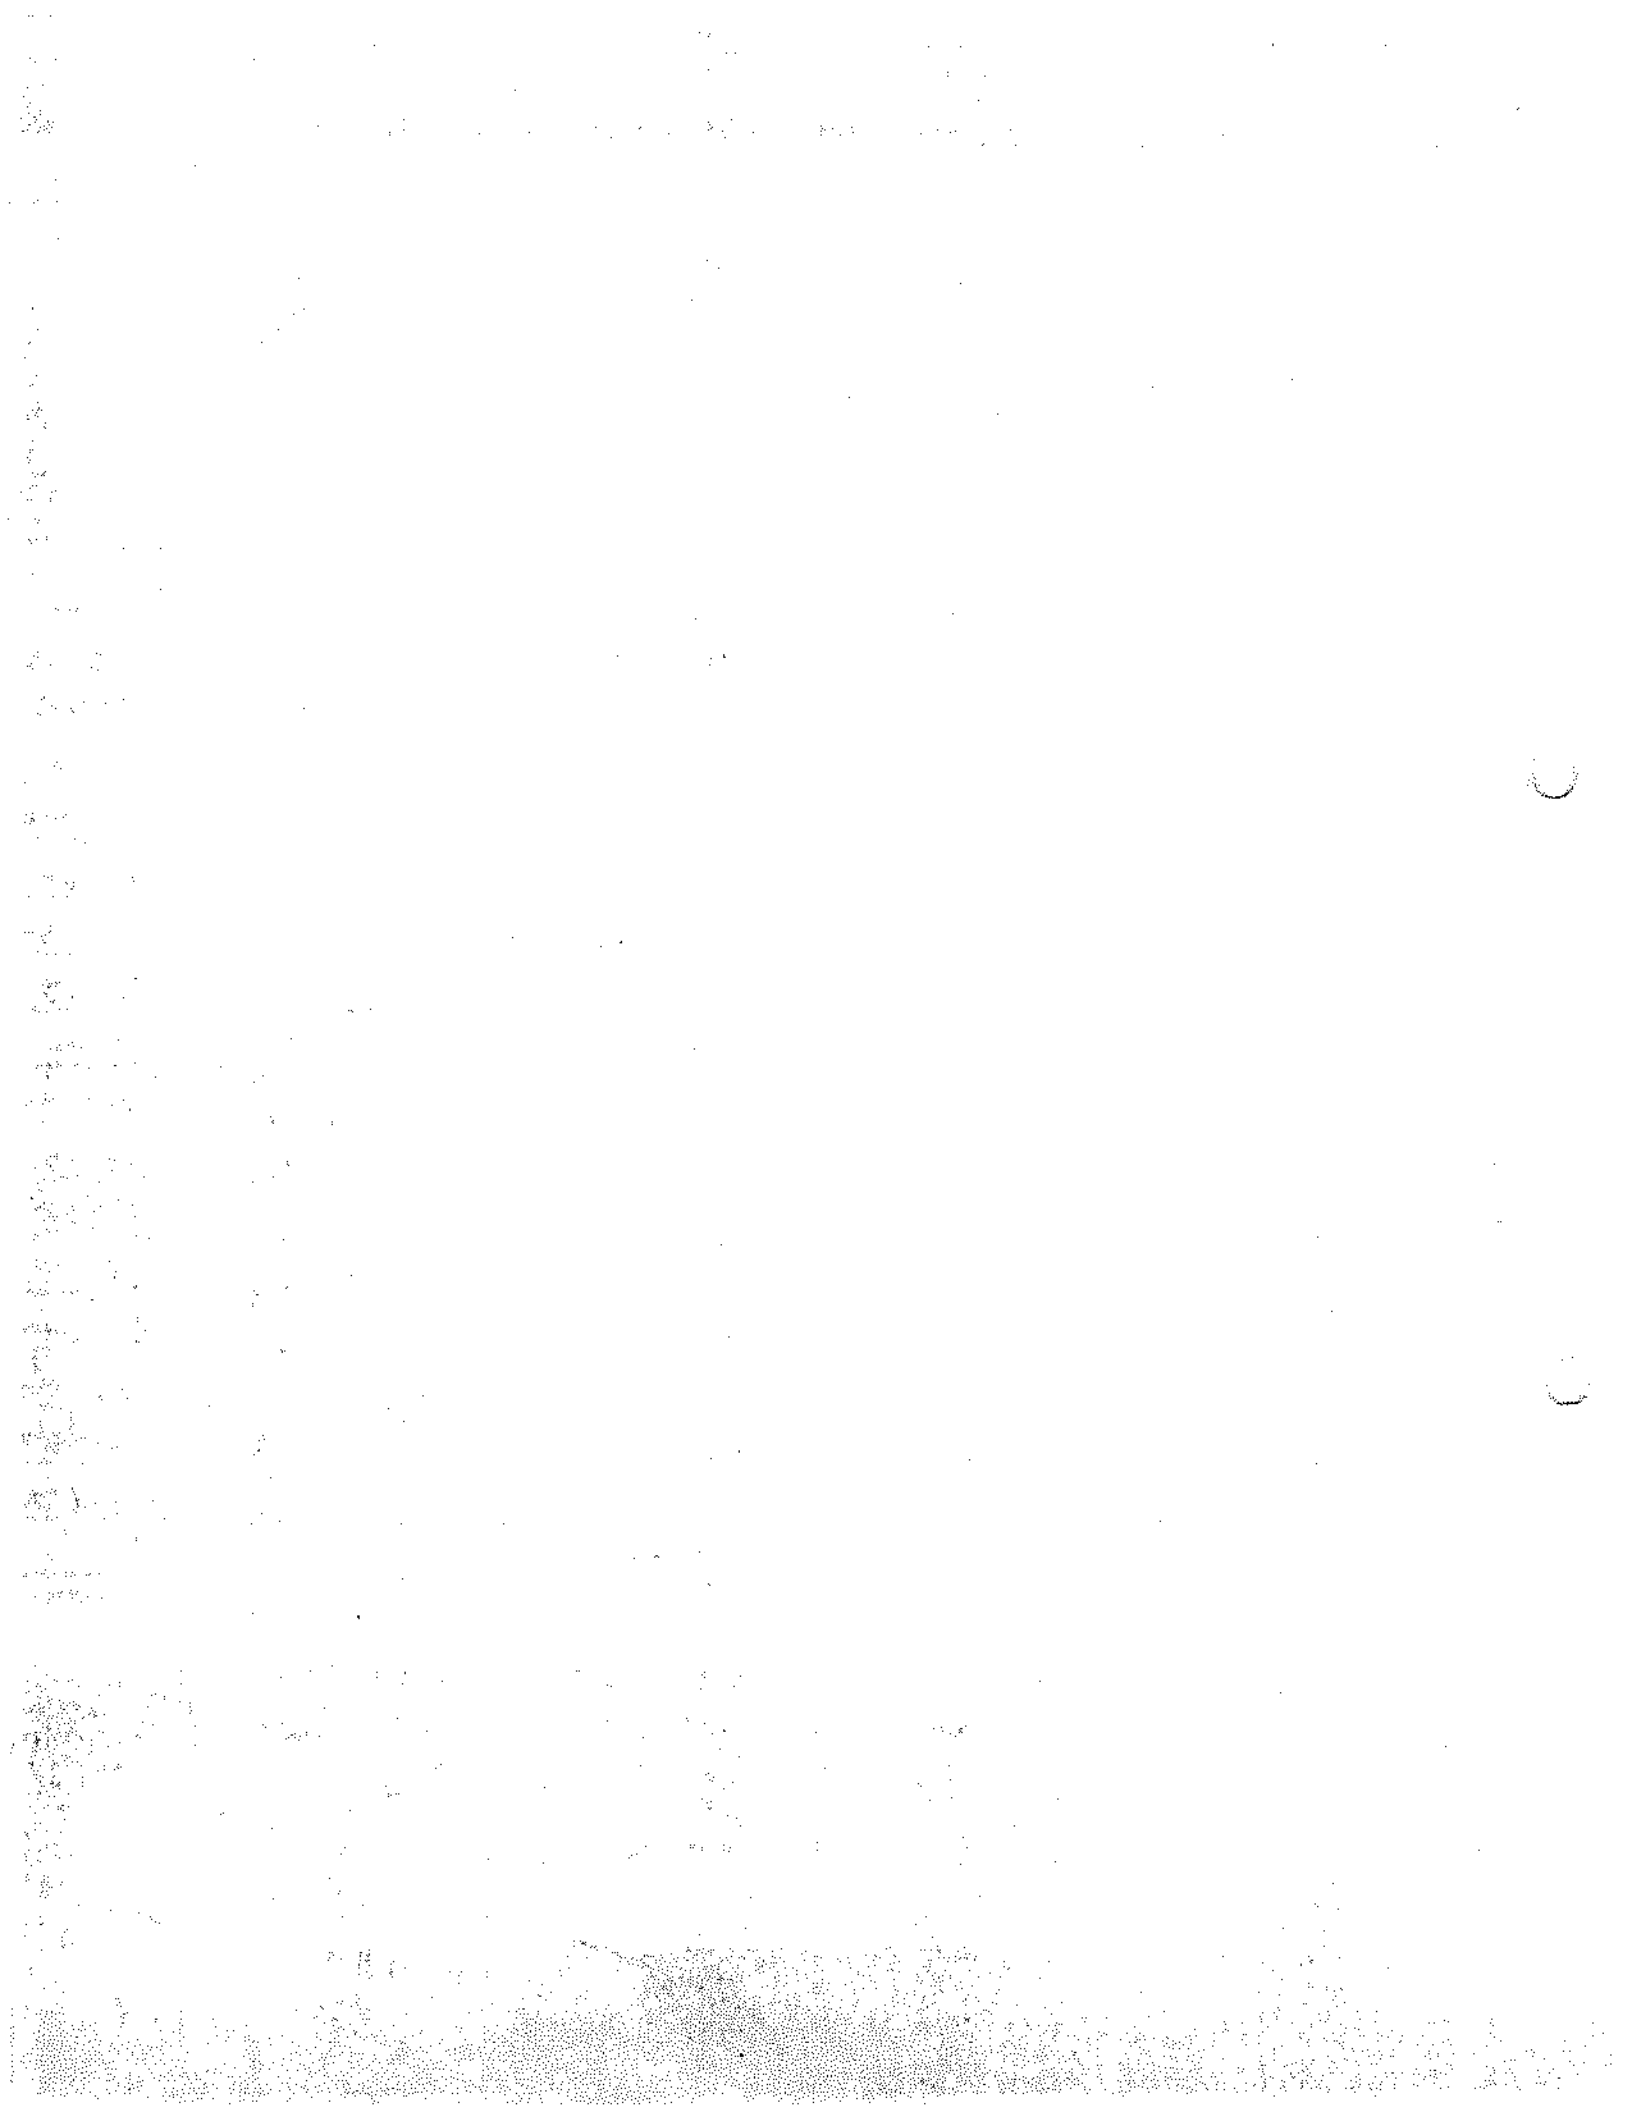

camara. Se finaliza la jornada con desinfeccion general, toma de temperatura al personal.

Condiciones climaticas: tiempo Seco.

Mayo 9 2020

Inicia la jornada con desinfeccion general, euevesta al personal y tomas de temperatura.

CL 13 cr 7 y 6: Continua excavacion para reposicion acueducto, construccion de muros alcaantarillado la estacion.

CL 13 cr 6 y 5: Construccion primer cuerpo camara alcaantarillado, construccion lleno sobre red 24"

Condiciones climaticas: tiempo Seco

Mayo 11 de 2020

Inicia jornada con desinfeccion general, euevesta al personal y toma de temperatura.


CL 13 cr 7 y 6: excavacion para reposicion acueducto, llenos en domiciliaria alcaantarillado la estacion.

CL 13 cr 6 y 5: Construccion 2do cuerpo

Camara
red p
con
tempe
Condi
la *

Mayo
Inicia
Eucos
Inicia
en la
CL 13
con
mate

de se
HF 3'
CL 13
tubera
por la
anterior
gastro

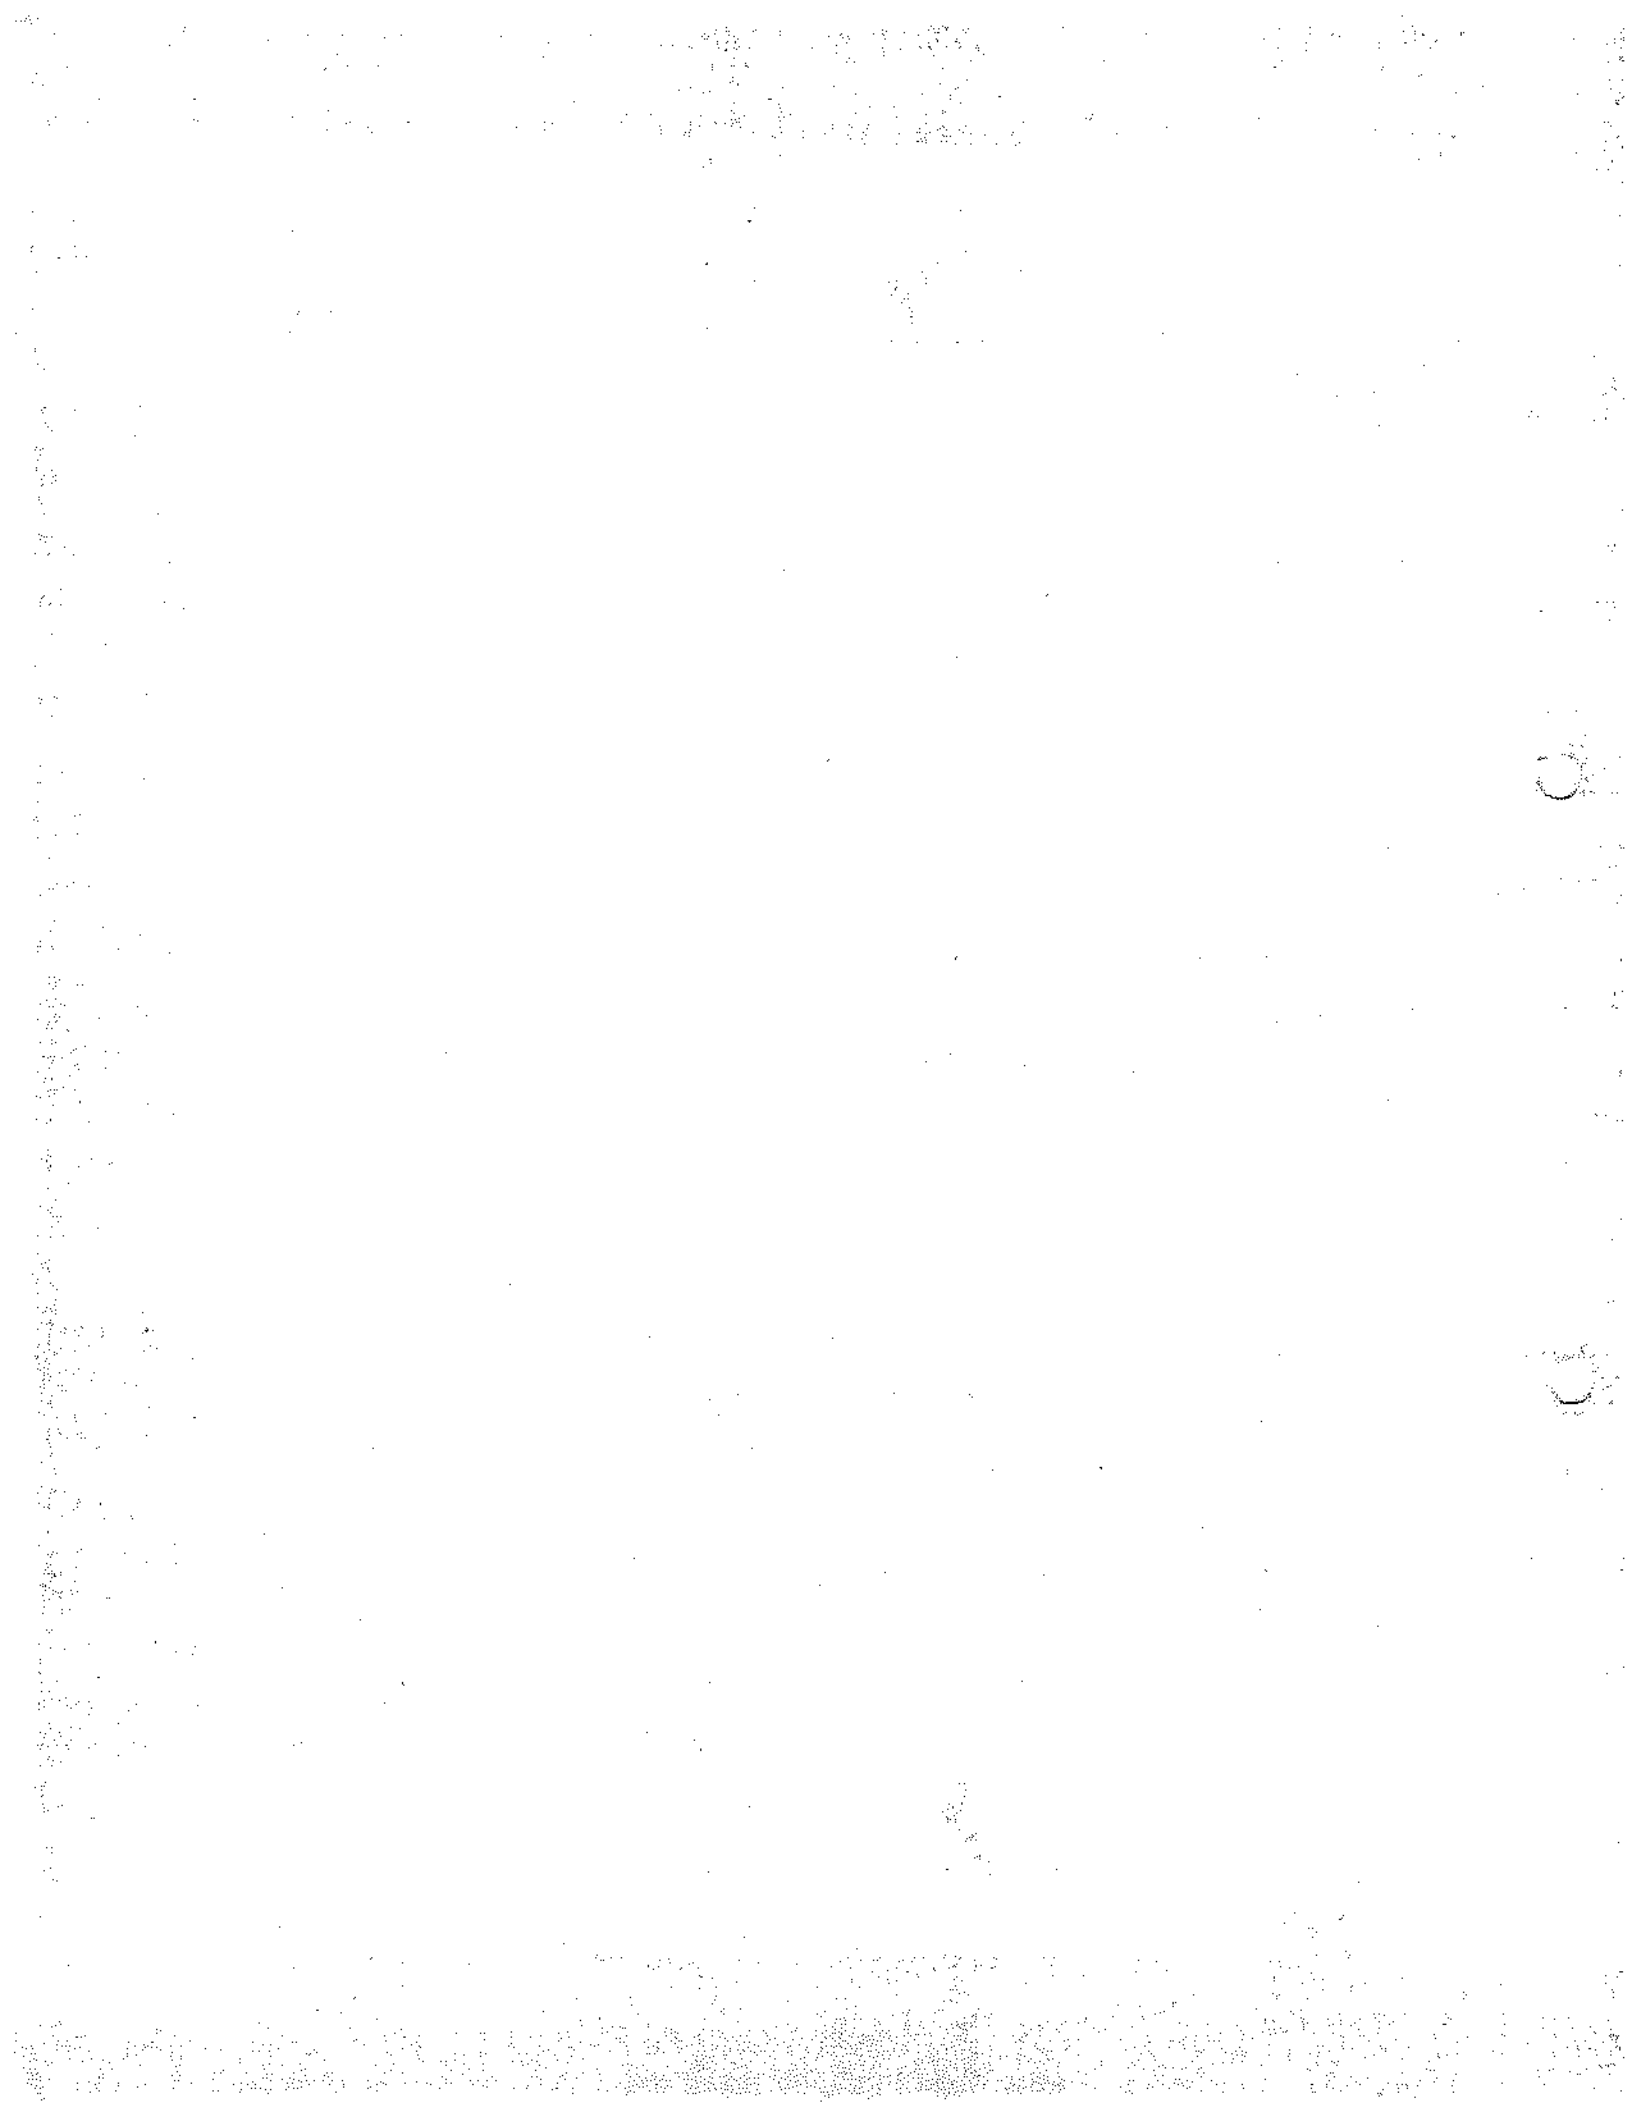

cañería de alcantarillado, continúa lleno sobre red principal 24" termina la jornada con desinfección general y toma de temperatura al personal.


Condiciones climáticas: lluvias fuertes en la tarde.

Mayo 12 de 2020

inicia jornada con desinfección general, encuesta al personal y toma de temperatura inicia instalación cajas para contadores en la carrera 9 calles 7 A B.

CL 13 carrera 7 y 6: se realiza recorrido con personal de epidemiología para verificar materiales para cruces. En cr 7 y cr 6 se solicita suministro de 4 reducciones HF 3'x2", continúa excavación red acueducto

CL 13 carrera 6 A 5: continúa lleno sobre tubería 24", reconstrucción 2^{do} cuerpo cámara por daño ocasionado por la lluvia de la tarde anterior, termina la jornada con desinfección general y toma de temperatura

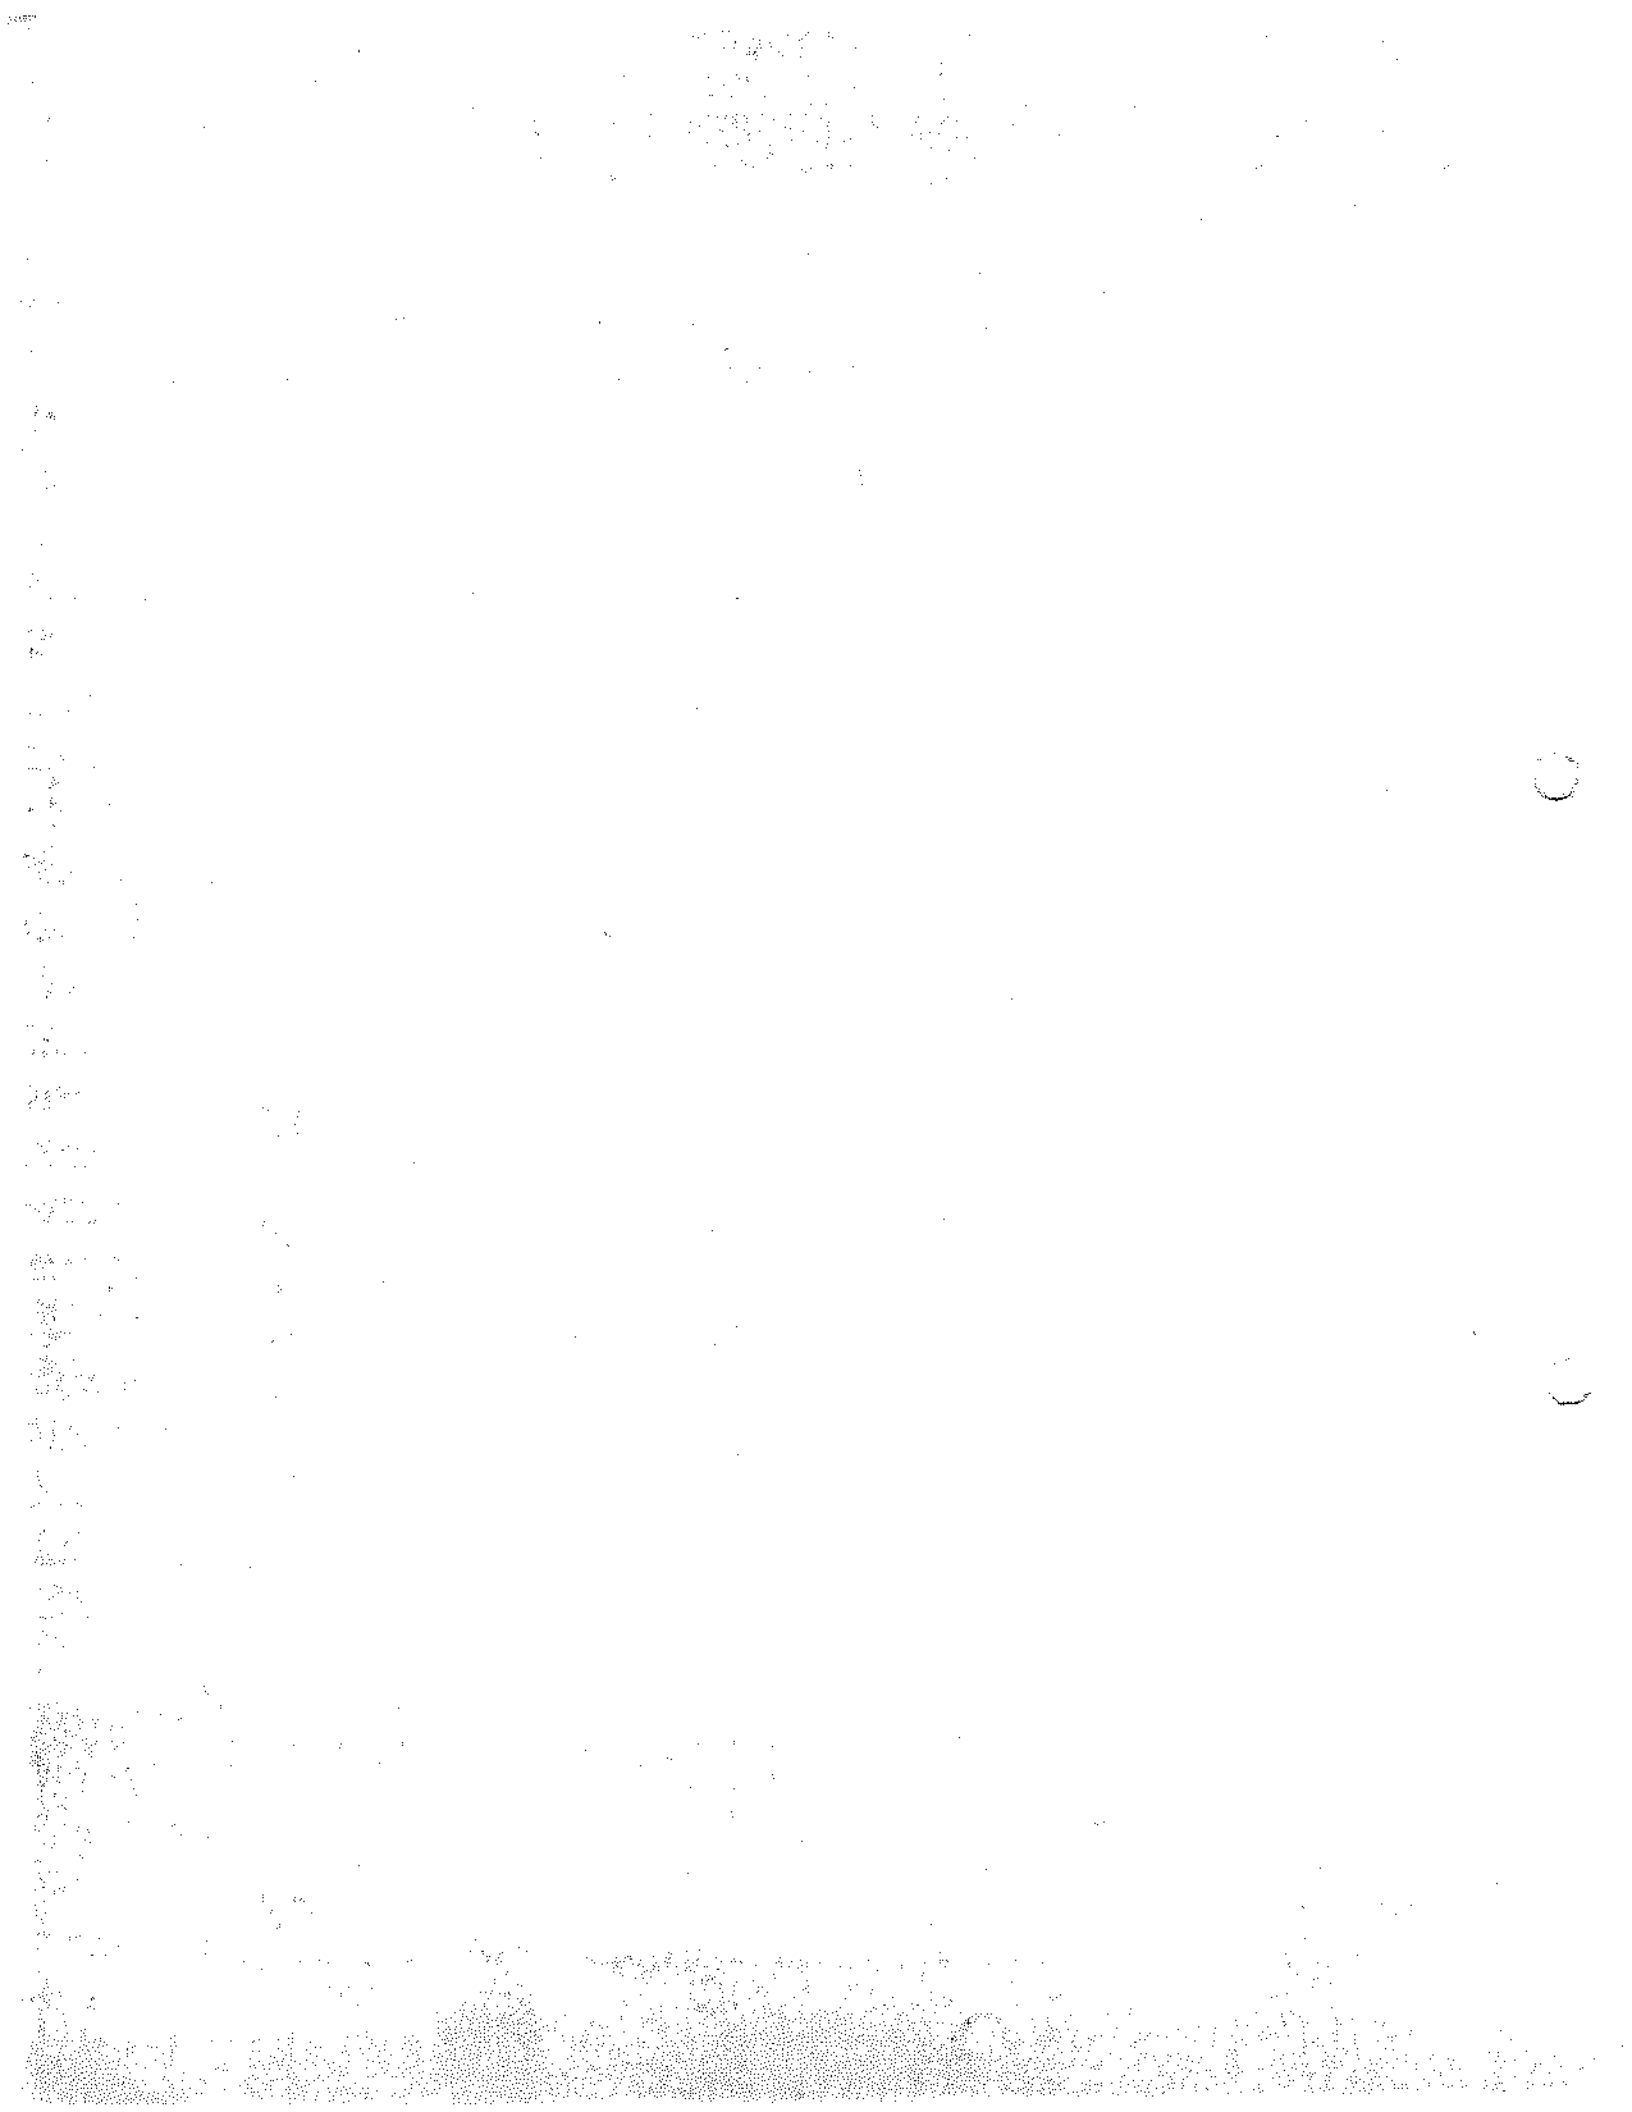

Mayo 13 de 2020.

Inicia jornada con encuesta al personal, desinfección general y toma de temperatura, continúa instalación cajas para medidores en la Carrera 9 entre calles 7 y 8.

CL 13 Cr 7 y 6: Se realizan excavaciones para reposición de cruces de acueducto en las carreras 7 y 6, continúa excavación para reposición red de acueducto.

CL 13 Cr 6 y 5: continúa lleno sobre tubería 24", construcción 3" cuerpo de cámara alcañalado. Termina la jornada con desinfección general y toma de temperatura.

Mayo 14 de 2020.

Inicia jornada con encuesta al personal, toma de temperatura y desinfección general, termina instalación cajas en Cra 9 y se inicia instalación en la Calle 13 entre carreras 9A a 7.

CL 13 cr 7 y 6: Termina excavación para reposición red de acueducto.

CL 13 cr 6 y 5: construcción 4 cuerpo cámara continúa llenos sobre red 24".

Termin
gener
Conec
en

Mayo
inicia

excave
contin
en la

CL 13

y se

CL 13

llenos

camas


excav

termin

al p

condi

tare

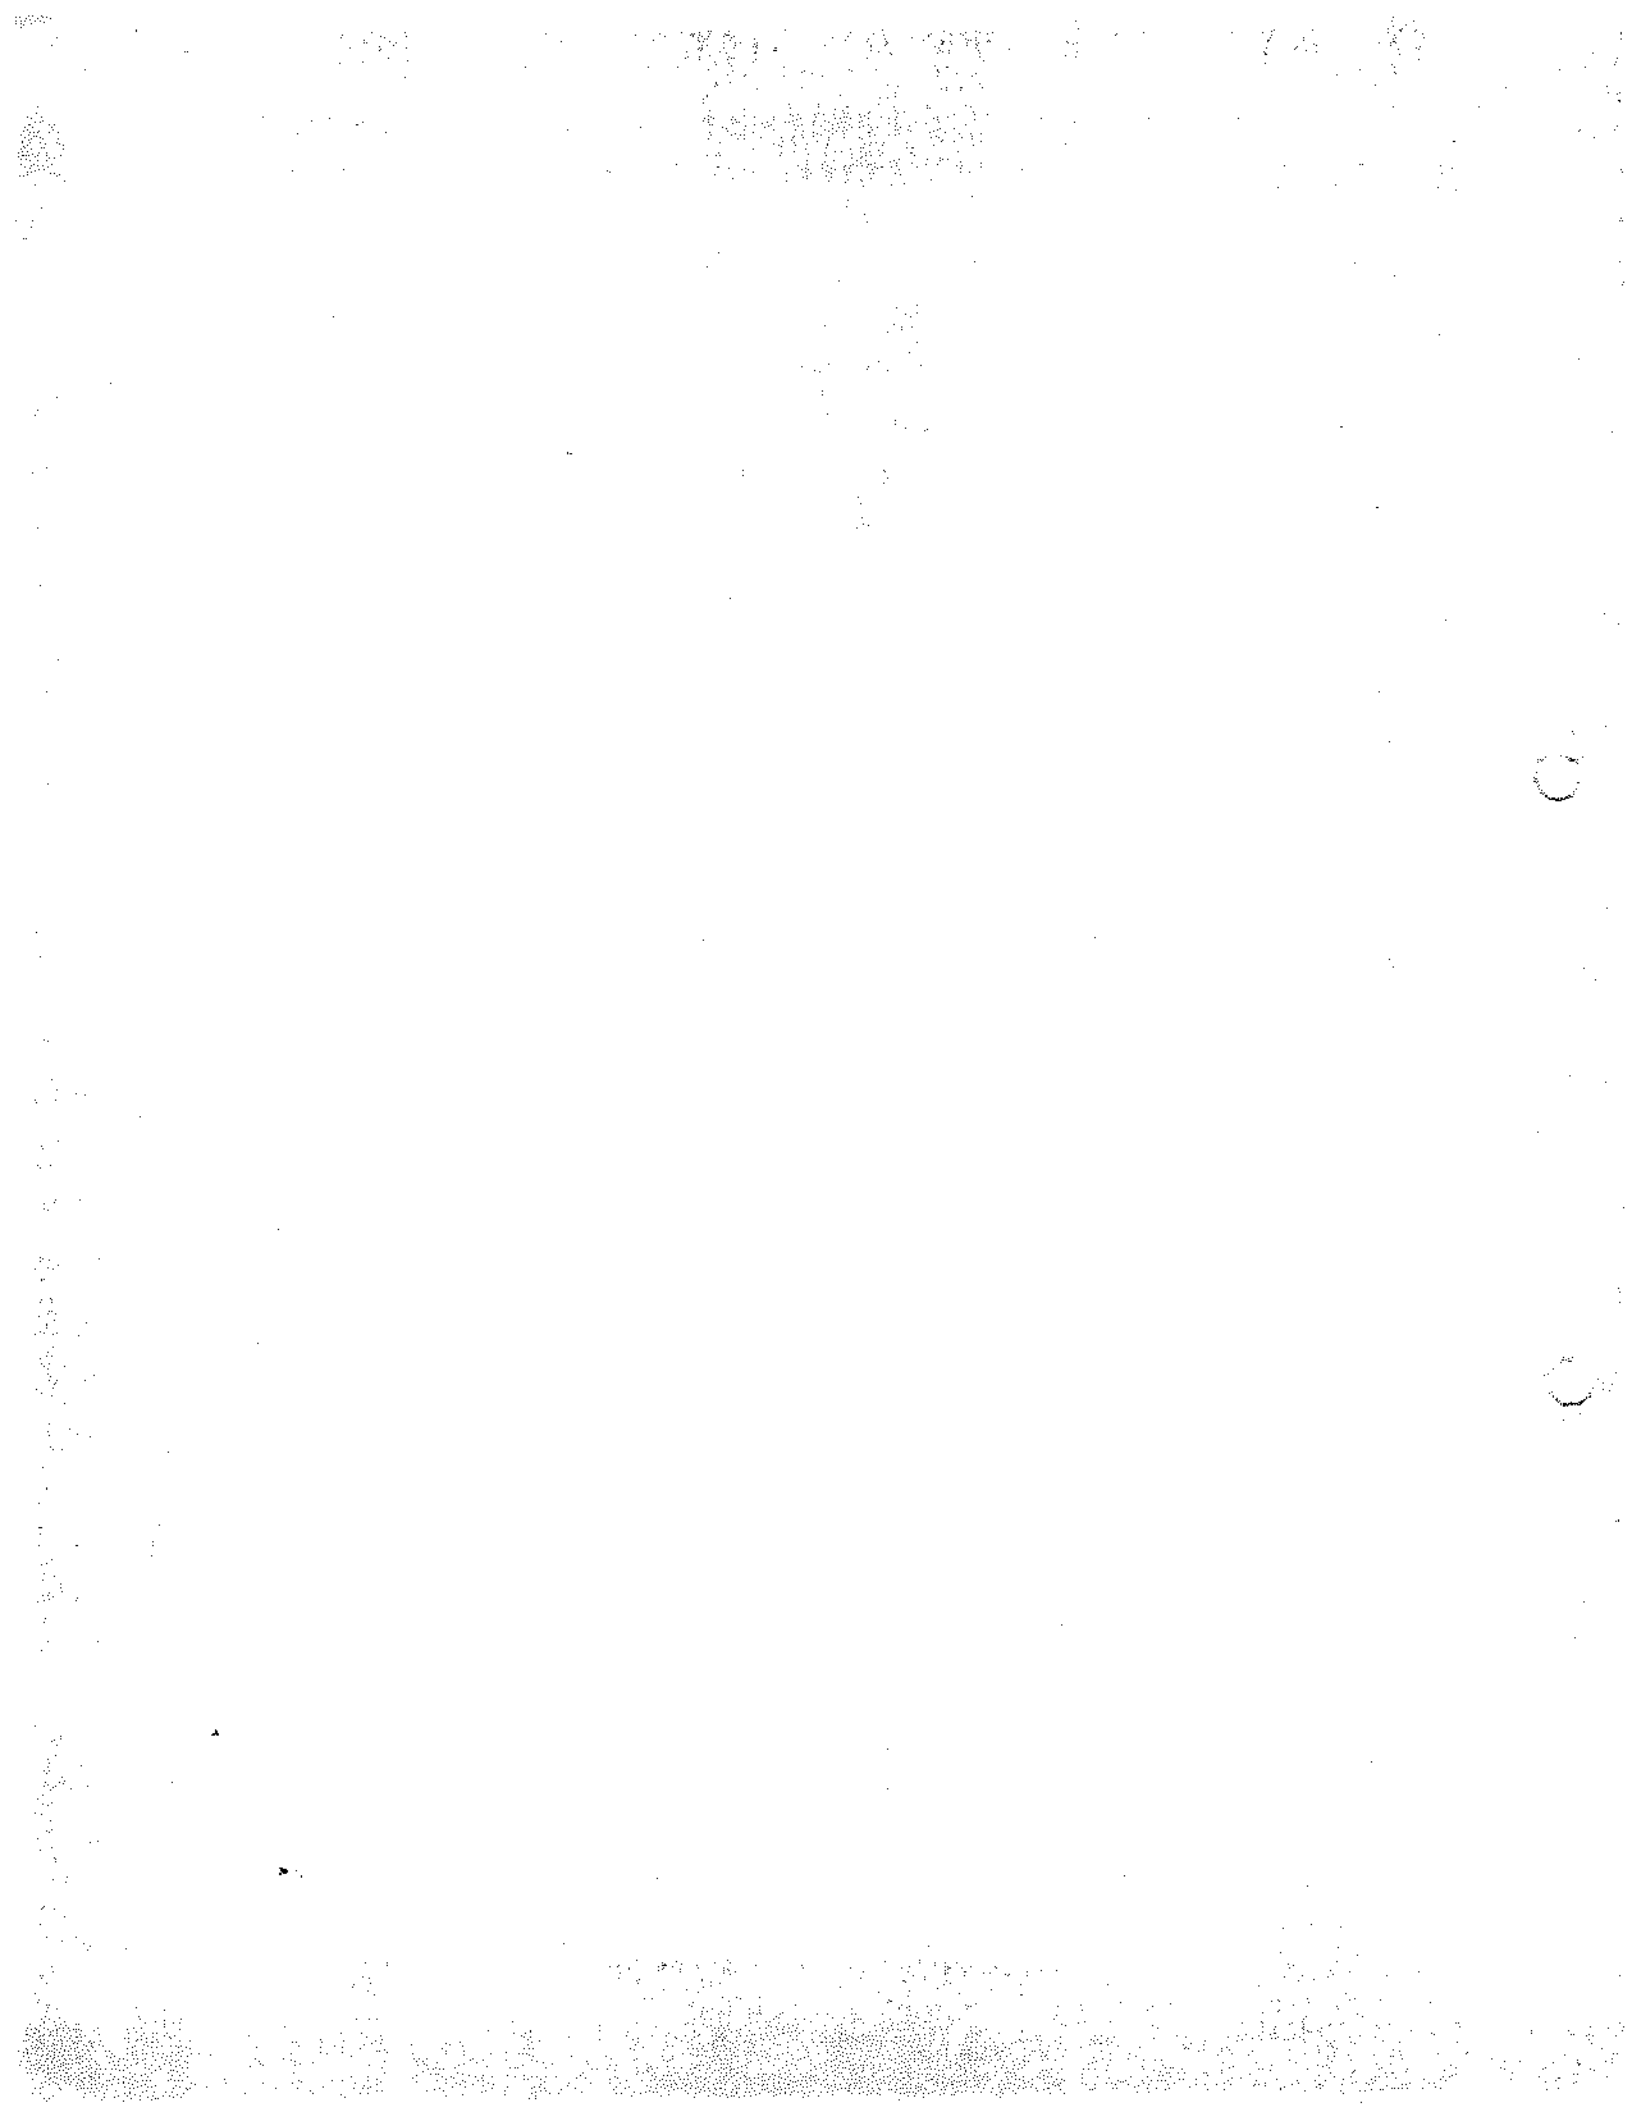

desinfección
continua
la

Termina la jornada con desinfección
general y toma de temperatura
condiciones climáticas: lluvias fuertes
en la tarde

trabajos
esto en
vacación

Mayo 15 2020

Inicia jornada con desinfección general
encuestas al personal y toma de temperatura
continua instalación cajas para medidores
en la calle 17. ora 9A a 7.

tubería
alcañorillado

CL 13 cr 7 y 6: se instala tubería acueducto
y se inicia con la instalación de collarines

general

CL 13 cr 6 y 5: Termina construcción de
llenos sobre red 24", construcción cañuela
canonra de alcañorillado, se inicia
excavación para red acueducto.

toma de
agua

Termina la jornada con toma de temperatura
al personal y desinfección general.

199
8


condiciones del clima: lluvias en la
tarde.

para

camera

Marden

Marden

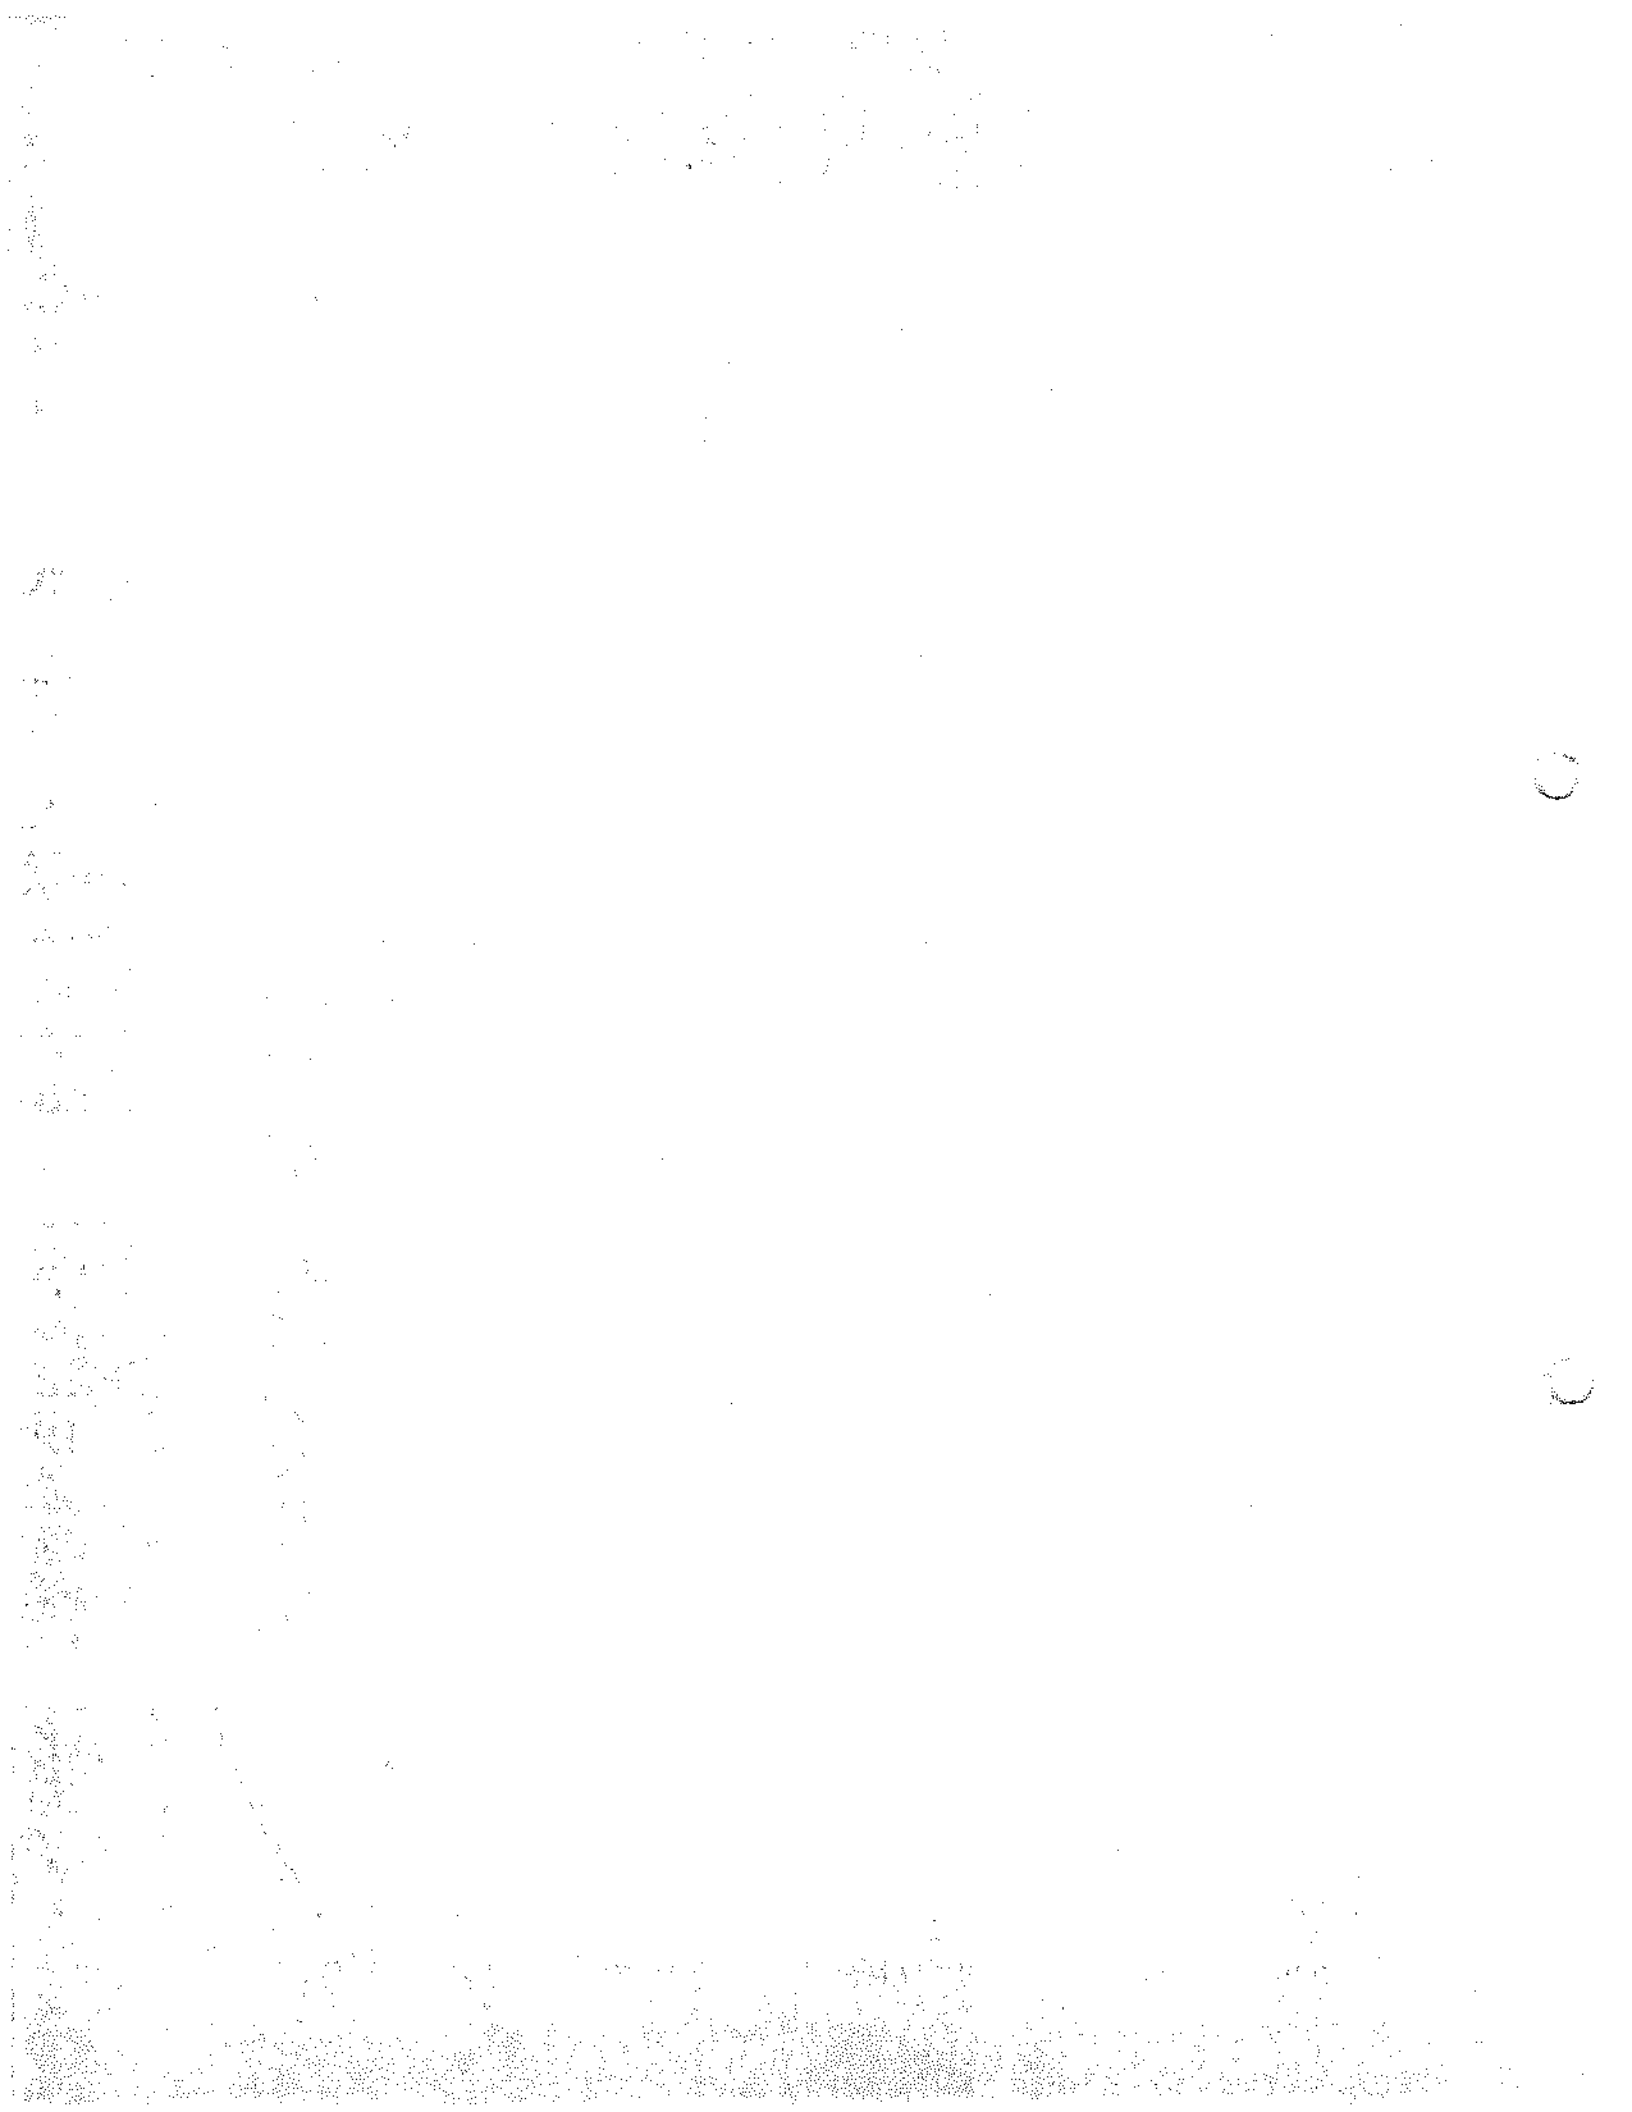

Mayo 16 de 2020:

Desinfección general en frente de obra
campamento, bodega, equipos y herramienta
termina instalación cajas de acueducto en
la calle 13 carreras 9A a 7.

Calle 13 cra 7 y 6: termina instalación
calorímetros en todas las domiciliarias y
reponer.

Calle 13 cra 6 y 5: continúa excavación
para red acueducto.

Termina jornada con toma de temperatura
y cierre de encuestas al personal.

Condiciones climáticas: tiempo seco



Mayo 18 de 2020

Se inicia con desinfección de
las áreas, perímetro de la
obra, toma de temperatura
y autoevaluación de sintomatología
COVID 19, todos los trabajadores

Se encuentran bien de salud

Se informa sobre los nuevos

med
impl
de

Mayo

Des

de

y ac

limp

obec

Ning

Sind

Gov

Mayo


Se

activi

al c

meq

prop

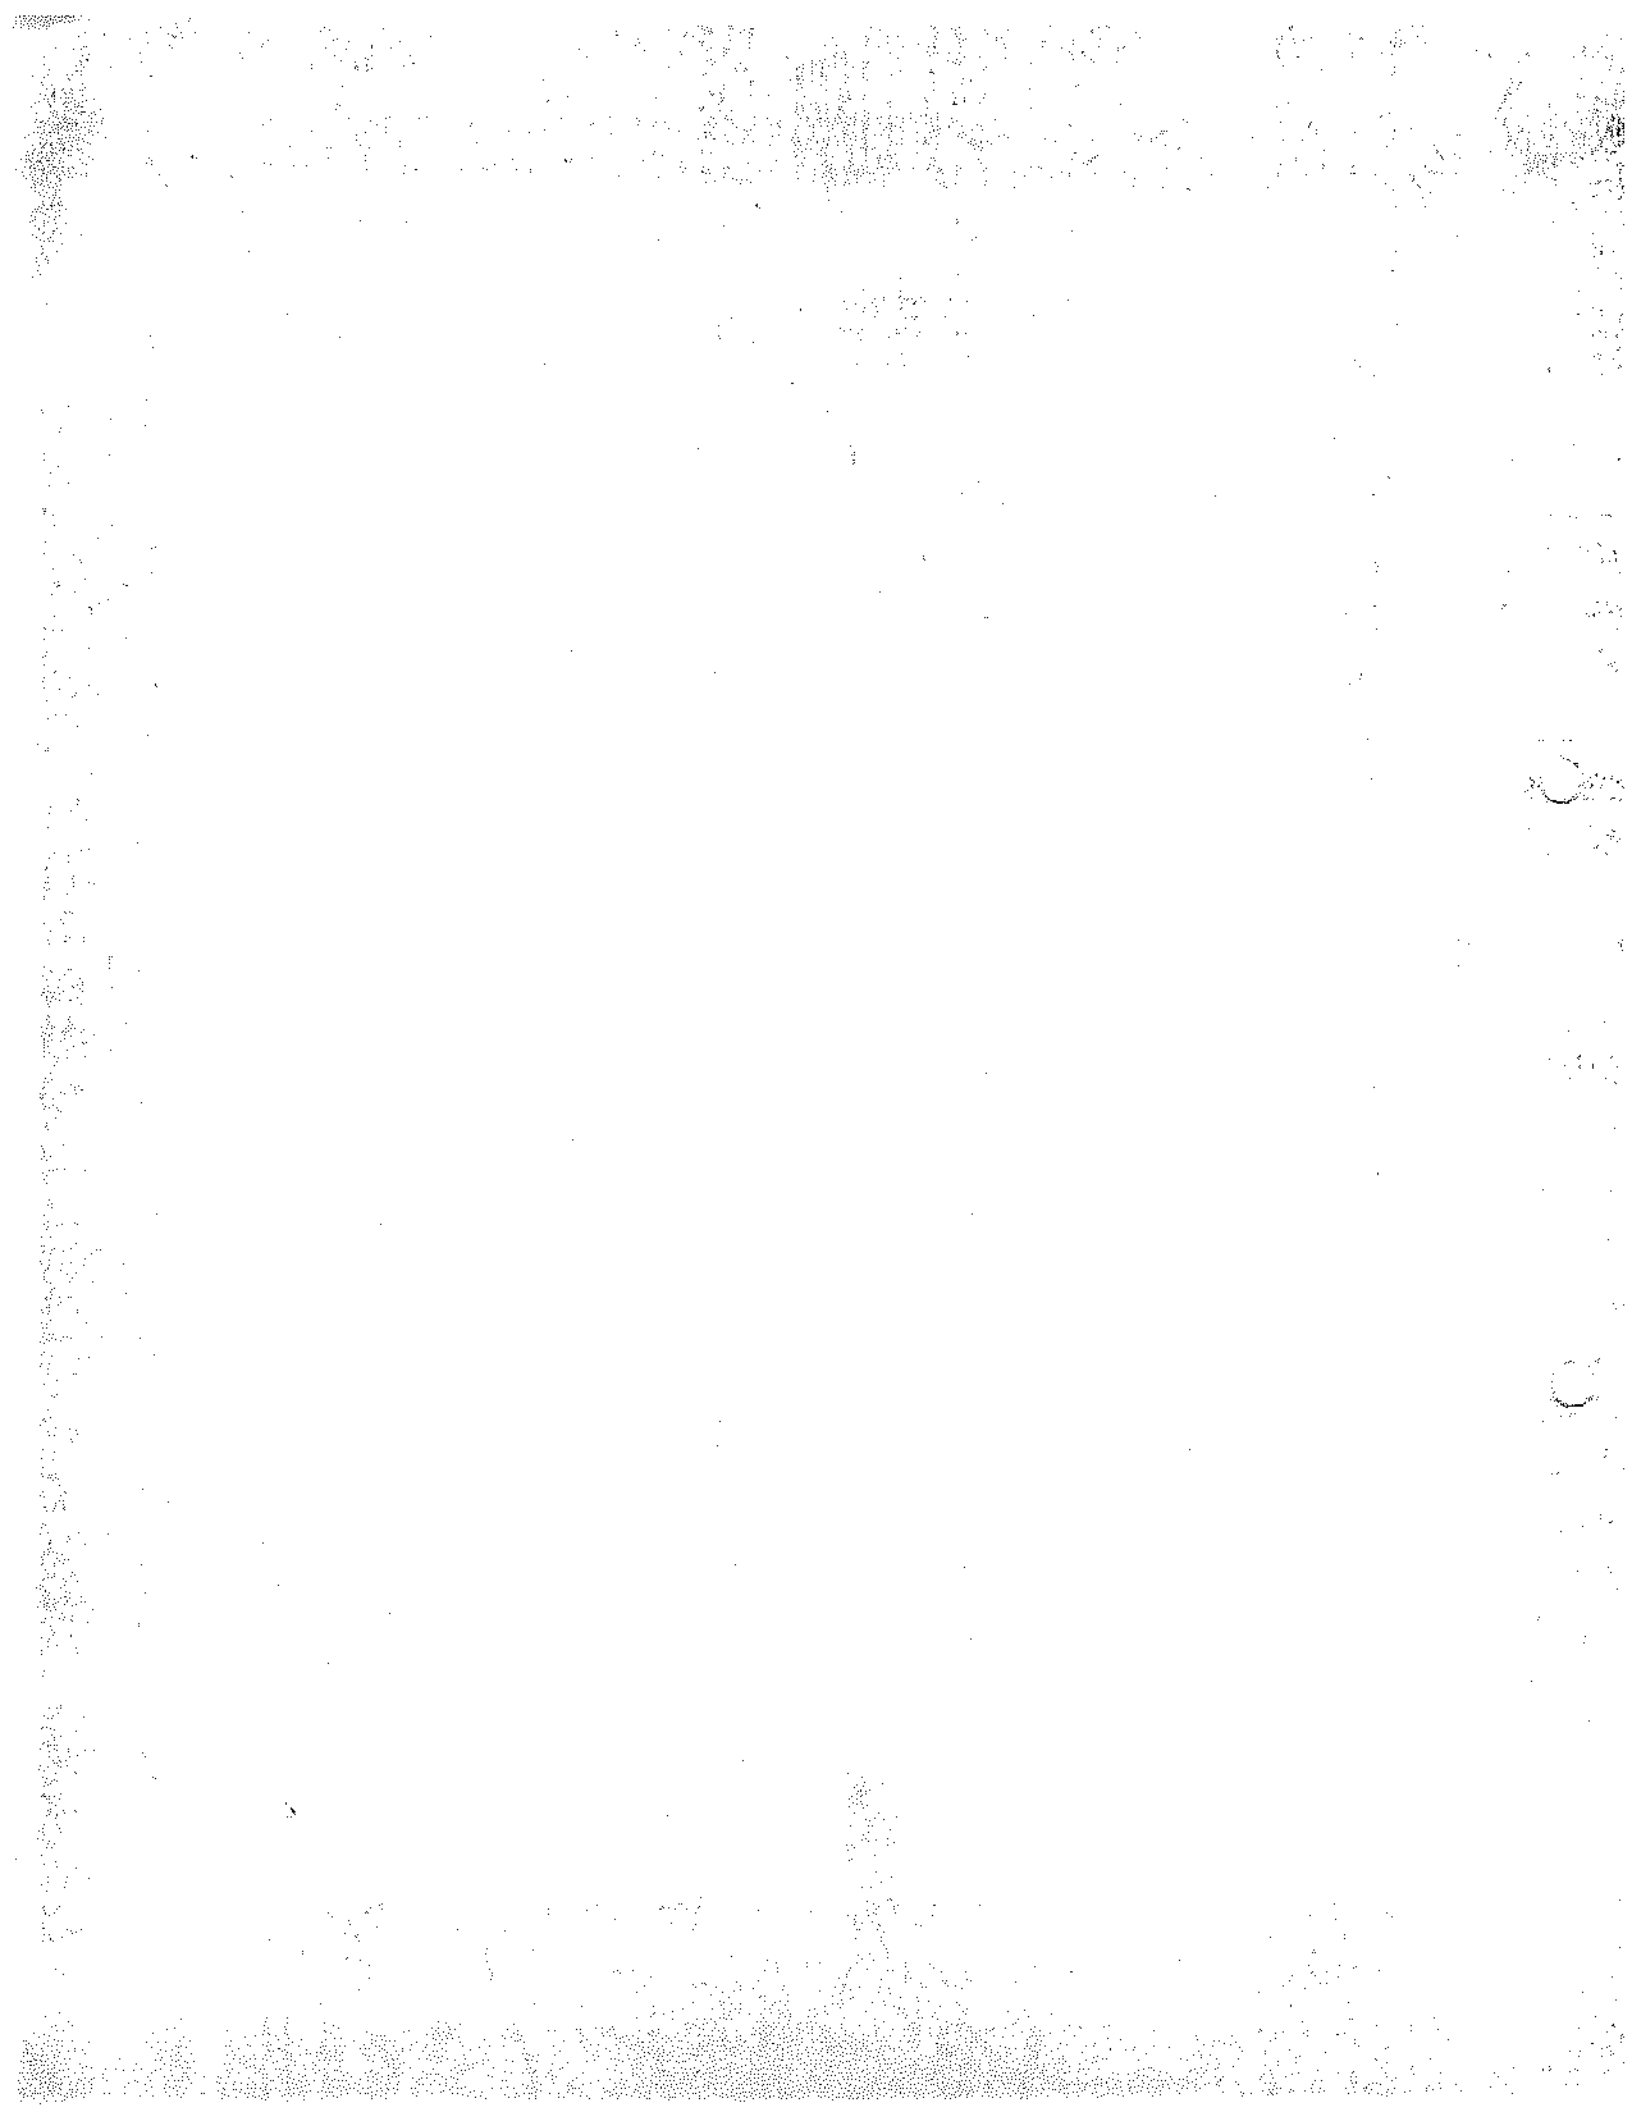

obra
cuarentena
sujeto en

medidas de prevención
implementadas por la Alcaldía
de Chinchipe.

Yuzel SST

lao
199

Mayo 19 de 2020

excavación

Desinfección de las áreas
de la obra, toma de temperatura
y autoevaluación de sintomatología,
limpieza y señalización de
obra.

rodadura

Ningun trabajador presenta
sintomatología asociado a
Covid-19.

Yuzel SST

m de
la

Mayo 20 de 2020


pes
sintomatología
doras
salud
nuevas

Se siguen realizando las
actividades que corresponden
al cumplimiento de las
medidas implementadas en el
protocolo de bioseguridad.

Marden


Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

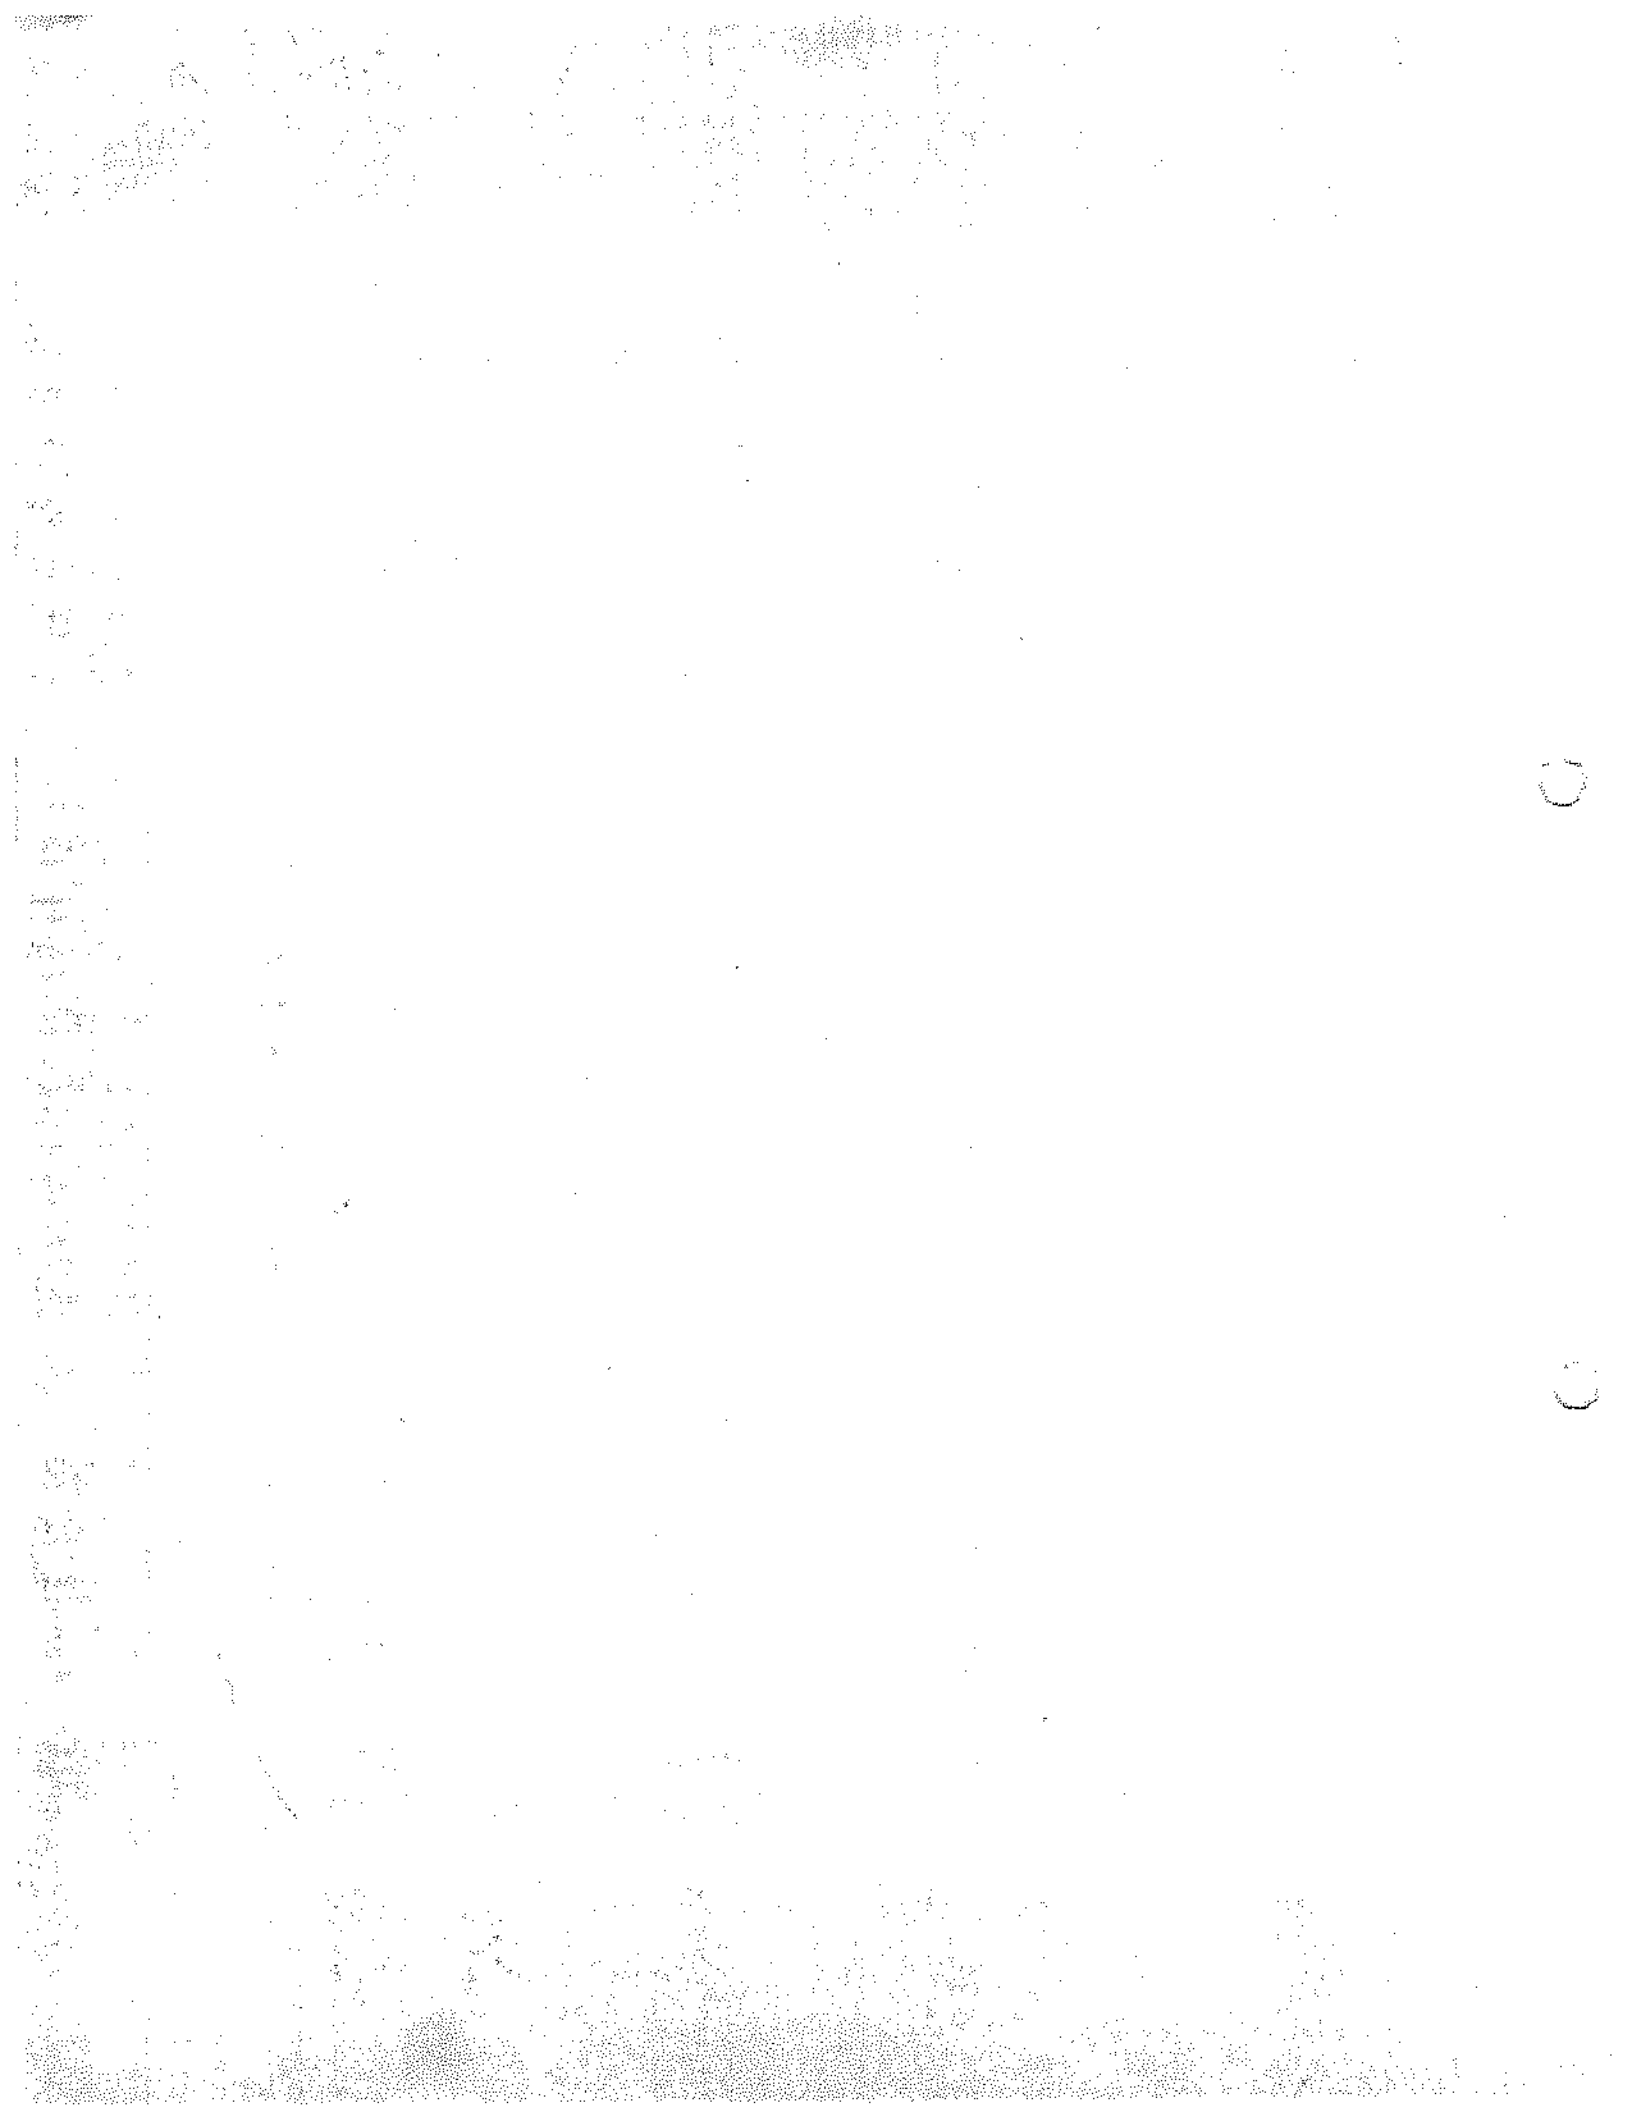

desinfección de áreas
toma de temperatura, Autoe-
valuación de sintomatología,
lavado de manos y uso de
los epp, además se cumple
con el distanciamiento en obra.

Yves SST




Mayo 21 de 2020

Se inicia el día con el
cumplimiento de las medidas
de prevención ante el covid19,
Desinfección de todas las
áreas de la obra, toma de
temperatura, autoevaluación
de sintomatología.

Se realiza actividad de
observación de comportamiento
en los trabajadores y Charla
de autocuidado para prevenir
el contagio por COVID-19.

44 trabajadores, 01 operarios
y maestro y P.SST. Yves SST

Libro Medio Oficio 80 H.




Mayo
Inicio
Gen
y fe
y ac
al pr
Activo
cl
red

progra
de
anillo
univ
el
instal
collar
Moud
hard

Mayo
Inicio
Medio
de 6

Libro Med

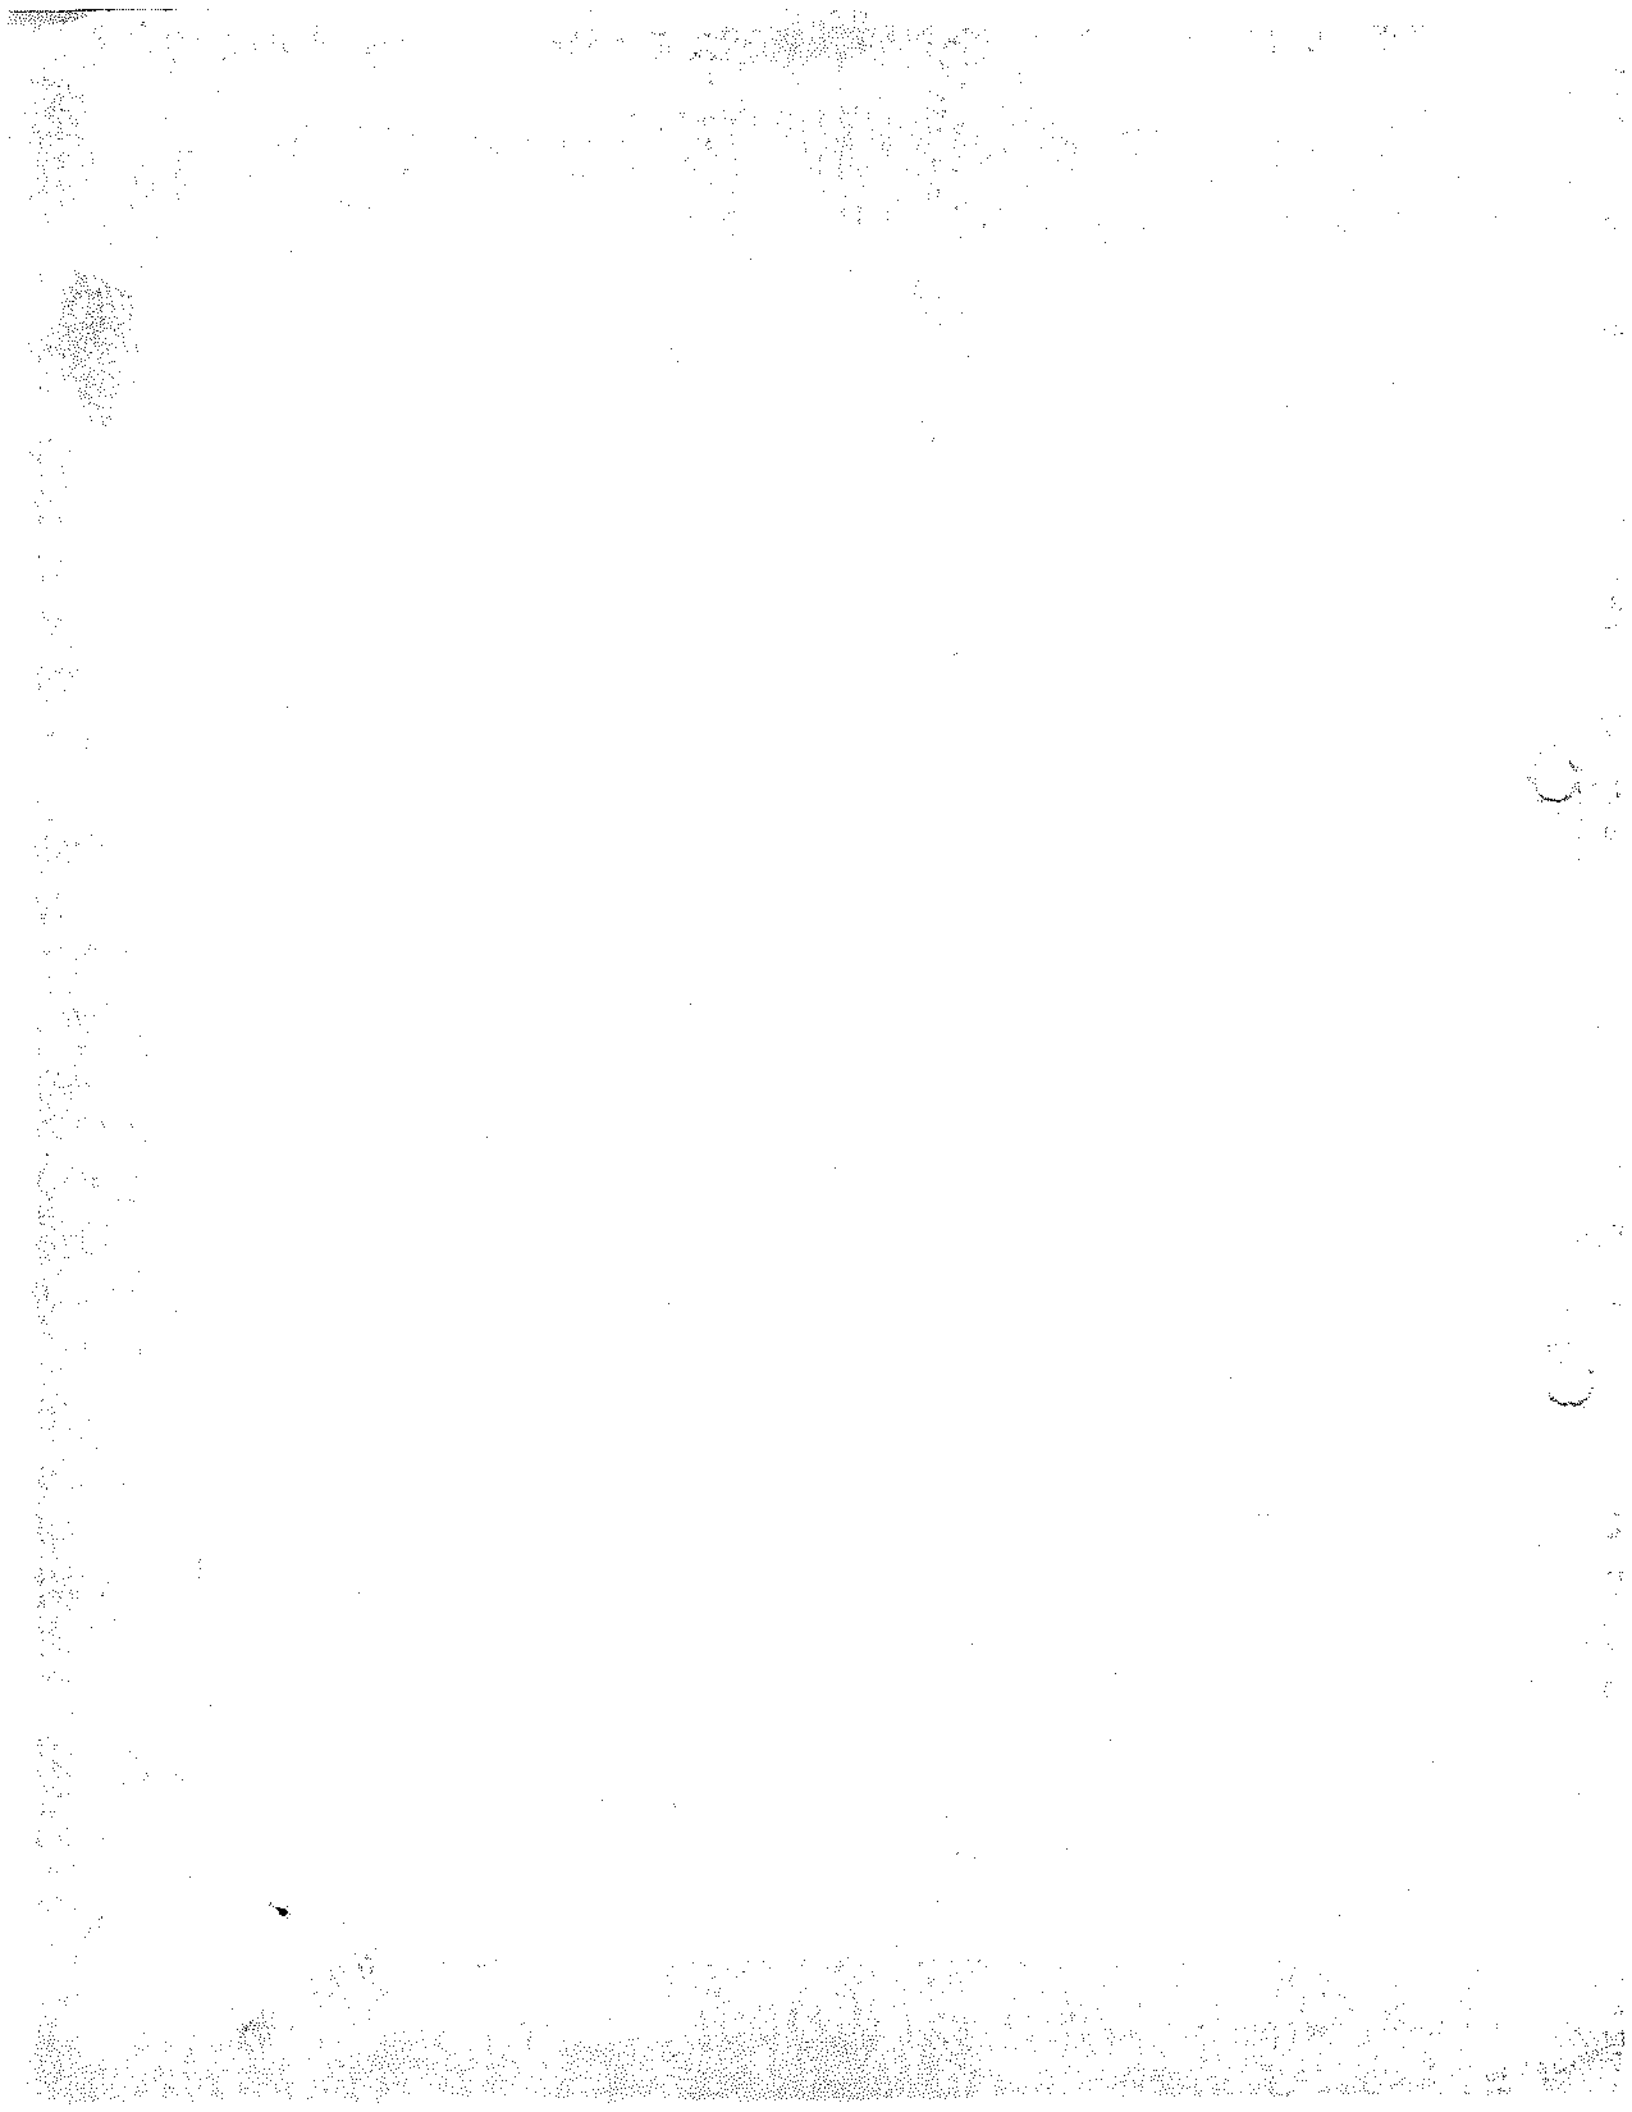

Mayo 22 de 2020

Inicio jornada con desinfección
General de áreas comunes, levantamiento
y fuentes de obra, toma de temperatura
y autoevaluación de sintomatología
al personal.

Actividades en obra.


El 13 CI 7-6: Se realizan leños sobre
red de acueducto y acometidas, se
programa para el finde semana del 23-25
de mayo la construcción de cruces en alcant.
anillado en el 13 CI 7 y acueducto en el
varioso sectores.

El 13 CI 6-5 (media cuadra): Se realiza
instalación red nuevo en 3" y se instalan
collarines

Modificaciones climáticas: lluvias fuertes en la
tarde.

Mayo 23 de 2020

Inicio jornada con el cumplimiento de las
medidas de prevención de acuerdo al protocolo
de bioseguridad.

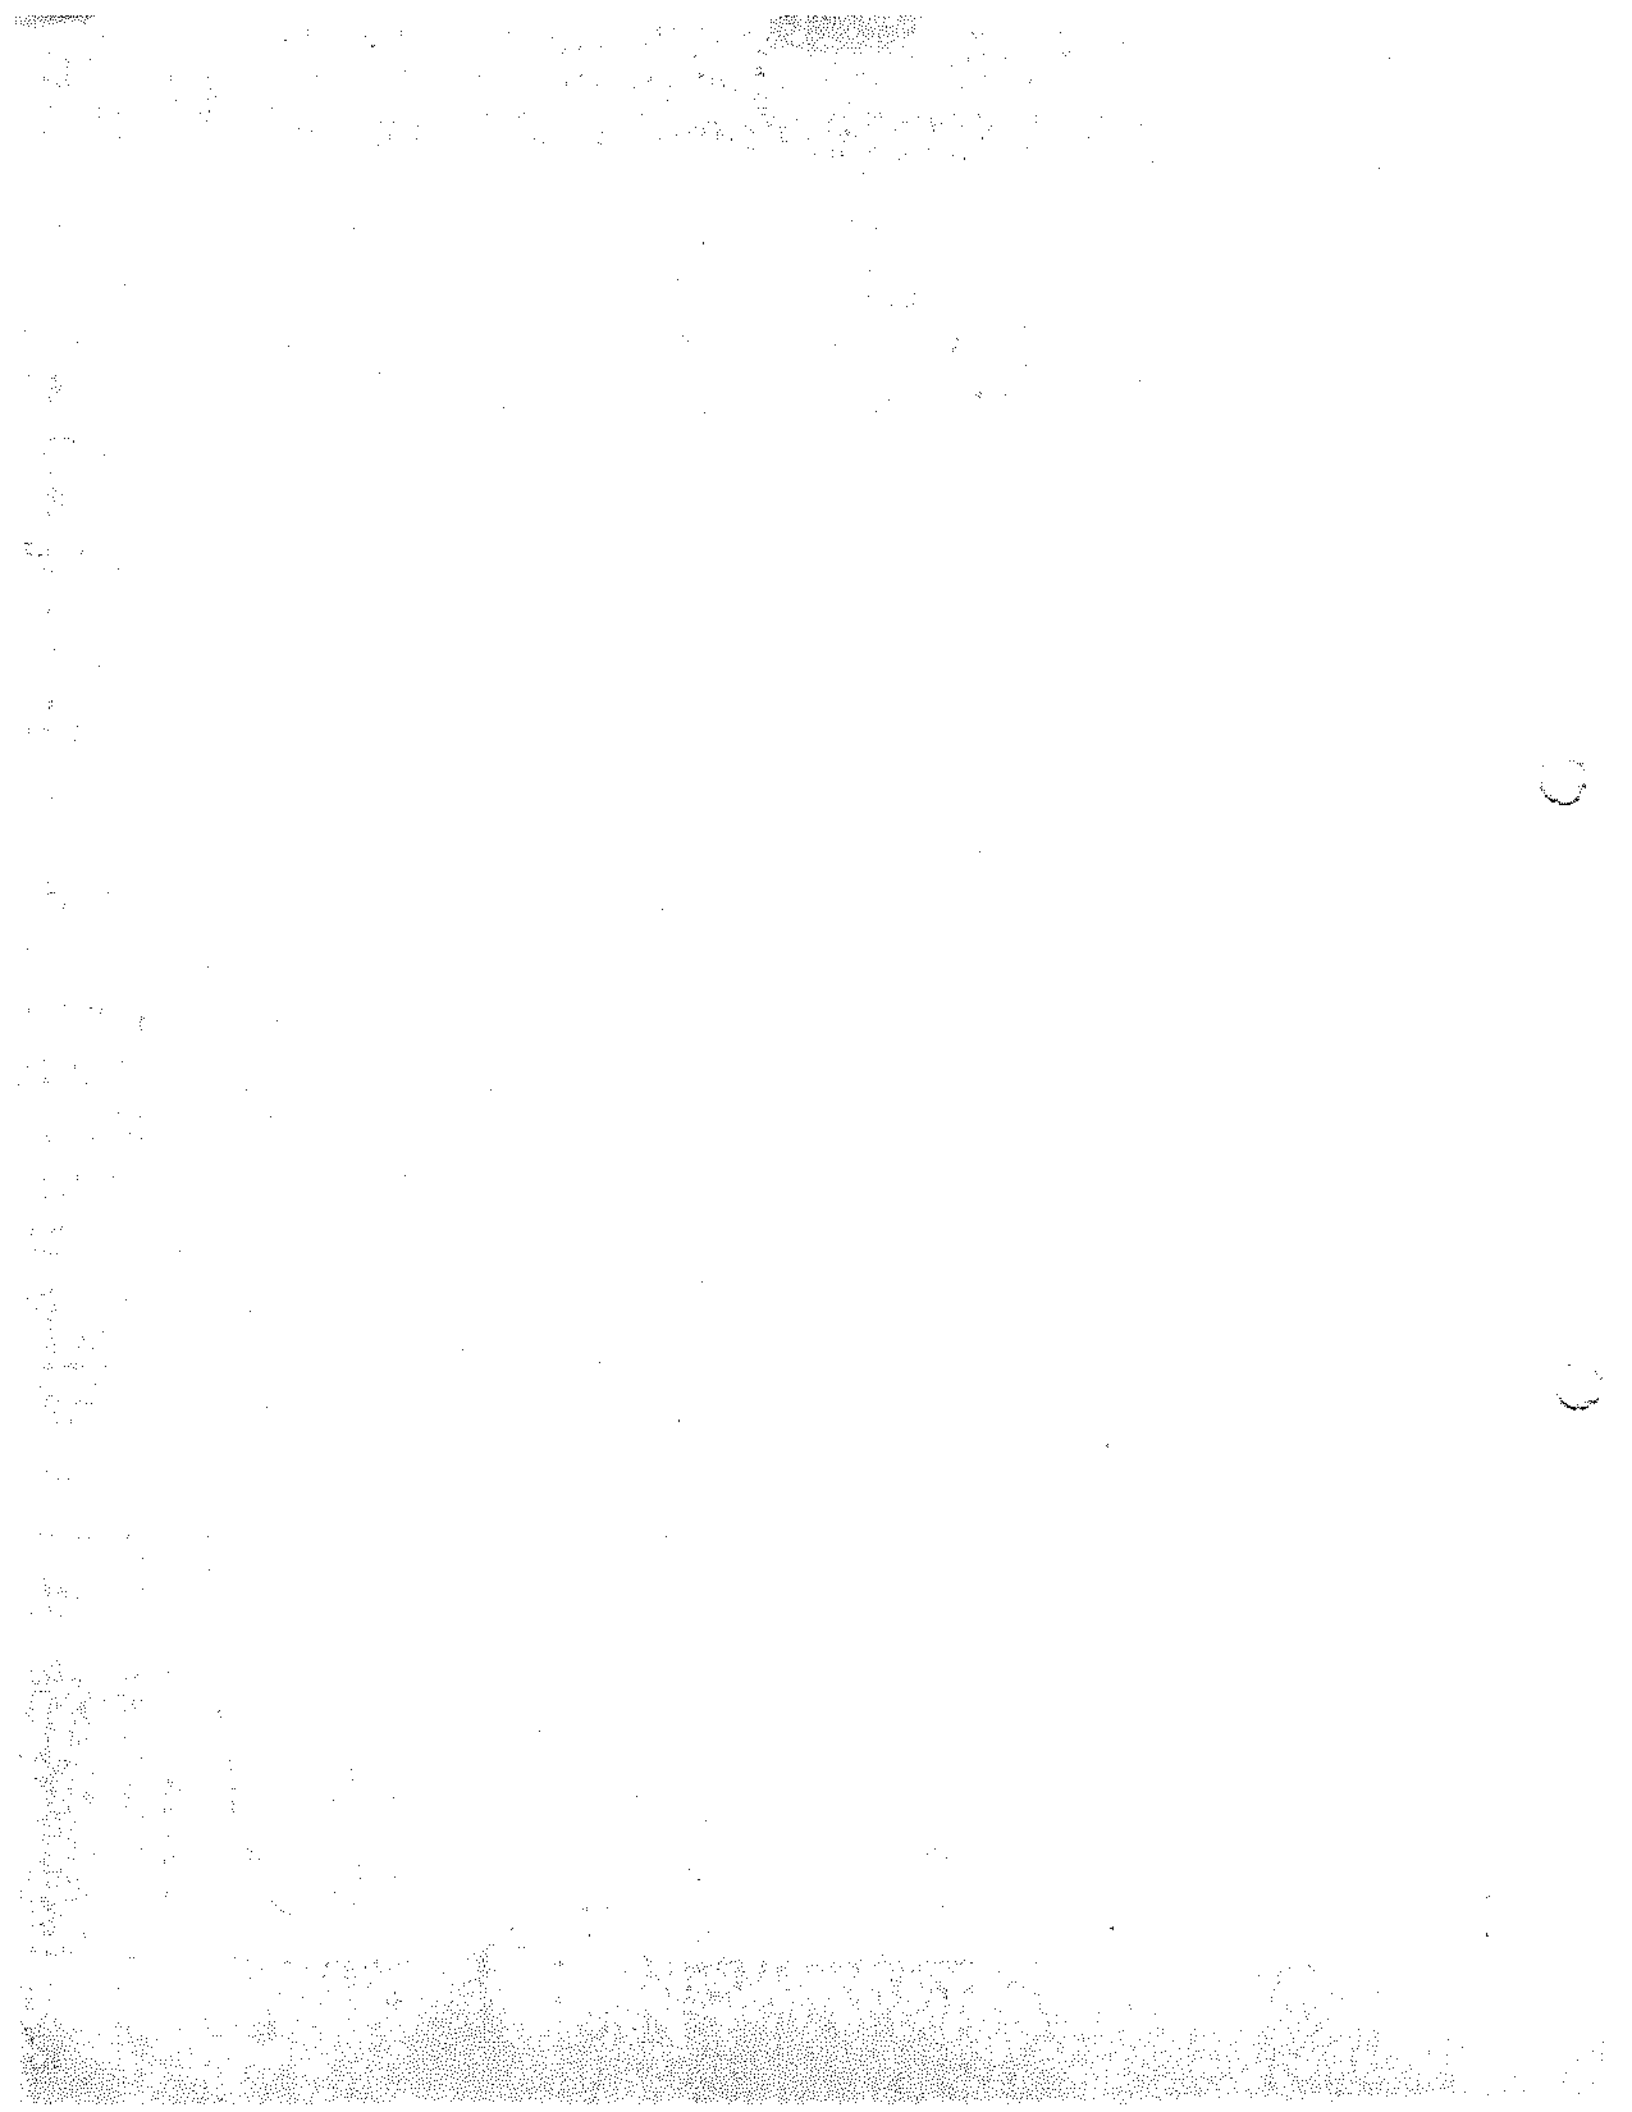


el 13 cr 7 y 6: se adelantan excavaciones para preparar terreno para cruces acueducto y alcañarillado en la cr 7

el 13 cr 5 y 6: se termina instalacion de collarines.

Termina la jornada con toma de temperatura al personal.

Condiciones climaticas: lluvias en la tarde



Mayo 24 de 2020


Inicio jornada con toma de temperatura, encuesta y desinfeccion de frente de obra, equipos y herramientas


el 13 cr 7: se realiza empalme de alcantarillado de la camera el 13 cr 7 con camera 1 tramo el 13 cr 7 y 6

se realizan demoliciones, excavaciones, instalacion tuberia 12" 7,5 ml y llenos.

Termina la jornada con toma de temperatura

Condiciones climaticas: lluvia moderada



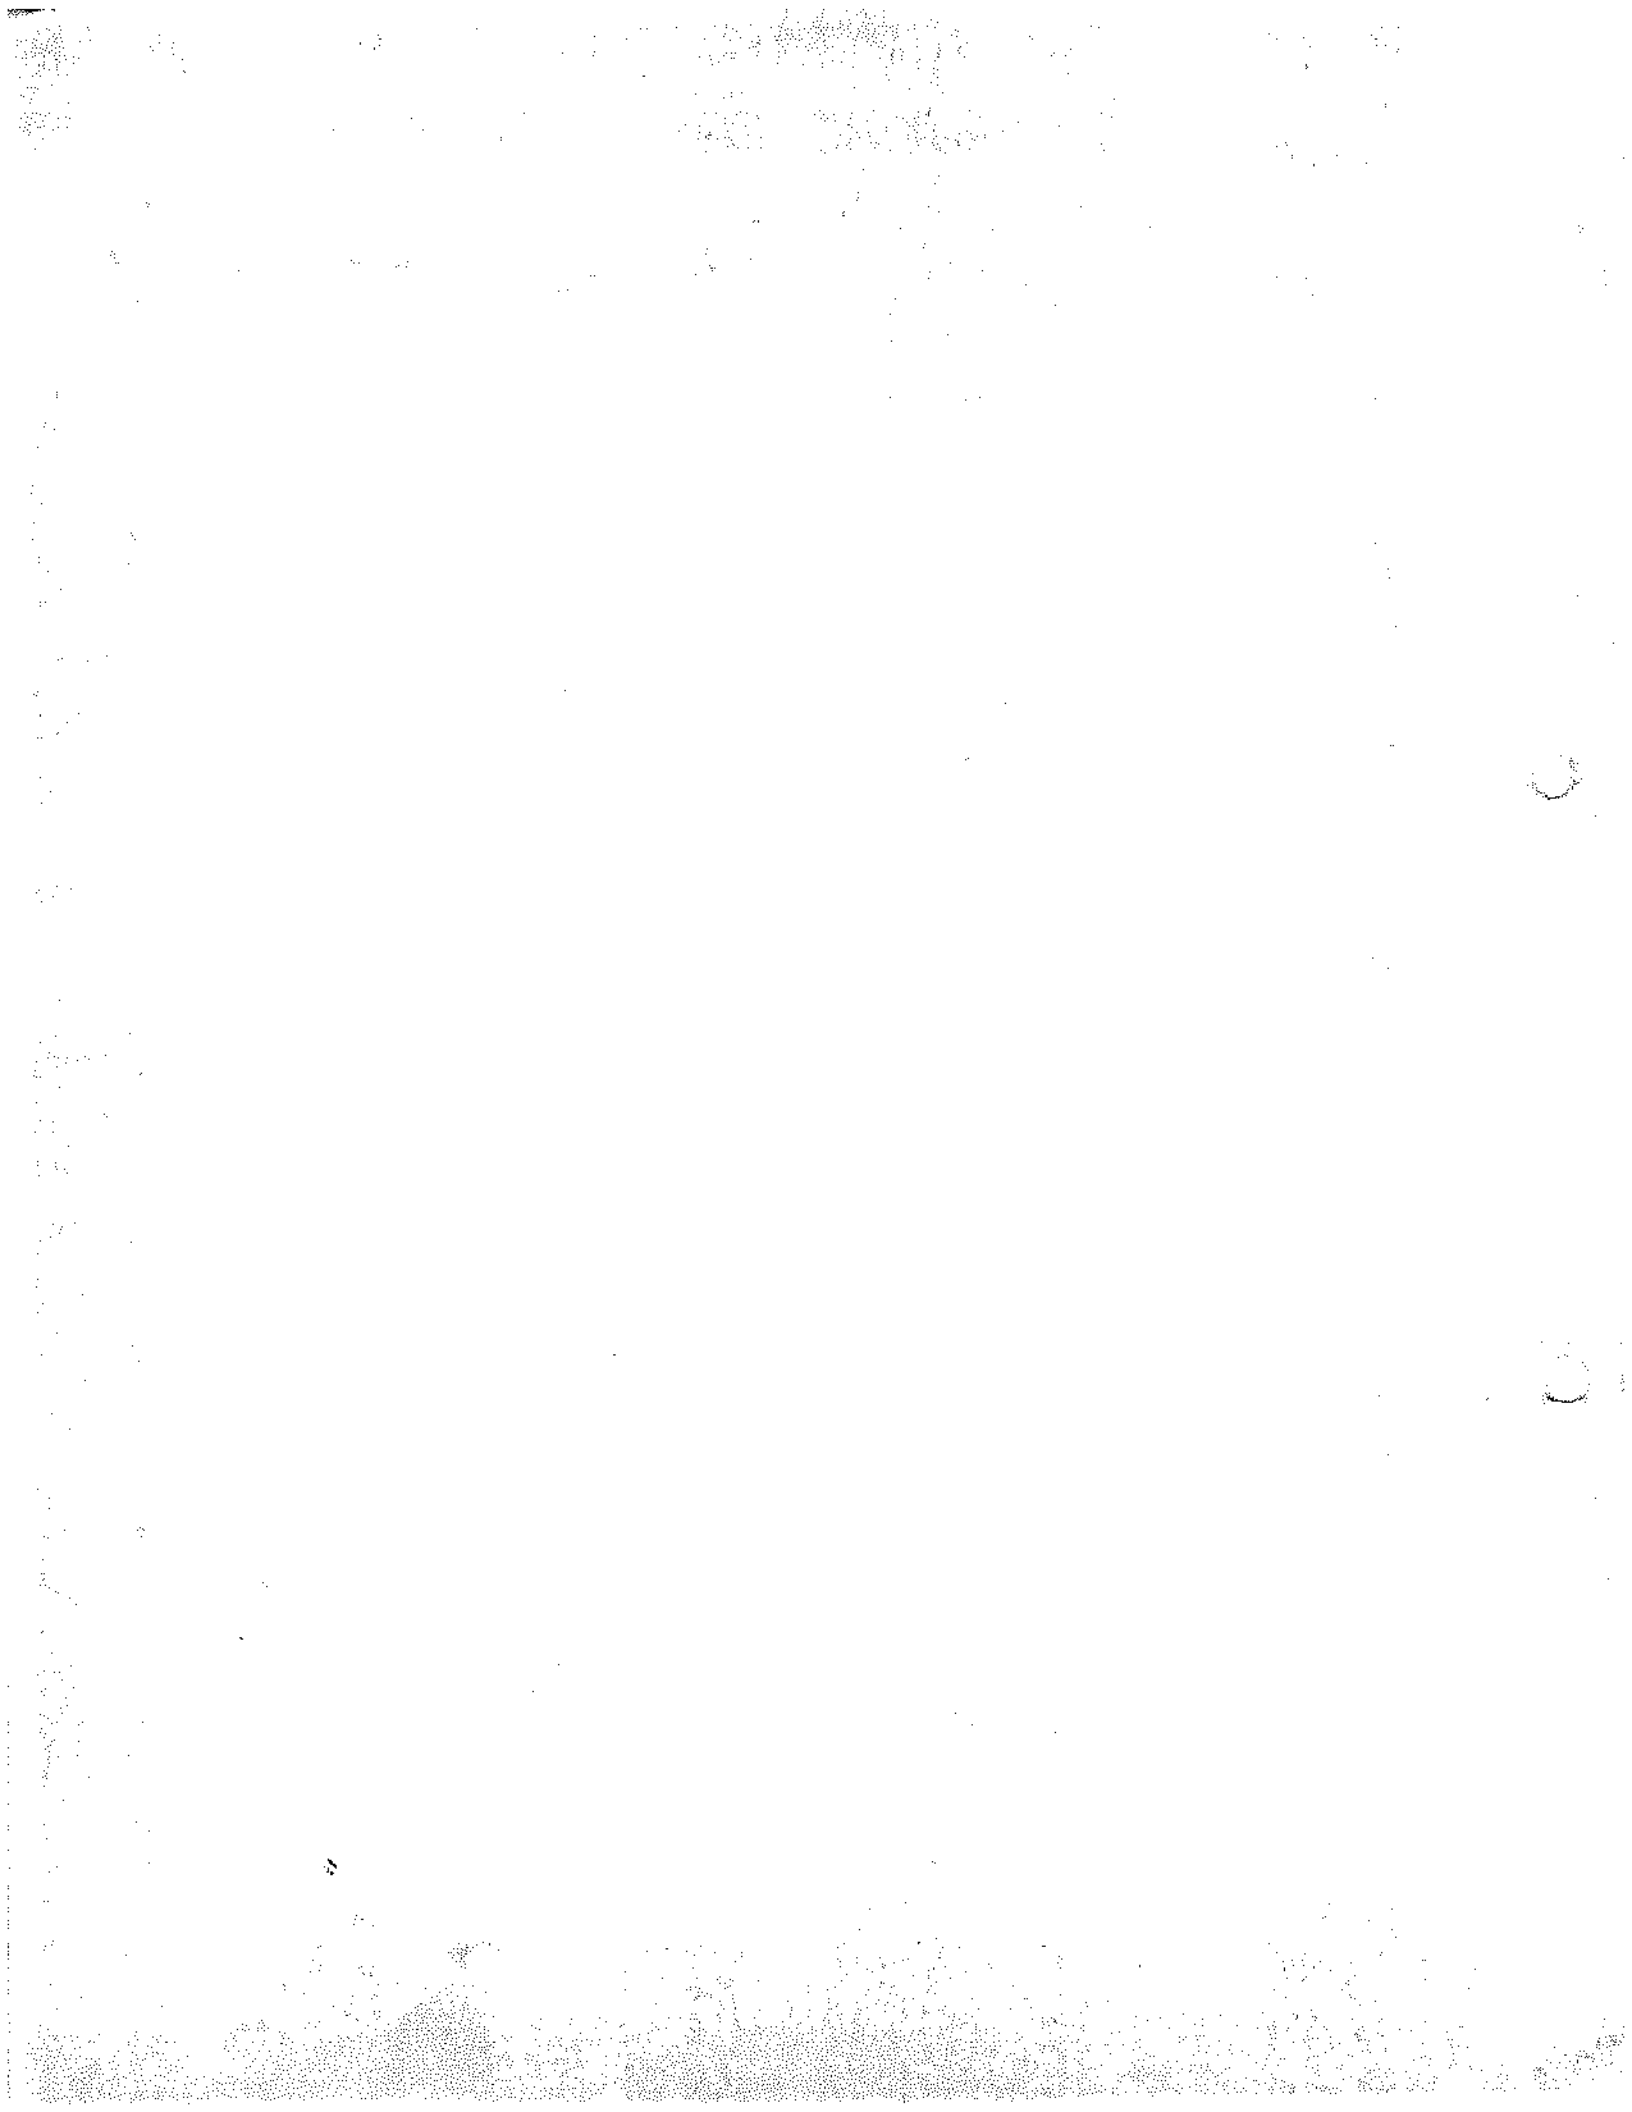


avances
acueducto
acion
pantera
a tarde

Mayo 25 de 2020
Cl. 13. CI 7 y 6 : se realiza excavacion para cruce de acueducto sobre la CI 7 de acuerdo a lo acordado para instalacion Tees en 3" y circuito para no afectar los equipamientos nuevos.
se realiza control al personal y desinfeccion de acuerdo a protocolo de bioseguridad.
condiciones climaticas : lluvia moderada

ma, encuesta
nipes y
de
17 y 7
y 6
instalacion

Mayo 26 de 2020
Cl. 13. CI 7 y 6 : se realiza cruce en alcantarillado sobre CI 7, de acuerdo a instrucciones de empacaldas y luego de verificar la existencia de tuberia de acueducto en PVC en la CI 7 hacia la CI 14 se decide solo reemplazar tramo en asbesto en la CI 7 hacia la CI 12
se realiza control al personal de acuerdo al protocolo de bioseguridad.
condiciones climaticas : lluvia en la tarde

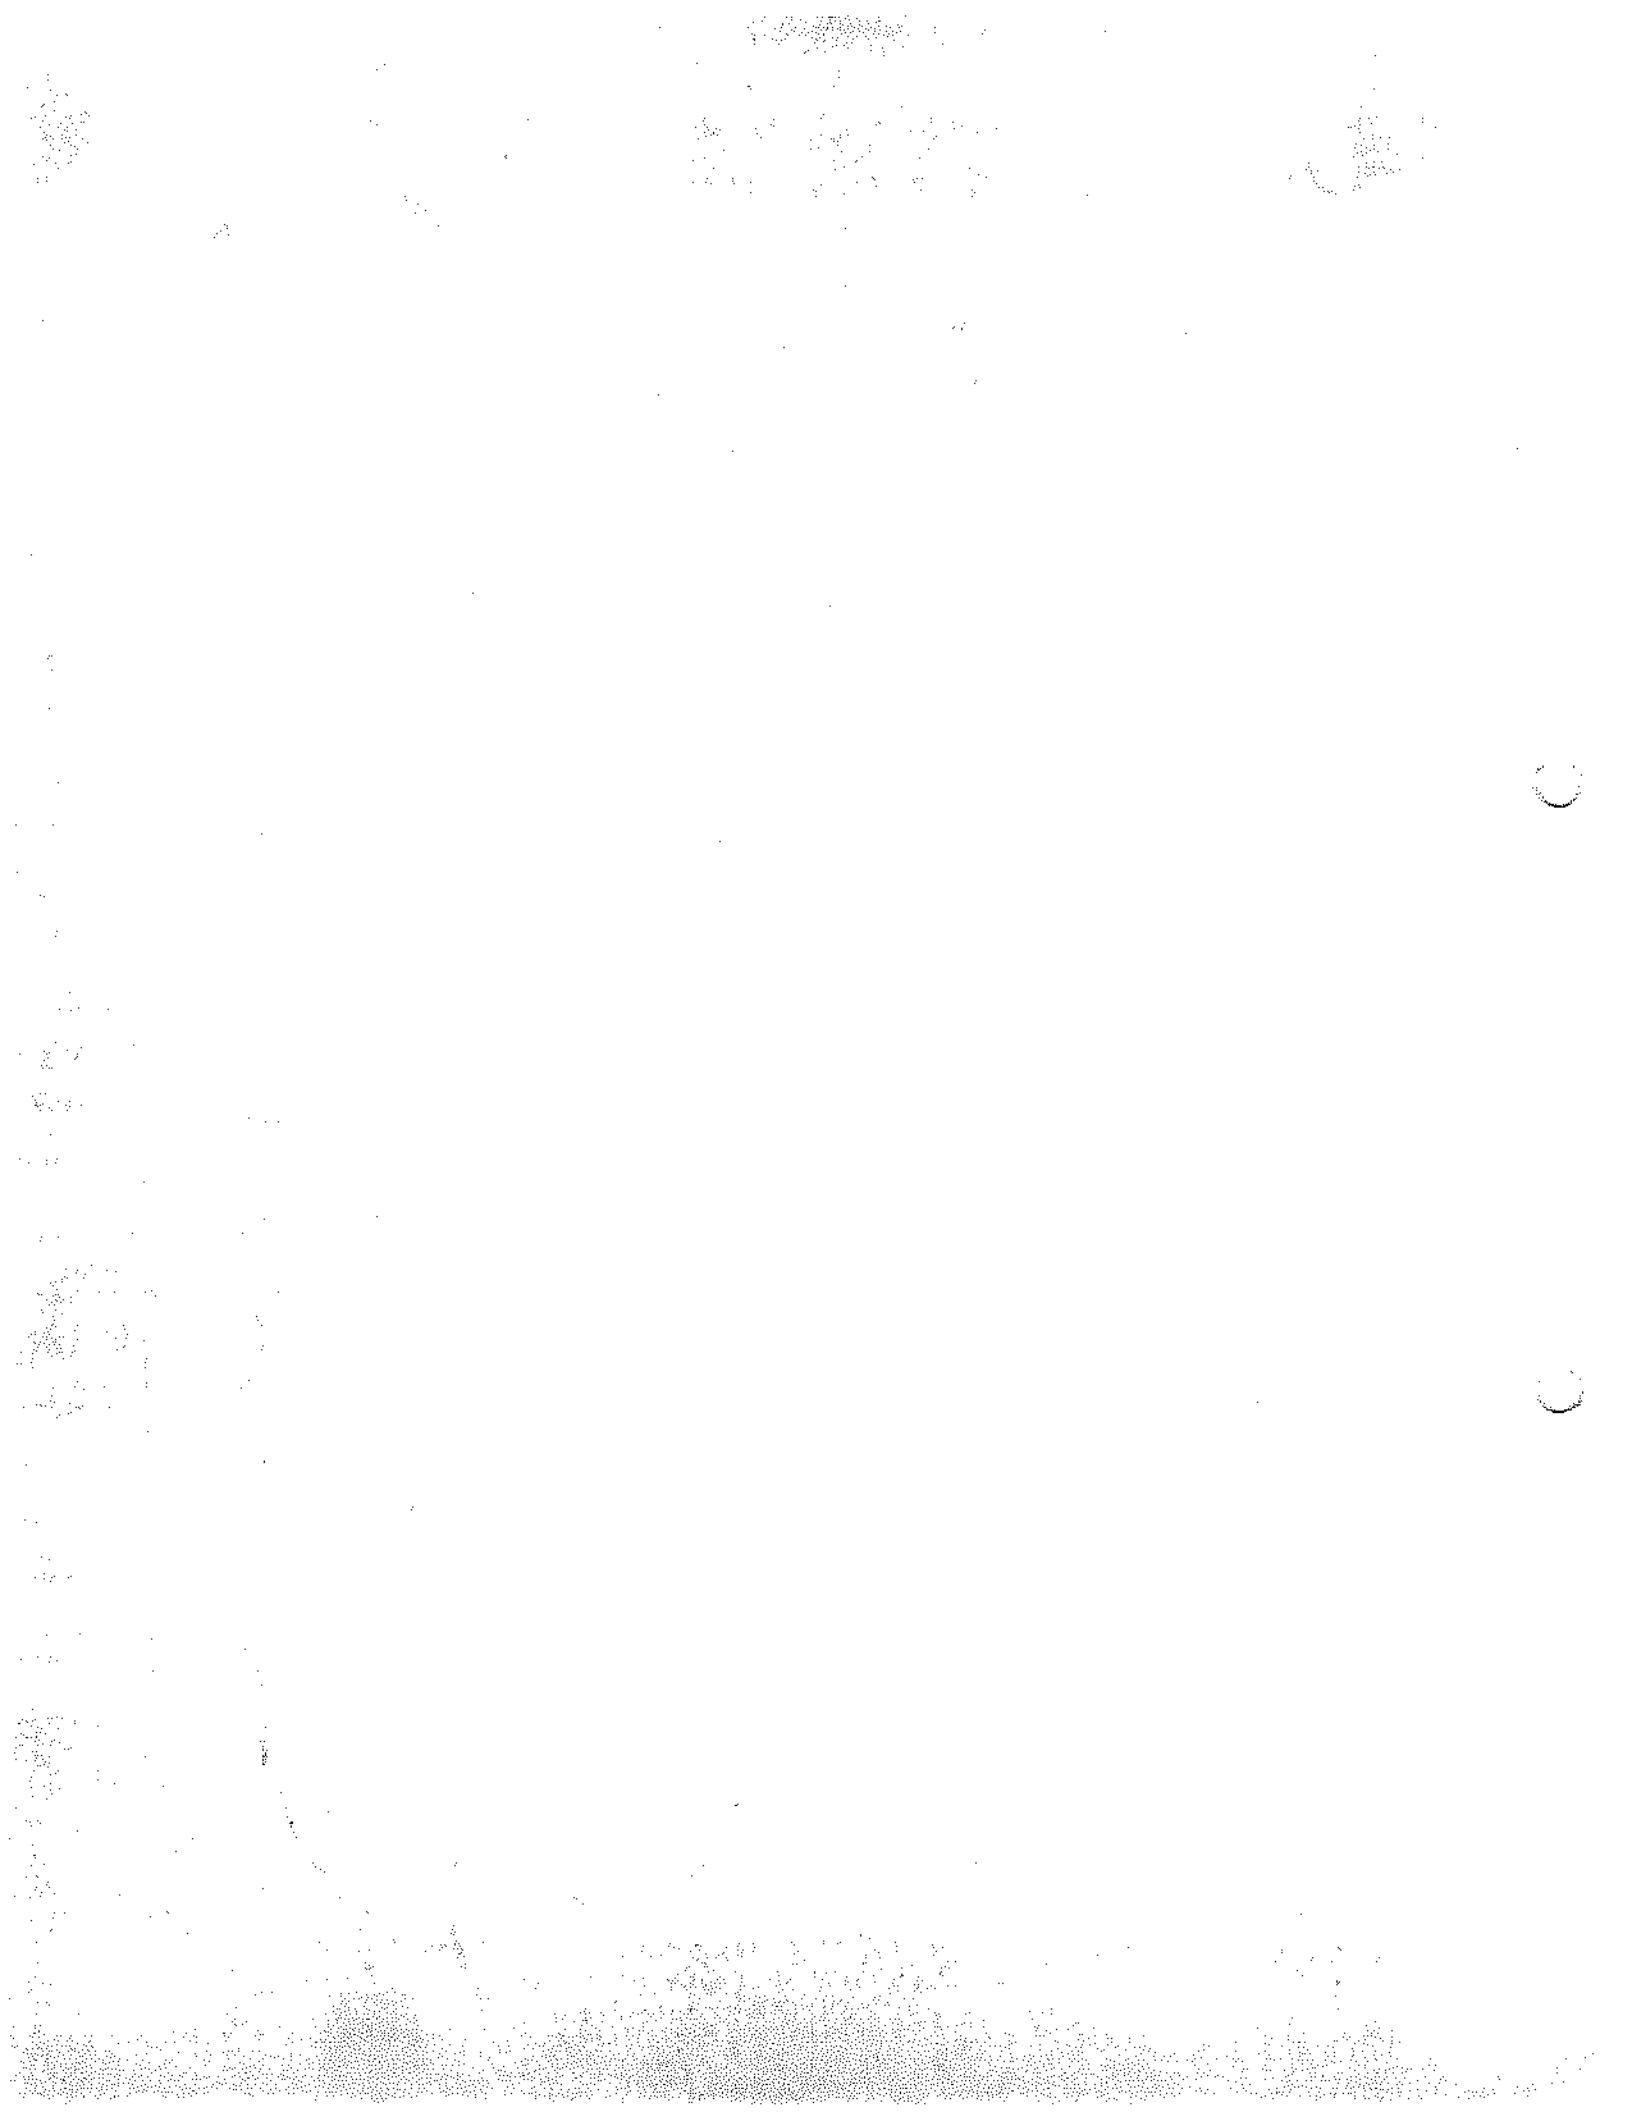

Mayo 27 de 2020

inicia la jornada con toma de temperatura, desinfección y autoevaluación de síntomas al personal de obra.


el 13 cr 7: continúa intervención para cruce en alcantarillado en carrera 7, se detecta domiciliaria para el predio con No 12-71, se plantea la necesidad de realizar la reposición de la acometida.

se terminan leños sobre red de acueducto en la cl 13 cr 7 y 6 y Cl 13 cr 8 y 5 perpendicular empalmes y cruces en cr 7 y cr 6 condiciones climáticas: lluvias en la tarde

Mayo 28 de 2020

inicia la jornada con toma de temperatura y desinfección de frente de obra, equipos y herramienta y evaluación sintomatología del personal

Se realiza instalación tubería alcantarillado para cruce sobre cr 7 y se inicia excavación para domiciliaria en cr 7 No 12-71
Se programa con empacaladas cierre para

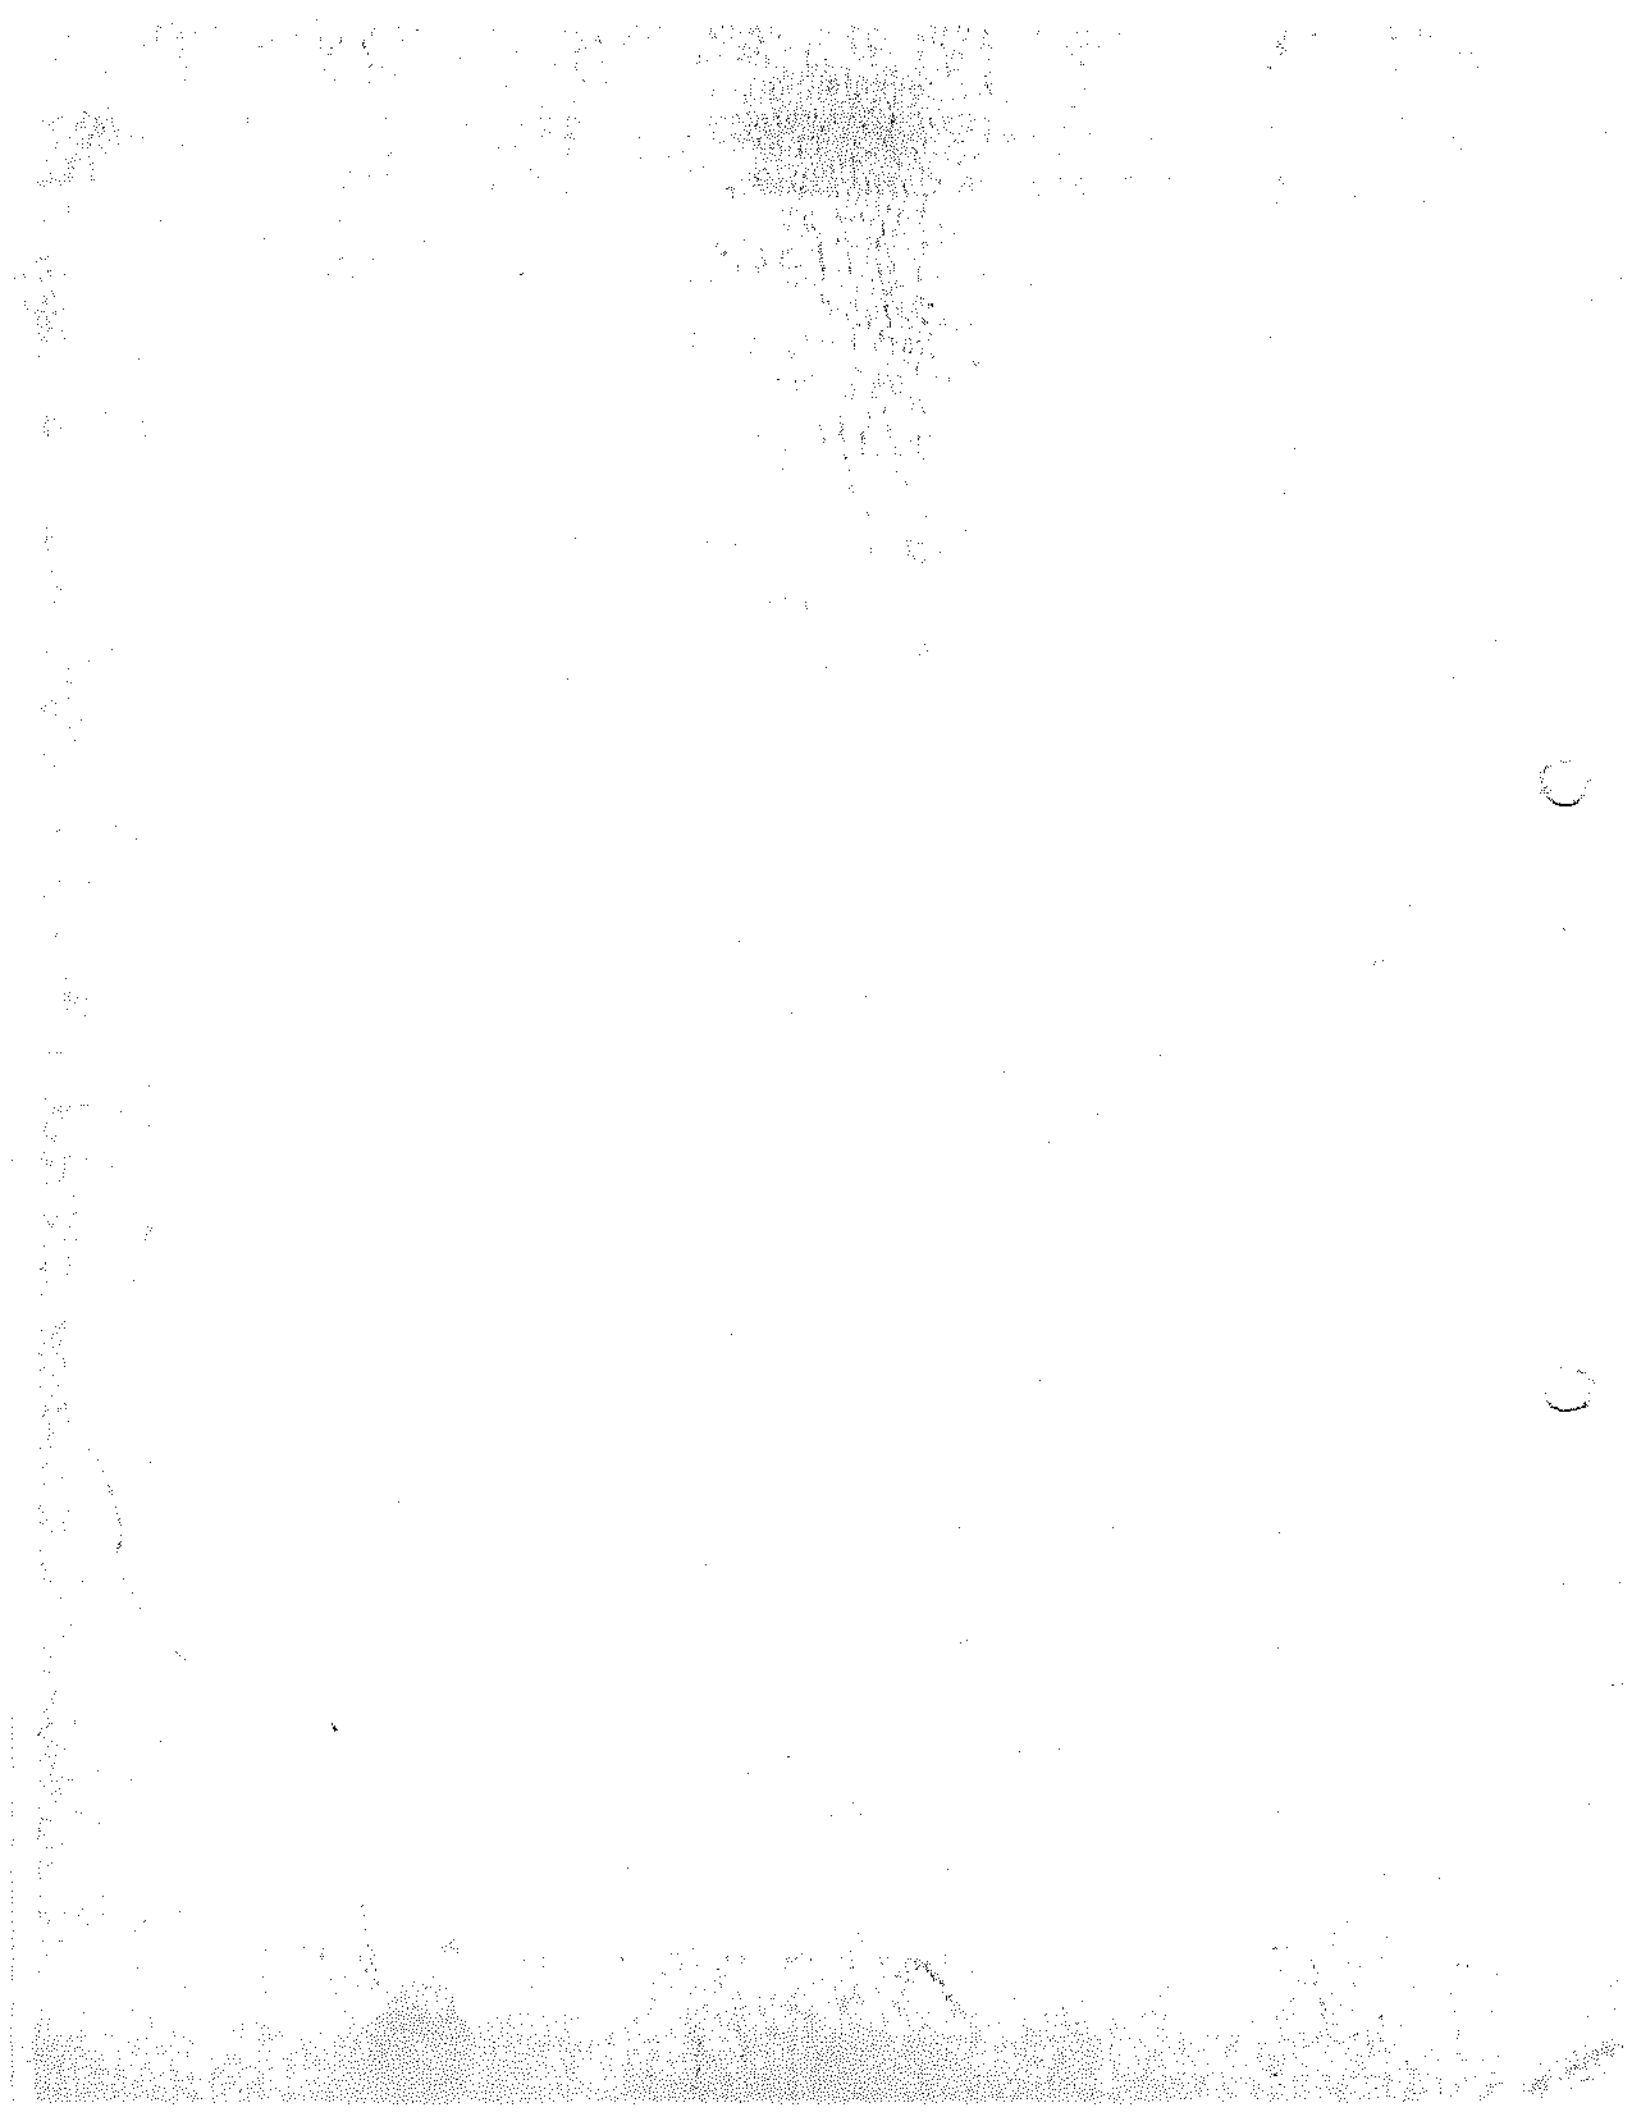

temperatura,
al al

empalmes de acueducto en la ci 7 para el
día Viernes 29 de mayo.
condiciones climáticas: lluvias en la tarde

por obra
lecta

Mayo 29 de 2020
inicia jornada con toma de temperatura, encuestas
y desinfección de acuerdo a lo planteado en
el protocolo de bioseguridad.

31, se
con de

ducto
5 y 5
7 y 6

se inician llenos sobre tubería 12" en la ci 7
y continúa excavación para acueducto.
se realiza empalme en red de acueducto ci 7
y se procede a realizar llenos.

tarde

termina la jornada con toma de temperatura
y autoevaluación al personal.

condiciones climáticas: lluvias fuertes en la tarde

trabajos
en las
a del


Mayo 30 de 2020.
No se labora en obra.

Estado
Excavación

71
para

Marden

Marden

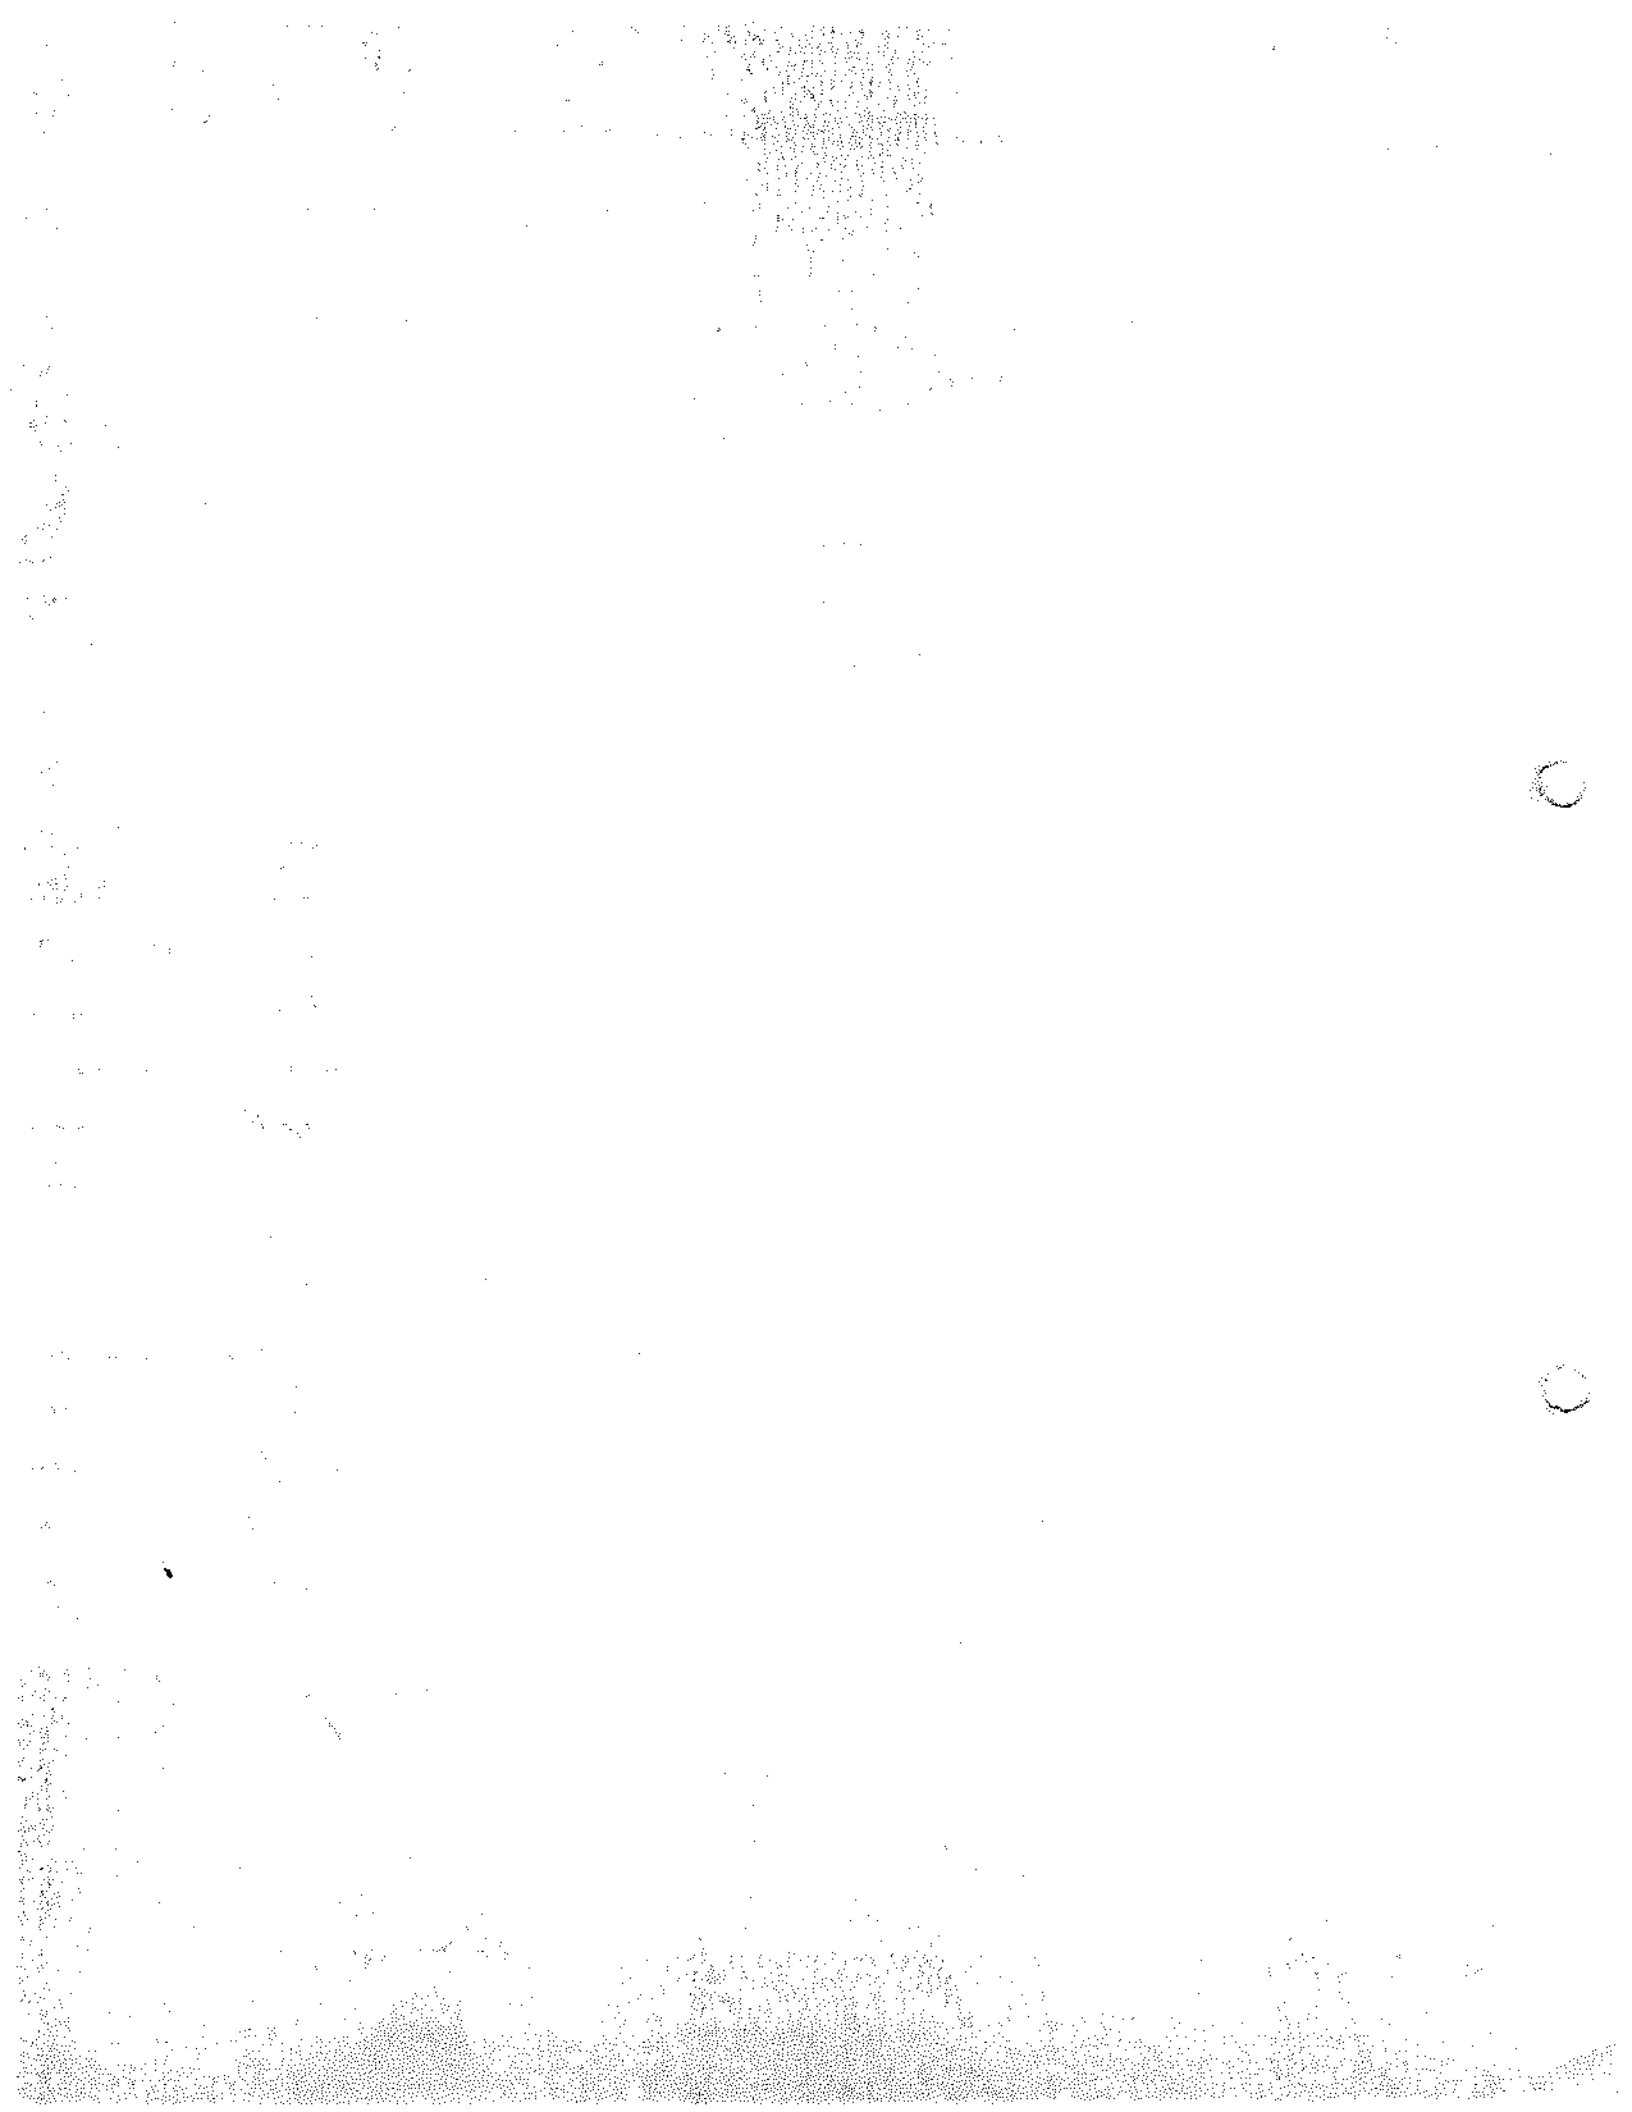

Junio 2 de 2020

inicia jornada con desinfeccion, toma de temperatura y encuesta al personal.

Se avanza con llenos sobre red acueducto y Alcañonillado en los cruces de la CL 13 con Carrera 7, se realiza despeje para empalmes de acueducto en el 13 con carrera 6.

Finaliza la jornada con toma de temperatura y desinfecciones a los frentes de obra, equipos y herramientas

condiciones climaticas: lluvias en la tarde




Junio 3 de 2020


inicia jornada con desinfeccion, toma de temperatura y encuesta al personal.

Terminan llenos para los cruces de acueducto y alcañonillado en la calle 13 con carrera 6 se cancela cierre para empalmes en calle 13 en 6 y 5 empalmadas no envia personal para cierre. Finaliza la jornada con toma de temperatura y desinfeccion

condiciones climaticas: lluvia moderada todo el dia



Junio
inicia jo
y encues
se real
a 5 y
En la
la alcal
de las
las prue
para la
termina
encuestas
condicio

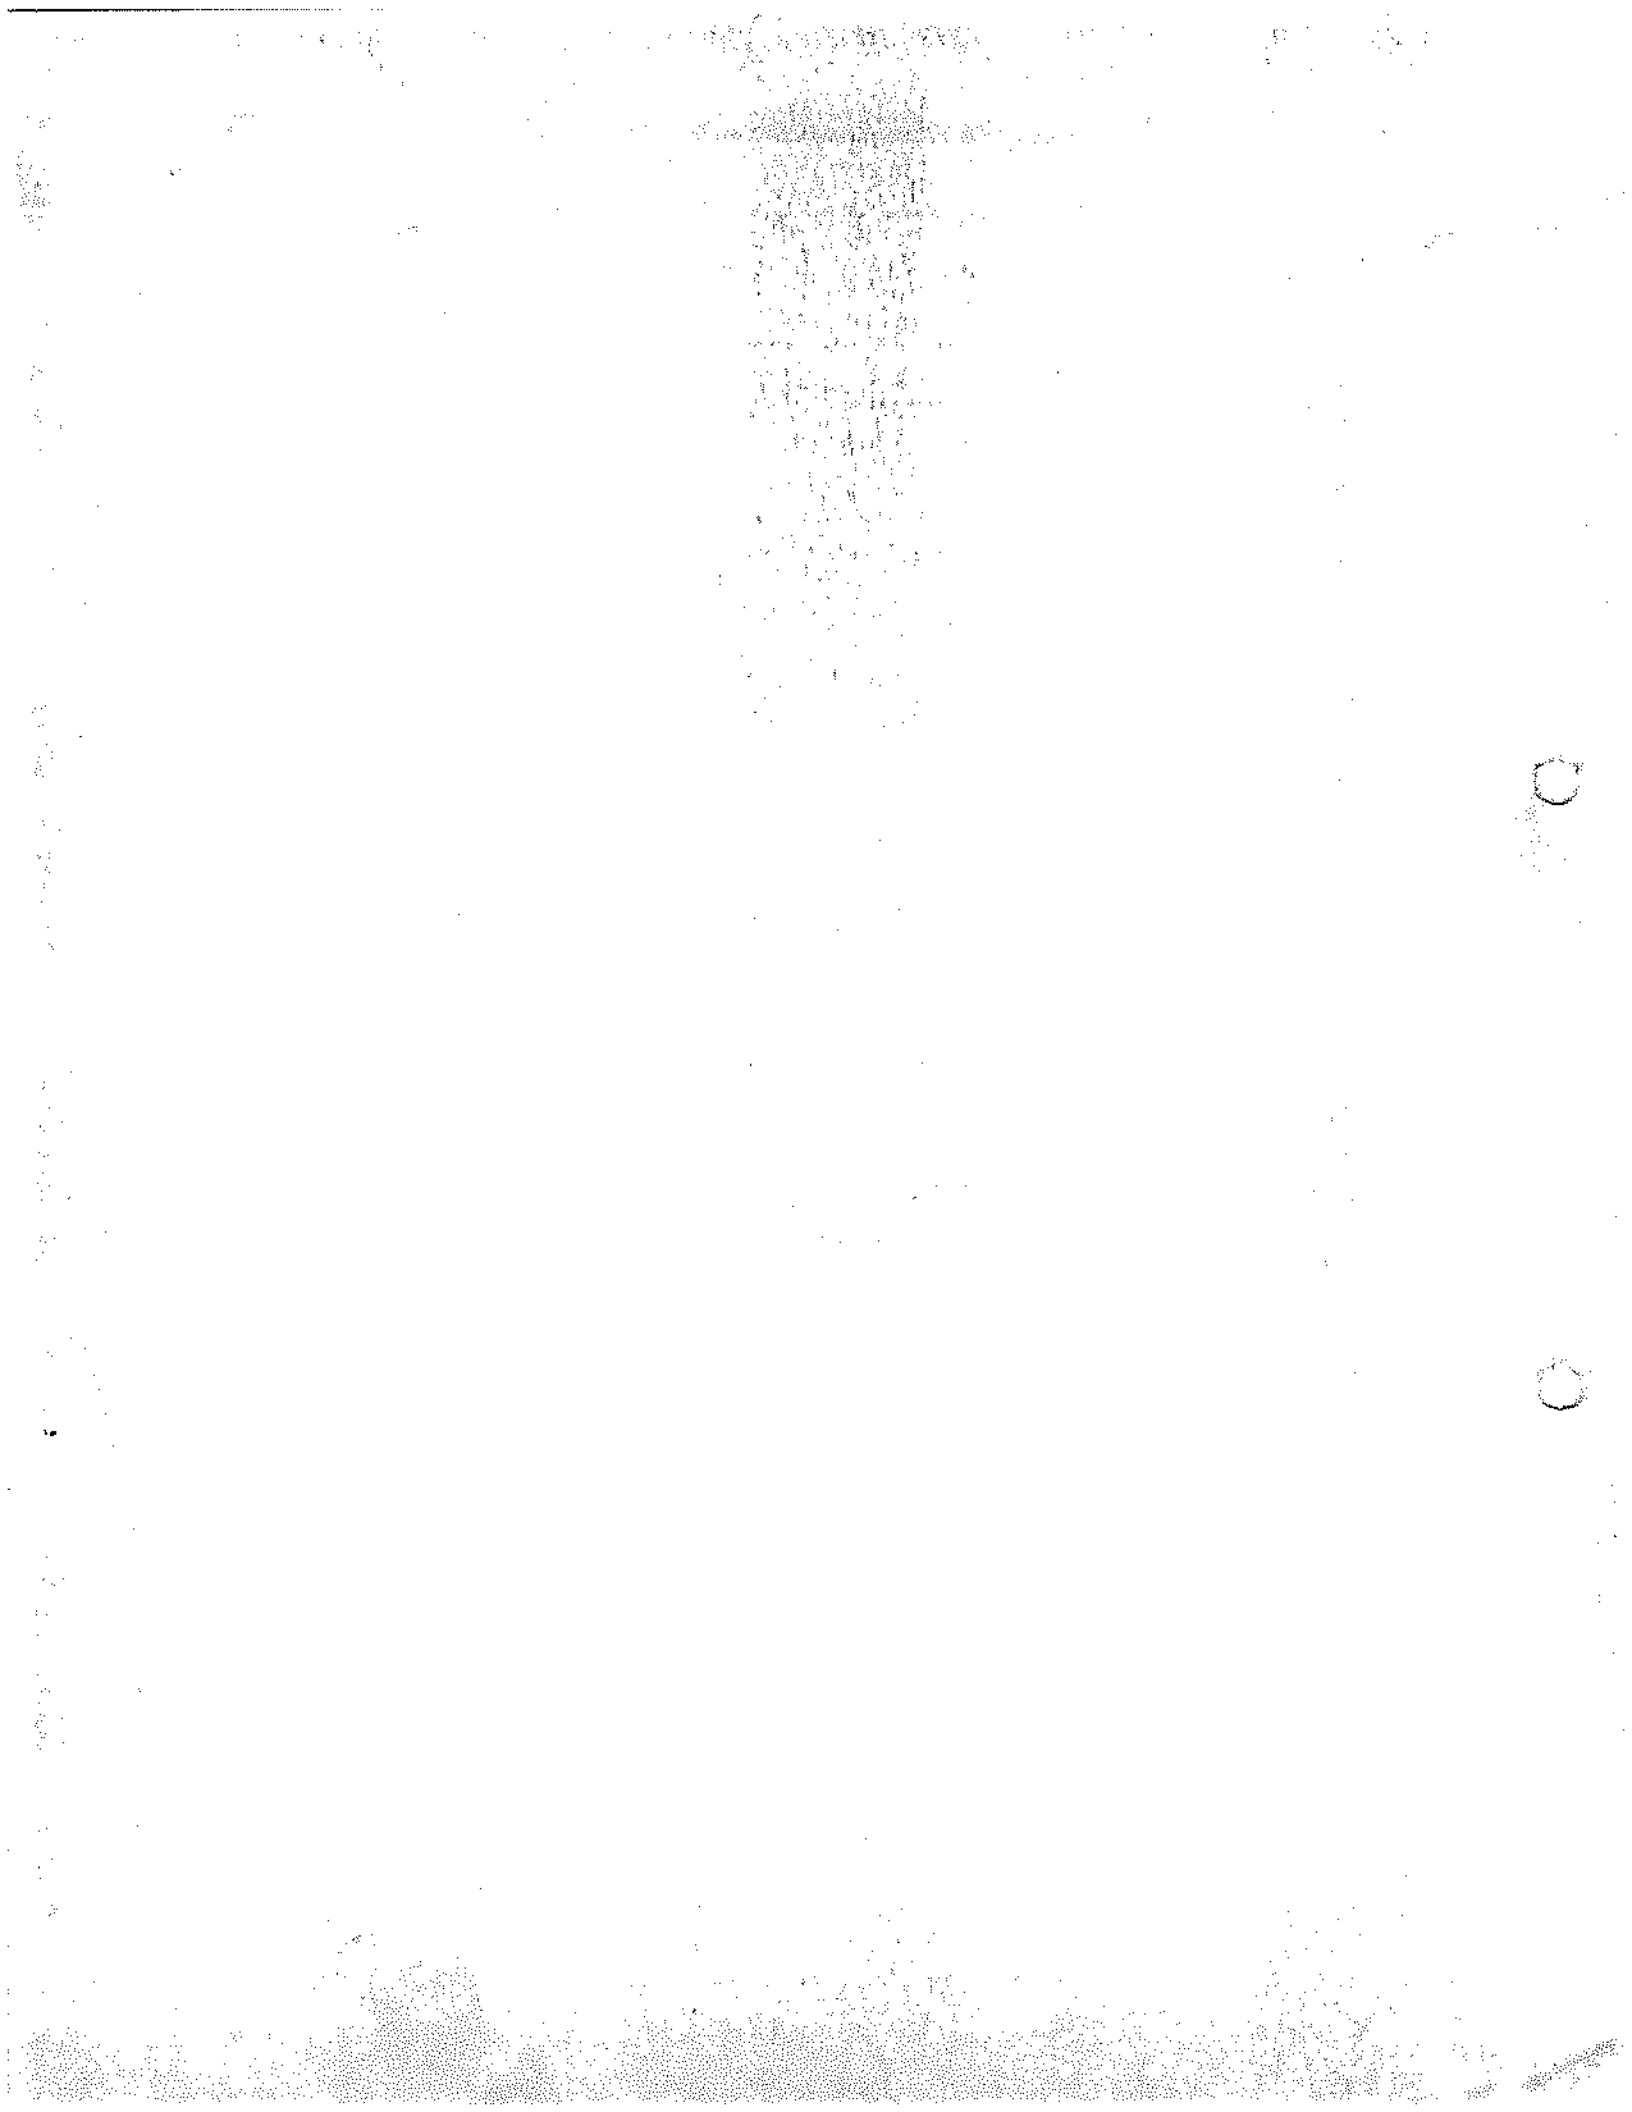

Junio 4 2020

de temperatura

nueva jornada con desinfección toma de temperatura y encuestas a los trabajadores.

de la calle 13 con

se realiza cierre y empalmes en la cl 13 cr 6 a 5 y cierre en la cr 6.

empalmes de

En la calle 13 con carrera 7 el contratista de la alcaldía municipal procedió con la construcción de las losas de pavimento, sin haberse realizado las pruebas a los llenos y sin dejar el espacio para la instalación de los portavalvulas.

trabaja

termina la jornada con toma de temperatura encuestas al personal y desinfección general.

en, equipos

condiciones climáticas: lluvia moderada en la mañana.

paralisa y

acuerdo


carrera 6

calle 13

al por

o de

todo el

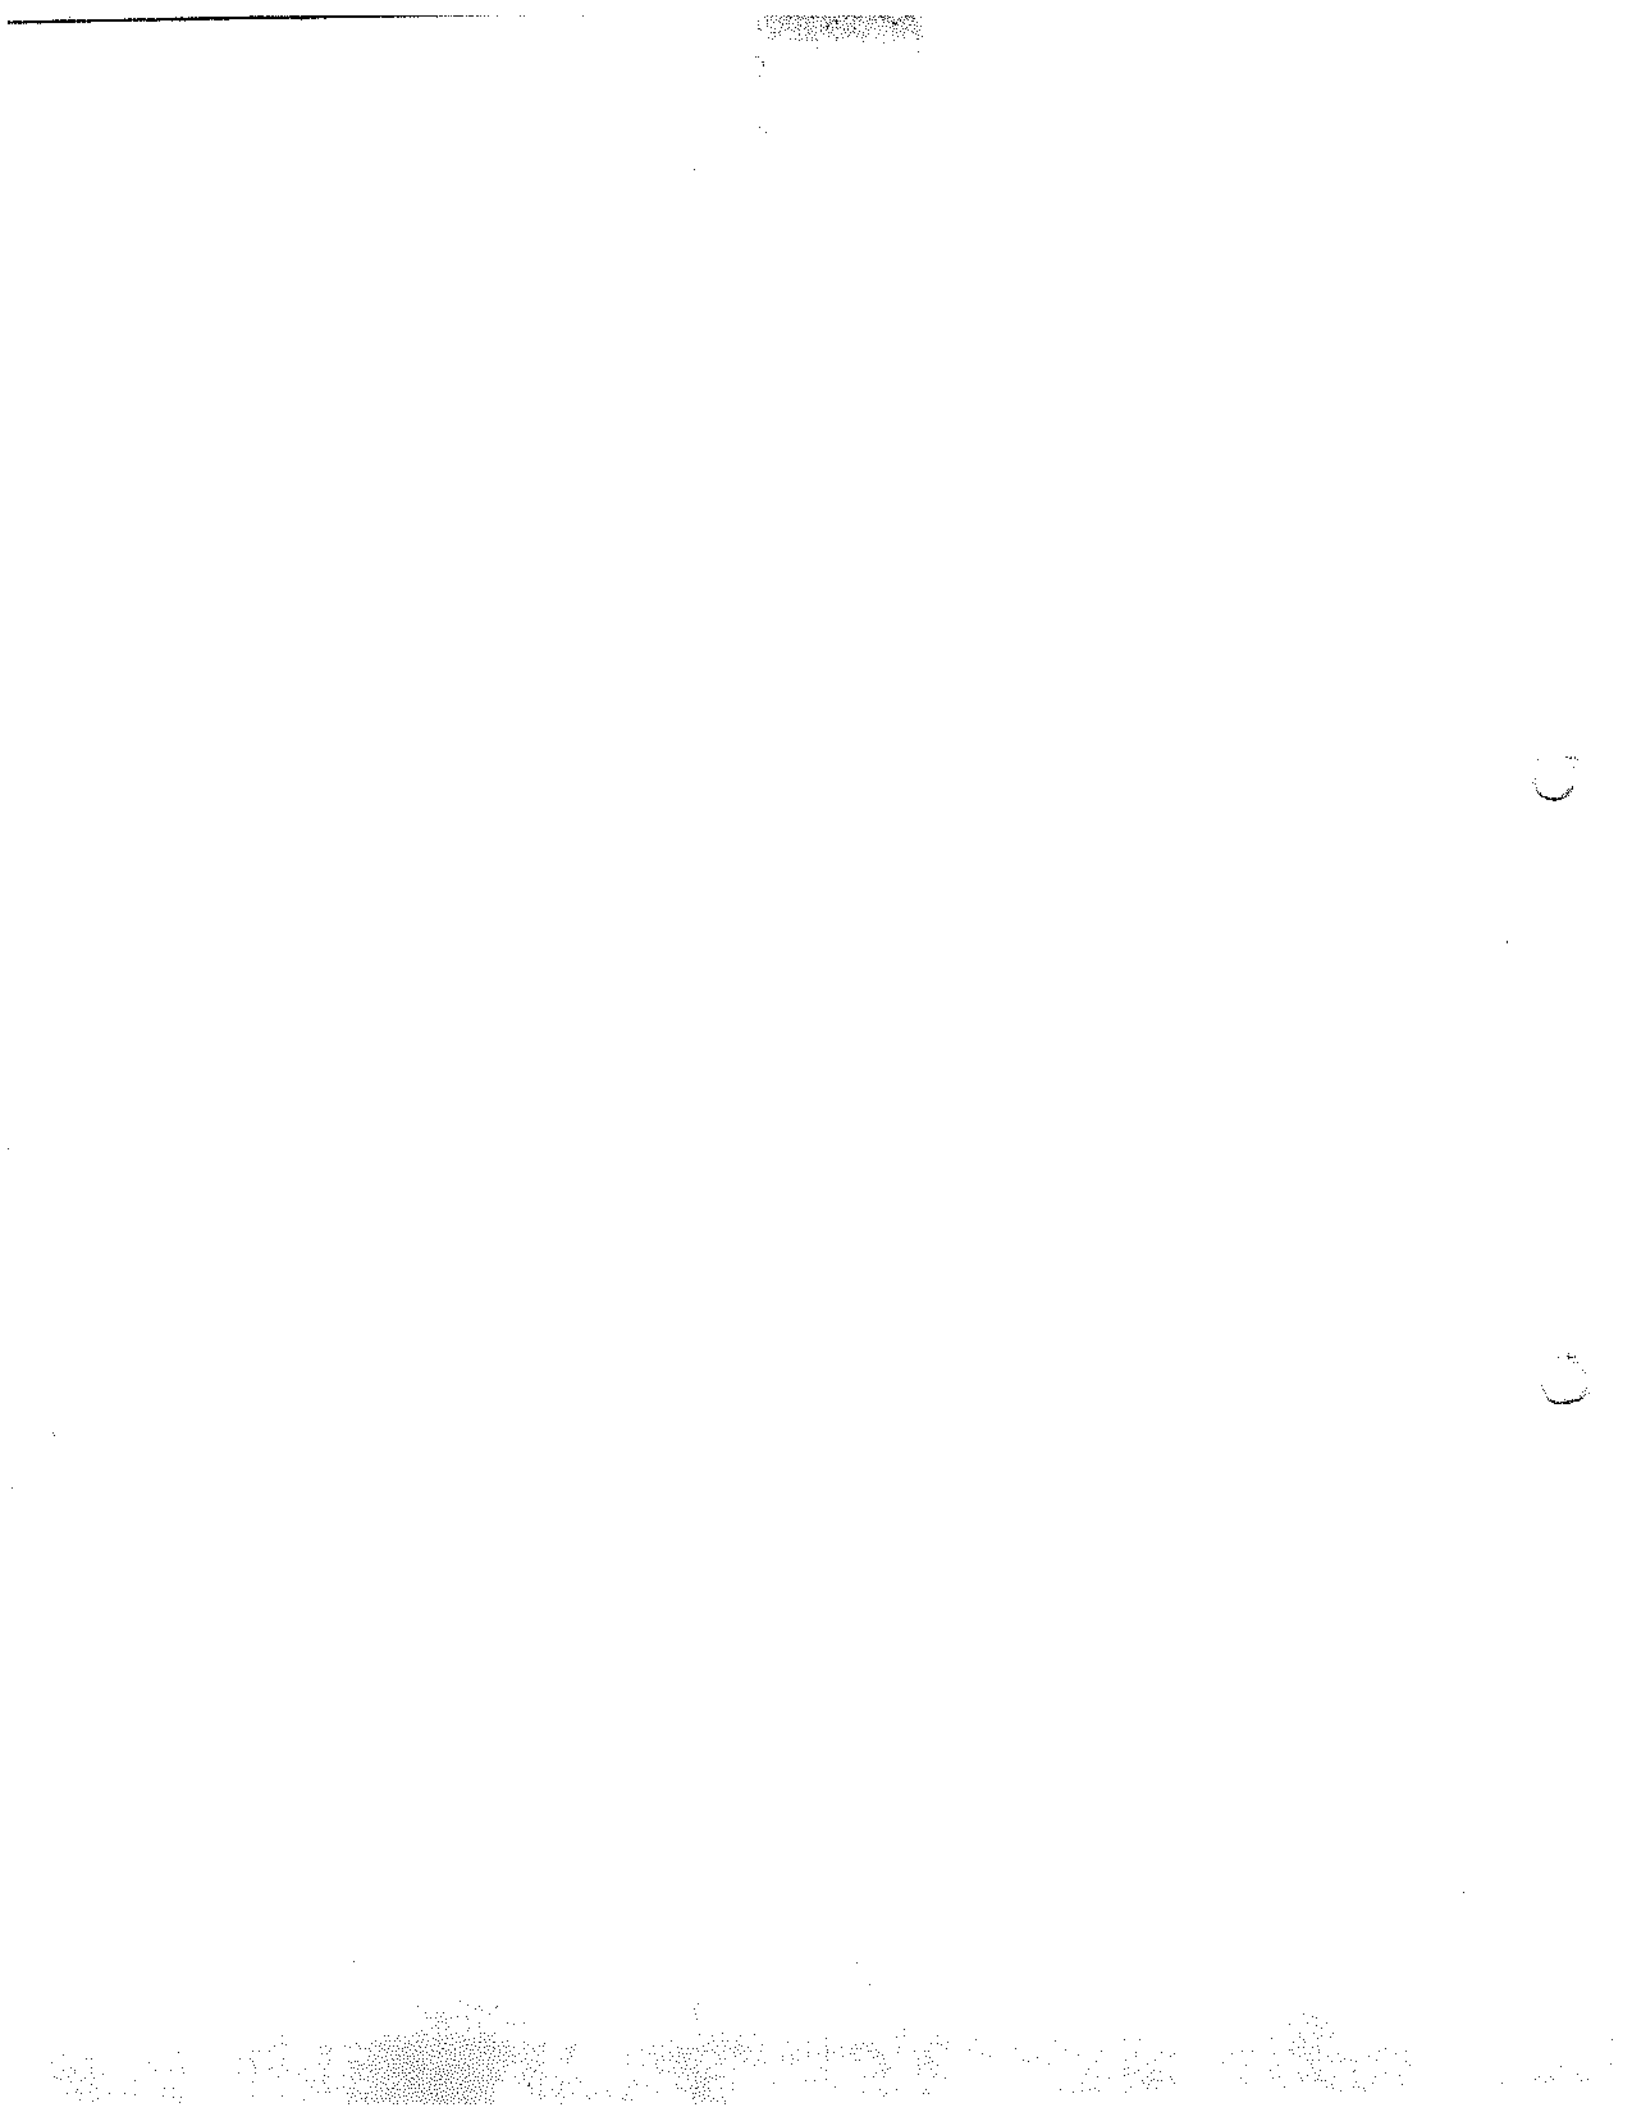



SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HF Y ALINEACION MEDIDORES DE ACUEDUCTO CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)					
	Actividad	UND			155.267,0
(Instalaciones)	Cuadrilla	HR	1,7	18.505	31.459
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,05	124.399	6.220
MATERIALES VARIOS PARA LA MOVILIZACION Y ALINEACION DEL MEDIDOR	Equipos	UND	1,03	2.736	2.818
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,4	2.404	962
CAJA RECTANGULAR HF CON LOGOTIPO DE EMPOCALDAS	Insumo	UND	1	78.000	78.000
CONCRETO 3000 PSI	Insumo	M3	0,09	397.872	35.808
ADMINISTRACION		24%			37.284,08
IMPREVISTOS		5%			7.763,35
UTILIDAD		5%			7.763,38
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			1.475,00
COSTO TOTAL					209.633,00

Suministro, transporte e instalación tapa para agrupación de medidores, incluye concreto marco tapa y contramarco en angulo de 2" x 3/16"					
	Actividad	UND			338.642
(Instalaciones)	Cuadrilla	HR	2	18.505	37.010
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,08	124.399	9.952
MATERIALES VARIOS PARA LA MOVILIZACION Y ALINEACION DEL MEDIDOR	Equipos	UND	1,05	2.736	2.873
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,4	2.404	962
CAJA RECTANGULAR EN ANGULO 1" Y CONCRETO	Insumo	UND	1	240.000	240.000
CONCRETO 3000 PSI	Insumo	M3	0,12	397.872	47.745
ADMINISTRACION		24%			81.250,08
IMPREVISTOS		5%			16.927,10
UTILIDAD		5%			16.927,10
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			3.216,00
COSTO TOTAL					456.862,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA					
	Actividad	ML			118.108
(Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0,8	16756	13.405
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0413	124399	5.138
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,09	2404	216
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,7	1258	881
MANEJO DE TUBERIA PVC CORRUGADA 12 U.C	Insumo	M	0,1	62040	6.204
LUBRICANTE PARA PVC CORRUGADA	Insumo	UND	0,011	131533	1.447
TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 315 MM	Insumo	M	1,05	86492	90.817
ADMINISTRACION		24%			28.345,92
IMPREVISTOS		5%			6.905,00
UTILIDAD		5%			6.905,00
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			1.122,00
COSTO TOTAL					159.385,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)					
	Actividad	ML			31.464
(Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,06	38750	2.325
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,02	124550	2.491
TABLERO 1,40 X 0,70	Equipos	DIA	1,6	550	880
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,3	2404	721
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,3	1258	377
FIBRA PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,1M	Insumo	M	2,6	3000	7.800
CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD (2 HILERAS)	Insumo	M	5	110	550
ESTRUCTURA EN GUADUA-CUARTON	Insumo	M	0,6	27200	16.320
ADMINISTRACION		24%			7.651,36
IMPREVISTOS		5%			1.573,20
UTILIDAD		5%			1.573,20
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			299,00
COSTO TOTAL					42.461,00


 CONSORCIO CALDAS
 R.L. EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
 Contratista


 Nombre: LUIS FERNANDO ARIAS
 INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document provides a detailed overview of the data analysis process. It describes how statistical and analytical techniques are used to identify trends, patterns, and insights from the collected data.

6. The sixth part of the document discusses the importance of data visualization in communicating complex information. It explains how charts, graphs, and dashboards can be used to present data in a clear and accessible manner, facilitating better understanding and decision-making.

7. The seventh part of the document explores the role of data in strategic planning and performance management. It shows how data-driven insights can be used to set goals, track progress, and make strategic adjustments to improve organizational performance.


8. The eighth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a data-driven culture and continuous improvement in data management practices to achieve long-term success.


**ANALISIS COSTOS ELABORACIÓN PROTOCOLO PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID 19
EN EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

NP5

PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD		MES	
	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
PERSONAL PROFESIONAL				
Profesional en Salud Ocupacional, o profesional en áreas afines con Especialización en Salud Ocupacional (Salario 2,200,000 factor prestacional de 1,72 + 600,000 manutención). Incluye la elaboración del protocolo de seguridad, permanencia 100% en la obra	mes	0,50	4.384.000,00	\$ 2.192.000,00
PERSONAL AUXILIAR				
Auxiliar Profesional SISO (Salario \$ 877.803 mas factor prestacional de 1,72). Permanencia 100% en la obra en labores de toma temperatura, aspersión diaria a cada trabajador, llenado de formatos requeridos, desinfección herramienta, control de lavado de manos, utilización y cambio de tapabocas, utilización de gafas.	mes	1,00	1.509.821,00	\$ 1.509.821,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL SISO				3.701.821,00
ADMINISTRACIÓN	24%			888.437,00
IMPREVISTOS	0%			
UTILIDAD	5%			185.091,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19%			35.167,00
COSTO TOTAL MES PERSONAL SISO				4.810.516,00


 CONSORCIO CALDAS
 R.L. EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
 Contratista


 Nombre LUIS FERNANDO ARIAS
 INGENIERO ZONA NORTE CENTRO
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial operations. This section also highlights the role of internal controls in preventing errors and fraud.

2. The second part of the document focuses on the implementation of robust risk management strategies. It outlines the need to identify potential risks early on and to develop effective mitigation plans. The text stresses that a proactive approach to risk management can significantly reduce the impact of unforeseen events on the organization's financial health.


3. The third part of the document addresses the importance of regular communication and reporting. It states that providing timely and accurate information to stakeholders is crucial for building trust and maintaining a positive reputation. This section also discusses the benefits of using clear and concise language in all communications.


4. The fourth part of the document discusses the role of technology in modern financial management. It highlights how digital tools and software can streamline processes, improve data accuracy, and enhance overall efficiency. The text also notes the importance of staying up-to-date with the latest technological advancements in the industry.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the need for a strong ethical foundation in all financial activities. It states that adhering to high ethical standards is not only a legal requirement but also a key factor in long-term success. The text encourages organizations to foster a culture of integrity and ethical behavior throughout all levels of the organization.

NP6


SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO				
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	UNIDAD	GL
			Vr. Unitario	Vr. Total
Suministro transporte e instalación de lavamanos en acero inoxidable tipo socoda o similar, incluye base en estructura metálica, grifería, tubería para acueducto y tubería para desagüe, según diseño entregado por la Interventoría.	Unidad	1,00	600.000,00	\$ 600.000,00
Suministro de termómetro Laser (No Invasivo), para toma y registro de temperatura diaria a cada trabajador.	Unidad	1,00	350.000,00	\$ 350.000,00
Suministro aspersor (Fumigador cacorro de espalda 20 litros)	Unidad	1,00	197.000,00	\$ 197.000,00
Suministro de caneca de pedal	Unidad	3,00	80.000,00	\$ 240.000,00
Suministro e instalación de pendones informativos (Zona desinfección herramienta, Zona lavado de manos, zona de toma de temperatura, Zona toma juramentada de no síntomas gripales o fiebras)	Unidad	3,00	100.000,00	\$ 300.000,00
Adecación espacios para vestier, para alimentación de trabajadores, y oficina syso 3x6 cerramiento en yute y guadua lecho techo en zinc	Unidad	1,00	510.000,00	\$ 510.000,00
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO ELEMENTOS PREVENCIÓN COVID 19				2.197.000,00
ADMINISTRACIÓN	24%			888.437,00
IMPREVISTOS	0%			
UTILIDAD	5%			185.091,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19%			35.167,00
COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO ELEMENTOS PREVENCIÓN COVID 19				3.305.695,00



 CONSORCIO CALDAS
 R.L. EDGAR ALONSO CASTRO-LIZARRALDE
 Contratista


 Nombre: LUIS FERNANDO ARIAS
 INGENIERO ZONA NORTE CENTRO,
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NP 7

SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.				
			UNIDAD	DÍAS TRABAJADOR
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Jabon antibacterial	Litro	0,02	12,412,00	\$ 248,24
Gej Antibacterial	Litro	0,01	15,000,00	\$ 120,00
Toalla de secado de manos	Unidad	5,00	100,00	\$ 500,00
Tapabocas 1 cada 3 horas, normalizados	Unidad	3,00	1,200,00	\$ 3.800,00
Viricida organico disuelto en agua al 5% para aspersión en trabajador, areas de trabajo y herramienta y equipos, y elementos de protección (gafas y casco)	galon	0,05	9.426,50	\$ 471,33
Papereria (Registro diario temperatura, declaración juramentada de no sintomas de gripe o manifestación de fiebre o relación con personas que presenta estos sintomas y todos la información acorde al protocolo establecido). Incluye volante informativo para cada trabajador lleve a su familia 3 volantesl.	gl	200,00	1,00	\$ 200,00
Bolsa para disposición de residuos	Unidad	0,25	150,00	\$ 37,50
Tiempo no productivo para lavado de manos, elaboración de encuesta, desifección de herramienta y recibo de charlas	hora	0,50	5.591,93	\$ 2.795,97
SUBTOTAL				7.973,00
ADMINISTRACIÓN	24%			1.914,00
IMPREVISTOS	0%			
UTILIDAD	5%			398,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19%			76,00
COSTO TOTAL				10.362,00


 CONSORCIO CALDAS
 R.L. EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE
 Contratista


 Nombre: LUIS FERNANDO ARIAS
 INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.


In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform business decisions.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the research and provides practical advice for implementing these findings in the business context.

100

100

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS -	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	
---	---	---

CONTRATO No. 201 del 2019	PRE-ACTA: 6
CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 04 DE 2019
INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS	FECHA TERMINACION: FEBRERO 28 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas FRENTE 3: Reposición red de alcantarillado calle 13 en carreras 8 y 9a y de la 7 a la 4 en el municipio de Chinchiná Caldas	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y replanteo de redes (incl. levantamiento del sector y plano record)	ML	124,2	138,30	262,50

FECHA	ABSCISA	LOCALIZACIÓN			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3		ML	ACUMULADO
				40,70				40,70	164,90	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6 entre camara 1 y 2
				45,20				45,20	210,10	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6 entre camara 2 y 3
				36,40				36,40	246,50	CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5 entre camaras 3 y 4
				7,50				7,50	254,00	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 A CAMARA 1
				8,50				8,50	262,50	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13
					CANTIDAD DE PAGO				138,30	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ML		159,10	159,10

FECHA	ABSCISA	CERRAMIENTO			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	lados	M3		ML	ACUMULADO
				159,10				159,10	159,10	90% REPOSICION CERRAMIENTO PERIMETRAL CALLE 13 CARRERA 7 A 5 MEDIA CUADRA
					CANTIDAD DE PAGO				159,10	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Señal preventiva y reglamentaria	UND	4	2,00	6,00

FECHA	ABSCISA	SEÑALIZACIÓN			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3		UND	ACUMULADO
								2,00	6,00	SEÑALES CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y 5
					CANTIDAD DE PAGO				2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Corte con disco abrasivo	ML	17,40	7,00	24,40

FECHA	ABSCISA	CORTE			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Cantidad	M3		ML	ACUMULADO
				3,50		2		7,00	24,40	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 A CAMARA 1
					CANTIDAD DE PAGO				7,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañales	M3		0,00	0,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3		ML	ACUMULADO
					CANTIDAD DE PAGO				0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	En material común de 0 a 2m	M3	234,46	527,58	762,04

FECHA	ABSCISA	DEMOLICION			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3		ML	ACUMULADO
				40,70	1,10	2,00	89,54		324,00	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6 entre camara 1 y 2
				45,20	1,10	2,00	99,61		423,61	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6 entre camara 2 y 3
				36,40	1,55	2,00	113,03		536,63	CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5 entre camaras 3 y 4
				2,01	1,00	2,00	4,02		540,65	Camara 1 (a 7 calle 3
				2,01	1,00	2,00	4,02		544,67	Camara 2 intermedia entre cia 7 y 6
				2,01	1,00	2,00	4,02		548,69	Camara 4 intermedia entre cia 6 y 5
				4,30	1,70	2,00	14,62		563,31	DERRUMBE 1
				3,80	1,93	2,00	14,67		577,98	DERRUMBE 2
				5,30	0,60	1,76	5,58		583,56	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen derecha Cr 7 12 - 48
				5,30	0,60	1,76	5,58		589,14	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen derecha c1 13 6-61, 6-63, 6-65, 6-67
				5,30	0,60	1,76	5,58		594,72	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen derecha C1 13 6-51, 6-57
				5,30	0,60	1,76	5,58		600,31	DOMICILIARIA4 entre c1 y c2 Margen derecha C1 13 6-45
				5,30	0,60	1,76	5,58		605,89	DOMICILIARIA5 entre c1 y c2 Margen derecha C1 13 6-41
				13,50	0,60	1,71	13,81		619,70	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen izquierda ESTACION
				13,50	0,60	1,40	11,34		631,04	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen izquierda ESTACION
				9,50	0,60	1,40	7,98		639,02	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen izquierda ESTACION
				0,70	0,70	1,30	0,64		639,65	CAJA DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen derecha
				0,70	0,70	1,30	0,64		640,29	CAJA DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen derecha
				0,70	0,70	1,30	0,64		640,93	CAJA DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen derecha
				0,70	0,70	1,30	0,64		641,57	CAJA DOMICILIARIA4 entre c1 y c2 Margen derecha
				0,70	0,70	1,30	0,64		642,20	CAJA DOMICILIARIA5 entre c1 y c2 Margen derecha
				0,70	0,70	1,20	0,59		642,79	CAJA DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen izquierda
				0,70	0,70	1,40	0,69		643,48	CAJA DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen izquierda
				0,70	0,70	1,40	0,69		644,16	CAJA DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen izquierda



CONTRATO No: 201 del 2019 CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS OBJETO DEL CONTRATO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas	PRE-ACTA: 6 FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 04 DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: FEBRERO 28 DE 2020
--	---

FRENTE 3: Reposición red de alcantarillado calle 13 en carreras 0 y 9a y de la 7 a la 4 en el municipio de Chinchiná Caldas						
	4,20	0,60	1,98	4,99	649,15	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen derecha C1 13 6-15
	4,20	0,60	1,98	4,99	654,14	DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen derecha C1 13 6-21
	4,20	0,60	1,98	4,99	659,13	DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen derecha C1 13 6-17
	4,20	0,60	1,98	4,99	664,12	DOMICILIARIA4 entre c2 y c3 Margen derecha C1 13 6-12 DI
	4,20	0,60	1,98	4,99	680,92	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen Izquierda ESTACION
	15,30	0,60	1,83	16,80	681,56	CAJA DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen derecha
	0,70	0,70	1,30	0,64	682,19	CAJA DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen derecha
	0,70	0,70	1,30	0,64	682,83	CAJA DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen derecha
	0,70	0,70	1,30	0,64	683,47	CAJA DOMICILIARIA4 entre c2 y c3 Margen derecha
	0,70	0,70	1,30	0,64	683,96	CAJA DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen Izquierda
	0,70	0,70	1,00	0,49	691,14	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen Izquierda C1 13 5-71
	3,00	1,20	2,00	7,18	698,32	DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen Izquierda C1 13 5-63
	3,00	1,20	2,00	7,18	705,50	DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen Izquierda BOMBA
	3,00	1,20	2,00	7,18	713,52	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha SUPERMUPAS
	6,70	0,60	2,00	8,02	714,50	CAJA DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen Izquierda
	0,70	0,70	2,00	0,98	715,48	CAJA DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen Izquierda
	0,70	0,70	2,00	0,98	716,46	CAJA DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen Izquierda
	0,70	0,70	2,00	0,98	717,44	CAJA DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen derecha
	0,70	0,70	2,00	0,98	735,44	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 A CAMARA 1
	7,50	1,20	2,00	18,00	752,44	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13
	8,50	1,00	2,00	17,00	767,04	DOMICILIARIA CARRERA 7 12-71 ASADERO
	6,00	0,80	2,00	9,60		CANTIDAD DE PAGO
						527,58

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	En material común de 2,1 a 4m	M3	0	245,47	245,47

OBSERVACIONES									
[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]									
FECHA	ABSCISA		DEMOLICIÓN			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO
				40,70	1,10	0,21	9,40	9,40	
				45,20	1,10	0,66	32,82	42,22	
				36,40	1,55	2,49	140,49	182,70	
				2,01	1,00	1,00	2,01	184,71	
				2,01	1,00	0,57	1,15	185,86	Camara 2 intermedia entre cía 7 y 6
				2,01	1,00	2,61	5,25	191,10	Camara 4 intermedia entre cía 6 y 5
				4,30	1,70	2,00	14,62	205,72	DERRUMBE 1
				3,80	1,93	2,00	14,67	220,39	DERRUMBE 2
				3,00	1,20	0,85	3,06	223,45	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen Izquierda
				3,00	1,20	0,85	3,06	226,51	DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen Izquierda
				3,00	1,20	0,85	3,06	229,57	DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen Izquierda
				6,70	0,60	1,35	5,43	235,00	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha
				6,70	0,70	0,85	0,42	235,42	CAJA DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen Izquierda
				6,70	0,70	0,85	0,42	235,83	CAJA DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen Izquierda
				6,70	0,70	0,85	0,42	236,25	CAJA DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen Izquierda
				6,70	0,70	0,85	0,42	236,67	CAJA DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha
				7,50	1,20	0,60	5,40	242,07	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 A CAMARA 1
				8,50	1,00	0,40	3,40	245,47	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13
									CANTIDAD DE PAGO
									245,47

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Entibado horizontal Tipo I	ML	0	96,40	96,40

OBSERVACIONES									
[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]									
FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO
				30,00				30,00	30,00
				30,00				30,00	60,00
				36,40				36,40	96,40
									CANTIDAD DE PAGO
									96,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	M3	1,89	129,96	131,85

OBSERVACIONES									
[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]									
FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO
							96,10		96,10
							33,60		131,85
									CANTIDAD DE PAGO
									129,96

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Instalación e tubería PVC corrugada de 12"	ML	120,60	101,90	222,50

OBSERVACIONES									
[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]									
FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ML	TOTAL	
Dia	Mes	Inicial	Final	Long	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO
				40,70		12"		40,70	161,30
				45,20		12"		45,20	206,50
				7,50		12"		7,50	214,00
				8,50		12"		8,50	222,50
									CANTIDAD DE PAGO
									101,90

AS



CONTRATO No. 201 del 2019	PRE-ACTA : 6
CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 04 DE 2019
INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS	FECHA TERMINACION: FEBRERO 28 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas FRENTES 3: Reposición red de alcantarillado calle 13 en carreras 8 y 9a y de la 7 a la 4 en el municipio de Chinchiná Caldas	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																																																																																																																							
15	Instalación e tubería PVC corrugada de 16"	ML		0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UN</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>CANTIDAD</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CANTIDAD DE PAGO: 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO											CANTIDAD DE PAGO: 0,00																																																																																																																																																																																											
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																																																																																																		
Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																			
										CANTIDAD DE PAGO: 0,00																																																																																																																																																																																																																		
16	Instalación e tubería PVC corrugada de 24"	ML	0	36,40	36,40																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>ML</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,40</td> <td>36,40</td> <td>CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5 entre carreras 3 y 4 CANTIDAD DE PAGO: 36,40</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ML	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO					36,40				36,40	36,40	CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5 entre carreras 3 y 4 CANTIDAD DE PAGO: 36,40																																																																																																																																																																																											
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ML	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																																																																																																		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																			
				36,40				36,40	36,40	CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5 entre carreras 3 y 4 CANTIDAD DE PAGO: 36,40																																																																																																																																																																																																																		
17	Cámara de calda D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ML	3,55	9,77	13,32																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UN</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>LONG</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,8</td> <td>6,35</td> <td>CAMARA 1 CALLE 13 CARRERA 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,57</td> <td>8,92</td> <td>Camara 2 Intermedia entre cra 7 y 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,4</td> <td>13,32</td> <td>CAMARA 4 INTERMEDIA CRA 6 Y 5 CANTIDAD DE PAGO: 9,77</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	LONG	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO					2,8				2,8	6,35	CAMARA 1 CALLE 13 CARRERA 7					2,57				2,57	8,92	Camara 2 Intermedia entre cra 7 y 6					4,4				4,4	13,32	CAMARA 4 INTERMEDIA CRA 6 Y 5 CANTIDAD DE PAGO: 9,77																																																																																																																																																																					
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																																																																																																		
Día	Mes	Inicial	Final	LONG	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																			
				2,8				2,8	6,35	CAMARA 1 CALLE 13 CARRERA 7																																																																																																																																																																																																																		
				2,57				2,57	8,92	Camara 2 Intermedia entre cra 7 y 6																																																																																																																																																																																																																		
				4,4				4,4	13,32	CAMARA 4 INTERMEDIA CRA 6 Y 5 CANTIDAD DE PAGO: 9,77																																																																																																																																																																																																																		
18	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de Inspección en HD D=0.60cm tráfico pesado	UN		0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UN</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>CANTIDAD</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UN</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CANTIDAD DE PAGO: 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO											CANTIDAD DE PAGO: 0,00																																																																																																																																																																																											
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																																																																																																		
Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																			
										CANTIDAD DE PAGO: 0,00																																																																																																																																																																																																																		
19	Bases y Cañuelas	UN	3	3,00	6,00																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UN</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>CANTIDAD</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UN</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>CAMARA 1 CALLE 13 CARRERA 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>5</td> <td>Camara 2 Intermedia entre cra 7 y 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>6</td> <td>CAMARA 4 INTERMEDIA CRA 6 Y 5 CANTIDAD DE PAGO: 3,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO					1				1	4	CAMARA 1 CALLE 13 CARRERA 7					1				1	5	Camara 2 Intermedia entre cra 7 y 6					1				1	6	CAMARA 4 INTERMEDIA CRA 6 Y 5 CANTIDAD DE PAGO: 3,00																																																																																																																																																																					
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																																																																																																		
Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																			
				1				1	4	CAMARA 1 CALLE 13 CARRERA 7																																																																																																																																																																																																																		
				1				1	5	Camara 2 Intermedia entre cra 7 y 6																																																																																																																																																																																																																		
				1				1	6	CAMARA 4 INTERMEDIA CRA 6 Y 5 CANTIDAD DE PAGO: 3,00																																																																																																																																																																																																																		
20	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ML	90,1	129,70	219,80																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>LONG</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>96,1</td><td>DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>102,1</td><td>DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>108,1</td><td>DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>114,1</td><td>DOMICILIARIA4 entre c1 y c2 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>120,1</td><td>DOMICILIARIA5 entre c1 y c2 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13,5</td><td></td><td></td><td></td><td>13,5</td><td>133,6</td><td>DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen Izquierda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13,5</td><td></td><td></td><td></td><td>13,5</td><td>147,1</td><td>DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen Izquierda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,5</td><td></td><td></td><td></td><td>9,5</td><td>156,6</td><td>DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen Izquierda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td>161,3</td><td>DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td>166</td><td>DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td>170,7</td><td>DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td></td><td></td><td></td><td>4,7</td><td>175,4</td><td>DOMICILIARIA4 entre c2 y c3 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15,8</td><td></td><td></td><td></td><td>15,8</td><td>191,2</td><td>DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen Izquierda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,3</td><td></td><td></td><td></td><td>5,3</td><td>196,5</td><td>DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen Izquierda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,3</td><td></td><td></td><td></td><td>5,3</td><td>201,8</td><td>DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen Izquierda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,3</td><td></td><td></td><td></td><td>5,3</td><td>207,1</td><td>DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen Izquierda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,7</td><td></td><td></td><td></td><td>6,7</td><td>213,8</td><td>DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>219,8</td><td>DOMICILIARIA CARRERA 7 No 12-71 ASADERO CANTIDAD DE PAGO: 129,70</td></tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONG	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO					6				6	96,1	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen derecha					6				6	102,1	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen derecha					6				6	108,1	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen derecha					6				6	114,1	DOMICILIARIA4 entre c1 y c2 Margen derecha					6				6	120,1	DOMICILIARIA5 entre c1 y c2 Margen derecha					13,5				13,5	133,6	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen Izquierda					13,5				13,5	147,1	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen Izquierda					9,5				9,5	156,6	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen Izquierda					4,7				4,7	161,3	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen derecha					4,7				4,7	166	DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen derecha					4,7				4,7	170,7	DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen derecha					4,7				4,7	175,4	DOMICILIARIA4 entre c2 y c3 Margen derecha					15,8				15,8	191,2	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen Izquierda					5,3				5,3	196,5	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen Izquierda					5,3				5,3	201,8	DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen Izquierda					5,3				5,3	207,1	DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen Izquierda					6,7				6,7	213,8	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha					6				6	219,8	DOMICILIARIA CARRERA 7 No 12-71 ASADERO CANTIDAD DE PAGO: 129,70
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONG	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																																																																																																		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																			
				6				6	96,1	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				6				6	102,1	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				6				6	108,1	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				6				6	114,1	DOMICILIARIA4 entre c1 y c2 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				6				6	120,1	DOMICILIARIA5 entre c1 y c2 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				13,5				13,5	133,6	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen Izquierda																																																																																																																																																																																																																		
				13,5				13,5	147,1	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen Izquierda																																																																																																																																																																																																																		
				9,5				9,5	156,6	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen Izquierda																																																																																																																																																																																																																		
				4,7				4,7	161,3	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				4,7				4,7	166	DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				4,7				4,7	170,7	DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				4,7				4,7	175,4	DOMICILIARIA4 entre c2 y c3 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				15,8				15,8	191,2	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen Izquierda																																																																																																																																																																																																																		
				5,3				5,3	196,5	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen Izquierda																																																																																																																																																																																																																		
				5,3				5,3	201,8	DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen Izquierda																																																																																																																																																																																																																		
				5,3				5,3	207,1	DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen Izquierda																																																																																																																																																																																																																		
				6,7				6,7	213,8	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha																																																																																																																																																																																																																		
				6				6	219,8	DOMICILIARIA CARRERA 7 No 12-71 ASADERO CANTIDAD DE PAGO: 129,70																																																																																																																																																																																																																		

CONTRATO No. 201 del 2019 CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS OBJETO DEL CONTRATO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas	PRE-ACTA : 6 FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 04 DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: FEBRERO 28 DE 2020
--	--

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
21	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto	ML	18	17,00	35,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	Ancho	Alto	M3	CANTI	ACUMULADO	
				1				1	19	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	20	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	21	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	22	DOMICILIARIA4 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	23	DOMICILIARIA5 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	24	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen izquierda
				1				1	25	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen izquierda
				1				1	26	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen izquierda
				1				1	27	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	28	DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	29	DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	30	DOMICILIARIA4 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	31	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen izquierda
				1				1	32	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	33	DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	34	DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	35	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha
CANTIDAD DE PAGO										17,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
22	Instalación de silleteras de 12"x6"	UN	18	11,00	29,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				1				1	19	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	20	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	21	DOMICILIARIA4 entre c1 y c2 Margen derecha
				1				1	22	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen izquierda
				1				1	23	DOMICILIARIA2 entre c1 y c2 Margen izquierda
				1				1	24	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	25	DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	26	DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	27	DOMICILIARIA4 entre c2 y c3 Margen derecha
				1				1	28	DOMICILIARIA1 entre c2 y c3 Margen izquierda
				1				1	29	DOMICILIARIA2 entre c2 y c3 Margen izquierda
				1				1	30	DOMICILIARIA3 entre c2 y c3 Margen izquierda
				1				1	31	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	32	DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	33	DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	34	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha
CANTIDAD DE PAGO										11,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
23	Instalación de silleteras de 16"x6"	UN		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
24	Instalación de silleteras de 24"x6"	UND	0	4,00	4,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				1				1	1	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	2	DOMICILIARIA2 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	3	DOMICILIARIA3 entre c3 y c4 Margen izquierda
				1				1	4	DOMICILIARIA1 entre c3 y c4 Margen derecha
CANTIDAD DE PAGO										4,00


ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
25	Empalme a cámara	UND	3	9,00	12,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	UNIDAD	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				1,0				1,0	4,0	DOMICILIARIA1 entre c1 y c2 Margen derecha
				1,0				1,0	5,0	DOMICILIARIA5 entre c1 y c2 Margen derecha
				1,0				1,0	6,0	DOMICILIARIA3 entre c1 y c2 Margen izquierda
				1,0				1,0	7,0	CAMARA CALLE 13 CR 7
				1,0				1,0	8,0	CAMARA CALLE 13 CR 6
				2,0				2,0	10,0	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 A CAMARA 1
				1,0				1,0	11,0	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13
				1,0				1,0	12,0	DOMICILIARIA CR 7 No 12-71 ASADERO
CANTIDAD DE PAGO										9,00



CONTRATO No. 201 del 2019	PRE-ACTA: 6
CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS	FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 04 DE 2019
INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS	FECHA TERMINACIÓN: FEBRERO 28 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas FRETE 3: Reposición red de alcantarillado calle 13 en carreras 8 y 8a y de la 7 a la 4 en el municipio de Chinchiná Caldas	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																			
27	Arena para base y atraque	M3	17,23	69,13	96,36																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85,60</td> <td>1,10</td> <td>0,48</td> <td>45,72</td> <td></td> <td>72,55</td> <td rowspan="2">CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85,60</td> <td>0,80</td> <td>0,15</td> <td>10,40</td> <td></td> <td>81,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,40</td> <td>1,10</td> <td>0,15</td> <td>6,01</td> <td></td> <td>89,45</td> <td rowspan="2">CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,40</td> <td>0,49</td> <td>0,15</td> <td>2,68</td> <td></td> <td>92,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,50</td> <td>1,20</td> <td>0,10</td> <td>0,90</td> <td></td> <td>93,01</td> <td rowspan="2">EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 CON CAMARA 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,50</td> <td>0,90</td> <td>0,15</td> <td>1,02</td> <td></td> <td>94,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,50</td> <td>1,10</td> <td>0,15</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>95,46</td> <td rowspan="2">CRUCE CARRERA 7 CALLE 13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,50</td> <td>0,70</td> <td>0,15</td> <td>0,90</td> <td></td> <td>96,36</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>69,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO					85,60	1,10	0,48	45,72		72,55	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6					85,60	0,80	0,15	10,40		81,45					36,40	1,10	0,15	6,01		89,45	CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5					36,40	0,49	0,15	2,68		92,11					7,50	1,20	0,10	0,90		93,01	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 CON CAMARA 1					7,50	0,90	0,15	1,02		94,06					8,50	1,10	0,15	1,40		95,46	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13					8,50	0,70	0,15	0,90		96,36						CANTIDAD DE PAGO				69,13				
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																															
				85,60	1,10	0,48	45,72		72,55	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6																																																																																																														
				85,60	0,80	0,15	10,40		81,45																																																																																																															
				36,40	1,10	0,15	6,01		89,45	CALLE 13 CARRERA 6 A CARRERA 5																																																																																																														
				36,40	0,49	0,15	2,68		92,11																																																																																																															
				7,50	1,20	0,10	0,90		93,01	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 CON CAMARA 1																																																																																																														
				7,50	0,90	0,15	1,02		94,06																																																																																																															
				8,50	1,10	0,15	1,40		95,46	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13																																																																																																														
				8,50	0,70	0,15	0,90		96,36																																																																																																															
					CANTIDAD DE PAGO				69,13																																																																																																															
28	Lleno compactado con material de la obra	M3	207,95	654,15	862,11																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UND</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>669,36</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>669,36</td> <td></td> <td>904,54</td> <td rowspan="2">CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 5 entre camara 1 y 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,50</td> <td>1,20</td> <td>2,80</td> <td>25,20</td> <td></td> <td>929,74</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,50</td> <td>DIAMETRO:</td> <td>12"</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>929,19</td> <td rowspan="2">EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 CON CAMARA 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,50</td> <td>1,00</td> <td>2,40</td> <td>20,40</td> <td></td> <td>949,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,50</td> <td>DIAMETRO:</td> <td>12"</td> <td>0,62</td> <td></td> <td>948,97</td> <td rowspan="2">CRUCE CARRERA 7 CALLE 13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td>0,80</td> <td>2,00</td> <td>9,60</td> <td></td> <td>958,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td>DIAMETRO:</td> <td>6"</td> <td>-0,11</td> <td></td> <td>958,46</td> <td rowspan="2">DOMICILIARIA CARRERA 7 No 12-71 ASADERO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-96,36</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>-96,36</td> <td></td> <td>862,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>654,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO					669,36	1,00	1,00	669,36		904,54	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 5 entre camara 1 y 4					7,50	1,20	2,80	25,20		929,74					7,50	DIAMETRO:	12"	0,55		929,19	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 CON CAMARA 1					8,50	1,00	2,40	20,40		949,59					8,50	DIAMETRO:	12"	0,62		948,97	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13					6,00	0,80	2,00	9,60		958,57					6,00	DIAMETRO:	6"	-0,11		958,46	DOMICILIARIA CARRERA 7 No 12-71 ASADERO					-96,36	1,00	1,00	-96,36		862,11						CANTIDAD DE PAGO				654,15				
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO																																																																																																															
				669,36	1,00	1,00	669,36		904,54	CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 5 entre camara 1 y 4																																																																																																														
				7,50	1,20	2,80	25,20		929,74																																																																																																															
				7,50	DIAMETRO:	12"	0,55		929,19	EMPALME CAMARA CARRERA 7 CALLE 13 CON CAMARA 1																																																																																																														
				8,50	1,00	2,40	20,40		949,59																																																																																																															
				8,50	DIAMETRO:	12"	0,62		948,97	CRUCE CARRERA 7 CALLE 13																																																																																																														
				6,00	0,80	2,00	9,60		958,57																																																																																																															
				6,00	DIAMETRO:	6"	-0,11		958,46	DOMICILIARIA CARRERA 7 No 12-71 ASADERO																																																																																																														
				-96,36	1,00	1,00	-96,36		862,11																																																																																																															
					CANTIDAD DE PAGO				654,15																																																																																																															
29	Sub base para pavimento	M3		0,00	0,00																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UND</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO						CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																								
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO																																																																																																															
					CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																																															
31	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	M3		0,00	0,00																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UND</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO						CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																								
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO																																																																																																															
					CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																																															
32	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	M3		0,00	0,00																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UND</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO						CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																								
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO																																																																																																															
					CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																																															
34	Acero de refuerzo para graderías	M3		0,00	0,00																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UND</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO						CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																								
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO																																																																																																															
					CANTIDAD DE PAGO				0,00																																																																																																															
36	Demolicion de pavimento rigidlo (FRETE 14 CRA 10 CLL 18 Y 19)	M3		0,84	0,84																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UND</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,50</td> <td>1,20</td> <td>0,20</td> <td>0,84</td> <td></td> <td>0,84</td> <td>EMPALME CAMARA CALLE 13 CARRERA 7 CON CAMARA 1</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>0,84</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO					3,50	1,20	0,20	0,84		0,84	EMPALME CAMARA CALLE 13 CARRERA 7 CON CAMARA 1						CANTIDAD DE PAGO				0,84																																																																													
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO																																																																																																															
				3,50	1,20	0,20	0,84		0,84	EMPALME CAMARA CALLE 13 CARRERA 7 CON CAMARA 1																																																																																																														
					CANTIDAD DE PAGO				0,84																																																																																																															
37	Acompañamiento social durante la Obra	MES		0	1,00	1,00																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>MES</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>MES</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>4 DE MAYO A 4 DE JUNIO</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	MES	Ancho	Alto	M3	MES	ACUMULADO					1,00				1,00	1,00	4 DE MAYO A 4 DE JUNIO						CANTIDAD DE PAGO				1,00																																																																													
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	MES	Ancho	Alto	M3	MES	ACUMULADO																																																																																																															
				1,00				1,00	1,00	4 DE MAYO A 4 DE JUNIO																																																																																																														
					CANTIDAD DE PAGO				1,00																																																																																																															



CONTRATO No. 201 del 2019	PRE-ACTA: 6
CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS	FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 04 DE 2019
INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS	FECHA TERMINACIÓN: FEBRERO 28 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO: Reparación De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas FRENTE 3: Reparación red de alcantarillado calle 13 en carreras 8 y 9a y de la 7 a la 4 en el municipio de Chinchiná Caldas	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
39	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.50cm	UN	0	0,00	0,00

FECHA							ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	UN	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO					
														0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 3	Suministro transporte e instalación tubería PVC corrugada 12"	ML	0	0,00	0,00

FECHA							ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	LARGO	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO					
														0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 4	Suministro transporte e instalación de puente provisional en madera	ML	0	3,00	3,00

FECHA							ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	LARGO	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO					
				3,00					3,00				3,00	CALLE 13 CRA 7 A CRA 6	
											CANTIDAD DE PAGO		3,00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 5	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	MES	0	1,00	1,00

FECHA							ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	MES	Ancho	Alto	M3	MES	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO					
				1,00					1,00			1,00	4 DE MAYO A 4 DE JUNIO		
											CANTIDAD DE PAGO		1,00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 6	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	GLB	0	1,00	1,00

FECHA							ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	GLB	Ancho	Alto	M3	GLB	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO					
				1,00					1,00			1,00	4 DE MAYO A 4 DE JUNIO		
											CANTIDAD DE PAGO		1,00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 7	GASTO/TRABAJADOR POR SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, REGISTRO CONTROL Y TIEMPO DEDICADO A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19	PERSONA/DIA	0	250,00	250,00

FECHA				ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	PERSONAS	DIAS	Alto	M3	PERSONAS/DIA	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO			
				10,00	10,00			100,00	100,00	4 A 15 DE MAYO			
				3,00	1,00			3,00	103,00	16 A 30 DE MAYO			
				9,00	13,00			117,00	220,00	1 A 6 DE JUNIO			
				5,00	6,00			30,00	250,00				
											CANTIDAD DE PAGO		250,00

 CONTRATISTA	 SUPERVISOR
--	--



CONTRATO No: 201 del 2019 CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS OBJETO DEL CONTRATO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas	PRE-ACTA: 6 FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 04 DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: JULIO 18 DE 2020
--	---

FRENTE 4: Cambio red acueducto calle 13 en carreras 8 y 9 y 4 a la 7 en el municipio de Chinchiná Caldas

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																																										
2	Localización y replanteo (Incluya plano record)										ML	225,10	156,50	381,60																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">LOCALIZACIÓN</th> <th>VOLUMEN</th> <th>LONGITUD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>137,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>137,00</td> <td>362,10</td> <td>REPLANTEO CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6 Y CARRERA 6 A CARRERA 5 (MEDIA CUADRA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,50</td> <td>368,60</td> <td>CRUCE CALLE 13 CON CARRERA 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,00</td> <td>381,60</td> <td>CRUCE CALLE 13 CON CARRERA 6</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>156,50</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		LOCALIZACIÓN			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO					137,00				137,00	362,10	REPLANTEO CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6 Y CARRERA 6 A CARRERA 5 (MEDIA CUADRA)					6,50				6,50	368,60	CRUCE CALLE 13 CON CARRERA 7					13,00				13,00	381,60	CRUCE CALLE 13 CON CARRERA 6	CANTIDAD DE PAGO													156,50																																																																										
FECHA		ABSCISA		LOCALIZACIÓN			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																															
				137,00				137,00	362,10	REPLANTEO CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6 Y CARRERA 6 A CARRERA 5 (MEDIA CUADRA)																																																																																																																																														
				6,50				6,50	368,60	CRUCE CALLE 13 CON CARRERA 7																																																																																																																																														
				13,00				13,00	381,60	CRUCE CALLE 13 CON CARRERA 6																																																																																																																																														
CANTIDAD DE PAGO													156,50																																																																																																																																											
3	Señal preventiva y reglamentaria										UND	6	0,00	6,00																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">SEÑALIZACIÓN</th> <th>VOLUMEN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UND</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		SEÑALIZACIÓN			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO													0,00																																																																																																											
FECHA		ABSCISA		SEÑALIZACIÓN			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO																																																																																																																																															
CANTIDAD DE PAGO													0,00																																																																																																																																											
5	Corte con disco abrasivo										ML	4,6	0,00	4,60																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">CORTE</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Cantidad</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		CORTE			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Cantidad	M3	ML	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO													0,00																																																																																																											
FECHA		ABSCISA		CORTE			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Cantidad	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																															
CANTIDAD DE PAGO													0,00																																																																																																																																											
6	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañueles										M3		0,00	0,00																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>AREA</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>M2</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	CANTIDAD DE PAGO													0,00																																																																																																											
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO																																																																																																																																															
CANTIDAD DE PAGO													0,00																																																																																																																																											
8	En material común de 0 a 2m										M3	130,55	106,99	237,54																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DEMOLICIÓN</th> <th>VOLUMEN</th> <th>LONGITUD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">CARRERA 5 (MEDIA CUADRA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>137,00</td> <td>0,60</td> <td>0,80</td> <td>65,76</td> <td></td> <td>196,31</td> <td>RED CL 13 CRA 7 A 5 (MEDIA CUADRA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,50</td> <td>0,60</td> <td>1,10</td> <td>4,29</td> <td></td> <td>200,60</td> <td>CRUCE CALLE 13 CARRERA 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,00</td> <td>0,60</td> <td>1,20</td> <td>9,36</td> <td></td> <td>209,96</td> <td>CRUCE EN CALLE 13 CARRERA 7 EXCAVACION PERDIDA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,00</td> <td>0,60</td> <td>1,10</td> <td>8,58</td> <td></td> <td>218,54</td> <td>CRUCE CALLE 13 CARRERA 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,50</td> <td>0,50</td> <td>0,80</td> <td>7,00</td> <td></td> <td>225,54</td> <td>DOMICILIARIAS CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30,00</td> <td>0,50</td> <td>0,80</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>237,54</td> <td>DOMICILIARIAS CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>106,99</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		DEMOLICIÓN			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	CARRERA 5 (MEDIA CUADRA)														137,00	0,60	0,80	65,76		196,31	RED CL 13 CRA 7 A 5 (MEDIA CUADRA)					6,50	0,60	1,10	4,29		200,60	CRUCE CALLE 13 CARRERA 7					13,00	0,60	1,20	9,36		209,96	CRUCE EN CALLE 13 CARRERA 7 EXCAVACION PERDIDA					13,00	0,60	1,10	8,58		218,54	CRUCE CALLE 13 CARRERA 6					17,50	0,50	0,80	7,00		225,54	DOMICILIARIAS CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6					30,00	0,50	0,80	12,00		237,54	DOMICILIARIAS CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6	CANTIDAD DE PAGO													106,99																															
FECHA		ABSCISA		DEMOLICIÓN			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																															
CARRERA 5 (MEDIA CUADRA)																																																																																																																																																								
				137,00	0,60	0,80	65,76		196,31	RED CL 13 CRA 7 A 5 (MEDIA CUADRA)																																																																																																																																														
				6,50	0,60	1,10	4,29		200,60	CRUCE CALLE 13 CARRERA 7																																																																																																																																														
				13,00	0,60	1,20	9,36		209,96	CRUCE EN CALLE 13 CARRERA 7 EXCAVACION PERDIDA																																																																																																																																														
				13,00	0,60	1,10	8,58		218,54	CRUCE CALLE 13 CARRERA 6																																																																																																																																														
				17,50	0,50	0,80	7,00		225,54	DOMICILIARIAS CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6																																																																																																																																														
				30,00	0,50	0,80	12,00		237,54	DOMICILIARIAS CALLE 13 CARRERA 7 A CARRERA 6																																																																																																																																														
CANTIDAD DE PAGO													106,99																																																																																																																																											
9	Retiro de material sobrante en vehículo automotor										M3	0,17	22,71	22,88																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>AREA</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>M2</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> <td>22,71</td> <td></td> <td>22,88</td> <td>VOLUMEN BASE Y TRAQUE CON ARENA</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,71</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO								22,71		22,88	VOLUMEN BASE Y TRAQUE CON ARENA	CANTIDAD DE PAGO													22,71																																																																																																
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO																																																																																																																																															
							22,71		22,88	VOLUMEN BASE Y TRAQUE CON ARENA																																																																																																																																														
CANTIDAD DE PAGO													22,71																																																																																																																																											
11	Instalación de tubería PVC de 3"										ML	225,10	156,50	381,60																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>LONGITUD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>ML</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>137,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>137,00</td> <td>362,10</td> <td>RED CL 13 CRA 7 A 5 (MEDIA CUADRA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,50</td> <td>368,60</td> <td>CRUCE CALLE 13 CARRERA 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,00</td> <td>381,60</td> <td>CRUCE CALLE 13 CARRERA 6</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">CANTIDAD DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>156,50</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO					137,00				137,00	362,10	RED CL 13 CRA 7 A 5 (MEDIA CUADRA)					6,50				6,50	368,60	CRUCE CALLE 13 CARRERA 7					13,00				13,00	381,60	CRUCE CALLE 13 CARRERA 6	CANTIDAD DE PAGO													156,50																																																																										
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO																																																																																																																																															
				137,00				137,00	362,10	RED CL 13 CRA 7 A 5 (MEDIA CUADRA)																																																																																																																																														
				6,50				6,50	368,60	CRUCE CALLE 13 CARRERA 7																																																																																																																																														
				13,00				13,00	381,60	CRUCE CALLE 13 CARRERA 6																																																																																																																																														
CANTIDAD DE PAGO													156,50																																																																																																																																											
12	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor										UN	52	40,00	92,00																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">ABSCISA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th>VOLUMEN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>UN</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>M3</th> <th>UN</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td>55,00</td> <td>CARRERA 7 No 12 48 PANADERIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td>61,00</td> <td>CALLE 13 6-45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>63,00</td> <td>CALLE 13 6-57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>64,00</td> <td>CALLE 13 6-51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>66,00</td> <td>CALLE 13 6-49</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>67,00</td> <td>CALLE 13 6-45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>69,00</td> <td>CALLE 13 6-41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td>75,00</td> <td>CALLE 13 6-35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>76,00</td> <td>CALLE 13 6-21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>77,00</td> <td>CALLE 13 6-17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>78,00</td> <td>CALLE 13 6-12 D1</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	Día	Mes	Inicial	Final	UN	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO					3,00				3,00	55,00	CARRERA 7 No 12 48 PANADERIA					6,00				6,00	61,00	CALLE 13 6-45					2,00				2,00	63,00	CALLE 13 6-57					1,00				1,00	64,00	CALLE 13 6-51					2,00				2,00	66,00	CALLE 13 6-49					1,00				1,00	67,00	CALLE 13 6-45					2,00				2,00	69,00	CALLE 13 6-41					6,00				6,00	75,00	CALLE 13 6-35					1,00				1,00	76,00	CALLE 13 6-21					1,00				1,00	77,00	CALLE 13 6-17					1,00				1,00	78,00	CALLE 13 6-12 D1
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)																																																																																																																																														
Día	Mes	Inicial	Final	UN	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO																																																																																																																																															
				3,00				3,00	55,00	CARRERA 7 No 12 48 PANADERIA																																																																																																																																														
				6,00				6,00	61,00	CALLE 13 6-45																																																																																																																																														
				2,00				2,00	63,00	CALLE 13 6-57																																																																																																																																														
				1,00				1,00	64,00	CALLE 13 6-51																																																																																																																																														
				2,00				2,00	66,00	CALLE 13 6-49																																																																																																																																														
				1,00				1,00	67,00	CALLE 13 6-45																																																																																																																																														
				2,00				2,00	69,00	CALLE 13 6-41																																																																																																																																														
				6,00				6,00	75,00	CALLE 13 6-35																																																																																																																																														
				1,00				1,00	76,00	CALLE 13 6-21																																																																																																																																														
				1,00				1,00	77,00	CALLE 13 6-17																																																																																																																																														
				1,00				1,00	78,00	CALLE 13 6-12 D1																																																																																																																																														

CONTRATO No. 201 del 2019 CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO ARIAS	PRE-ACTA: 6 FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 04 DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: JULIO 18 DE 2020
--	---

OBJETO DEL CONTRATO: Reposición De Redes De Acueducto y Alcantarillado En El Municipio De Chinchina Caldas

FRENTE 4: Cambio red acueducto calle 13 en carreras 8 y 9 y 4 a la 7 en el municipio de Chinchina Caldas

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
24	Acero de refuerzo para gradofías	Kg		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
				3,50	0,60	0,20	0,42		0,59		

ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS DENTRO DEL CONTRATO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
25	Demolicion de pavimento rígido	M3	0,17	0,42	0,59

FECHA		ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
				3,50	0,60	0,20	0,42		0,59		

ITEMS NO PREVISTOS CON ACTA DE CONVENIO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
27	Suministro transporte e instalación caja hf y alineación medidores (incluye demoliciones y accesorios)	Un	0	55,00	55,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
				4				4,00	4,00	
				2				1,00	5,00	CALLE 13 9-25 CASA
				1				1,00	6,00	CALLE 13 9-23 CASA
				2				2,00	8,00	CALLE 13 9 TALLER
				1				1,00	9,00	CALLE 13 8-16 DROGUERIA
				2				2,00	11,00	CALLE 13 8-24 LOCAL PINTURAS
				1				1,00	12,00	CALLE 13 8-26 AUDIFARMA
				1				1,00	13,00	CALLE 13 8-32 FUNERARIA
				1				1,00	14,00	CALLE 13 8-52 PESEBRERA
				1				1,00	15,00	CALLE 13 8 BAR BOMBONERA
				1				1,00	16,00	CALLE 13 8-72 ESQUINA EMAS
				1				1,00	17,00	CALLE 13 8-71 RELIQUIAS
				1				1,00	18,00	CALLE 13 8-67 LOCAL
				2				2,00	20,00	CALLE 13 8-61 Y 8-63 LOCAL
				2				2,00	22,00	CALLE 13 8-57 Y 8-59 LOCAL Y CASA
				1				1,00	23,00	CALLE 13 8-27
				2				2,00	25,00	CALLE 13 7-71 APTO ESQUINA
				1				1,00	26,00	CALLE 13 7-47 CARNICERIA
				1				1,00	27,00	CALLE 13 7-35 GRAN CALDAS
				2				2,00	29,00	CALLE 13 7-33 CARNICERIA
				1				1,00	30,00	CALLE 13 7-25
				1				1,00	31,00	CALLE 13 7-03
				1				1,00	32,00	CARRERA 9 7-31 LOCAL 1
				1				1,00	33,00	CARRERA 9 7-15
				1				1,00	34,00	CARRERA 9 7-15 LOCAL
				1				1,00	35,00	CARRERA 9 7-27
				1				1,00	36,00	CARRERA 9 7-31
				2				2,00	38,00	CARRERA 9 7-41
				1				1,00	39,00	CARRERA 9 7-45
				1				1,00	40,00	CARRERA 9 7-57
				1				1,00	41,00	CARRERA 9 7-65 SUSUERTE
				2				2,00	43,00	CARRERA 9 7-69
				2				2,00	45,00	CARRERA 9 7-77
				1				1,00	46,00	CARRERA 9 7-72
				1				1,00	47,00	CARRERA 9 7-42
				1				1,00	48,00	CARRERA 9 7-32 LOCAL
				1				1,00	49,00	CARRERA 9 7-26
				1				1,00	50,00	CARRERA 9 7-22
				1				1,00	51,00	CARRERA 9 7-22 LOCAL
				1				1,00	52,00	CARRERA 9 7-14 PARQUEADERO
				1				1,00	53,00	CARRERA 9 7-10 ESQUINA
				1				1,00	54,00	
				1				1,00	55,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
27	Suministro, transporte e instalación tapa para agrupación de medidores, incluye concreto marco tapa y contramarco en ángulo de 2" x 3/16"	Un	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANTIDAD	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
				1				1,00	1,00	
				1				1,00	2,00	

CONTRATISTA
 SUPERVISOR
