

# CONTRATO Y AÑO	0201-2017	Acta Nº	02 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	280.590.020 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	0 ✓
CONTRATISTA	CONSORCIO M.I.			3. VALOR TOTAL (1+2)	280.590.020 ✓
NIT O CC:	901.122.086-5 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	184.662.910 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000199 del 16 de Enero de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	87.624.691 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000164 del 16 de Enero de 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	8.302.419 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR INTERCEPTOR LAGUNA-MATADERO CAMARAS C0-C8 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS) Y OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR INTERCEPTOR GUAYABITO K0+000 A K0+300 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO (CALDAS).				
TIPO DE RECURSOS	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSMV	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					
				✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).				X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.				X	
3- Pagos al FIC				X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.				✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.				✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20				✓	
8- Ensayos de densidad.					
9- Diseño de Mezclas.					
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.				✓	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					

Handwritten: Planilla P.C.

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Handwritten Signature: Juan Guisaoles-A
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Handwritten: 14/02/18
 FIRMA


DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta original	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Copia del Registro Presupuestal	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Supervisor Zona Occidente	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
Gerardo Antonio Ramirez Gomez	Supervisor Zona Centro	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
428581854	AHORROS	BOGOTÁ
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Planilla Integrada

EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
	Administradora	Días	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENIA	Valor Cotización SENIA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa AEN	Valor Cotización AEN	Especeado SENIA e ICBF
6.600	CONFAMILIARES	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.400	30	6,96%	5	\$ 51.400	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
4.600	CONFAMILIARES	25	\$ 615.000	4%	\$ 24.600	25	6,96%	5	\$ 42.900	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
3.000	CONFAMILIARES	22	\$ 586.167	4%	\$ 23.300	22	6,96%	5	\$ 40.900	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
4.800	CONFAMILIARES	4	\$ 94.400	4%	\$ 4.000	4	6,96%	5	\$ 6.900	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
1.900	CONFAMILIARES	12	\$ 795.200	4%	\$ 11.000	12	6,96%	5	\$ 20.600	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
1.700	CONFAMILIARES	22	\$ 541.200	4%	\$ 21.700	22	6,96%	5	\$ 37.700	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
1.000	CONFAMILIARES	1	\$ 24.000	4%	\$ 1.000	1	6,96%	5	\$ 3.000	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
4.000	CONFAMILIARES	25	\$ 615.000	4%	\$ 24.600	25	6,96%	5	\$ 42.900	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
4.000	CONFAMILIARES	25	\$ 615.000	4%	\$ 24.600	25	6,96%	5	\$ 42.900	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
2.700	CONFAMILIARES	25	\$ 245.800	4%	\$ 23.700	25	6,96%	5	\$ 39.400	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
1.000	CONFAMILIARES	1	\$ 24.000	4%	\$ 1.000	1	6,96%	5	\$ 3.000	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.600	CONFAMILIARES	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.400	30	6,96%	5	\$ 51.400	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
1.000	CONFAMILIARES	1	\$ 24.000	4%	\$ 1.000	1	6,96%	5	\$ 3.000	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.600	CONFAMILIARES	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.400	30	6,96%	5	\$ 51.400	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.800	CONFAMILIARES	10	\$ 748.000	4%	\$ 9.800	10	6,96%	5	\$ 17.200	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
4.000	CONFAMILIARES	25	\$ 615.000	4%	\$ 24.600	25	6,96%	5	\$ 42.900	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.700	CONFAMILIARES	30	\$ 693.000	4%	\$ 19.700	30	6,96%	5	\$ 34.300	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
4.000	CONFAMILIARES	25	\$ 615.000	4%	\$ 24.600	25	6,96%	5	\$ 42.900	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
1.000	CONFAMILIARES	3	\$ 73.800	4%	\$ 3.000	3	6,96%	5	\$ 5.200	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.700	CONFAMILIARES	20	\$ 692.000	4%	\$ 19.700	20	6,96%	5	\$ 34.300	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
5.000	CONFAMILIARES	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.400	30	6,96%	5	\$ 51.400	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.700	CONFAMILIARES	20	\$ 692.000	4%	\$ 19.700	20	6,96%	5	\$ 34.300	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.800	CONFAMILIARES	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.400	30	6,96%	5	\$ 51.400	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.700	CONFAMILIARES	20	\$ 692.000	4%	\$ 19.700	20	6,96%	5	\$ 34.300	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.700	CONFAMILIARES	20	\$ 692.000	4%	\$ 19.700	20	6,96%	5	\$ 34.300	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.900	CONFAMILIARES	10	\$ 746.000	4%	\$ 9.900	10	6,96%	5	\$ 17.200	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	SI
9.100					\$ 925.100				\$ 833.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	0%	0%	\$ 0



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901122086	5	CONSORCIO AL B - MENOS DE 200 COLIZANTES	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	PRINCIPAL	carrera 24 # 22-36 011 501	MANIZALES-CALDAS	8601501	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2017-12	2018-01	75-21193	6475-21193	E	2018/01/22	2018/01/29	BANCO AV VILLAS		\$3,726,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$1,913,400	\$0	\$1,924,200		
COLEFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$575,000	\$0	\$578,200		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$271,100	\$0	\$272,700		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$665,700	\$0	\$669,400		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$401,600	\$0	\$403,900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$833,500	\$0	\$838,200		
ARP SURTA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	26	\$833,500	\$0	\$838,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$479,100	\$0	\$481,800		
CONFAMILIARES	CCF11	800,806,490	5	26	\$479,100	\$0	\$481,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	\$479,100	\$0	\$482,200		
ASWET SALUD	ESSC62	817,000,248	3	3	\$45,400	\$0	\$45,700		
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$108,300	\$0	\$109,000		
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	10	\$188,200	\$0	\$189,300		
NUOVA EPS	EPS037	900,156,264	2	5	\$90,800	\$0	\$91,400		
SALUD TOTAL	EP-9002	800,130,907	4	2	\$21,800	\$0	\$22,000		
SALUDVIA S.A. EPS MOVILIDAD	EP-SC33	830,074,184	5	1	\$24,600	\$0	\$24,800		
TOTAL				26	\$3,705,100	\$0	\$3,726,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 90040010	1	INCILIPRO SAS	C - IMPAYMES	INCILIPRO	cra 36a995b-56	8747447	SI
CITY		CITY		CITY		CITY	
MANIZALES-CAJALAS		MANIZALES-CAJALAS		MANIZALES-CAJALAS		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2017-12	2018-01	E	2018/01/04	2018/01/09		\$1,036,400
Salud	Pago	Plantilla	Limite	Banco		
2017-12	306398623	8474820004	2018/01/04	BANCOLOMBIA		


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte		
1	CC 20304460	ARIAS QUIJANA LEIANA MARIA	25-14	16	\$1,333,334	\$213,400	EP5016	16	\$53,400	CCF11	16	\$1,333,334	\$53,400	14-28	16	\$1,333,334	\$72,900	16	\$1,333,334	50					
2	CC 75905862	ARNE RAMIREZ VICTOR HILSO	230201	16	\$853,334	\$136,600	EP5002	16	\$34,200	CCF11	16	\$853,334	\$34,200	14-28	16	\$853,334	\$59,400	16	\$853,334	50					
3	CC 16137761	ARROYAVE MARIN JOSE NORBERT	230201	3	\$160,000	\$25,600	EP5004	3	\$6,400	CCF11	3	\$160,000	\$6,400	14-28	3	\$160,000	\$11,200	3	\$160,000	50					
4	CC 4329332	BENOVA ZULETA CARLOS ALBERTO	25-14	16	\$393,600	\$63,000	EP5002	16	\$15,800	CCF11	16	\$393,600	\$15,800	14-28	16	\$393,600	\$27,400	16	\$393,600	50					
5	CC 5861879	CARDONA MONTOYA ERNESTO ANICIBAR	230201	16	\$393,600	\$63,000	EP5002	16	\$15,800	CCF11	16	\$393,600	\$15,800	14-28	16	\$393,600	\$27,400	16	\$393,600	50					
6	CC 10269705	GASTROZARANTA JOSE INOLFR	25-14	16	\$853,334	\$136,600	EP5002	16	\$34,200	CCF11	16	\$853,334	\$34,200	14-28	16	\$853,334	\$59,400	16	\$853,334	50					
7	CC 105376590	CATAÑO NUÑOZ JULIAN ANDRES	231001	3	\$160,000	\$26,800	EP5002	3	\$6,400	CCF11	3	\$160,000	\$6,400	14-28	3	\$160,000	\$11,200	3	\$160,000	50					
8	CC 16076683	CORREA TRON FREDY	25-14	16	\$393,600	\$63,000	EP5002	16	\$15,800	CCF11	16	\$393,600	\$15,800	14-28	16	\$393,600	\$27,400	16	\$393,600	50					
9	CC 30239378	DUQUE SALAZAR MARIA EMMA	230201	16	\$640,000	\$107,400	EP5016	16	\$25,600	CCF11	16	\$640,000	\$25,600	14-28	16	\$640,000	\$44,800	16	\$640,000	50					
10	CC 4419815	GATTAN MORALES JHONY ANDRES	25-14	3	\$100,000	\$16,000	EP5016	3	\$4,000	CCF11	3	\$100,000	\$4,000	14-28	3	\$100,000	\$7,000	3	\$100,000	50					
11	CC 10234167	GOMEZ GILBERTO FREDY	230201	16	\$393,600	\$63,000	EP5002	16	\$15,800	CCF11	16	\$393,600	\$15,800	14-28	16	\$393,600	\$27,400	16	\$393,600	50					
12	CC 102023814	GOMEZ SOTO NELSON DAVID	230201	16	\$393,600	\$63,000	EP5002	16	\$15,800	CCF11	16	\$393,600	\$15,800	14-28	16	\$393,600	\$27,400	16	\$393,600	50					
13	CC 105373912	HERNANDEZ ANDRES ALBERTO	230201	7	\$172,200	\$27,400	EP5010	7	\$6,900	CCF11	7	\$172,200	\$6,900	14-28	7	\$172,200	\$12,000	7	\$172,200	50					
14	CC 102381703	HERNANDEZ MORALES CARLOS EDUARDO	231001	16	\$393,600	\$63,000	EP5002	16	\$15,800	CCF11	16	\$393,600	\$15,800	14-28	16	\$393,600	\$27,400	16	\$393,600	50					
15	CC 102664829	LOMBARDI VILLEGAS CARLOS ALBERTO	230201	16	\$1,066,667	\$170,700	EP5002	16	\$42,700	CCF11	16	\$1,066,667	\$42,700	14-28	16	\$1,066,667	\$74,300	16	\$1,066,667	50					
16	CC 16071800	LONDOÑO LOPEZ FABIO NELSON	231001	16	\$853,334	\$136,600	EP5017	16	\$34,200	CCF11	16	\$853,334	\$34,200	14-28	16	\$853,334	\$59,400	16	\$853,334	50					
17	CC 16077802	MERA VALLEJO CRISTIAN CAMILO	230201	16	\$640,000	\$107,400	EP5016	16	\$25,600	CCF11	16	\$640,000	\$25,600	14-28	16	\$640,000	\$44,800	16	\$640,000	50					
18	CC 15938354	MORALES REYES HENALDO	231001	16	\$393,600	\$63,000	EP5002	16	\$15,800	CCF11	16	\$393,600	\$15,800	14-28	16	\$393,600	\$27,400	16	\$393,600	50					
19	CC 106134829	OSORIO HEJAO ALBERTO	LUR-230201	7	\$172,200	\$27,400	EP5016	7	\$6,900	CCF11	7	\$172,200	\$6,900	14-28	7	\$172,200	\$12,000	7	\$172,200	50					
20	CC 10257225	QUINTERO GARCÓN LUIS ALBERTO	25-14	2	\$49,200	\$7,900	EP5002	2	\$2,000	CCF11	2	\$49,200	\$2,000	14-28	2	\$49,200	\$3,300	2	\$49,200	50					
Total		Afiliados(20)			\$9,808,653	\$1,570,000			\$393,100			\$9,808,653	\$377,400			\$9,808,653	\$683,300		\$9,808,653						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 16077530		PATRINO TORRES ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 195CL 22-79	MANIZALES-CALDAS	8801501	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2017-12	299315576	8473110719			1	2017/11/13	2017/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	\$228,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
1	CC 16077530	PATRINO TORRES ALEXANDER	231001	30	\$800,000	\$128,000	EPS005	30	\$800,000	\$100,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0			
Total	Afiliados(1)				\$800,000	\$128,000			\$800,000	\$100,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$128,000	\$0	\$128,000		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$128,000	\$0	\$128,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100,000	\$0	\$100,000		
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$100,000	\$0	\$100,000		
TOTAL				1	\$228,000	\$0	\$228,000		

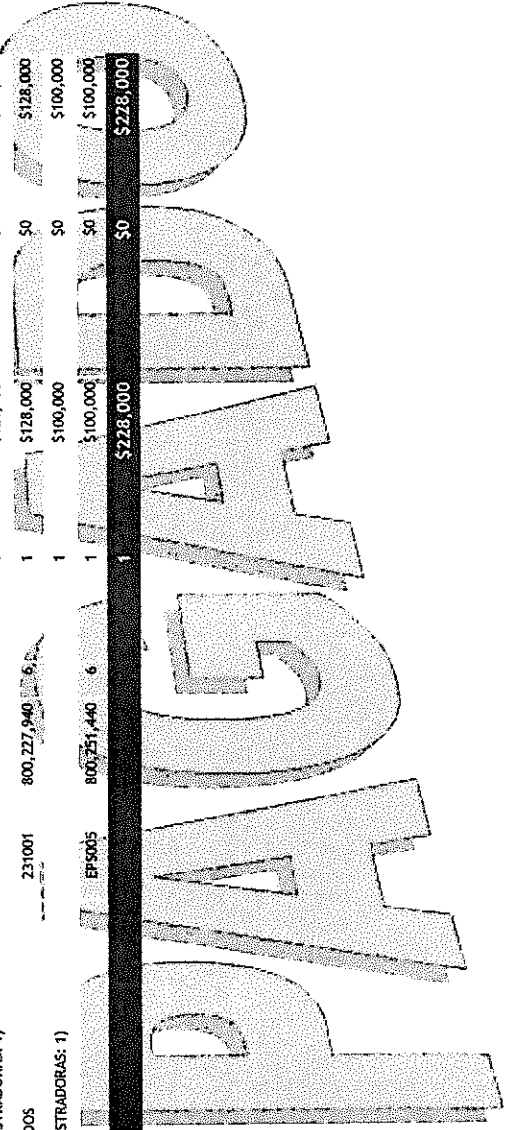

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$1,570,000	\$0	\$1,576,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$288,200	\$0	\$289,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$499,900	\$0	\$501,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$399,100	\$0	\$400,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$382,800	\$0	\$384,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$683,300	\$0	\$686,100
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	20	\$683,300	\$0	\$686,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$377,400	\$0	\$378,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	20	\$377,400	\$0	\$378,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	\$393,100	\$0	\$395,000
ASMET SALUD	ESSC62	817,000,248	3	1	\$34,200	\$0	\$34,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$115,500	\$0	\$116,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$6,900	\$0	\$7,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$6,400	\$0	\$6,500
NUOVA EPS	EP-037	900,156,264	2	1	\$34,200	\$0	\$34,400
SALUD TOTAL	EP-002	800,130,907	4	11	\$195,900	\$0	\$196,700
TOTAL				20	\$3,023,800	\$0	\$3,036,400



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dr	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		carretera 24 # 22-36 011 501		MANIZALES-CALDAS		8801501		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dis. Mora			53.726.400			
2017-12	2016-01	75421193	8475421193	E	2018/01/22	2018/01/29	BANCO AV VILLAS								

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO															HOVEDADES																												
No.	Tip	Id	No Id	Nombre	Apellido	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Excent. Emp. en el Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Idc-tax	Idc-tap	Idc-vsp	Fecha Inicio con ret. In	Fecha Inicio sin	Fecha Fin Ige	Fecha Fin Ima	Fecha Inicio vac-if	Fecha Fin vac-if	Fecha Inicio vac-if	Fecha Fin vac-if	Tip																					
1	CC	4597749	ACERVEDO GIL JOHN JAIR	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/06	X	2017/12/06																																		
2	CC	106162419	AGUDELO CAROLINA OSCAR JAVIER	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/09	X	2017/12/09																																		
3	CC	13068556	ALVAREZ ZAPATA JOSE EDUARDO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/27	X	2017/12/27																																		
4	CC	75070194	ALFONSO CIRIO JESUS ANTONIO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/19	X	2017/12/19																																		
5	CC	114328370	ARIELA ARIAS HON JAINE	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/09	X	2017/12/09																																		
6	CC	91463240	ARROYAVE GARCIA JORGE IVAN	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/01	X	2017/12/01																																		
7	CC	1089744127	BETANCOURT ORTIZ EIDER ANTONIO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/06	X	2017/12/06																																		
8	CC	106162505	CARRILLO NOGALES CAROLINA ANDRES	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/06	X	2017/12/06																																		
9	CC	104162783	CARSONA MARCO STIVEN	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/08	X	2017/12/08																																		
10	CC	9911830	CORREA GOMEZ GABRIEL ANGEL	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/01	X	2017/12/01																																		
11	CC	9946871	FLORES ANDRICA ELVIS ALBERTO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/01	X	2017/12/01																																		
12	CC	9997746	GALILEO NESTRO JOAQUIN ANTONIO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
13	CC	11631294	GONZALEZ CLAUDIA ELIAS	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
14	CC	9844574	HERNANDEZ HELDER DE JESUS	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/01	X	2017/12/01																																		
15	CC	10315242	MARIN REINORA JOSE WILBER	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/21	X	2017/12/21																																		
16	CC	1339463	MARTINEZ CAROLINA ROBERTO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/06	X	2017/12/06																																		
17	CC	1641501	MURILANDA ZAPATA REGINA GONZALEZ	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/06	X	2017/12/06																																		
18	CC	4116277	MUSCATEL GONZALEZ JONATAN FREDY	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
19	CC	454994	NIETO GALLEGO CESAR AUGUSTO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
20	CC	10281690	OSPINA BANCAY ANTONIO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
21	CC	9847800	PEREZ ABARCA RECTOR FABIAN	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
22	CC	10613864	RAMIREZ NESTRO DIEGO FERNANDO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
23	CC	10303983	REYES CHAMORRO JUAN DIEGO	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
24	CC	10095806	SUMAR VALENCIA WILANES	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
25	CC	106162451	VARGAS JUAN GABRIEL	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/11	X	2017/12/11																																		
26	CC	1023122	WILLA CANO LUIS ENRIQUE	DEPENDIENTE	0	No	2017/12/21	X	2017/12/21																																		
Total Afiliados(26)																																											

ACTA No 1 RECIBO FINAL

CONTRATO N°: 201/2017
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR INTERCEPTOR LAGUNA-MATADERO CAMARAS C0-C8 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS) Y OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR INTERCEPTOR GUAYABITO K0+000 A K0+300 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO (CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO M.I
NIT: 901,122,086-5
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER PATIÑO TORRES
MUNICIPIO: PALESTINA CALDAS


COSTO INICIAL:	\$ 280.590.020
ADICION	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 272.287.601
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 8.302.419

RECURSOS: CONVENIO 0272. CORPOCALDAS PSMV
INTERVENTOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
CDP: 199 16/01/2018
RP 164 16/01/2018

En la ciudad de Manizales a los 7 días del mes de Febererp , se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ ,GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingenieros de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero ALEXANDER PATIÑO TORRES representante Legal del contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato 201/2017.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron


GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


CONSORCIO M.I
ALEXANDER PATIÑO TORRES
Contratista

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único
901122086

Valor a Pagar \$: 3'726'400

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA										
Número de Planilla	8	4	7	5	4	2	1	1	9	3

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO			
Operador de Información	_____		
Periodo de Cotización a Pagar:	Año	Mes	
	[] []	[] []	

AVV 351 20180129-10:37 SC-494 LINEA D
 VALOR PAGADO: 3,726,400.00
 NOMBRE: APORTES EN LINEA
 CLAVE: 8475421193
 ID: 901122086
 Fecha Aplicación: 20180129 PIN: 103722
 Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ADVERTENCIA: ASEGURESE DE QUE LA INFORMACIÓN IMPRIMIDA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO EN EL SISTEMA DEL BANCO NO TENGA COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e	
NIT 90112386		5		CONSORCIO M...	B - MENOS DE 200 COLTARITES	PRINCIPAL	camera 24 # 21-36 OF 501	MANIZALES-CALDAS	8601501	KBPF	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	2018-01	7542193	Pago	E	2018/01/22	2018/01/29	BANCO AV VILLAS	Banco	Dias Mora	53,726,400

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
1	CC 4247746	ACEVEDO EL JOSE JUAN	221001	20	5738,000	5738,000	EP3031	20	5738,000	5738,000	CEP11	20	5738,000	5738,000	14-28	30	5738,000	5738,000	20	5738,000								
2	CC 1061534149	AQUERO CAROLINA OSCAR JAVIER	220301	25	5415,000	5415,000	EP5045	25	5415,000	5415,000	CEP11	25	5415,000	5415,000	14-28	25	5415,000	5415,000	25	5415,000								
3	CC 19593556	ALVARADO ZAPATA JOSF FERNANDO	225-14	22	586,667	586,667	EP5045	22	586,667	586,667	CEP11	22	586,667	586,667	14-28	22	586,667	586,667	22	586,667								
4	CC 73070197	ARRELLANO CIRIO JESUS ANTONIO	220301	4	598,400	598,400	EP5045	4	598,400	598,400	CEP11	4	598,400	598,400	14-28	4	598,400	598,400	4	598,400								
5	CC 1143282710	AROLA ARELA JHON JAIME	220301	12	5295,200	5295,200	EP5022	12	5295,200	5295,200	CEP11	12	5295,200	5295,200	14-28	12	5295,200	5295,200	12	5295,200								
6	CC 9846029	ARROYAVE GARCIA JOSE IVAN	220201	22	5541,200	5541,200	EP5045	22	5541,200	5541,200	CEP11	22	5541,200	5541,200	14-28	22	5541,200	5541,200	22	5541,200								
7	CC 08674417	BETANCOURT ORTIZ ROSA ANTONIO	221001	1	524,600	524,600	EP3045	1	524,600	524,600	CEP11	1	524,600	524,600	14-28	1	524,600	524,600	1	524,600								
8	CC 1004259598	CABRERO NOGALES EDUARDO ANDRES	220201	25	5415,000	5415,000	EP5044	25	5415,000	5415,000	CEP11	25	5415,000	5415,000	14-28	25	5415,000	5415,000	25	5415,000								
9	CC 1004567633	CARONHA HANCOLE STIVEN	220301	25	5415,000	5415,000	EP5044	25	5415,000	5415,000	CEP11	25	5415,000	5415,000	14-28	25	5415,000	5415,000	25	5415,000								
10	CC 69418826	CORREA GOMEZ GABRIEL ANDRE	220301	23	585,800	585,800	EP5042	23	585,800	585,800	CEP11	23	585,800	585,800	14-28	23	585,800	585,800	23	585,800								
11	CC 49946482	CRANEZ ANDREA LUIS ALBERTO	220301	1	524,600	524,600	EP3037	1	524,600	524,600	CEP11	1	524,600	524,600	14-28	1	524,600	524,600	1	524,600								
12	CC 19923248	DOLLEGO BENTHEZ MARIANO ANTONIO	220201	30	5738,000	5738,000	EP5027	30	5738,000	5738,000	CEP11	30	5738,000	5738,000	14-28	30	5738,000	5738,000	30	5738,000								
13	CC 17621589	GRANDOS CULMA ELIAS	220201	1	524,600	524,600	EP5037	1	524,600	524,600	CEP11	1	524,600	524,600	14-28	1	524,600	524,600	1	524,600								
14	CC 9846575	HERRANDEZ HERRERA DE JESUS	221001	30	5738,000	5738,000	EP5045	30	5738,000	5738,000	CEP11	30	5738,000	5738,000	14-28	30	5738,000	5738,000	30	5738,000								
15	CC 10255626	HERRERA BENSON LUIS ALBERTO	220201	10	524,600	524,600	EP5048	10	524,600	524,600	CEP11	10	524,600	524,600	14-28	10	524,600	524,600	10	524,600								
16	CC 12375462	MARTINEZ CARROSA ROBERTO	225-14	25	5615,000	5615,000	EP5044	25	5615,000	5615,000	CEP11	25	5615,000	5615,000	14-28	25	5615,000	5615,000	25	5615,000								
17	CC 16415014	MARLANDA ZAPATA NELSON	220201	20	5492,000	5492,000	EP5045	20	5492,000	5492,000	CEP11	20	5492,000	5492,000	14-28	20	5492,000	5492,000	20	5492,000								
18	CC 4449270	MOYLES GOMEZ JHON RICARDO	221001	25	5615,000	5615,000	EP5045	25	5615,000	5615,000	CEP11	25	5615,000	5615,000	14-28	25	5615,000	5615,000	25	5615,000								
19	CC 4549561	MUTO GALLICO CESAR AGUSTO	220201	3	573,800	573,800	EP5042	3	573,800	573,800	CEP11	3	573,800	573,800	14-28	3	573,800	573,800	3	573,800								
20	CC 10261660	OSORZA RAMON ANTONIO	221001	20	5492,000	5492,000	EP5044	20	5492,000	5492,000	CEP11	20	5492,000	5492,000	14-28	20	5492,000	5492,000	20	5492,000								
21	CC 8947030	PEREZ ALVARO HECTOR FABIEN	220201	30	5738,000	5738,000	EP5045	30	5738,000	5738,000	CEP11	30	5738,000	5738,000	14-28	30	5738,000	5738,000	30	5738,000								
22	CC 1001346545	RAMIREZ RESTREPO DIEGO FERNANDO	225-14	20	5492,000	5492,000	EP5042	20	5492,000	5492,000	CEP11	20	5492,000	5492,000	14-28	20	5492,000	5492,000	20	5492,000								
23	CC 1001010820	SERRA CHAMORRO JUAN DIEGO	220201	30	5738,000	5738,000	EP5037	30	5738,000	5738,000	CEP11	30	5738,000	5738,000	14-28	30	5738,000	5738,000	30	5738,000								
24	CC 1003386805	SUAREZ VALENZUELA WALTER	221001	20	5492,000	5492,000	EP5044	20	5492,000	5492,000	CEP11	20	5492,000	5492,000	14-28	20	5492,000	5492,000	20	5492,000								
25	CC 1006162812	VARGAS JUAN GABRIEL	221001	20	5492,000	5492,000	EP5044	20	5492,000	5492,000	CEP11	20	5492,000	5492,000	14-28	20	5492,000	5492,000	20	5492,000								
26	CC 10231221	VILLA CANO LUIS ENRIQUE	220201	10	524,600	524,600	EP5042	10	524,600	524,600	CEP11	10	524,600	524,600	14-28	10	524,600	524,600	10	524,600								
Total					Antilador (26)	511,951,887			511,951,887	511,951,887			511,951,887	511,951,887	479,100		511,951,887	511,951,887	479,100		511,951,887	511,951,887	53,726,400		883,500		511,951,887	\$0

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCPAGADIDADES	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$1,913,400	\$0	\$1,924,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$575,000	\$0	\$579,200
FORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$271,100	\$0	\$272,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$665,700	\$0	\$669,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURBA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	26	\$401,600	\$0	\$403,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
CONFAMILIARES	CCR11	890,806,490	5	26	\$833,500	\$0	\$838,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)							
ASMET SALUD	ESSC62	817,000,248	3	3	\$833,500	\$0	\$838,200
MEDINAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$479,100	\$0	\$481,800
MEDINAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	5	\$479,100	\$0	\$481,800
NUOVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$479,100	\$0	\$482,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$45,700	\$0	\$45,700
SALUDVIDA S. A. EPS MOVILIDAD	EPS033	810,074,184	5	1	\$109,000	\$0	\$109,000
TOTAL			26		\$3,705,100	\$0	\$3,726,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SEMA e	
Identificación	dv	Razon Social											ICBF
CC 1607330		PATRO TORRES ALEXANDER	INDEPENHENTE	PRINCIPAL		CALLE 106C1 27-79		MANIZALES-CALDAS		9801501			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo											
Pension	2018-01	309285681	1474193697	Planilla	Planilla	2018/01/10	2018/01/22	BANCOLOMBIA			5230,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1607330	PATRO TORRES ALEXANDER	231001	30	\$900,000	\$128,000	EP5005	30	\$800,000	\$100,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados (1)					\$900,000	\$128,000			\$800,000	\$100,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$128,000	\$0	\$129,300				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$128,000	\$0	\$129,300				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100,000	\$0	\$101,000				
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$100,000	\$0	\$101,000				
TOTAL				1	\$228,000	\$0	\$230,300				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SEMA e	
Identificación	dr	Razon Social		PRINCIPAL		CALLE GOSCI 27-79		MANIZALES-CALDAS		BB01501		ICDF	SI
CC 1607330		PATRIO TORRES ALEXANDER		INDEFINITE									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo											
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	2018/02/08	2018/02/08	BANCOLOMBI	Banco	Dias Mora	5128.000
2018-02		31217445	8475114669								

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARATISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1607330	PATRIO TORRES ALEXANDER	211001	30	\$800,000	\$128,000	EP9901	30	\$800,000	\$100,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
Total				Atilados (1)	\$800,000	\$128,000			\$800,000	\$100,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ATILADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$128,000	\$0	\$128,000				
COLFONDOS	211001	800,227,940	6	1	\$128,000	\$0	\$128,000				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100,000	\$0	\$100,000				
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$100,000	\$0	\$100,000				
TOTAL				1	\$228,000	\$0	\$228,000				



CONSORCIO MI

**LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO MI NIT
901.122.086-5, IDENTIFICADOS COMO APARECE EN EL PIE DE LAS FIRMAS**


CERTIFICAN QUE:


El CONSORCIO MI NIT 901.122.086-5 con corte al 31 de Enero de 2018 respecto a toda su planta de empleados, se encuentra a Paz y Salvo con todos sus aportes causados y vencidos al Sistema de Seguridad Social integral (SALUD – PENSIÓN – RIESGOS PROFESIONALES) De igual forma se encuentra a Paz y Salvo con los aportes PARAFISCALES, PAGO DE SALARIOS y HONORARIOS.

Se deja constancia del pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses y durante la ejecución del contrato 0201-2017 suscrito entre el Consorcio MI y Empocaldas.

Se deja constancia del pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses.

Se firma en Manizales a los 8 días del mes de Febrero de 2018 para dar cumplimiento a las disposiciones de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.


Hector Edison Henao Restrepo
C.C. 10.286.271
TP. 70960-T
Contador
Consortio MI


Alexander Patiño Torres
c.c. 16.077.530
Representante Legal
Consortio MI



CONSORCIO MI

**LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO MI NIT
901.122.086-5, IDENTIFICADOS COMO APARECE EN EL PIE DE LAS FIRMAS**

CERTIFICAN QUE:

El CONSORCIO MI NIT 901.122.086-5, para la ejecución del contrato 0201-2017 con EMPOCALDAS SA ESP, tuvo más de un (1) trabajador afiliado y ninguno de los trabajadores devengo más de diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes según lo estipula la Ley 1607 de 2012

Se firma en Manizales a los 8 días del mes de Febrero de 2018 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Hector Edison Henao Restrepo
C.C. 10.286.271
TP. 70960-T
Contador
Consortio MI

Alexander Patiño Torres
c.c. 16.077.530
Representante Legal
Consortio MI

Región de Occidente
Ministerio de Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



70960-T

**HECTOR EDISON
NEMAO RESTREPO
C.C. 10286271
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 50
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

FECHA 09/03/2000

[Signature]


00076571

C

[Signature]

000844


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 47 de 1993.
Agúzale el sello a quien encuentre esta tarjeta conlleva
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



010286271

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 8 A C B E 0 9 F 1 4 2 C 8 9 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286271 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 70960-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA 60537021		
FECHA DE EXPEDICIÓN 29 01 2018		
FECHA VENCIMIENTO 03 02 2018		

Primer Nombre o Razón Social :

CONSORCIO MI

Primer Apellido :

Identificación :

901122086

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC BANCOLOMBIA RECAUDO Fecha: 29-01-2018 10:51 Costo: 0.00 Conv: 29232 - SENIA FIC CODIGO DE BARRA Suc: 859 - CARRERA 23 Ciudad: MANIZALES Caj: 002 Sec: 812 Valor Tot: \$ 479,550.00 Formas de Pago Efec: \$ 479,550.00 Pagador: 901122086 Ref: 60537021		\$479,550.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$479,550.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$479,550.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60537021(3900)479550(96)20180203

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60537021

Ciudad	D M A	Nit o Cedula	901122086	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: CONSORCIO MI				
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR	
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.			CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
				CHEQUE
			TOTAL	\$479,550.00

AREA PARA SELLO



CONSORCIO MI

Nit 901.122.086-5
Integrantes

Incivilpro S.A.S Nit 900.604.010-1 Porcentaje de Participación 50%
Maran S.A.S. Nit 860.058.536-6 Porcentaje de Participación 50%

FACTURA DE VENTA

4

Señor (es): Empedaldas SA ESP	
NIT: 890 803 232-9	Dirección: Cra 23 # 75-82
Teléfono: 886 7080	Ciudad: Manizales

Ventas Régimen Común:
Formulario Dian N° 18762006050111
11 de diciembre de 2017 Autoriza del 1 al 50

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
8	02	2018

CANT	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Acto # 2 contrato de obra 0201-2017		
	Costo Directo	\$66.414.617	\$66.414.617
	Alto 30%		\$20.074.385
	Administracion 20%	\$13.382.923	
	Imprevistos 5%	\$ 3.345.731	
	Utilidad 5%	\$ 3.345.731	

SON:	
	SUB TOTAL \$ 86.489.002
	IVA \$ 635.689
	TOTAL \$ 87.124.691

OBSERVACIONES:
Esta Factura es expedida en los términos de la Ley 1231 de 2008 y art. 617 del estatuto Tributario.

Entregado	Acceptado
Firma y Cédula 16077530	Firma y Cédula _____
	DÍA MES AÑO _____

Dirección: Carrera 24 N° 22-36 Ofc 501 Manizales, Caldas - Tel: (6)80-15-01 - Cel: 301 249 2291 - Mail: incivilpro@gmail.com

EMPRESA DEL CAJE - JOSE WILMAR ALCATE LÓPEZ NIT. 14804832 TEL: 075 9101

Manizales, 28 de Enero de 2018.

INFORME ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA 0201-2017

Suscrito entre EMPOCALDAS S.A E.S.P y el consorcio MI que tiene por objeto "ejecutar las obras correspondientes al saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) colector interceptor Laguna-Matadero C0-C8 en el municipio de palestina (caldas) y obras correspondientes al saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) colector interceptor GUAYABITO K0+000 a K0+300 en el municipio de Viterbo-Caldas.

VITERBO (CALDAS)

Se inicia construcción de cámaras desde C-1 hasta C-8 conjuntamente con los aliviaderos y descoles mencionados a continuación.

D-27 (SALTO)

D-28 (VERTEDERO)

D-29 (VERTEDERO)

D-30 (SALTO)

Aliviadero 27.



Se hace entrega al descole en tubería de 18" en una L=9.00 metros, allí se construye cabezote de entrega al caño. Allí se reciben las aguas combinadas de escorrentía y residuales del sector, presentando un alivio tipo salto el cual se conecta a la red construida.



Este descole solo funciona en temporada de lluvias y su entrega se hace al caño existente.

El refuerzo en las paredes de la estructura del aliviadero se realizó con malla electro soldada y en el piso y la tapa el refuerzo se realizó en malla y en hierro de $\frac{1}{2}$ ".





Aliviadero 28.



El aliviadero 28 está a una distancia de $L=2.0$ metros para entregar a la C-2 en tubería de 12"

Aliviadero 29.



Se hace necesario construir una cámara ciega para cambiar de curso el flujo con el fin de hacer entrega en el caño en el tramo más corto.



El descole tiene una entrega en enrrocado que ayuda a disipar la entrega al caño.



Allviadero 30.



Se instala aliviadero tipo salto y se hace entrega a un descole existente que es ajustado para instalarle tubería de 12" y se organiza de tal forma que quede funcional, también se conecta el aliviadero con la cámara C-8 en tubería de 8".



Entrega del descole de la C-8 en 12" una L=8.50 metros



Construcción de cámaras con sus bases y cañuelas desde la C-1 hasta la C-8.



PALESTINA (CALDAS)

Se inicia construcción de las cámaras y terminar la excavación entre cámaras C-6 y C-8





Se construyen trinchos desde la cámara C-5 para estabilizar el terreno.



Entibados a lo largo de todo la instalación por las profundidades de la excavación.



Se construyen gaviones para protección del talud de la cámara C-2



Construcción de aliviadero y descole



Se conecta en tubería de 12" a la cámara C-2 y luego al descole a una distancia de L=18.0 metros

CONSORCIO MI

R.L. ALEXANDER PATIÑO TORRES
C.C.16077530

(8)

Martes 12 Diciembre 2017

7:00 Emision de topografía
para Ubicacion de tuberia

12:00 Excavacion para

instalacion de tuberia arriba

Barras T-3 y C-4

(9)

Miércoles 15 Diciembre 2017

7:00 Continua excavacion,
para Barras T-4 hasta T-8

2:00 miera Instalacion Barras

T-4 y T-5

(10)

Lunes 18 Dic. 2014

9:00 Se recibe material
en la parte Superior
y se inicia obras en
Vehículo Abanderado.

2:00 Se recibe Prueba
Para Entorn

(11)

Miércoles 20 Dic. 2014

7: Solado de Impermea
Para Construcción de
Barriles.

2:00 arranque de la prueba
hasta el lugar de la
Construcción

(12)

Lunes 01 Enero 2018

7:00 Instalación de tubería
en la Cámara E-7-E-8

9:00 Finalización de tuberías

Para protección de
tubos Cámara E-2

(13)

Viernes 19 Enero 2018

7:00 Instalación de tubería
de decodo para el
rio desde la Cámara E-8

2: Muro de protección de
Aliviadero

(14)

Viernes 26 Enero 2018

7:00 Participación Bustroenen
Alvaredo y Pesceole
a la quebrada.

2:00 obras de entrega
y movimiento Prof. de
Tierras.

Justo Orellana

(15)

Sábado 27 Enero 2018

9:00 entrega de la obra
a la Comunidad

2:00 Angulos Menores

5:00 fin de la obra.

Justo Orellana

VITERBO

Lunes 01 Enero 2018

7:00 Conferencia de Canarias

E-3 - E-4

2:00 mesa Conferencia Alumnos

#30

Viernes 19 enero 2018

7:00 inicio Instalación de

Canuras E-5 a E-7

2:00 termina Descalo #30

y Se inicia # 29

Con Sr Descalo.

Viernes 26 Enero 2018

7:00 terminación de descalos

Con Srs Rosperchas

Descalos. y Instalación

de Cabzotes de ancha.

2:00 instalación de descalo

en tuberna de 18"

Sabado 27 Enero 2018

7:00 terminacion Decole #27
y finalizacion de Obra
de entrega.

2:00 instalacion de todos los

Temas en Bunkers
Kapurando

Lunes 29 Enero 2018

2:00 finalizacion y obras
menores para entrega
de la obra.

3:00 fin de la obra.

NOMINA PERSONAL VITERBO EMPOCALDAS - CONSORCIO MI

PERIODO DICIEMBRE 17- ENERO 17 DE 2018

N°	C.C.	NOMBRE	CARGO	DIAS	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	4.547.749	JHON JAIRO ACEVEDO	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Jhon Jairo Acevedo</i>
3	9.992.646	JAIME DE JESUS CALLE	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Jaime Calle Lopez</i>
4	9.991.896	GABRIEL ANGEL CORREA	oficial	30	\$ 1 200 000.00	<i>Gabriel A. Correa</i>
6	9.992.748	MAURICIO ANTONIO GALLEGO	oficial	30	\$ 1 200 000.00	<i>Mauricio Serna</i>
9	1.010.010.830	JUAN DIEGO SERNA	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Juan Diego Serna</i>
10	1.053.773.019	CARLOS ALBARAN	maestro obra	30	\$ 1 700 000.00	<i>Carlos Albarán</i>
11	10.128.448	JUAN DE JESUS MARTINEZ MONCADA	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Juan Martinez</i>
13	1.005.850.805	WILMER SUAREZ VALENCIA	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Wilmer Suarez</i>
15	1.061.368.545	DIEGO FERNANDO RAMIREZ	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Diego Fernando</i>
					\$ 9 140 000.00	

NOMINA PERSONAL VITERBO EMPOCALDAS - CONSORCIO MI

PERIODO DICIEMBRE 17- ENERO 17 DE 2018

N°	C.C.	NOMBRE	CARGO	DIAS	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	4.547.749	JHON JAIRO ACEVEDO	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Jhon Jairo Acevedo</i>
3	9.992.646	JAIME DE JESUS CALLE	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Jaime Calle</i>
4	9.991.896	GABRIEL ANGEL CORREA	oficial	30	\$ 1 200 000.00	<i>Gabriel A. Correa</i>
6	9.992.748	MAURICIO ANTONIO GALLEG0	oficial	30	\$ 1 200 000.00	<i>Mauricio Serna</i>
9	1.010.010.830	JUAN DIEGO SERNA	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Juan Diego Serna</i>
10	1.053.773.019	CARLOS ALBARAN	maestro obra	30	\$ 1 700 000.00	<i>Carlos Albarán</i>
11	10.128.448	JUAN DE JESUS MARTINEZ MONCADA	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Juan Martinez</i>
13	1.005.850.805	WILMER SUAREZ VALENCIA	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Wilmer Suarez</i>
15	1.061.368.545	DIEGO FERNANDO RAMIREZ	ayudante obra	30	\$ 840 000.00	<i>Diego Fernando</i>
					\$ 9 140 000.00	

NOMINA PERSONAL PALESTINA EMPOCALDAS - CONSORCIO MI

PERIODO DICIEMBRE 06 - ENERO 20 DE 2018

N°	C.C.	NOMBRE	CARGO	DIAS	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	1.329.462	ROBERTO MARTINEZ	maestro de obra	15	\$ 1 200 000.00	<i>Roberto Martinez</i>
2	16.415.014	NELSON MARULANDA	oficial	15	\$ 795 000.00	<i>Nelson Marulanda</i>
3	4.416.270	JHON FREDY MORALES	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Jhon Freddy Morales</i>
4	1.061.624.149	OSCAR JAVIER AGUDELO	ayudante practico	15	\$ 480 000.00	<i>Oscar Javier Agudelo</i>
5	9.846.575	ELVER DE JESUS HERNANDEZ	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Elver Hernandez</i>
6	15.906.556	FERNANDO ALBORADO	oficial	8	\$ 420 000.00	<i>Fernando Alborado</i>
7	10.254.266	ULISES MARIN	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Ulises Marin</i>
8	75.070.197	ANTONIO ARBOLEDA	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Antonio Arboleda</i>
9	10.261.690	RAMON ANTONIO OSPINA	ayudante obra	8	\$ 205 000	<i>Ramon Antonio Ospina</i>
					\$ 4 740 000.00	

**NOMINA PERSONAL PALESTINA EMPOCALDAS - CONSORCIO MI
PERIODO DICIEMBRE 23- ENERO 6 DE 2018**

N°	C.C.	NOMBRE	CARGO	DIAS	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	1.329.462	ROBERTO MARTINEZ	maestro de obra	15	\$ 1 200 000.00	<i>Roberto Martinez</i>
2	16.415.014	NELSON MARULANDA	oficial	15	\$ 795 000.00	<i>Nelson Marulanda</i>
3	4.416.270	JHON FREDY MORALES	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Jhon Fredy Morales</i>
4	1.061.624.149	OSCAR JAVIER AGUDELO	ayudante practico	15	\$ 480 000.00	<i>Oscar Javier Agudelo</i>
5	1.061.626.783	MAICOL ESTIVEN CARDONA	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Maicol Estiven Cardona</i>
6	1.061.625.909	EDUARD ANDRES CAMPIÑO	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Eduard Andres Campino</i>
7	9.846.575	ELVER DE JESUS HERNANDEZ	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Elver de Jesus Hernandez</i>
8	9.846.039	JORGE IVAN ARROYAVE	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Jorge Ivan Arroyave</i>
9	9.847.830	HECTOR FARIT PEREZ	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Hector Farit Perez</i>
10	15.906.556	FERNANDO ALBORADO	oficial	15	\$ 840 000.00	<i>Fernando Alvarado</i>
11	1.061.624.513	JUAN GABRIEL VARGAS	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Juan Gabriel Vargas</i>
12	1.143.928.770	JHON JAIME ARCILA	ayudante obra	15	\$ 410 000.00	<i>Jhon Jaime Arcila</i>
13	10.254.266	ULISES MARIN	ayudante obra	4	\$ 410 000.00	<i>Ulises Marin</i>
14	10.231.221	LUIS ENRRIQUE VILLA	maestro de obra	3	\$ 1 600 000	<i>Luis Enrique Villa</i>
15	10.261.690	RAMON ANTONIO OSPINA	ayudante obra	15	\$ 410 000	<i>Ramon Antonio Ospina</i>
					\$ 9 015 000.00	



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	2	Fecha del informe	Enero 28 de 2018	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	---	----------------------	---------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0201-2017
Objeto:	EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR INTERCEPTOR LAGUNA-MATADERO CAMARAS CO-C8 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS) Y OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR INTERCEPTOR GUAYABITO K0+000 A K0+300 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO (CALDAS).
Nombre Contratista:	CONSORCIO M.I. 901,122,086-5 ALEXANDER PATIÑO TORRES c.c 16.077.530
Fecha del contrato:	12/10/2017
Plazo de ejecución:	3 meses
Valor inicial:	\$ 280.590.020
Fecha de iniciación:	Noviembre 7 de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	6 DE FEBRERO DE 2017
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	\$ 0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	50%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra):

• **ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.**

- El día 7 de Noviembre se firma acta de inicio por parte de interventoría y contratista.
- Se inicia construcción de 8 cámaras y 1 aliviadero



Foto 1 Y 2. Construcción de cámaras



Foto 3 y 4. Cámara 2



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



Foto 5. Entibados entre camaras



Foto 6. Valla alusiva a la obra.

- se presenta un sobreacarrao de material desde la parte alta a una distancia aproximada de 600 metros en vehículo automotor, ya que en la zona no hay acceso a vehículos pesados por el tema de alta pendiente



Foto 7. sobreacarreo



Foto 8. Fuerte pendiente



Foto 9. Comisión de topografía para la instalación de la tubería debido a las bajas pendientes



Foto 10. Construcción de gaviones y se organiza canal en concreto existente



Fotos 11. Gaviones protegiendo la socavación de la C-2



Fotos 12. Solados de limpieza

Se construyen gaviones evitando que la quebrada a futuro presente socavación del talud y afecte la red nueva



Foto 13. Construcción de trinchos para soportar y mejorar las condiciones del terreno y la zona por donde se instaló la tubería



Fotos 14. Trinchos C-7 y C-8



Fotos 15. Trinchos C-6 y C-7



Foto 16. Excavación C-6 y C-7 en conglomerado y presencia de roca



Foto 17. Excavación C-7 y C-8 en conglomerado y presencia de rocas



Foto 18. Excavación para descole



Foto 25. Construcción aliviadero D-29 tipo lateral



Foto 26. Terminado aliviadero D-28 y C-2



Foto 27. Terminado aliviadero D-29 y entrega de vía



Foto 28. Construcción de cámara ciega entrega descole D-29



Foto 29. Descole D-29



Foto 30. Descole D-27



Foto 30. aliviadero D-27 tipo salto

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	90 DÍAS ✓
Tiempo total transcurrido:	80 DÍAS
Avance Porcentual:	100%


1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5. Problemáticas con la obra: se presentó suelo de relleno y niveles freáticos altos por lo que se hace necesario realizar la excavación con un ancho superior que el indicado en los diseños.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	280.590.020.00 ✓
Inversión ejecutada en el periodo:	87.624.691
Porcentaje ejecutado en el periodo:	42%
Inversión total ejecutada:	272.287.603
Porcentaje total ejecutado:	97.04%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra).

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

Cumplimiento con los trabajadores	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural): Se recibe el pago de la seguridad social.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
DICIEMBRE 18/17	A		A	A			A		
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica									

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Supervisor Zona Centro
EMPOCALDAS S.A E.S.P

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Supervisor Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A E.S.P
