



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	206 DE 2019	Acta N°	4 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	16 337 392
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO			3. VALOR TOTAL (1+2)	16 337 392
NIT O CC:	1.087.048.022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12 253 044
CDP (#, rubro y fecha)	00727 de 01-08-2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4 084 348
RP (#, rubro y fecha)	000923 de 05-09-2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CREDITO DE LOS 10.000 MILLONES ZONA 3 - SALAMINA, AGUADAS, FILADELFIA, ARMA

TIPO DE RECURSOS	CREDITO \$10.000 MILLONES	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			# FOLIOS
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			NA
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente

27-12-2019
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		NA

Fecha de presentación DICIEMBRE 26 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA NORTE	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
.084900064753.	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONTRATACION

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL

CONTRATO No. 206 DE 2019

OBJETO PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CREDITO DE LOS 10.000 MILLONES ZONA 3 – SALAMINA, AGUADAS, FILADELFIA, ARMA.

CONTRATISTA DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO
C.C. No. 1.087.048.022

VALOR DEL ACTA \$4,084,348

CONTROL FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	\$	16,337,392
ACTA PARCIAL No. 01	\$	4,084,348
ACTA PARCIAL No. 02	\$	4,084,348
ACTA PARCIAL No. 03	\$	4,084,348
ACTA PARCIAL No. 04 Y FINAL	\$	4,084,348
SALDO POR PAGAR	\$	0.00

En Manizales (Caldas) a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron: Ing. ABEL ROJAS RUBIANO Ingeniero de Zona Norte de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO, con el fin de tramitar el pago de los días comprendidos entre el 10 y el 26 de diciembre de 2019 correspondiente al Contrato No. 206 de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 04 Y FINAL, CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$4,084,348).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (PROTECCIÓN) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de diciembre de 2019.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de Zona Norte
Supervisor



DANIEL MENA TRUJILLO
Contratista

PLANILLA ASISTIDA FEDECAJAS	
ADMINISTRADORAS	EMPLEADOS
NUEVA EPS	1
PROTECCION	1
POSITIVA	1
El Numero de Referencia o PIN es : 8736436207	
El Numero de Referencia o PIN es vigente hasta : 31-12-2019	
La fecha limite de pago es :2020-01-09 00:00:00.0 Actualmente tiene 0 dias de mora	
Fecha 1 de pago :20200109 Valor a pagar: \$ 505500 Incluye valor de mora \$0	
Fecha 2 de pago :20200110 Valor a pagar: \$ 506000 Incluye valor de mora \$500	
Fecha 3 de pago :20200113 Valor a pagar: \$ 507100 Incluye valor de mora \$1600	
Fecha 4 de pago :20200114 Valor a pagar: \$ 507500 Incluye valor de mora \$2000	
Fecha 5 de pago :20200115 Valor a pagar: \$ 507800 Incluye valor de mora \$2300	
Fecha 6 de pago :20200116 Valor a pagar: \$ 508300 Incluye valor de mora \$2800	
Valor comision \$:0, IVA comision: \$ 0	
Total comision \$:0	

—ORIGINAL—
**TRANSACCION
 EXITOSA**



Banco de Bogotá

27/12/2019 9:20 am
 MovilRed
 Código del Punto: 174720
 Punto de Venta: MULTIPAGAS SANGAN
 CIO
 Dirección: CARRERA 27A No 66 - 30
 LOCAL 860
 Número Transacción: 1778701837
 Terminal: 76a98a3ccc686c

Detalle:
 PAGO DE FACTURAS
 Número autorización: 301792
 Convenio: CONVENIO PILA
 No. Referencia: 8736436207
 Valor: \$ 505,500
 Comision: \$ 0

Línea de Atención
 Línea Nacional 018000512825
 Bogotá 7432626
 Correo: bancosaval@en-contacto.co
 ORIGINAL

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Fecha de certificación: 03-00-19

Datos generales:

Aportante DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO		Sucursal		Tel: 3163013562		Dirección	
CEDULA 1087048022 - 7		depto: CALDAS Mun MANIZALES		Principal		calle 48 d n° 19-22	
N° Planilla: 8555838		Período Salud: 2019-12		Fecha de pago: null		Correo electrónico: danyfer507@hotmail.com	
		Período Otros: 2019-12		N° Transacción: 0		Días mora: 0	
						N° Afiliados: 1	

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT APP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERES MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0	0,00	0,00	39.800,00	398,00	39.800,00
Totales: \$			39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00		0,00	0,00	39.800,00	398,00	39.800,00

CERTIFICADO

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	MATERNIDAD	VALOR VLR NETO	DIAS MORA	INTER. MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS037	NUEVA EPS	900156264	204.300	0	0	0	204.300	0	0	0	0	0	204.300	0	0	204.300	1
Totales: \$			204.300	0	0	0	204.300		0	0	0	0	204.300	0	0	204.300	1

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR VLR AFILIADO	COTIZACION APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
PROTECCION	800228739	261.400	0	0	0	0	0	0	0	261.400	1
Totales: \$		261.400	0	0	0	0	0	0	0	261.400	1

Total a pagar: \$ 505.500,00



RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Id	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF,	Número Planilla	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Tipo	
CC	1.087.048.022	DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO	Principal	2019-12	2019-12	8555838	PRIVADO	I	14-23	I	
Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
calle 48 d n° 19-22	MANIZALES	001	CALDAS	3163013562	0	danyfer507@hotmail.com	7110	1			

SERVICIO : EPS

COD.	NIT ADM	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS MORA	INT MORA	INT MORA COTIZ	No. AFILIADOS	COTIZACION OBLIGATORIA
EPS037	900156264	NUEVA EPS	0,00	0,00	0,00	1	204.300
TOTAL x Servicio :					0	1	204.300

SERVICIO : ARP

COD.	NIT ADM	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS MORA	INT MORA	INT MORA COTIZ	No. AFILIADOS	COTIZACION OBLIGATORIA
14-23	860011153	POSITIVA	0,00	0,00	0,00	1	39.800
TOTAL x Servicio :					0	1	39.800

SERVICIO : AFP

COD.	NIT ADM	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS MORA	INT MORA	INT MORA COTIZ	No. AFILIADOS	COTIZACION OBLIGATORIA
230201	800229739	PROTECCION	0,00	0,00	0,00	1	261.400
TOTAL x Servicio :					0	1	261.400

SUB TOTAL :	505.500	INTERES MORA:	0	GRAN TOTAL :	505.500
--------------------	---------	----------------------	---	---------------------	---------

 <p>F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010</p>	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN FINANCIERA	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 004		
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239-9		
CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.004 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)		
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, DICIEMBRE 26 DE 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS:	DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO	
CEDULA O NIT:	1.087.048.022	
DIRECCION:	Calle 880 # 19 - 22. B. San Jorge (Manizales - Caldas)	
DESCRIPCION DE LA OPERACION		
PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CREDITO DE LOS 10.000 MILLONES POR CONCEPTO DE: ZONA 3 - EUADÉLFIA, SALAMINA, AGUADAS, AIRMA.		
ACTA PARCIAL No. 04 y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 206 DE 2019.		
		SUBTOTAL: \$ 4 084 348.00
		RETENCION RENTA: _____ 0
		IVA ASUMIDO (): _____ 0
		TOTAL A PAGAR: \$ 4 084 348.00
		
DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC. 1.087.048.022 de Linares - Nariño		



Manizales, diciembre 26 de 2019

**EL INGENIERO DE ZONA NORTE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 206 DE 2019**

CERTIFICA QUE:

El contratista DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.087.048.022 de Linares Nariño, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta parcial No. 04 y Final del contrato No. 206 de 2019 periodo comprendido entre el 10 y el 26 de diciembre de 2019.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019. ✓


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de zona Norte
Supervisor

 F-GF-32 Versión 2 Julio 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN FINANCIERA DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS
---	---

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

CODIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1315130	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO			250 000
1315130	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO			2 100 000
1315130	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO			1 200 000
1315130	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO			534 348

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION	-	-	4 084 348
--------------------	---	---	-----------

Fecha de presentación

26 de diciembre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR
ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE
Ingeniero de Zona Norte
CARGO
FIRMA

MES DICIEMBRE 2019			
RETENCION EN LA FUENTE			
Empleado: DANIEL MENA TRUJILLO			
UVT 2019	\$ 34 270		
RETENCION RENTAS DE TRABAJO			
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$ 4 084 348		
Otros Pagos Laborales	\$ -		
Ingresos laborales	\$ 4 084 348		
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA			
1. Aportes obligatorios a Pension (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 261 400		
2. Aportes obligatorios a salud (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 204 300		
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT al año)			
Total Ingresos no constitutivos	\$ 465 700		
Subtotal 1	\$ 3 618 648		
DEDUCCIONES			
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Limite maximo 100 UVT Mensuales (\$3.427.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23</i>			
2. Deducion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.097.000 2019) Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción. Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.18</i>			
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 548.000 Año 2019)</i>	\$ -		
Total Deduciones	\$ -		
Subtotal 2	\$ 3 618 648		
RENTAS EXENTAS			
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)			
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) <i>La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (125.9528200 año 2018) Art. 126-1 E.T.</i>	\$ -		
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8			
Total Rentas Exentas	\$ -		
Subtotal 3	\$ 3 618 648		
Renta de Trabajo Exenta (25%) Maximo \$ 8.224.800 Año 2019. (240 Uvt)	\$ 905 000		
Subtotal 4	\$ 2 713 648		
Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$ 1 447 458		
Total deducciones y renta exentas	\$ 905 000		
<i>En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.8 Decreto 1625 de 2016</i>	\$ 14 393 400		
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$ 2 713 648		
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 79		
Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retencion por aplicar
87	0%	\$ 0	-
145	18%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 UVT)*18%	-
335	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT)*28% más 11 UVT	-
640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 UVT)* 33% más 64 UVT	-
945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 165 UVT	-
2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 272 UVT	-
En adelante	38%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*38% más 773 UVT	-
UVT 2019	\$ 34 270		
Ingreso laboral gravado en uvt	\$ 79		
RETENCION EN LA FUENTE			\$ 0.00



INFORME 04

Manizales, 26 de diciembre de 2019

Ingeniero

ABEL ROJAS RUBIANO

Ingeniero Interventor de Zona Norte (EMPOCALDAS S.A. E.S.P.)

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato de prestación de servicio No. 206 de 2019.

OBJETO: PRESTAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CREDITO DE LOS \$ 10.007 MILLONES ZONA 3: SALAMINA, AGUADAS, FILADELFIA, ARMA

INGENIERO DE APOYO: DANIEL MENA TRUJILLO

Permitame enviarle la relación de las actividades y apoyo realizado, comprendido entre el 10 de diciembre y el 26 de diciembre:

AGUADAS

Número del contrato	0196 DE 2019
Objeto:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Nombre Contratista:	JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA
Fecha del contrato:	15 DE AGOSTO DE 2019
Plazo de ejecución:	CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Valor inicial:	\$ 449.968.995,00
Fecha de iniciación:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	17 DE DICIEMBRE DE 2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	0
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

2. REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

Inversión Contratada:	\$ 69.491.719
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 3.540.192
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	5.09 %
Inversión total ejecutada:	\$ 55.272.224
Porcentaje ejecutado sobre inversión:	84.6 %
Avance general de obra	100 %

Reposición de 162 m.l. de alcantarillado con tubería PVC corrugada de 12", 78 m.l.

Durante el período no se realizaron actividades pues las obras mayores finalizaron en el periodo anterior. Se dejaron algunas actividades contractuales sin terminar: como el arreglo de bases y cañuelas y suministro e instalación de una tapa con aro. A la fecha este tramo ya se interviene en su pavimentación por parte de la Alcaldía Municipal.



(estado final de la obra)

4. REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 7 CON CALLES 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

Inversión Contratada:	\$ 43.997.228
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 0.00
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	0.00 %
Inversión total ejecutada:	\$ 31.617.182
Porcentaje ejecutado sobre inversión	71.9 %
Avance general de obra	100.0 %

Reposición de 84 m.l. de alcantarillado con tubería PVC corrugada de 12" y 84 m.l.

Las obras terminaron en el periodo anterior. No se ejecutaron algunas labores como arreglo de cañuelas. A la fecha este tramo ya se interviene en su pavimentación por parte de la Alcaldía Municipal




(estado final de la obra)



(instalación de acometidas y red principal acueducto 3")

Adicionalmente se trabajó en la reparación de un canal de aguas lluvias dañado por las obras del contrato y se reparó un desagüe transversal instalando un tubo de 14".

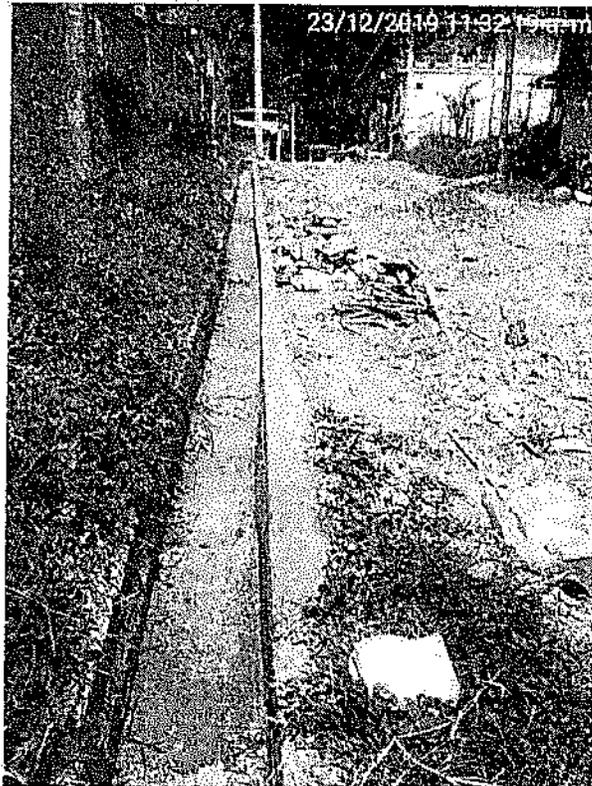

(reparación canal)

7. CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

Inversión Contratada:	\$ 17.091.820
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 0.00
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	0.00 %
Inversión total ejecutada:	\$ 13.129.529
Porcentaje ejecutado sobre inversión	76.8 %
Avance general de obra	100.0 %

Instalación de 78 ml tubería PVC de 4" e instalación de 84 ml tubería PVC de 6",

Todas las actividades se terminaron en el periodo anterior junto con los trabajos de la reposición de alcantarillado. A la fecha este tramo ya se interviene en su pavimentación por parte de la Alcaldía Municipal.




(labores de pavimentación)


9. CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 13, 14 Y 15
SECTOR LA VANA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.


Inversión Contratada:	\$ 101.410.667
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 0.00
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	0.00 %
Inversión total ejecutada:	\$ 106.447.981
Porcentaje ejecutado sobre inversión	105.0 %
Avance general de obra	100 %

Instalación de 216 m.l. red de acueducto en tubería Polietileno de 10". Las obras en este sector se encuentran terminadas desde el periodo anterior. La red y la vía se encuentran en servicio.

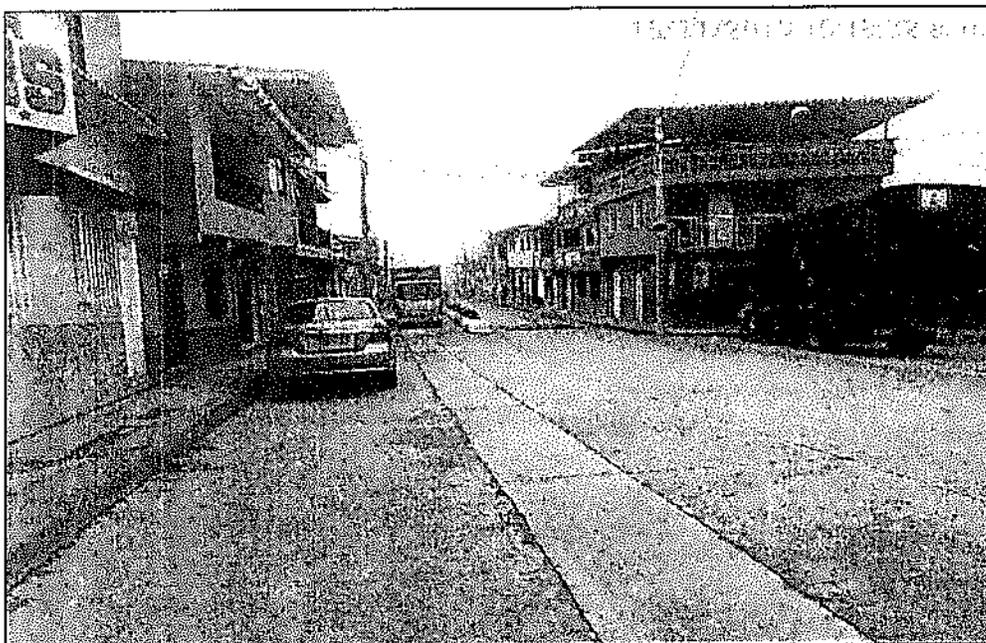

(estado final de la obra)


DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO
C.C. 1087048022
Ingeniero de apoyo


ABEL ROJAS RUBIANO
Supervisor Zona Norte

INFORME 04

Manizales, 26 de diciembre de 2019

Ingeniero

ABEL ROJAS RUBIANO

Ingeniero Interventor de Zona Norte (EMPOCALDAS S.A. E.S.P.)

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato de prestación de servicio No. 206 de 2019.

OBJETO: PRESTAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CREDITO DE LOS \$ 10.000 MILLONES ZONA 3: SALAMINA, AGUADAS, FILADELFIA, ARMA


INGENIERO DE APOYO: DANIEL MENA TRUJILLO

PERIODO: Entre el 10 y el 26 de diciembre de 2019

SALAMINA

Número del contrato	0192 DE 2019
Objeto:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA
Nombre Contratista:	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Fecha del contrato:	14 DE AGOSTO DE 2019
Plazo de ejecución:	CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Valor inicial:	\$ 821.365.151,00
Fecha de iniciación:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	22 DE DICIEMBRE DE 2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	0
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

En el sitio realizó la reposición de 54 ml de alcantarillado en tubería PVC corrugada de 12". Las obras finalizaron en un período anterior. A la fecha el la red se encuentra en servicio y sin inconvenientes.

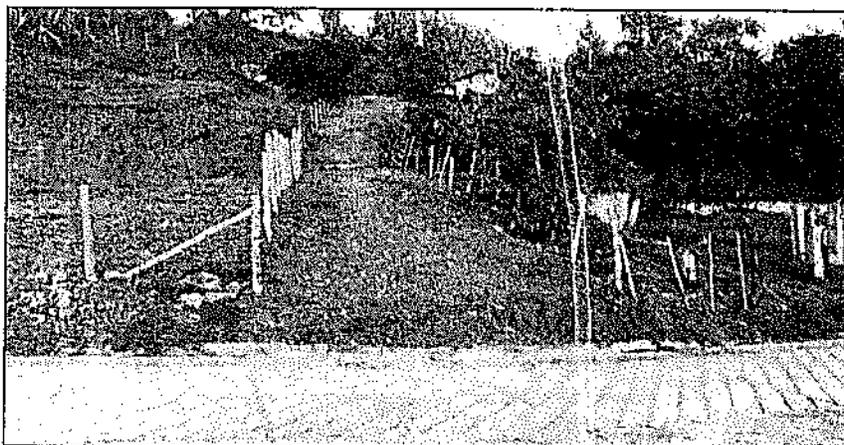

(obras finalizadas)

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN CARRERA 8 CON CALLE 15 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.


Inversión Contratada:	\$ 30.072.306
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 0.00
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	0.00%
Inversión total ejecutada:	\$ 33.598.226
Porcentaje ejecutado sobre inversión	111.7%
Avance general de obra	100.0%

Reposición de 42 ml de alcantarillado en tubería PVC corrugada de 12". Las obras finalizaron en un periodo anterior. A la fecha el la red se encuentra en servicio y sin inconvenientes. La vía también se encuentra habilitada y en normal funcionamiento.



(estado final de la obra)

En el sitio se hizo reposición de 48 ml de alcantarillado con tubería PVC corrugada de 12". Las obras finalizaron en un periodo anterior. A la fecha el la red se encuentra en servicio y sin inconvenientes. La vía también se encuentra habilitada y en normal funcionamiento

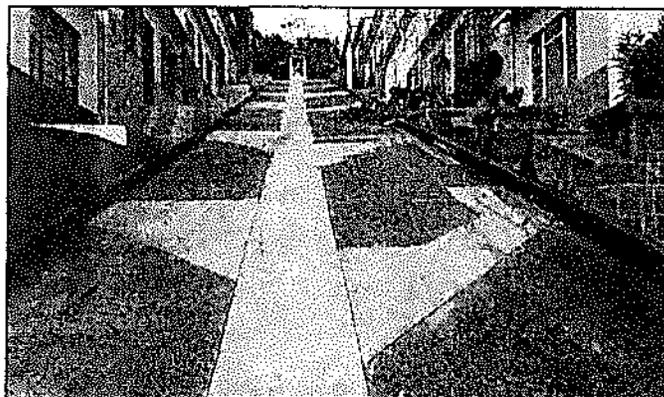


(estado final de la obra)


REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 A LA 5 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

Inversión Contratada:	\$ 37.651.965
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 0.0
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	0.0 %
Inversión total ejecutada:	\$ 0.0
Porcentaje ejecutado sobre inversión	0.0 %
Avance general de obra	0.0 %

En el sitio se hará reposición de 48 m.l. de alcantarillado con tubería PVC corrugada de 18". A la fecha no se han realizado actividades en este tramo.

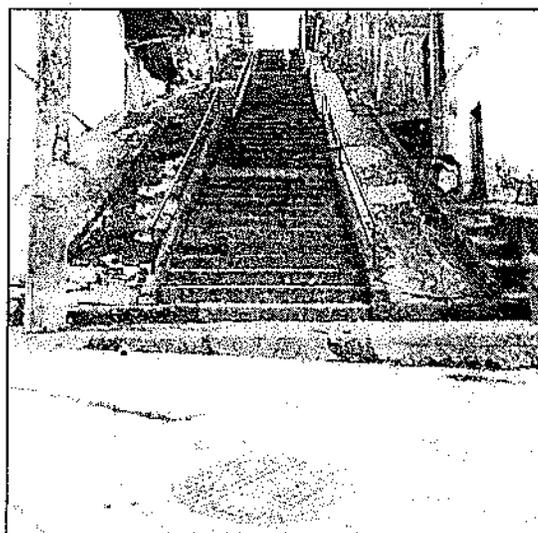

(calle 5 entre cra 4 y 5)

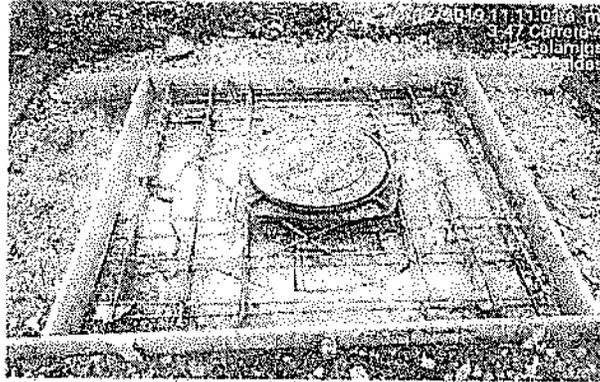


(instalación tapa metálica)



REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 5 CON CALLES 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.

Inversión Contratada:	\$ 58.632.751
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 11.945.477
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	20.38.6%
Inversión total ejecutada:	\$ 49.404.954
Porcentaje ejecutado sobre inversión	84.3%
Avance general de obra	90.0%

Reposición de 102 m.l. de alcantarillado con tubería PVC corrugada de 12". Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: compactación de sub base para pavimento, instalación de tapa con aro pozo de inspección, construcción de cajas de inspección y se inicio con la pavimentación. A la fecha no se realizan actividades por fin de año. Queda pendiente terminar pavimentación y trabajos en la instalación de tapas con aro en las cámaras de inicio y entrega.

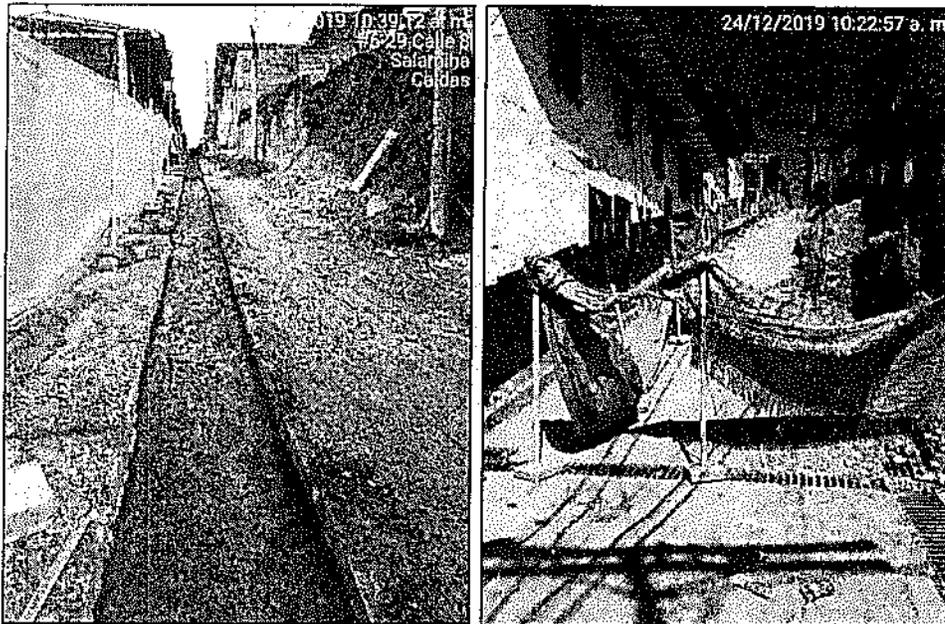

(sub base para pavimento y estado actual de la obra)

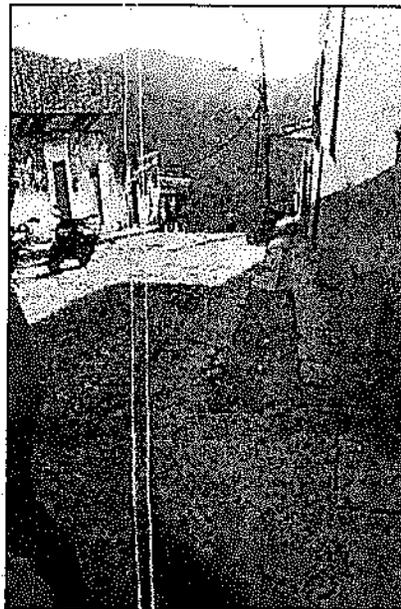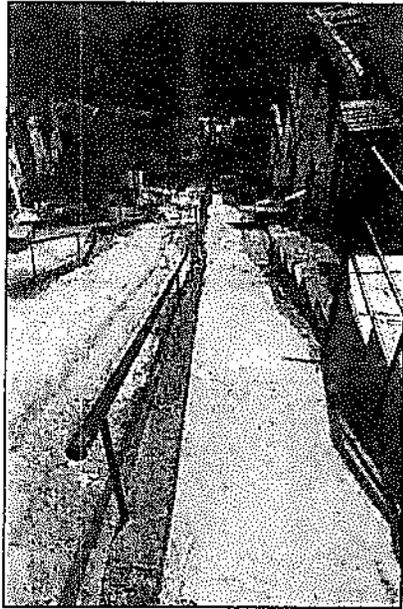


(localización de la obra)


CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 7 CON CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.

Inversión Contratada:	\$ 15.540.460
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 0.00
Porcentaje obra ejecutado en el periodo:	0.00 %
Inversión total ejecutada:	\$ 9.027.522
Porcentaje ejecutado sobre inversión	58.1 %
Avance general de obra	95.0 %


Las obras finalizaron en un periodo anterior. El tramo sigue en obras del contrato de alcantarillado.

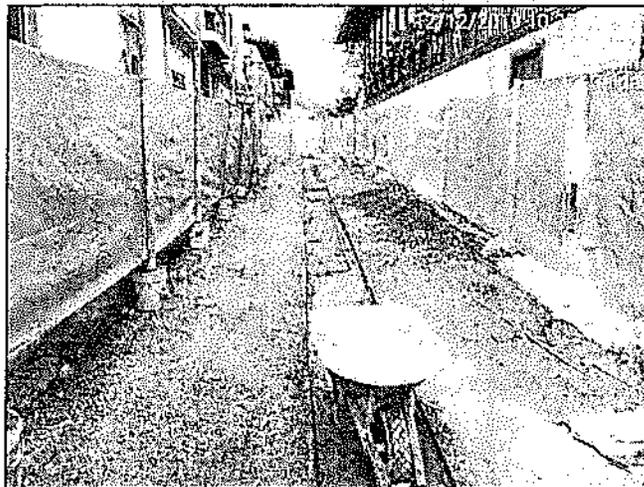

(estado actual del tramo)

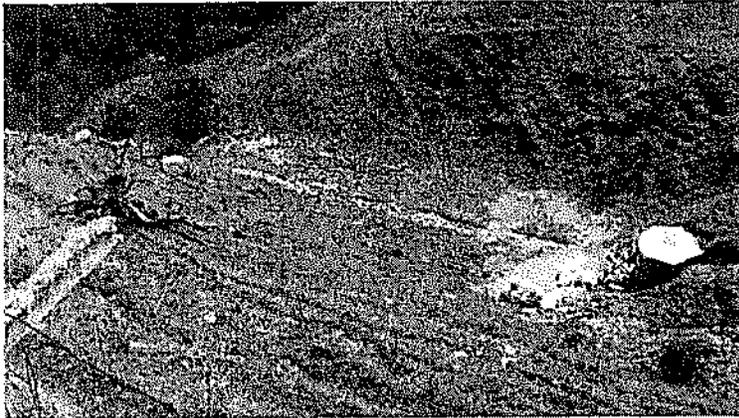

(estado final tramo desagüe desarenador)

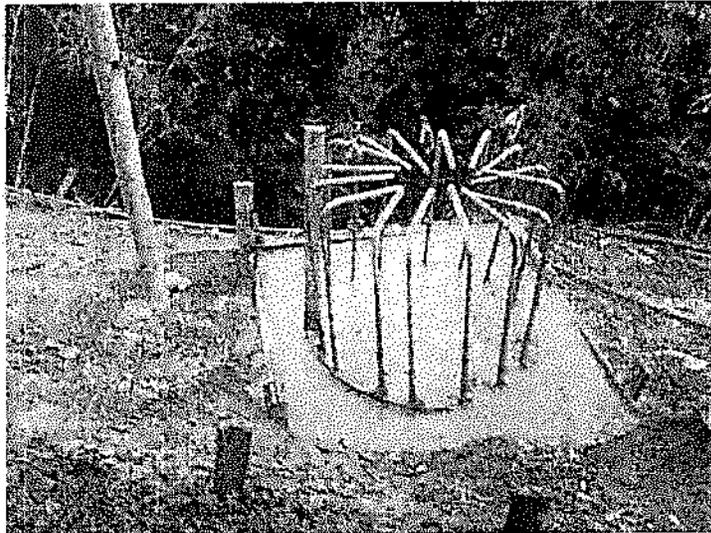

(vaciado de los caisson)

A la fecha se considera el valor de una adición para cubrir los costos adicionales en esta obra y una prórroga para permitir la culminación de los trabajos.

DANIEL FERNANDO MENA TRUJILLO
CC. 1087048022
Ingeniero de apoyo

ABEL ROJAS RUBIANO
Supervisor Zona Norte.
