

# CONTRATO Y AÑO	0200/2019 ✓	Acta N°	2 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	185.337.343
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CONSORCIO LROX ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	185.337.343
NIT O CC:	900.560.766-1 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	93.405.284
CDP (#, rubro y fecha)	00174 DE ENERO 14/2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	40.342.094
RP (#, rubro y fecha)	000139 DE ENERO 14/2020 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	51.589.965
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA				
TIPO DE RECURSOS	CREDITO DE LOS 10,000 MIL MILLONES 2019	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					x

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderon B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

07/04/2020.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
537026478	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Parafiscales, Sena, ICBF, Aportes a Salud

¿En qué casos se exoneró de pagos de aportes al SENA, ICBF Y SALUD a los empleadores y desde cuándo?

PAGO PARAFISCALES. La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al ICBF, al SENA y a las Cajas de Compensación Familiar, al igual que a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

EXCEPCION. La Ley 1607 de 2012, ha establecido como excepción a esa norma la exoneración al empleador de realizar aportes al ICBF y Sena e igual que a Salud así:

ENTIDAD	PORCENTAJE HOY	REFORMA	NORMA LEGAL
SENA	2%	No aporta	.
ICBF	3%	No aporta	Ley 89 de 1998
CAJAS DE COMPENSACION	4%	4%	Ley 21 de 1982

EXONERADOS DEL PAGO DEL APORTE:

EMPLEADOR	REQUISITO
Sociedades y Personas Jurídicas asimiladas	-Declarantes del impuesto sobre renta y complementarios. -Que devenguen individualmente hasta 10 salarios mínimos
Personas naturales empleadoras	-Que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales -Que el empleador tenga 2 o más trabajadores

NO APLICA LA EXONERACION PARA:

Personas naturales empleadoras	Que empleen una sola persona
Empleadores de trabajadores que devenguen más de 10 smlmv	Sean o no sujetos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE
Entidades sin ánimo de lucro	Por no ser sujetos del impuesto CREE
Sociedades declaradas Zonas Francas	Que estén en las condiciones del Art 20 Paragrafo 3 Ley 1607

¿DESDE CUANDO APLICA? A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE- y en todo caso antes del 1° de julio de 2013.

APORTE DE SALUD. Porcentaje que se aplica al salario

PARTES	HOY	REFORMA
Empleador	8.5%	No aporta
Trabajador	4.0%	4%

La exoneración de pago del aporte en salud para el empleador también aplica a las mismos empleadores exonerados del pago de aportes al SENA , ICBF

¿DESDE CUANDO APLICA? A partir del 1° de enero de 2014, Art 31 Ley 1607 de 2012.

¿EN QUE CONSISTE EL IMPUESTO- CREE. Es el impuesto sobre la renta para la equidad aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios; en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social, impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013. Art 20.

También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

TARIFA. Será del ocho por ciento (8%).


Para los años 2013, 2014 Y 2015 la tarifa del -CREE- será del nueve (9%).

HECHO GENERADOR. Lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos del impuesto, en el año o período gravable respectivo.

DISTRIBUCION DEL IMPUESTO

CONCEPTO	PORCENTAJE
Sena	1.4%
ICBF	2.2%
Salud	4.4%

FINALIDAD DE LA REFORMA. No gravar la creación de empleo sino las utilidades de las empresas. En esta forma se financiará garantizando el monto equivalente al que aportaban los empleadores a título de contribución parafiscal para los mismos fines

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	2 /	Fecha del informe	24/03/2020 /	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	-----	-------------------	--------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0200/2019 /
Objeto:	Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de la dorada.
Nombre Contratista:	consorcio LROX
Representante legal:	Hernán Cañas Ortiz
Fecha del contrato:	21 de Agosto del 2019 /
Plazo de ejecución:	105 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 185.337.343
Fecha de iniciación:	11 de septiembre del 2019
Fecha de suspensión:	16 de Octubre del 2019
Fecha de reiniciación:	13 de Enero del 2020 /
Fecha de terminación inicial:	24 de Diciembre del 2019 /
Nueva fecha de terminación:	21 de Abril del 2020
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlax Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	78 %
Avance físico Acumulado	78 %

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
La Dorada	acueducto	

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	135
Tiempo total transcurrido:	105
Avance Porcentual:	78 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas durante la ejecución del contrato



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 185.337.343
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 133.747.378
Porcentaje ejecutado en el periodo:	72 %
Inversión total ejecutada:	\$ 133.747.378
Porcentaje total ejecutado:	72 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado	42-45-101041476	11/09/2019	25/06/2020	\$ 55.601.202.90
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado	42-45-101041476	11/09/2019	25/03/2023	\$ 37.067.488.60
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado	42-45-101041476	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 37.087.468.60
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado	42-40-101031471	11/09/2019	25/06/2020	\$ 55.601.202.90

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
José Nelson Camacho Rusinque	x	x	x	x	x
Javier Calvo Hernández	x	x	x	x	x
Edgar francisco López Forero	x	x	x	x	x
José Guillermo López Forero	x	x	x	x	x
Jonathan Guillermo López Cardona	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
27/01/2020	N/A	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	D
28/02/2020	N/A	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	D

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

Se anexa acta de cantidades

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados todos los pobladores del municipio de la dorada caldas

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		x
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P


NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000139

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/14
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000174
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0009 ENE 10 DE 2020 - ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
019
BENEFICIARIO CONSORCIO L.R.OX.
C.C NRO 900560766

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030502	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLAN. REDES, BOCAT.	185,337,343
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		185,337,343


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto


PLAZO DE EJECUCION 351 DIAS

CONSORCIO L.R.OX.

Nit. 900.560.766-1
Responsable de Iva

**FACTURA
DE VENTA**

Nº LROX - 3

Actividad Económica 4290 CALLE 64 A 21 50 OF.1305 MANIZALES - CALDAS Teléfono: 8895121 Cel.310 415 2864 No somos Autoretenedores - No Somos Grandes Contribuyentes Actividad ICA:31001 5.00x mil			
FECHA	Manizales, 1/04/2020	NIT	890803239-9
SEÑORES	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	TEL	8867080
DIRECCION	CR 23 75 82	Manizales - Caldas	
DESCRIPCION		VALOR	
CONTRATO N°0200-2019 Reposición redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de LA DORADA - CALDAS. Grupo -VI ACTA PARCIAL II		40.058.099	
COSTO DIRECTO		29.894.104	
ADMINISTRACION 24%		7.174.585	
IMPREVISTO 5%		1.494.705	
UTILIDAD 5%		1.494.705	
Favor efectuar el pago a nombre de Consorcio LR.OX CTA.CTE. BBVA N°537 026478			
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN N° 18763000890445 FECHA: OCTUBRE 10 DE 2018 - AUTORIZACIÓN RANGOS DESDE LROX - 1 HASTA LROX - 50 VIGENCIA 18 MESES			
Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.			
Firma Autorizada,		SUBTOTAL	40.058.099
		IVA	283.994
		TOTAL	40.342.093

Firma del Cliente, _____

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: 0200 DEL 2019	ACTA No: 2	FECHA CORTE: 24 DE MARZO DEL 2020
OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	FECHA INICIACIÓN: 22 DE ENERO DEL 2020	FECHA VENCIMIENTO: 21 DE ABRIL DEL 2020
MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 185.337.343	VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO LROX	VALOR OBRA: \$ 185.337.343	FECHA: 24 DE MARZO DEL 2020
REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN CAÑAS ORTIZ	SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ	

CAMBIAR LÁMINAS EXTERNAS DEL CASCO DE LA BARCAZA SOBRE EL RÍO MAGDALENA, ADECUAR LA PROA Y QUILLA, INCLUYENDO RETIRO DE LA MISMA A TIERRA FIRME, REALIZAR SOPORTES Y SISTEMAS DE ANCLAJE PARA REALIZAR LAS REPARACIONES RESPECTIVAS Y NUEVAMENTE LLEVARLA A LA UBICACIÓN ORIGINAL TENIENDO EN CUENTA LA ALINEACIÓN CORRESPONDIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	Láminas Acero Naval 131 de 2.50 x 6.00 mtrs., para el cambio de lámina laterales, fondo y rediseño de Proa	C/U	10	\$ 4.302.421	43.024.210	10	43.024.210	0		100%
2	Angulos en acero al Carbono de 2.00 x 6.00 mtrs, para estructura diseño de Proa y compartimento bodegas.	C/U	20	\$ 112.598	2.251.980	10	1.125.980	10	1.125.980	50%
3	Tejas de Zinc # 10 Calibre 30 y Rediseño de Cerramiento, Malla Proa.	C/U	5	\$ 60.447	302.235	-	-	0	-	0%
4	Cerchas de 1.1/2" x 4" x 6.00 mtrs. Para alargar cubierta sitio de la Proa.	C/U	4	\$ 82.967	331.868	-	-	0	-	0%
5	Amarres para Teja de Zinc.	Docena	3	\$ 10.667	32.001	-	-	0	-	0%
6	Servicio de Grúa para sacar Barcaza, a terreno firmes y terminada dichas reparaciones, volverla al sitio	Global	1	\$ 28.445.760	28.445.760	0,50	14.222.880	0	-	50%
7	Servicio de Retiro para alistamiento de terreno donde se va a realizar dichas reparaciones.	Global	1	\$ 3.567.559	3.567.559	1	3.567.559	0	-	100%
8	Alineación Barcaza en el sitio de operación.	Global	1	\$ 3.555.720	3.555.720	-	-	0	-	0%
9	Anticorrosivo Primer Z8, para aplicación exterior e interior.	Galon	10	\$ 112.598	1.125.980	-	-	5	562.990	0%
10	Pintura epoxica aplicación exterior e interior	Galon	10	\$ 231.122	2.311.220	-	-	5	1.155.610	0%
11	Soldadura 6011 x 1/8	Caja	6	\$ 408.908	2.453.448	3	1.226.724	3	1.226.724	50%
12	Soldadura 7018 x 1/8	Caja	6	\$ 450.391	2.702.346	3	1.351.173	3	1.351.173	50%
13	Discos de Corte de 7"	C/U	60	\$ 17.779	1.066.740	30	533.370	30	533.370	50%
14	Discos para Pulir de 7" x 1/4	C/U	30	\$ 21.334	640.020	15	320.010	15	320.010	50%
15	Grapas de acero de 7"	C/U	25	\$ 29.631	740.775	10	296.310	15	444.465	40%
16	Pipas de Oxigeno	Pipa	6	\$ 206.232	1.237.392	3	618.696	3	618.696	50%
17	Acetileno	Pipa	4	\$ 225.196	900.784	2	450.392	2	450.392	50%
18	Tubo IMC 4" x 3 Metros	C/U	2	\$ 379.277	758.554	-	-	-	-	0%
19	Unión IMC 4"	C/U	1	\$ 35.557	35.557	-	-	-	-	0%
20	conduit flexible liquid tight de 4"	Metro	8	\$ 82.967	663.736	-	-	-	-	0%
21	Terminal conduit flexible liquid tight de 4"	C/U	4	\$ 77.041	308.164	-	-	-	-	0%

Manizales, marzo 31 de 2020

Señores,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad

ASUNTO: Entrega Documentación Acta No. 2

Cordial saludo,

Adjunto documentación requerida para el correcto tramite de la presente; correspondiente a la entrega del acta No.2 del contrato 0200 - 2019.

- Informe de Obra
- Factura de Venta LROX2
- Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales
- Planillas Paga de Seguridad social y Parafiscales
- Planillas Pago Trabajadores
- RUT – Registro Único Tributario
- Certificación Bancaria
- Autorización Retención en la Fuente
- Pagos FIC



CONSORCIO LROX
Hernán Cañas Ortiz
Rep. Legal
C.C: 4.446.625

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

INFORME DE OBRA ACTA N° 2

CONTRATO No. 0200 - 2019



FECHA:

MARZO 31 DE 2020

OBJETO:

**REPOSICIÓN DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.
GRUPO VI**

CONTRATISTA:

CONSORCIO LROX

SUPERVISOR:

ARLEX QUINTERO VASQUEZ

CONTRATO No.

0200 - 2019

ÍNDICE

	Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA	3
1.1 GENERALIDADES	3
2. AVANCE DEL CONTRATO	4
2.1 AVANCE FÍSICO	4
2.2 AVANCE FINANCIERO	4
3. INFORME CONTRATO DE OBRA	5
3.1 FRENTE DE OBRA	5
3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	5
3.2.1 Visitas de Interventoría	5
3.2.2 Control de Pólizas y Reservas Presupuestales	5
3.2.3 Aspectos logísticos	6

INDICE DE ANEXOS

ANEXO No. 1	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO No. 2	PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO No. 3	CERTIFICADO BANCARIO
ANEXO No. 4	FACTURA

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se ejecutó mediante el contrato de obra No. 0200 de 2019, el cual corresponde al objeto **REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. GRUPO VI**, “Cambiar laminas externas del casco de la barcaza sobre el río Magdalena, adecuar la proa y quilla, incluyendo retiro de la misma a tierra firme, realizar soportes y sistemas de anclaje para realizar las reparaciones respectivas y nuevamente llevarla a la ubicación original teniendo en cuenta la alineación correspondiente”

1.1 GENERALIDADES

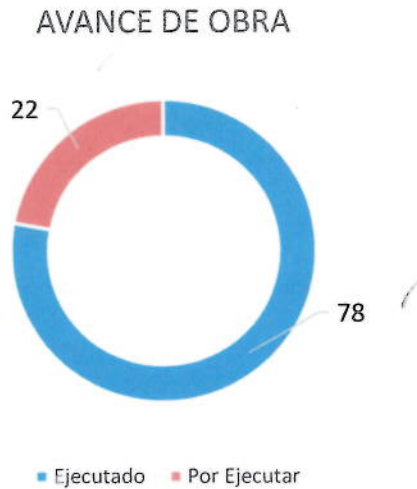
**TABLA No 1
DATOS BÁSICOS CONTRATO DE OBRA**

Número del contrato:	0200 de 2019 ✓
Objeto	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. GRUPO VI
Nombre Contratista	CONSORCIO LROX
Fecha del contrato	Agosto 21 de 2019 ✓
Plazo de Ejecución	105 días
Valor Inicial	Ciento ochenta y cinco millones trescientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos (\$ 185'337.343) ✓
Valor presente Acta	Cuarenta millones trescientos cuarenta y dos mil noventa y cuatro pesos (\$ 40'342.094)
Valor total del contrato	Ciento ochenta y cinco millones trescientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos (\$ 185'337.343)
Fecha de iniciación	Diciembre 31 de 2019 ✓
Suspensión No. 01	Octubre 16 de 2019 – Noviembre 16 de 2019
Suspensión No. 02	Noviembre 15 de 2019 – Diciembre 15 de 2019
Suspensión No. 03	Diciembre 13 de 2019 – Enero 13 de 2020
Fecha de Reinicio	Enero 13 de 2020
Interventor / Supervisora	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

2. AVANCE DEL CONTRATO

2.1 AVANCE FÍSICO

Avance Físico Acumulado 78 %



2.2 AVANCE FINANCIERO

La presente contempla el avance de la presente acta, el Contratista adelantó su etapa de construcción de obra en los diferentes puntos del contrato. El avance financiero a la fecha es del 78 %.

Tabla 1. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Valor Total del Contrato	\$ 185'337.343.00
Valor ejecutado Acta No. 1	\$ 93'405.284.00
Valor ejecutado Acta No. 2	\$ 40'342.094.00
Porcentaje ejecutado en el periodo	78 %
Porcentaje Restante por ejecutar	22 %

3. INFORME CONTRATO DE OBRA

3.1 FRENTE DE OBRA

Durante la ejecución del presente proyecto se terminaron todas las actividades referentes a cambiar laminas externas del casco de la barcaza sobre el rio Magdalena, adecuar la proa y quilla, incluyendo retiro de la misma a tierra firme, realizar soportes y sistemas de anclaje para realizar las reparaciones respectivas.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas:

SUMINISTRO DE MATERIALES: A la fecha se viene realizando el suministro constante de todos los materiales necesarios para su correcta instalación.

OTRAS ACTIVIDADES: Se termino la elaboración de la estructura y compartimientos de la proa, al igual que la reparación y cambio de láminas deterioradas en todo el recorrido de la embarcación.

PINTURA Y ACABADOS: A la fecha se viene realizando todas las adecuaciones finales en la estructura y la pintura de la misma.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.2.1 Visitas de Interventoría

El contratista en compañía de supervisión realizó acompañamiento a todos los procesos constructivos, mediante visitas técnicas para la revisión de los aspectos técnicos y administrativos del contrato.

3.2.2 Control de Pólizas y Reservas Presupuestales

Una vez firmado el contrato de obra y el acta de reinicio, el contratista a entregado todas las pólizas a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., las cuales se describen a continuación:

3.2.3 Ampliación Contrato

Según comunicados verbales y presenciales, a la fecha se espera documento que referencia la presente prórroga del contrato según lo determinado y ejecutado en obra.

**TABLA No 7
VIGENCIA DE PÓLIZAS Y AMPAROS**

Garantías	Nombre Aseguradora	No. Póliza	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento	Seguros del estado	42-45-101041476	11/09/2019	25/06/2020	\$ 55.601.203.00
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del estado	42-45-101041476	11/09/2019	25/03/2023	\$ 37.067.469.00
Estabilidad de la obra	Seguros del estado	42-45-101041476	Si ampara 5 años		\$ 37.067.469.00
Predios Labores y Operaciones	Seguros del estado	42-40-101031471	11/09/2019	25/06/2020	\$ 55.601.203.00

3.2.4 Aspectos logísticos**Personal Técnico y Administrativo:**

Se cuenta con todo el personal profesional electro mecánico idóneo para la realización de los trabajos y además se cuenta con un equipo de trabajo en oficina como secretaria, contador, etc.



CONSORCIO LROX
Hernán Cañas Ortiz
Rep. Legal

**ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRÁFICO**








**CERTIFICACIÓN
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **HERNÁN CAÑAS ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.446.625 de Marmato - Caldas, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO LROX, identificado con Nit 900.560.766-1, Bajo Juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Manizales, a los 30 días del mes de marzo de 2020


HERNAN CAÑAS ORTIZ
C.C 4.446.625
REPRESENTANTE LEGAL
L.R. AMBIENTAL S.A.S

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900560766
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO L.R. OX. ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 70 No. 23 B 41
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8871000
Correo electrónico	oxfaropp@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0200 ✓
Nombre Obra	REPOSICION REDES DORADA ✓
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	31/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020 ✓
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$185,337,343.00
Costo Total Mano de Obra	\$15,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$131,670.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Total Pagado	\$131,670.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65358959
Fecha de Creación	16/03/2020 02:58:29 p.m.
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Número de Confirmación/CUS	579779699
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900560766	1	CONSORCIO L.R.OX	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 44 A.21 50	MANIZALES-CALDAS	8895121	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	9404016774	56007683	E	2020/03/16	2020/03/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$1.397,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes													
			ing	ret	ide	lae	ide	tap	vsp	cor	vet	sin	lge	lma	vac	avp	vet	in	vip	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias		IBC	Codigo	Dias	IBC									
1	CC	3131657	CALVO HERNANDEZ JAVIER															230301	4	\$117,041	\$18,800	EP5044	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	\$117,041	\$4,700	14-4	4	\$117,041	\$8,200	14-4	4	\$117,041	\$8,200	50	50	\$0	50	\$0	50	\$36,400
2	CC	3131373	CAMACHO RUSHINQUE JOSE NELSON															230301	30	\$877,803	\$140,300	EP5044	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$61,000	14-4	30	\$877,803	\$61,000	50	50	\$0	50	\$0	50	\$272,000
3	CC	10168781	LOPEZ FORERO EDUAR FRANCISCO															25-14	30	\$877,803	\$140,300	EP5044	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$61,000	14-4	30	\$877,803	\$61,000	50	50	\$0	50	\$0	50	\$272,000
4	CC	1054563726	LOPEZ CARDONA JONATHAN GUILLEN															230301	30	\$877,803	\$140,300	EP5037	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$61,000	14-4	30	\$877,803	\$61,000	50	50	\$0	50	\$0	50	\$272,000
5	CC	19275083	LOPEZ FORERO JOSE GUILLERMO															25-14	30	\$877,803	\$140,300	EP5037	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$61,000	14-4	30	\$877,803	\$61,000	50	50	\$0	50	\$0	50	\$272,000
6	CC	3131780	RIEALDO VELASQUEZ NOANI															25-14	30	\$877,803	\$140,300	EP5037	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$61,000	14-4	30	\$877,803	\$61,000	50	50	\$0	50	\$0	50	\$272,000
Total		Affiliados(6)																		\$4,556,056	\$771,300			\$4,556,056	\$180,700			\$4,556,056	\$180,700			\$4,556,056	\$313,700			\$4,556,056	\$313,700	50	50	\$0	50	\$1,397,800		

PLANILLA EMPONCALDAS - 0200
FEBRERO 24 AL 8 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DEL TRABAJADOR	SUELDO BASICO	DIAS LEVANTADOS	SUELDO BASICO QUINCENAL	SUB. TRANSP.	TOTAL DEVENGADA	DESCUENTOS			TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	ESTADO
						PENSIÓN	SALUD	SALUD			
JAVIER CALVO HERNANDEZ	\$ 877.803	4	\$ 117.040	\$ 402.854	\$ 218.884	\$ 4.682	\$ 4.682	\$ 9.363	\$ 210.531	PAGADO	
JOSE NELSON CAMACHO RUSINQUE	\$ 877.803	14	\$ 408.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 478.724	PAGADO	
EDGAR FRANCISCO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	14	\$ 408.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 478.724	PAGADO	
CONRATAN GUILLERMO LOPEZ CARDONA	\$ 877.803	14	\$ 408.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 478.724	PAGADO	
JOSE GUILLERMO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	14	\$ 408.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 478.724	PAGADO	
YOANNIR FALDO VELASQUEZ	\$ 877.803	14	\$ 408.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 478.724	PAGADO	
TOTALES			\$ 2.165.247	\$ 817.124	\$ 2.782.371	\$ 85.810	\$ 85.810	\$ 173.220	\$ 2.609.152		

PLANILLA EMPOCALDAS - 0200
MARZO 9 AL 22 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DEL TRABAJADOR	SUELDO BASICO	DIAS LICENCIADOS	SUELDO BASICO QUINCENAL	SUB. TRANSP.	TOTAL DEVENGAD D	DESCUENTOS			TOTAL DEDUCCIONE \$	NETO PAGADO	ESTADO
						PENSION	SALUD	SALUD			
1. JOSE NELSON CAMACHO RUSINOUE	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	PAGADO	
2. EDGAR FRANCISCO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	PAGADO	
3. JONATAN GUILLERMO LOPEZ CARDONA	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	PAGADO	
4. JOSE GUILLERMO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	PAGADO	
5. YONIRIPALDO VELASQUEZ	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	PAGADO	
TOTALES			\$ 2,049,207	\$ 514,270	\$ 2,562,477	\$ 64,928	\$ 64,928	\$ 129,857	\$ 2,398,620		

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO L.R.OX.** identificado(a) con número **900.560.766** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130537000100026478** aperturada el **23 de octubre de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **537026478**
10 dígitos: **0537026478**
16 dígitos: **0537000100026478**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **26 de febrero de 2020** a las **10:48**, con destino a **Quien Interece**.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DE COLOMBIA
100-000



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



CONSORCIO LROX

Manizales – Caldas

Marzo 30 del Año 2020

Señores:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO N° 0200 DE 2019

Por medio de la presente autorizo a **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, para que realice la retención en la fuente correspondiente a la factura anexa a los documentos del proceso de la referencia.

Atentamente,



LR AMBIENTAL SAS

Hernán Cañas Ortiz

Rep. Legal

