

Contratación

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-30
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS		Versión: 06 2022-08-16


# CONTRATO Y AÑO	Acto 037 DE 2023	Acta N.º	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	48.380.274
				2. VALOR ADICIÓN (+)		
CONTRATISTA	FUTUREENERGY S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	48.380.274
NIT O CC:	901,110,079-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
CDP (#, rubro y fecha)	20230704 - 2320101001030812 - 26/07/2023 20230809 - 2320101001030812 - 05/09/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	48.380.274
RP (#, rubro y fecha)	973 - 2320101001030812 - 08/09/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	-

OBJETO DEL CONTRATO: Desmonte de transformador existente, suministro, transporte e instalación de transformador nuevo de 75 KVA a 33 KVA/220 - 120v trifásico en el municipio de Victoria.

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GIN-02		X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05		X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTOS VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
4- Informe del Supervisor.		X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		X	
7- Certificado de calidad del producto.		N/A	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)		N/A	
9- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

Mo. PATTY
24-10-2023
S: 25 p

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	F-GC-30 Versión: 06 2022-08-16
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 24/10/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.	INSPECTOR ELECTROMECAÁNICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
859-000014-81	Bancolombia	Corriente
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



Empocaldas @empocaldas_oficial
empocaldas@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO No.1 Final

CONTRATO No 037 DE SEPTIEMBRE 07 DE 2023

OBJETO DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 75 KVA A 33 KVA/220 - 120V TRIFÁSICO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.

CONTRATISTA FUTUREENERGY S.A.S

NIT 901110079-1

VALOR \$ 48.380.274 IVA INCLUIDO.

PLAZO 5 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

Prorroga 1 10 DIAS CALENDARIO

Prorroga 2 12 DIAS CALENDARIO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez y nueve (07) días del mes de Octubre de 2023, se reunieron OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE, Inspector Electromecánico, como Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P y ADRIANA MARIA VARGAS representante legal de FUTUREENERGY S.A.S, con el fin de realizar el acta de recibo No.1 y final.

VALOR ACTA	\$ 48.380.274 INCLUIDO IVA
NO SE CONCEDIO ANTICIPO	
VALOR TOTAL ACTA	\$ 48.380.274 INCLUIDO IVA
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron

OSCAR EDUARDO CLAVIJO.
Inspector Electromecánico
Supervisor Acto 037 de Septiembre 07
de 2023.

ADRIANA MARIA VARGAS
Representante legal

IBG Caja	Aportes Planilla	Aportes Salud	Aportes Bilingüe	Aportes Cajas	Aportes Sane	Aportes ICIF	Aportes BSAJ	Aportes Min. Educación	Responsables (PDR - a Part)	Responsables (PDR - a Part) EP*	BUNTOTAL BN ANTIGÜEDAD MONA	TOTAL INTERESER (2% MONA)	TOTAL PMAIL
5 772 001	\$ 1 108 200	\$ 311 600	\$ 827 700	\$ 371 600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2 339 100	\$ 8 200	\$ 2 347 300

FUTUREENERGY S.A.S

NIT: 901110079-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 11 D 47 L 48, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 0000000

Email. futureenergy.gerencia@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764039327536 válida desde 2022-11-09 hasta 2023-11-09 rango desde E51 hasta E100.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A.
NIT :	890803239
Dirección:	CR 23 75-82, Manizales, Caldas, Colombia, CP 17001
Teléfono:	6068866966
Email:	facturacionelectronica@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	18/10/2023
Total de Líneas:	6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		E92
MONEDA:	COP Colombia, Pesos	
HORA EMISIÓN:	09:52:33	
FECHA FIRMADO:	18/10/2023 09:52:35	
FECHA DE EMISIÓN		
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
18	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	VOLOR BRUTO	VALOR BRUTO Desmote de transformador existente Suministro, Transporte e Instalación de Transformador Nuevo de 75 Kv a 33 Kv 220 - 120 V Trifásico. Incluye desmote con Brazo Grúa en el municipio de Victoria (Caldas)	94	1,00	\$42.810.300,00		0,00	\$42.810.300,00
2	VOLOR BRUTO	VALOR BRUTO Suministro e instalación de Pararrayos de 45 Kva	94	3,00	\$350.000,00		0,00	\$1.050.000,00
3	VOLOR BRUTO	VALOR BRUTO Suministro e instalación de Cajas Primarias	94	2,00	\$500.000,00		0,00	\$1.000.000,00
4	VOLOR BRUTO	VALOR BRUTO Suministro e Instalación de Cable Ecológico para cambiar puentes eléctricos en sub estación	LM	30,00	\$35.000,00		0,00	\$1.050.000,00
5	ADMON	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 3%	94	1,00	\$1.377.309,00		0,00	\$1.377.309,00
6	UTI	UTILIDAD UTILIDAD 2%	94	1,00	\$918.206,00	19,00	0,00	\$918.206,00

Notas:	Subtotal:	\$48.205.815,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cuarenta y ocho millones trescientos ochenta mil doscientos setenta y cuatro pesos catorce centavos)	IVA:	\$174.459,14
CUFE: a61c8107ab9a0e52dbe7e4f287ca3384f247a36e547e6f80cd3665770c476a71a772714a6940e06bac16af3239c378b6	Total:	\$48.380.274,14

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$918.206,00	19,00%	\$174.459,14

Firma Digital: R3BV/QO0/kQBWAeyT7IX5VICn321AVA4SgXFUjvgeFu+qhTXDYENj1nqy0xwI MqLeDvV182DNoWWFRXV/0a9b1MkEoOx4asiUjqp8XUIK5A0S8G ZI7RkaVP33eUu5 2jNtaT25hiRN+zDrjM1PSJlwSV3ih+s6rNsQEeZ8Lb2o5y7ynqm0l+E/mA1O96 UpNj25Pi+uswcDq3Pt3fPij7zPIJNDVALg hWOqJJs1f5uLg8MdB/Vg/7CUqLu7/ bz5BiiOWKbQDTRYI/254xadOoOg8IXD83KYoxXM6U9pyys4FQFTsXQy4hmQ8qA/ 0M6a6J0J/Pjo/Ml6FLIPY 7Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

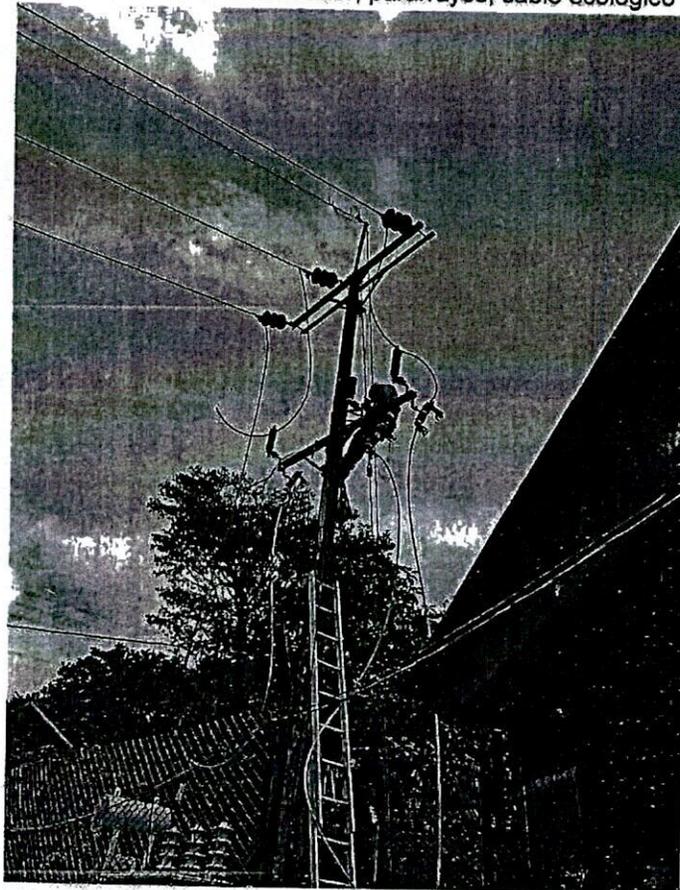


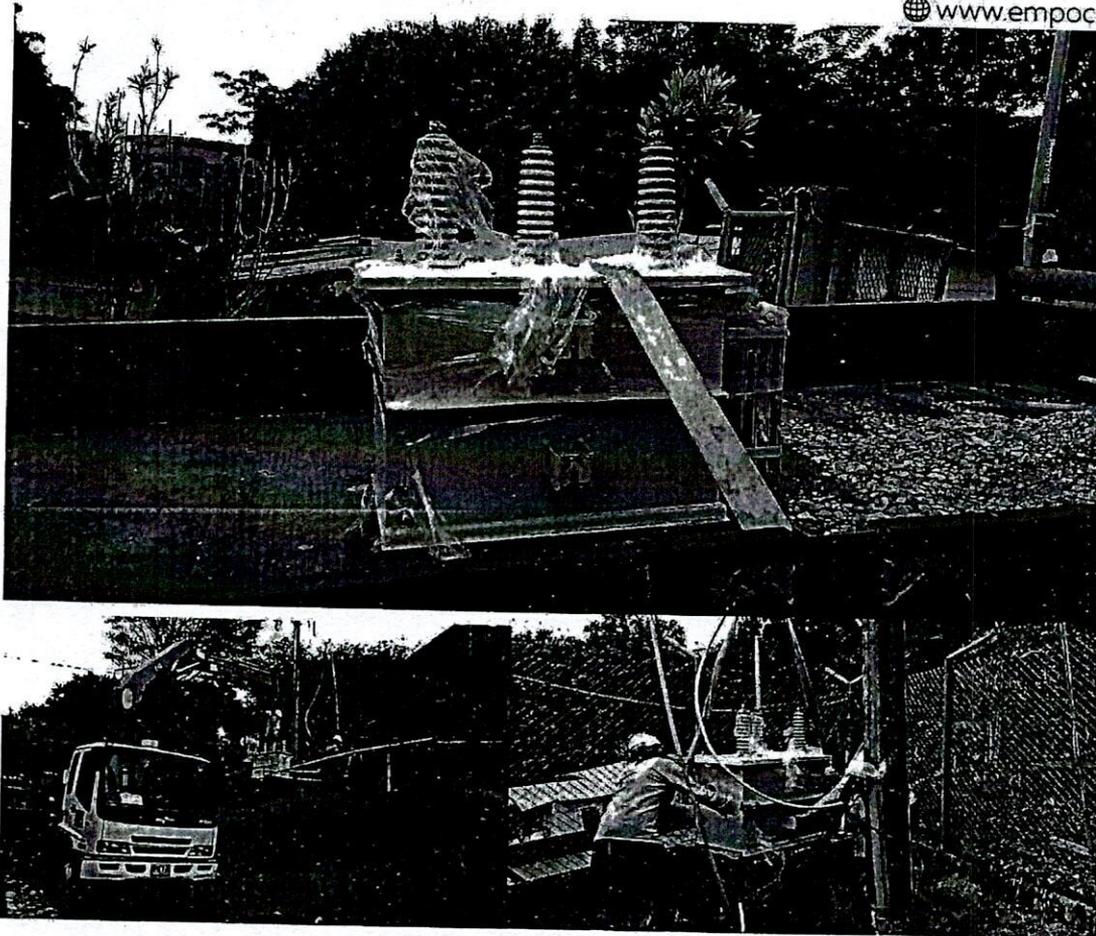
INFORME DE ACTIVIDAD ACTO 037 DE 2023.

OBJETO	DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 75 KVA A 33 KVA/220 - 120V TRIFÁSICO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.
--------	---

De acuerdo al suministro realizados por el contratista LUIS FUTUREENERGY S.A.S, puedo constatar que fue ejecutado a satisfacción la siguiente actividad: Suministro, instalación de 1 transformador de 75 KVA, 3 pararrayos, 2 cajas primarias y 30 metros de cable ecológico para la Ptar Victoria.


1. Suministro e instalación de transformador, pararrayos, cable ecológico y cajas primarias.






La Dorada, Octubre 10 de 2023

Atentamente,


OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.
Inspector Electromecánico.
Supervisor Acto 037/2023.

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	FUTUREENERGY SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9011100791	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-10-13
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	37/2023	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE		
CARGO:	Inspector Electromecánico		
FIRMA:			

	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P NIT 890.803.239-9 INGRESO	CODIGO : F-GIN-09
		FECHA VIGENCIA : 2023-01-01
		VERSION : 01
		Página : 1 de 1

CONCEPTO :		NUMERO : 168
ACTO 037/2023 ACTA 1 Y FINAL SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR, TRANSPORTE E INSTALACION CDP704., FUTUREENERGY SAS E89.		FECHA : 18/10/2023
NIT/ CC : 901110079	NOMBRE : FUTUREENERGY S.A.S	
TELEFONO:NA	DOMICILIO Carrera 11 D 47 L 48 Brr El Caribe	
	MAIL futureenergy.gerencia@gmail.com	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1165501016447	Transformador 75 KVA a 33,000 kv 220/120v	Suministros	01 PRINCIPAL MANIZALES	UNIDAD	1	42,810,300.00	42,810,300.00
2	1151801016448	Pararayos de 45KVA	Suministros	01 PRINCIPAL MANIZALES	UNIDAD	3	350,000.00	1,050,000.00
3	1151801016449	Cajas primarias 33,000 KV	Suministros	01 PRINCIPAL MANIZALES	UNIDAD	2	500,000.00	1,000,000.00
4	5511114016450	Cable ecologico	Suministros	01 PRINCIPAL MANIZALES	UNIDAD	30	35,000.00	1,050,000.00
5	1990105015036	TRANSPORTE	Suministros	01 PRINCIPAL MANIZALES	UNIDAD	1	1,377,309.00	1,377,309.00
6	5511190016422	Adecuaciones	Suministros	01 PRINCIPAL MANIZALES	UNIDAD	1	1,092,665.14	1,092,665.14
						CANTIDAD: 38	TOTAL \$:	48,380,274.14


 Jefe Seccion Suministros

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

18-10-2023 18-10-2023 E E92 Factura electrónica 901110079 FUTUREENERGY S.A.S 890603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica 548,360,274
