

Jurídica


# CONTRATO Y AÑO	00180 DE 2017	Acta N°	/ FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AITU e IVA)	44.208.720	/
				2. VALOR ADICION (+)		
CONTRATISTA	AQUA COLOMBIA EV LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	44.208.720	
NIT O CC:	900.137.321-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00205 DE ENERO 16 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.700.458	/
RP (#, rubro y fecha)	000170 DE ENERO 16 DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	24.508.262	/
OBJETO DEL CONTRATO:	OPTIMIZACIÓN SEDIMENTADOR B. DOS COMPARTIMIENTOS PTAP EL LLANO ACUEDUCTO LA DORADA, CALDAS.-					

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	/
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	X	
3- Pagos al FIC	X	/
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	/
5- Informe de actividades o Bitácora.	N/A	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	✓
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

17/02/18
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓	
Factura original o documento equivalente	X	
Acta original	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Copia del Registro Presupuestal	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARFL ROSAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
Cuenta	TIPO DE CUENTA	BANCO

88 Pg 22 9:40 am



NIT: 900.137.321-3

IVA REGIMEN COMUN- AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762005647849- FECHA: 2017/11/14 -NUMERACIÓN HABILITADA DEL 984 AL 1100 - ACTIVIDAD ECONOMICA 4390.

SEÑORES :	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	FECHA FACTURACION				FECHA VENCIMIENTO				FACTURA DE VENTA	
NIT:	890.803.239-9	05	02	2018	28	02	2018	No	989		
CUIDAD	Manizales - Caldas	DIRECCION:				Carrera 23 No. 75-82					
		TELEFONO:				(6) 8867080					

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
26,51	Desmontaje y retiro de Placas de cemento de 2.40m x 1.2m en los sedimentadores, incluye transporte para la evacuación de las Placas y disposición en un sitio autorizado.	26.000,00	689.260,00
26,51	Suministro, transporte e instalación Módulos de sedimentacion Acelerada, tipo Colmena de sección hexagonal de 6cm x 6cm color negro de h= 1,04 m en la vertical, formando un angulo de 60° con la horizontal en polietileno Cal 40 en color azul o negro. Incluye soportes en canal C de 4" de acero al carbón recubrimiento en fibra en vidrio incluye chazos expansivos de 3/8" * 3" en acero.	500.000,00	13.255.000,00
1	Transporte.	1.100.000,00	1.100.000,00

FACTURA DISEÑADA E IMPRESA POR AQUA COLOMBIA EV LTDA. NIT: 900 137 321-3


OBSERVACIONES: ACTA FINAL SEGÚN CONTRATO NO. 0180 DE AGOSTO 16 DE 2017.	TOTAL COSTO DIRECTO.	\$ 15.044.260,00
	ADMINISTRACION 20%	\$ 3.008.852,00
SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.	IMPREVISTOS 5%	752.213,00
	UTILIDADES 5%	\$ 752.213,00
	IVA 19%/UTILIDAD 5%	142.920,00
	VALOR TOTAL	\$ 19.700.458,00

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun art:774 del codigo de comercio.

AQUA COLOMBIA EV LTDA	ACEPTADA
 _____ FIRMA Y SELLO CC- NIT	_____ FIRMA Y SELLO- CC. NIT

Carrera 28B No 76 - 37

Tel: 2509181 - 3108046 - E-mail:aqua_colombia@yahoo.es Bogota D.C - Colombia



NIT: 900.137.321-3

Bogotá D.C., 23 de enero de 2018

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales - Caldas

Respetados Señores:

El suscrito Representante Legal de la empresa **AQUA COLOMBIA EV LTDA**, identificada con Nit No. 900.137.321-3, hace constar que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar de sus trabajadores, dando así cumplimiento con lo establecido en el contrato No. 0180 de 2017 suscrito con **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Cordialmente,

JAVIER ERNESTO GOENAGA POLO
Representante Legal
Aqua/Colombia EV Ltda

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Bogotá D.C., 15 de enero de 2018


Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales - Caldas

Respetados Señores:

El suscrito Revisor Fiscal certifica que la firma **AQUA COLOMBIA EV LTDA**, identificada con Nit No. 900.137.321-3, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones pendientes provenientes del Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

Lo anterior, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



HENRY IDARRAGA MARTIN
Revisor Fiscal
C.C. No. 19.264.389 de Bogotá
TP- 23135-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8EAA50P0A5B900FA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HENRY IDARRAGA MARTIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19264389 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 23135-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Febrero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2018-01-16, 03:07:16 PM | Tipo Planilla: I | Número Planilla: 35651781 | Período Cotización: 201801 | Cliente: Periodo Servicio 201801

PAGADA 2018-01-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN JOSE VILLANUEVA SAN JUAN		Dirección	CALLE 91 # 75A-26 PISO 1	
Documento	CC 3719570	Teléfono	3452560		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados: 1	
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ATLANTICO		
Ciudad	BARRANQUILLA	Identificación	CC 3719570		
Representante Legal	IVAN JOSE VILLANUEVA SAN JUAN				

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3719570	Residente	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotización	01 05	Extranjero	IVAN JOSE VILLANUEVA SAN JUAN		8001000 - 08		ATLANTICO

Días AFP	0	Días EPS	30	Días ARP	30	Días CCF	0
Salario	\$ 781.242						

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Código AFP:	NINGUNA AFP						
Código AFP Traslado:	NINGUNA AFP						
IBC AFP	\$ 0						
Total Cotización AFP:	\$ 0						
Fondo Solidaridad Pensional	\$ 0						
Fondo Solidaridad Pensional Subsistencia	\$ 0						
Tarifa AFP	0 %						

Código GCF:	NINGUNA CCF						
IBC CCF:	\$ 0						
Aporte CCF:	\$ 0						
Tarifa CCF:	0 %						

Código EPS:	MEDIMAS EPS						
Código EPS Traslado:	MEDIMAS EPS						
IBC EPS	\$ 781.242						
Aporte EPS	\$ 97.700						
Aporte UPC	\$ 0						
Tarifa Salud	12.5 %						
Responsable UPC							

Código EPS:	ARL SURA						
Código EPS Traslado:	ARL SURA						
IBC ARP	\$ 781.242						
Aporte ARP	\$ 54.000						
Tarifa ARP	6.960 %						
Clase de Tarifa ARP	5						

Tarifa Ministerio	0 %
Tarifa ICBF	0 %
Tarifa SENA	0 %
Tarifa ESAP	0 %

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
															0



AQUA COLOMBIA E. V LTDA

NIT 900.137.321-3

DEBE A:

IVAN JOSE VILLANUEVA SAN JUAN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.719.570 expedida en Baranoa (Atlántico) la suma de **\$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.)** por concepto de Mano de Obra por Optimización Sedimentador B en la Planta el Llano ubicada en la vereda el Llano (Municipio de Victoria) por los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2017.

Cordialmente;

Ivan Villa. San Juan

IVAN JOSE VILLANUEVA SAN JUAN

C. C 3. 719. 570

Teléfono: 3104306242



RECIBO	
Pagado por: AQUA COLOMBIA E.V LTDA NIT: 900.137.321-3	Pagado a: IVAN JOSE VILLANUEVA SAN JUAN Cedula : 3.719.570
DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD
Instalación y limpieza de módulos de sedimentación de sedimentadores B en la planta ubicada en la vereda el llano, municipio de la victoria, La Dorada Caldas.	3076923
SUBTOTAL	-
DESCUENTO(S)	-
RETENCION 2.5%	76.923
TOTAL	\$ 3.000.000
Fecha: 20/12/2017	Recibido por: Iván Villanueva

Ivan Villanue. San Juan
C.C. 3.719.570

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA
60506762

FECHA DE EXPEDICIÓN
19 01 2018

FECHA VENCIMIENTO
24 01 2018


Primer Nombre ó Razón Social :
AQUA COLOMBIA EV LTDA

Primer Apellido :

Identificación :
900137321

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$36,000.00
TREINTA Y SEIS MIL	SUBTOTAL	\$36,000.00
	IVA	
	TOTAL →	\$36,000.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)60506762(3900)036000(96)20180124

BANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 22-01-2018 10:37 Costo: 0.00
 Conv: 29232 - SENAFIC DOLIBO DE BARRA
 Suc: 033 - PULO CLUB
 Cuid: 808031A
 Caj: 003 Sec: 495
 Valor Tot: \$ 36,000.00
 Forma de Pago Efectivo \$ 36,000.00
 Pagador: 900137321
 Ref: 60506762



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60506762

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 900137321 Telefono:

Nombre del Pagador /Cliente: AQUA COLOMBIA EV LTDA

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$36,000.00

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 900137321

Primer Nombre ó Razón Social: AQUA COLOMBIA EV LTDA

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): 3

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CUNDINAMARCA

Ciudad Capital: BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio: CR 28B 76 37

Ciudad de Domicilio: BOGOTA

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 3108046

Correo electrónico: aqua_colombia@yahoo.es

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Bogotá D.C.

Regional Centros SIIF: 36-02-00-011-000000

Número Licencia o Contrato Obra: 0180-2017

Nombre Obra: OPTIMIZACION SEDIMENTADOR B

Fecha Inicio Obra: 05/10/2017

Fecha Terminación Obra: 20/12/2018

Ciudad de Ejecución de la Obra: LA DORADA - CALDAS

Tipo FIC: Costo Total Mano de Obra

Año Periodo a Pagar: 2017

Mes Periodo a Pagar: DICIEMBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$19,700,458.00

Costo Total Mano de Obra: \$1,200,000.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 1

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$12,000.00

Aporte SENA: \$24,000.00

Valor del Pago: \$36,000.00

Total Pagado: \$36,000.00

Nro. Transacción eCollect: 60506762

IP Origen: 186.84.9.243

Valor Total: \$36,000.00


Fecha de Proceso: 22/01/2018 12:00:00 a.m.

Entidad Autorizadora: **BANCOLOMBIA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Número de Confirmación: **000000**

Usted puede descargar el documento en el siguiente link. [Clic aquí.](#)



NIT: 900.137.321-3



IVA REGIMEN COMUN- AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762005647849- FECHA: 2017/11/14 -NUMERACIÓN HABILITADA DEL 984 AL 1100 - ACTIVIDAD ECONOMICA 4390.

SEÑORES :	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	FECHA FACTURACION						FECHA VENCIMIENTO			FACTURA DE VENTA	
NIT:	890.803.239-9	05	02	2018	28	02	2018	No		989		
CIUDAD	Manizales - Caldas	DIRECCION: Carrera 23 No. 75-82						TELEFONO: (6) 8867080				

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
26,51	Desmontaje y retiro de Placas de cemento de 2.40m x 1.2m en los sedimentadores, incluye transporte para la evacuación de las Placas y disposición en un sitio autorizado.	26.000,00	689.260,00
26,51	Suministro, transporte e instalación Módulos de sedimentación Acelerada, tipo Colmena de sección hexagonal de 6cm x 6cm color negro de h= 1,04 m en la vertical, formando un angulo de 60° con la horizontal en polietileno Cal 40 en color azul o negro. Incluye soportes en canal C de 4" de acero al carbón recubrimiento en fibra en vidrio incluye chazos expansivos de 3/8" * 3" en acero.	500.000,00	13.255.000,00
1	Transporte.	1.100.000,00	1.100.000,00

OBSERVACIONES: ACTA FINAL SEGÚN CONTRATO NO. 0180 DE AGOSTO 16 DE 2017. SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.	TOTAL COSTO DIRECTO.	\$ 15.044.260,00
	ADMINISTRACION 20%	\$ 3.008.852,00
	IMPREVISTOS 5%	752.213,00
	UTILIDADES 5%	\$ 752.213,00
	IVA 19%/UTILIDAD 5%	142.920,00
	VALOR TOTAL	\$ 19.700.458,00

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio seguna art:774 del codigo de comercio.

AQUA COLOMBIA EV LTDA  FIRMA Y SELLO CC- NIT	ACEPTADA  FIRMA Y SELLO- CC. NIT
--	--

Carrera 28B No 76 - 37

Tel: 2509181 - 3108046 - E-mail:aqua_colombia@yahoo.es Bogota D.C - Colombia

FACTURA INGRESADA E IMPRESA POR AQUA COLOMBIA EV LTDA. NIT. 900.137.321-3

Bogota, Julio 13 de 2017

Señores:
AQUA COLOMBIA EV LIMITADA
Att. ALVARO LUIS NAVARRO DE_LA_ROSA
KR 32 76 37
BOGOTA

Asunto: Apertura Cuenta de Ahorros Persona Jurídica

Estimados señores:

Bienvenidos al Banco Caja Social. Para nosotros, y en particular para esta oficina, es muy grato contar con su vinculación mediante la Cuenta de Ahorros No. **24075218940**.


Medio de manejo:
Talónario No/Rango 100013383870001-0020

Su nueva cuenta les brinda múltiples beneficios:

- Disponibilidad de sus recursos cuando los necesiten, en las oficinas del Banco.
- Acceso al detalle de los movimientos de su cuenta en el extracto.
- Liquidación y capitalización diaria de intereses.
- Consignaciones en efectivo y cheque, y manejo de remesas al cobro.
- Consignaciones y retiros en todas las oficinas del país.
- Consultas y transacciones en nuestro portal de Internet Empresarial.
- Amparo de su producto por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para más información www.bancocajasocial.com

Con el fin de darles a conocer las comisiones que aplican a su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones.

Les agradecemos habernos escogido como su opción bancaria y esperamos que disfruten los beneficios de nuestros productos y servicios, en una fructífera relación comercial de largo plazo.

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	DICIEMBRE 20 de 2017.	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	--------------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0180 DE 2017
Objeto:	OPTIMIZACIÓN SEDIMENTADOR B- DOS COMPARTIMIENTOS PTAP EL LLANO ACUEDUCTO LA DORADA, CALDAS.-
Contratista:	AQUA COLOMBIA EV LTDA
Representante Legal.	JAVIER ERNESTO GOENAGA POLO
Fecha del contrato:	AGOSTO 16 DE 2017
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45)DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 44.208.720,00
Fecha de iniciación:	OCTUBRE 05 DE 2017 ✓
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	NOVIEMBRE 18 DE 2017
Nueva fecha de terminación: Según Prorroga No. 2	DICIEMBRE 20 DE 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	44.56%
Avance físico Acumulado	44.56%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	77
Tiempo total transcurrido:	77
Avance Porcentual:	100%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRÁFICO

AR

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

En la Planta del Llano los sedimentadores presenta las placas de asbesto cemento se encuentra en muy mala condiciones de deterioro se necesita ser reemplazadas lo mas pronto posible por el peligro en el momento del lavado, con riesgo para el personal que hace esta actividad frecuentemente.

-Y se afectaría el proceso Clarificación del agua vital para el consumo humano, es de vital importancia Contratarse la colocación de panales plásticos, para reemplazar las placas de asbesto Cemento en males condiciones..

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El proceso consiste en desmote las placas de Asbesto cemento y colocarse los panales tipo colmena en el Área de los Sedimentadores donde las Placas están en malas condiciones y que este caso se proyecto dos y que al final solamente se intervino un solo compartimiento por la dificultad que encontró el contratista para adquirir la materia prima según versión del contratista.

-Por el suministro al contratista de la materia prima "Módulos plásticos tipo Colmena el contratista solicito en dos ocasiones Prorrogas de tiempo siendo la segunda prórroga hasta el 20 de diciembre de 2017, previa las legalizaciones respectivas para estos caso.

-Por las dificultades en conseguir la materia prima, el contratista solamente cambio un solo modulo de 4,82 x 5.50 m, donde solo se ejecuto el 44,56% del Valor Total del Contrato, quedando pendiente por cambio tres sedimentadores.


1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	44.208.720
Inversión ejecutada en el periodo:	44.56%
Porcentaje ejecutado en el periodo:	44.56%
Inversión total ejecutada:	19.700.458
Porcentaje total ejecutado:	44.56%

2.1.-CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros del Estado S.A	12-44-101159100	05/10/2017	20/12/2020	\$ 8.841.744,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado S.A	12-44-101159100	05/10/2017	05/10/2022	\$ 8.841.744,00
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A	12-44-101159100	05/10/2017	20/03/2018	\$ 13.262.616,00

Handwritten signature/initials

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL				

Responsabilidad Civil	Seguros del Estado S.A	12-40-101033527	05/10/2017	20/03/2018	\$ 13.262.616,00
-----------------------	------------------------	-----------------	------------	------------	---------------------

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial					
Ayudante Práctico					
Ayudante	x	X	X	X	X

**3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)**

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)


Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MAYO 22 DE 2107	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

AJP

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---



ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OPTIMIZACIÓN SEDIMENTADOR B, DOS COMPARTIMIENTOS PTAP EL LLANO ACUEDUCTO LA DORADA, CALDAS.-
LOCALIZACION: EL LLANO VICTORIA.
CONTRATISTA: AQUA COLOMBIA EV LTDA.CER LTDA.
CONTRATO: 00180 DE AGOSTO 16 DE 2017
FECHA INFORME: ENERO 18 DE 2018



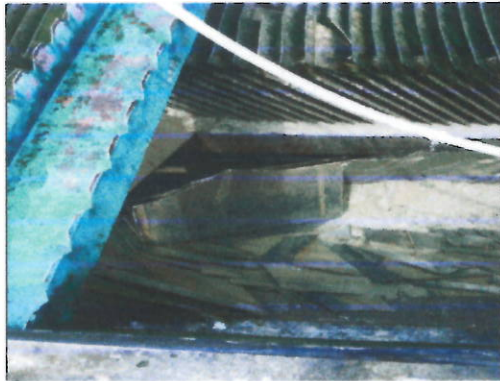
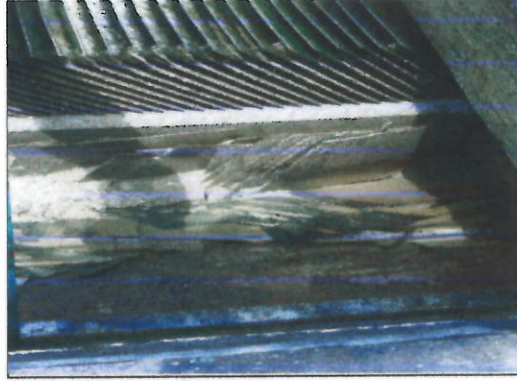


AJP

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OPTIMIZACIÓN SEDIMENTADOR B, DOS COMPARTIMIENTOS PTAP EL LLANO ACUEDUCTO LA DORADA, CALDAS.-
LOCALIZACION: EL LLANO VICTORIA.
CONTRATISTA: AQUA COLOMBIA EV LTDA.CER LTDA.
CONTRATO: 00180 DE AGOSTO 16 DE 2017
FECHA INFORME: ENERO 18 DE 2018



ASZ
