	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	


# CONTRATO Y AÑO	0214 DE 2020	Acta Nº	2 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	205.182.043	
CONTRATISTA	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ			2. VALOR ADICION	41.707.782	
NIT O CC:	79.838.206			3. VALOR TOTAL (1+2)	246.889.825	
CDP (#, rubro y fecha)	00671 - 00673 DEL 08/19/2020 000242 DEL 19/01/2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	212.587.171	
RP (#, rubro y fecha)	000783 DEL 09/30/2020 000228 DEL 19/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	33.627.380	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIÓ LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS OBRA 2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO POR REPARACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	675.274	
DOCUMENTO VERIFICADOS						
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)					X	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.						
3- Pagos al FIC					N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					X	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X	
15- Acta parcial o final del contrato.					X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.




NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
9282008984	AHORROS	COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
1/15/20
1/20/20
1/25/20
2/1/20
2/5/20
2/10/20
2/15/20
2/20/20
2/25/20
3/1/20
3/5/20
3/10/20
3/15/20
3/20/20
3/25/20
4/1/20
4/5/20
4/10/20
4/15/20
4/20/20
4/25/20
5/1/20
5/5/20
5/10/20
5/15/20
5/20/20
5/25/20
6/1/20
6/5/20
6/10/20
6/15/20
6/20/20
6/25/20
7/1/20
7/5/20
7/10/20
7/15/20
7/20/20
7/25/20
7/31/20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación: 5 LINO MENDOZA VELASQUEZ A-200 O.MAS COTIZANTES

Razon Social: LINO MENDOZA

Dirección: calle 57 n 10 60

Teléfono: 7850537

Exonerado SENA e ICBF: SI

CIUDAD-DEPARTAMENTO: MONTERIA-CORDOBA

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo: 2021-01

Salud: E

Clave: Pago


Limite: 2021/01/05

Fecha: Pago

Banco: Dias Mora: 0

Valor:

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes				
				Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
SUCURSAL - LINO MENDOZA CALDAS (10 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: MANIZALE CALDAS (10 Afiliados)																							
1	CC	14567851	DUQUE LUIS	25-14	3	\$87,781	\$14,100	ESS62	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,200	3	\$0	SI	\$27,500
2	CC	1067928253	HEMO VICTOR	230301	4	\$117,041	\$18,800	ESSC07	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	\$117,041	\$4,700	14-4	4	\$117,041	\$8,200	4	\$0	SI	\$36,400
3	CC	16115027	MUÑOZ JOHN	230301	3	\$87,781	\$14,100	EP5037	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,200	3	\$0	SI	\$27,500
4	CC	1061654535	PORECO JHON	230301	3	\$87,781	\$14,100	ESS62	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,200	3	\$0	SI	\$27,500
5	CC	1061372903	OSPINA LUIS	230301	3	\$87,781	\$14,100	EP5037	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,200	3	\$0	SI	\$27,500
6	CC	16113223	QUINTERO ALQUINAHUES	230301	3	\$87,781	\$14,100	EP5002	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,200	3	\$0	SI	\$27,500
7	CC	1061656125	RESTREPO DAIRÓ	230301	2	\$58,521	\$9,400	EP5037	2	\$58,521	\$2,400	CCF11	2	\$58,521	\$2,400	14-4	2	\$58,521	\$4,100	2	\$0	SI	\$18,300
8	CC	1061369855	RODRIGUEZ SERGIO	25-14	4	\$117,041	\$18,800	ESS62	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	\$117,041	\$4,700	14-4	4	\$117,041	\$8,200	4	\$0	SI	\$36,400
9	CC	71613933	SOTO HUGO	230301	4	\$117,041	\$18,800	EP5037	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	\$117,041	\$4,700	14-4	4	\$117,041	\$8,200	4	\$0	SI	\$36,400
10	CC	19320900	TELES RAMON			\$936,330	\$190,400			\$936,330	\$38,100			\$936,330	\$38,100			\$936,330	\$45,900		\$0	SI	\$92,500
Total Afiliados(10)																							

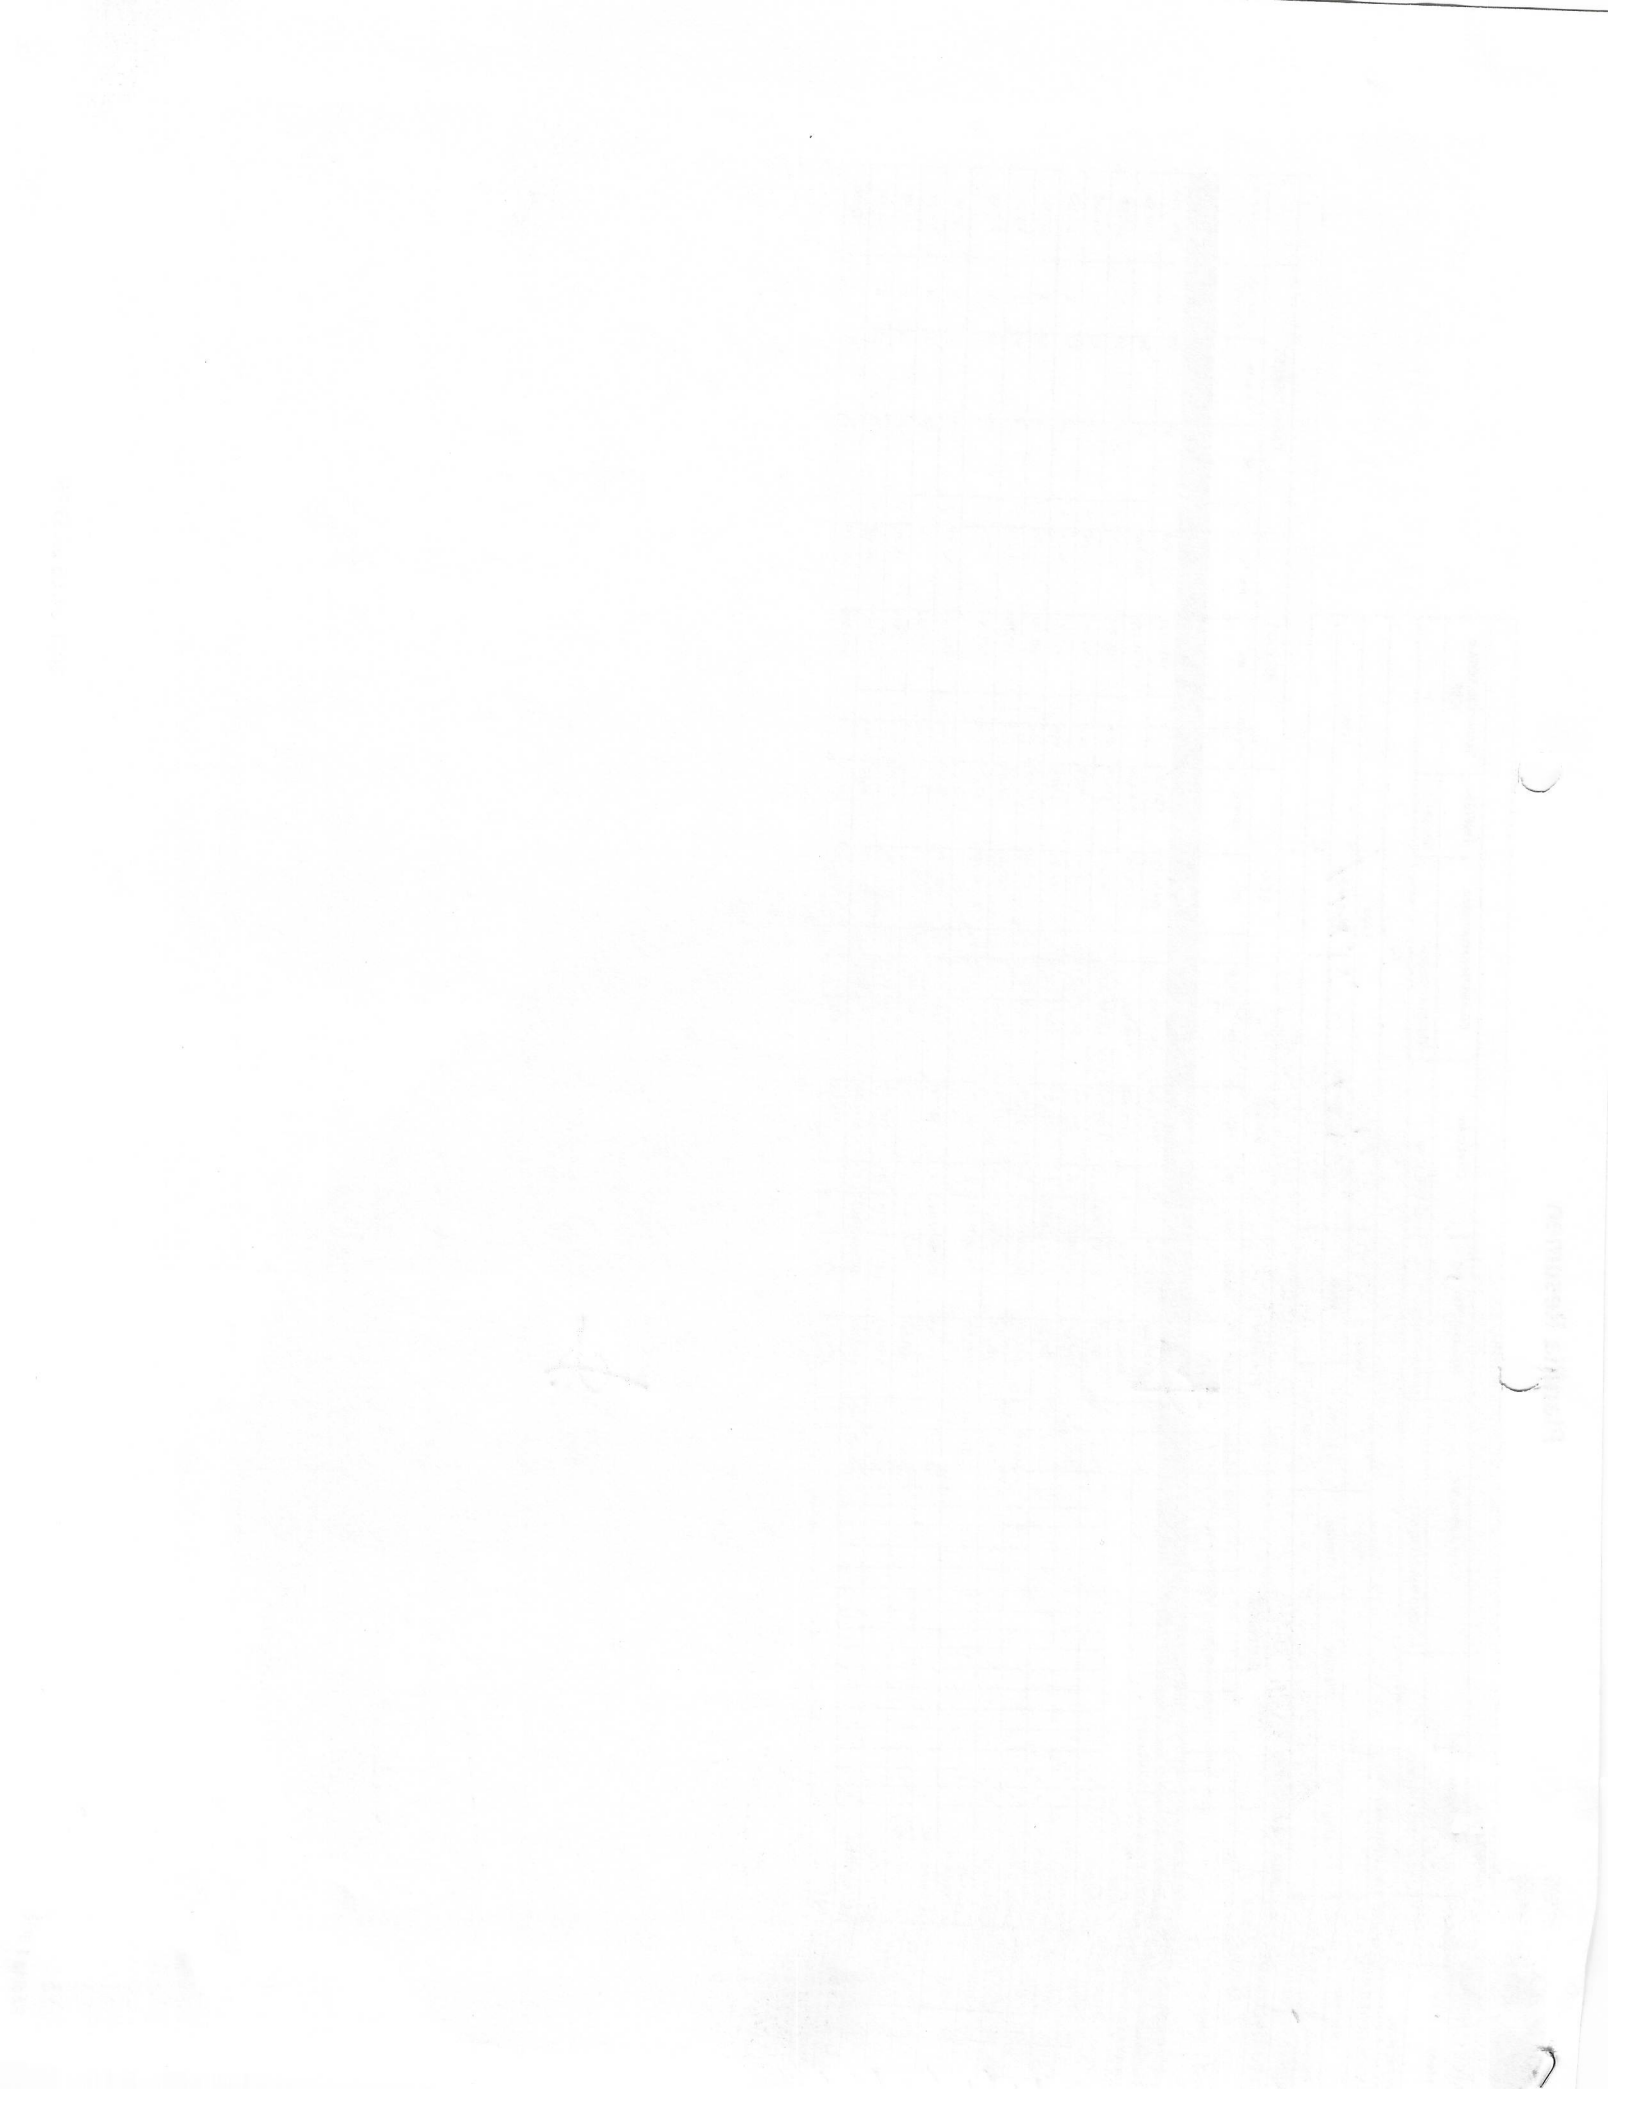

C

10/11/2020


2

7

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 79838206	5	LINO MENDOZA VELASQUEZ	A. 200 O MAS COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Tipo
Pension Salud 2021-01	Pago	Planilla E	Planilla E
Sucursal Principal		Direccion	
LINO MENDOZA		calle 57 n 10 60	
Ciudad-Departamento		Telefono	
MONTERIA-CORDOBA		7850537	
Exonerado SENA e ICBF		SI	

RESUMEN DE PAGO			
Periodo	Clave	Planilla	Tipo
2021-01	Pago	Planilla E	Planilla E
Limite		Fecha	
2021/01/05		Pago	
Banco		Valor	
		0	

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$150,400	\$0	\$0	\$150,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$75,200	\$0	\$0	\$32,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$42,300	\$0	\$0	\$75,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	\$65,900	\$0	\$0	\$42,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$38,100	\$0	\$0	\$65,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$15,500	\$0	\$0	\$38,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$4,700	\$0	\$0	\$38,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$14,300	\$0	\$0	\$38,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$3,600	\$0	\$0	\$15,500
TOTAL				10	\$292,500	\$0	\$0	\$292,500



219

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	79838206
Primer Nombre ó Razón Social	LINO
Primer Apellido (si es Persona natural)	MENDOZA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CORDOBA
Ciudad Capital	MONTERIA (CORDOBA)
Dirección de Domicilio	CL 64 A 40 39 TO 7 AP 304
Ciudad de Domicilio	MONTERIA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3154332343
Correo electrónico	pagospila@outlook.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02142020
Número Contrato de Obra	02142020
Nombre Obra	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO
Fecha Inicio Obra	07/10/2020
Fecha Terminación Obra	07/01/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	VITERBO
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$205,182,043.00
Costo Total Mano de Obra	\$205,182,043.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$219,451.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Total Pagado	\$219,451.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68339676
Fecha de Creación	07/12/2020 02:50:09 p.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	824223081
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura





LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ
 NIT 79.838.206
 CRA 8#45-35 OFICINA 810 ALAMEDAS
 Tel: (034) 3004001602
 Montería - Colombia
 linoandresmendoza@yahoo.com

Factura electrónica de venta
 No. FE-16

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A EMPOCALDAS S.A E.S.P		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CRA 23 #75-82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2021-04-05	2021-05-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA NO. 2 FINAL	1.00	24,918,399.00
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	5,980,416.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	1,245,920.00
4	UTILIDADES 5%	1.00	1,482,644.80

Elaborado por Slligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:

Treinta y tres millones seiscientos veintisiete mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte con 0.8

Total Bruto	33,390,655.00
IVA 19%	236,724.80
Total a Pagar	33,627,379.80

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-05 por \$ 33,627,379.80

Observaciones:

CONTRATO No: 0214 DE 2020
 OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN RED DE
 ALCANTARILLADO BARRIÓ LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS
 OBRA 2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO POR REPARACIÓN DE LAS
 REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO
 CALDAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764005363606 aprobado en 20201007 prefijo FE desde el número 1 al 2000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa NO

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides strong evidence for the proposed model.

The final section of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results could be used to improve the efficiency of the current system. By identifying areas where the data is most accurate, it is possible to optimize the process and reduce errors.

In conclusion, the document has shown that maintaining accurate records is essential for any business. It has also demonstrated that the data collected is reliable and can be used to make informed decisions. The author hopes that these findings will be helpful to others in the field.

NOMINA, PAGO Nro 5
 FECHA DE PAGO:
 CONTRATO DE OBRA:
 CONTRATANTE:
 CONTRATISTA:
 PERIODO DE PAGO:

31 DE DICIEMBRE DE 2020
 No 0214
 EMPOCALDAS S.A E.S.P
 LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma	
Ramon Nonato Telles Rueda	79.320.900	Oficial de obra	\$ 60.000	\$ 4.600	4		\$ 240.000	Ramon N Telles	
Luis Carlos Duque Cardona	4.567.851	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	Luis Carlos D	
Jhon Jairo Orozco Muñoz	1.061.654.535	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	Jhon Jairo Orozco	
John Alberto Muñoz Molano	16.115.027	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	John Alberto Molano	
Alquiudades Quintero Lopez	16.113.223	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	Alquiudades	
Victor Andres Henao Otalvaro	1.067.928.253	Residente	\$ 60.000	\$ 4.600	4		\$ 240.000	Victor Henao	
Luis Ospina	1.061.372.903	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	Luis Ospino	
Sergio Rodriguez	1.061.369.855	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	2		\$ 70.000	Sergio R.	
Hugo Soto	71.613.933	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	4		\$ 140.000	Hugo Soto	
Dario Andres Restrepo Garcia	1.061.656.125	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	Dario Restrepo	
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$	1.320.000	

Fecha: 06 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Maestro de obra 1
- Oficiales 1
- Ayudantes 4

Actividades: Se da inicio a la obra, en presencia del ingeniero supervisor de zona. Se comienza con la demolición de las excavaciones, por donde pasara un tubo de 12". Se instala la valla de obra y lo correspondiente para cumplir con el protocolo de bioseguridad.

Victor Herra
 Ing. Victor Herra
 Residente de obra

Fecha: 07 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Maestro de obra 1
- Oficiales 1
- Ayudantes 6

Actividades: Se continua con la demolición de la excavación existente. Se traen lomos de tuberia y se abren 3 cámaras de inspección para iniciar con su excavación, el diametro de las mismas es de 1,60 m., y se realiza el respectivo cerramiento de las mismas.

Victor Herra
 Ing. Victor Herra
 Residente de obra.

Fecha: 08 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra: 1

Oficiales 1

Ayudantes 6

Actividades: Se continúa con el montaje de excavación un tramo por las escaleras (previamente demolidas) y otro tramo en la calle. También se realiza los cortes en el pavimento, para conectar el alcantarillado con una cámara existente.

Victor Herrero
 Ing. Victor Herrero
 Residente de obra

Fecha: 09 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficiales 1

Ayudantes 6

Actividades: Se continúa con excavación, se realiza la instalación de tubería de alcantarillado de 12", aplicando arena para conformar la cama donde reposará la tubería, y se sella con el material proveniente de la misma excavación. Se inicia con la albañilería de pavimento en la zona baja.

Victor Herrero
 Ing. Victor Herrero
 Residente de obra

Fecha: 10 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficiales 1

Ayudantes 6

Actividades: Se continuo con la demolición de paramentos, y con la excavación manual de la zanja para tubería de 12" en la zona alta. Se dejan los pozos interconectados con escombro en losa verde. — — — — —

Victor Herrero
Ing. Victor Herrero
Presidente de obra.

Fecha: 12 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficiales 1

Ayudantes 6

Actividades: Se continuo con la excavación de zanjas para tubería de alcantarillado de 12", en la zona alta y zona baja del proyecto. — — — — —

Victor Herrero
Ing. Victor Herrero
Presidente de obra

Fecha: 13 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1
 Oficiales 1
 Ayudantes 6

Actividades: Se continúa con la excavación de zangas para la instalación de la tubería de alcantarillado de 12" en los dos frentes de trabajo. En el frente sur se instalan tubería de alcantarillado de 12".

Victor Hinoj

Ing. Presidente de obra

Fecha: 14 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1
 Oficiales 1
 Ayudantes 6

Actividades: Se continúa con la instalación de tubería de 12", para ello se le goma miculada con la arena para su correcta instalación. Se rellena y compacta las zangas en los dos frentes de la obra.

Victor Hinoj

Ing. Victor Hinoj
 Presidente de obra

Fecha: 15 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Maestro de obra 1
- Oficiales 1
- Ayudantes 6

Actividades: Se continuo con excavacion para tuberia de 12" en la zona alta del proyecto. Se hacen los brues permanent. Se contina con el sellado de la zona bajo del proyecto y la envergadura del tubo de 12" en camera de inspeccion existente.

Victor Henao
 Ing. Victor Henao O
 Residente de obra

Fecha: 16 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Maestro de obra 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 12

Actividades: Se continua con la excavacion de tuberia de 12" Se funden dos pozos de camera de inspeccion en camaras de 3000 PSI y presion (para mayoria de c/depur). Se mueva zona de tramo de la excava y se instala obra tuberia.

Victor Henao
 Ing. Victor Henao O
 Residente de obra

Fecha: 17 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficiales 2

Ayudantes 11

Actividades: Se formalizan los paredes de uno de las
comunas de impresión. Se instala en tramo el tablero
de 12" pulgada por las escaleras. — — — — —

Victor Herra O

Ing. Victor Herra O

Residente de obra

Fecha: 19 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficiales 2

Ayudantes 11

Actividades: Se instala en tramo el tablero de 12" en la
zona alta y se continúa con ejecución para los mismos
tramos. Se demuestran como finalizado y se formalizan otros
y se procede a finalizado en concreto de 3000 PSI con
anchos de paredes de 20 cm, se instala y se tapa tablero
de 12" en las escaleras. — — — — —

Victor Herra O

Ing. Victor Herra Otañez

Residente de obra

Fecha: 20 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Martes de obra 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 12

Actividades: Se vuelven zonas para instalar tubería de 12" en zona alta, se sellan las zonas con el mismo material proveniente de la excavación. Se demuele el último tramo de tubería. Se demuestran y se encapa otra cámara de inspección, se funde en concreto de 3000 PSI y el espesor de paredes de 20 cm. ————

Victor Horno O
 Ing. Victor Horno Ochoauro
 Residente de obra.


Fecha: 21 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Martes de obra 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 12

Actividades: Se instala tubería de 12" en las excavaciones. Se continúa con la excavación en la zona alta de la obra para instalación de tubería de 12". ————

Victor Horno O
 Ing. Victor Horno Ochoauro
 Residente de obra



Fecha: 22 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1
 Oficiales 2
 Ayudantes 12

Actividades: Se continúa con excavación para tubería de 12" pulgadas. Se funden dos zapatas y se funden pisos de concreto de inspección. Se realizan planos de obra sobras en la zona by pass del proyecto. — — — — —

Victor Horno O

Ing. Victor Horno Ochoa
 Residente de obra

Fecha: 23 de octubre de 2020


Personal en obra:

Maestro de obra: 1
 Oficiales 2
 Ayudantes 11

Actividades: Se instala tubería de 12" en la zona esta del documento attached. Se funde concreto de inspección en los oscuros en concreto de 5000 PSI. — — — — —

Victor Horno O

Ing. Victor Horno Ochoa
 Residente de obra.



Fecha: 24 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Maestro de obra 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 11

Actividades: Se continuo con la excavacion de zanjas para la instalacion de tubos de 12". Se fundo con arena de imprecision en cantidad de 3000 psi. — o —

Viter Hugo O
Ing. Viter Hugo Ochoa
Residente de obra

Fecha: 26 de octubre de 2020

Personal en obra:

- Maestro de obra 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 11

Actividades: Se instala tubos de 12" en la zona alta del proyecto. Se fundo con arena de imprecision en las excavaciones. — o —

Viter Hugo O
Residente de obra.

Fecha: 27 de octubre de 2020

Personal en obra

Maestro de obra	1
Oficiales	2
Ayudantes	17

Achucados: Se inicio con excavacion de zanjo para
 tubos de conducto de 3". Se funden paradas de
 como de inspeccion y pisan en conducto 3000 fsi
 e plo. —————

Victor Herra O

Residente de obra

Fecha: 28 de octubre de 2020

Personal en obra

Maestro de obra	1
Oficiales	2
Ayudantes	17

Achucados: Se corta y fijan alero para las paradas
 de las tapas de las cámaras. Se instala tubo de
 3" para conducto. Se funden paradas para una cámara
 de inspeccion. —————

Nota: Se pararon obras a las horas de los mañana
 y al medio día.

Victor Herra O

Residente de obra

Fecha: 29 de octubre de 2010

Personal en obra

Maestro de obra 1

Oficiales 2

Ayudantes 11

Actividades: Se funden tapas de cámaras de inspección con otro de refuerzo de 12" a cada 15 cm de espesor. Se remueven materiales en zona baja, se realizon actividades para retirar los zunchos existentes y se continuan con la extraccion de zunchos para tubos de 12".

Nota: Se presentan lluvias en las horas de la mañana, entre las 7:00 a 8:30 am.

Victor Hugo O
Residente de obra

Fecha: 30 de octubre de 2010

Personal en obra

Maestro de obra 1

Oficiales 2

Ayudantes 11

Actividades: Se instaló ultimo tramo de tubo de 12" Se funden cámaras y pozos de cámaras de inspección. Se realizon actividades para la extraccion de aguas en distintos zonas.

Nota: Se presentan lluvias a las horas de la mañana y ocurren en el transcurso del día.

Victor Hugo O
Residente de obra

Fecha: 31 de octubre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1
 Oficiales 2
 Ayudantes 11

Actividades: Se instaló tubería de acueducto de 3". Se retiró formateo de resumero de inspección y se formateó otro. Se finalizó etapa de entubamiento de cámara de inspección en los alcantarales. — — — — —

Nota: Se presentaron precipitaciones en las horas de la mañana entre 7:00 a 8:00 am.

Vctor Henr O
 Residente de obra


Fecha: 02 de noviembre de 2020

Personal en obra

Maestro de obra 1
 Oficiales 2
 Ayudantes 10

Actividades: Se finalizó parcela de cámara de inspección. Se fijó esta cámara para parcela de cámara de tapa para los alcantarales y se formateó. Se continuó con la excavación de tubería de 3" y el acueducto. Se finalizó etapa en los alcantarales, de cámara de inspección. Se finalizó con esto. — — — — —

Vctor Henr O
 Residente de obra



Fecha: 03 de noviembre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficiales 2

Ayudantes 10

Actividades: Se continuó con la ejecución del zongo para tubería de succión de 3". Se instaló tubería de 3" y acometidos. Se cortó y fijó acero para tapas de cámaras de inspección. Se fundió luego el concreto en concreto de 3000 PSI.

Nota: Se presentaron lluvias en las horas de la mañana desde las 7:00 am a 8:00 am.

Victor Hinojosa
Residente de obra

Fecha: 04 de noviembre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficiales 2

Ayudantes 10

Actividades: Se continuó con la ejecución del zongo para la instalación de tubería de 3". Se realizó acometido para acometido al alcantarillado en tubería de 6", se instaló sifón de 6" x 12". Se usó acero para tapas de zongo y se fundió lo mismo en concreto de 3000 PSI. Se fundió acometido y se instaló tubería de 3".

Victor Hinojosa
Residente de obra

Fecha: 05 de noviembre del 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficials 2

Ayudantes 10

Actividades: Se contina con la excavacion de zapata para tablero de 3", se instalara columna de 3" x 1/2". Se continua armando tapas de zapatas de inspeccion.

Victor Hinojosa
Residente de obra

Fecha: 06 de noviembre del 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficials 2

Ayudantes 10

Actividades: Se continua con la excavacion para instalacion de tablero de coque de 2" y 3", se entasa y arma acero para tapas de zapatas de inspeccion y se finalizan zapatas.

Nota: Se presentan prescripciones en base de los momentos.

Victor Hinojosa
Residente de obra

Fecha: 07 de noviembre del 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1

Oficials 2

Ayudantes 10

Actividades: Se continua con la excavacion y instalacion de tablero de 3" y 2". Se instala columna de 3" x 1/2".

Victor Hinojosa
Residente de obra

Fecha: 10 de noviembre del 2010

- Personal en obra
- Maestro 1
- Oficiales 1
- Ayudantes 7

Actividades: Se continúa con los excavaciones de zanja para tubería de alcantarilla de 3" y 2". Se realizó excavación para la instalación de alcantarilla de 6".

Victor Hugo
Presidente de obra

Fecha: 11 de noviembre del 2010

- Personal en obra
- Maestro de obra 1
- Oficiales 1
- Ayudantes 7

Actividades: Se continúa con los excavaciones de zanja para tubería de 3" y 2". Se compraron la subestructura de la alcantarilla y se inicia con el entrafundido de la misma.

Victor Hugo
Presidente de obra

Fecha: 12 de noviembre del 2010

- Personal en obra
- Oficiales 1
- Ayudantes 7

Actividades: Se finalizó la parte de alcantarilla en cantidad de 3000 PSI, se instaló tubería de 3" y 2", se tapó y compacta con material de la misma excavación.

Victor Hugo
Presidente de obra

Fecha: 13 de noviembre de 2020

Personal en obra

Oficiales 1

Ayudantes 5

Actividades: Se terminó el drenaje exterior existente en retenero y se conformó subsiguiente al lechero de nuevo y en el punto de la misma.

Presidente de obra

Victor Hugo O

Fecha: 14 de noviembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 5

Actividades: Se fundió segundo tramo de escalas en concreto de 3000 PSI.

Victor Hugo O

Presidente de obra

Fecha: 17 de noviembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 5

Actividades: Se desmontó segundo tramo de escalas y se inició a conformar lo subsiguiente del tercer tramo de escalas. Se realizó excavación al retenero de tuberías de 3" y 2".

Victor Hugo O

Presidente de obra

Fecha: 18 de noviembre de 2020

Personal en obra

- Oficiales 1
- Ayudantes 5

Actividades: Se viene con para luego el pago el inspección en fondo la misma en contrato de 3000 P.S.I., también termino el pavimento.

Victor Hugo O
Residente de obra

Fecha: 19 de noviembre de 2020

Personal en obra:

- Oficiales 1
- Ayudante 5

Actividades: Se fundo tras termino el escalar en altura de 3000 P.S.I., se hacen vacunos para reemplazo de acometidas de acueducto.

Victor Hugo O
Residente de obra


Fecha: 20 de noviembre de 2020

Personal en obra

- Oficiales 1
- Ayudantes 5

Actividades: Se midieron vacunos para acometida de abastecimiento y instalaron de los mismos, pilotes de 12" x 6"

Victor Hugo O
Residente de obra



Fecha: 21 de noviembre del 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 5

Actuación: Se formaliza y se funden bombillas de escalas se continúan haciendo recomendaciones al otomelobes del conducto.

Victor Hinoj
Resoluto el día

Fecha: 24 de noviembre del 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 5

Actuación: Se funden conductos de escalas y bombillas en concreto de 3000 psi, se realiza excavación para instalación de tubo de 3"

Victor Hinoj
Resoluto el día

Fecha: 25 de noviembre del 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 5

Actuación: Se funden bombillas en concreto de 3000 psi Se instalan tubos de 3"

Victor Hinoj
Resoluto el día

Fecha: 27 de noviembre de 2020

Personal en obra:

Oficial	1
Ayudante	5

Actividades: Se funden boquillas y conos para realizar en contacto al 3000 PSI, 14 funde ejes de impresión de acetato

Victor Herra
Presidente de obra

Fecha: 28 de noviembre de 2020

Personal en obra:

Oficial	1
Ayudante	5

Actividades: Se realiza examen para instalación de acetato y se instala tubo en 8"

Victor Herra
Presidente de obra


Fecha: 01 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Oficial	1
Ayudante	4

Actividades: Se funden conos de ejes de impresión en contacto al 3000 PSI se instala tubo y se calienta

Victor Herra
Presidente de obra



Fecha: 02 de diciembre de 2010

Personal en obra

Oficial 1

Ayudantes 4

Actividades: Se realizó instalación de tubería de 3" en línea al almacenamiento, se usó alcantarilla y cañerías. para abastecer al conducto nuevo con muro.

Victor Hugo

Residente de obra

Fecha: 03 de diciembre de 2010

Personal en obra:

Oficial 1

Ayudante 4

Actividades: Se realizó levante en murallas en planta de tratamiento de agua, se instaló estructura de concreto prefabricada.

Victor Hugo

Residente de obra

Fecha: 04 de diciembre de 2010

Personal en obra

Oficial 1

Ayudante 4

Actividades: Se continúa con la construcción del muro en murallas para servir al conducto nuevo.

Victor Hugo

Residente de obra

Fecha: 09 de diciembre de 2010

Personal en obra:

Ayudante 3

Oficial 1

Actividades: Se realizó instalación de tuberías acumuladas, ya que se hizo reparación al tubo de 3", se pon en marcha las tuberías instaladas.

Vicente Heras

Presidente de obra

Fecha: 10 de diciembre de 2010

Personal en obra:

Oficial 1

Ayudante 3

Actividades: Se realizó limpieza de conductos y se repararon los mismos, se realizó obra en la obra, se

Vicente Heras

Presidente de obra

Fecha: 11 de diciembre de 2010

Personal en obra:

Oficial 1

Ayudante 3

Actividades: Se realizó obra de línea y trabajos de limpieza y reparaciones, se realizó obra general y se realizó demás trabajos.

Vicente Heras

Presidente de obra




1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050



NOMINA, PAGO Nro 5
 FECHA DE PAGO:
 CONTRATO DE OBRA:
 CONTRATANTE:
 CONTRATISTA:
 PERIODO DE PAGO:

31 DE DICIEMBRE DE 2020
 No 0214
 EMPOCALDAS S.A E.S.P
 LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Ramon Nonato Telles Rueda	79.320.900	Oficial de obra	\$ 60.000	\$ 4.600	4		\$ 240.000	<i>Ramon N. Telles</i>
Luis Carlos Duque Cardona	4.567.851	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	<i>Luis Carlos D</i>
Jhon Jairo Orozco Muñoz	1.061.654.535	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	<i>Jhon Jairo Orozco</i>
John Alberto Muñoz Molano	16.115.027	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	<i>John Alberto Molano</i>
Alquiviades Quintero Lopez	16.113.223	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	<i>Alquiviades</i>
Victor Andres Henao Otalvaro	1.067.928.253	Residente	\$ 60.000	\$ 4.600	4		\$ 240.000	<i>Victor Henao</i>
Luis Ospina	1.061.372.903	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	<i>Luis Ospina</i>
Sergio Rodriguez	1.061.369.855	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	2		\$ 70.000	<i>Sergio R.</i>
Hugo Soto	71.613.933	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	4		\$ 140.000	<i>Hugo Soto</i>
Dario Andres Restrepo Garcia	1.061.656.125	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	3		\$ 105.000	<i>Dario Restrepo</i>
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$ 1.320.000	

 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	2	Fecha del informe	20/01/2020	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0214/2020
Objeto:	<p>OBRA 1: Reposición red de acueducto y construcción red de alcantarillado barrió la plazuela en el Municipio de Samana Caldas</p> <p>OBRA 2: Obras de reposición de pavimento por reparación de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Viterbo Caldas</p>
Nombre Contratista:	Lino Andrés Mendoza Velásquez
Representante legal:	Lino Andrés Mendoza Velásquez
Fecha del contrato:	24 de septiembre del 2020
Plazo de ejecución:	90 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 205.182.043
Fecha de iniciación:	07 de octubre del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	41.707.782
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Samana	Alcantarillado	
Samana	Acueducto	

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	90
Tiempo total transcurrido:	86
Avance Porcentual:	96 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)




1.5. Problemáticas con la obra

La obra se ejecuta en totalidad sin problemáticas

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 246.889.825
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 33.627.380
Porcentaje ejecutado en el periodo:	86 %
Inversión total ejecutada:	\$ 246.214.575
Porcentaje total ejecutado:	100 %

 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Aseguradora solidaria de Colombia	540-47-994000012788	07/10/2020	07/04/2021	\$ 74.066.947.50
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Aseguradora solidaria de Colombia	540-47-994000012788	07/10/2020	07/01/2024	\$ 49.377.965.00
Estabilidad y calidad de la obra	Aseguradora solidaria de Colombia	540-47-994000012788	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 49.377.965.00
Responsabilidad civil extracontractual	Aseguradora solidaria de Colombia	540-74-994000002906	24/09/2020	24/03/2021	\$ 61.554.612.90

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Ramón nonato telles	X	X	X	X	X
Luis Carlos duque	X	X	X	X	X
Jhon Jairo Orozco	X	X	X	X	X
Jhon Alberto Muñoz	X	X	X	X	X
Alquiviades Quintero	X	X	X	X	X
Víctor Andrés Henao	X	X	X	X	X
Luis Ospina	X	X	X	X	X
Sergio Rodríguez	X	X	X	X	X
Hugo soto	X	X	X	X	X
Darío Andrés Restrepo	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
09/10/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
10/11/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
15/12/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
