

| | |
|---|---|
|  <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p> | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL |

| Personal Interventoría | | Local | Externa | Subtotal |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| Mano de Obra Calificada | Indígenas | | | |
| | Negritudes | | | |
| | Madres cabeza de familia | | | |
| | Personal con limitaciones físicas | | | |
| Mano de Obra No Calificada | Indígenas | | | |
| | Negritudes | | | |
| | Madres cabeza de familia | | | |
| | Personal con limitaciones físicas | | | |
| TOTALES | | | | |

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del barrio la plazuela parte alta del Municipio de Samaná Caldas en la construcción de alcantarillado y la reposición de acueducto, en el Municipio de Viterbo Caldas son beneficiados los pobladores con la pavimentación realizada

8. DOCUMENTOS ANEXOS

| DOCUMENTO | SI | N/A |
|--|----|-----|
| Acta de entorno | | x |
| Acta de veeduría | | x |
| Acta de convenio de precios | x | |
| Plan de manejo ambiental | | x |
| Ensayos de laboratorio | | x |
| Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación) | | x |
| Bitácora de la obra | x | |
| Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación. | x | |
| Paz y Salvo oficina de trabajo. | x | |
| Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra. | x | |
| Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor. | x | |
| Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar | x | |

| | |
|---|---|
| Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4 |
|---|---|



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | |
|---------------------------|---|
| CONTRATO No.: | 0214 de 2020 |
| OBJETO CONTRATO: | OBRA 1: REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS. OBRA 2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO POR REPARACIONES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS. |
| CONTRATISTA: | LINO ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ |
| SUPERVISOR: | LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ |
| FECHA INICIACIÓN: | OCTUBRE 07 DE 2020 |
| FECHA VENCIMIENTO: | ENERO 07 de 2021 |
| VALOR OBRA 2: | \$95.893.032 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES. |

GENERALIDADES

El presente constituye el informe de actividades de obra, por medio del cual se evidenciarán todas las actividades ejecutadas por parte del Contratista LINO ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ, ejecutor del Contrato de Obra No. 0214 con objeto "OBRA 1: REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS. OBRA 2: OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO POR REPARACIONES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS".

ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

En el Municipio de Viterbo Caldas con el fin de garantizar la continuidad del servicio, EMPOCALDAS S.A. E. S.P. realiza las reparaciones de las redes de acueducto y alcantarillado; debido a estos daños los pavimentos sufren un gran deterioro y algunos de ellos presentan hundimientos que se generan riesgo tanto para transeúntes como para todo tipo de vehículos que transitan por el sector, teniendo algunos sitios críticos como son la carrera 7 entre calles 6 y 7, calle 7 entre carreras 7 y 8 y el de la calle 6 entre carreras 6 y 7. Se requiere realizar dichas reparaciones ya que al dejar el pavimento en ese estado representa un potencial riesgo para la comunidad y los transeúntes del sector. Es conveniente para la Empresa ya que al ejecutar estas obras se estaría minimizando el riesgo de que se presenten reclamaciones o demandas por algún accidente producido por el mal estado de los pavimentos. Es oportuna la contratación ya que a la fecha no se han presentado accidentes graves, ni se han presentado reclamaciones o demandas por la ocurrencia de estos.

1. FRENTE DE OBRA No. 1

OBRA 1: REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 7 Y 6 FRENTE A LA REGISTRADURÍA EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.

Actividades ejecutadas:

✓ Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros

Con el fin de tener una protección adecuada tanto para la ejecución de las actividades en obra como del personal laborando en obra y las personas ajenas a esta, se realizó el respectivo cerramiento en tela verde con soportes en guadua cada 2 m, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.

✓ **Señal preventiva y reglamentaria**

Consecuentemente para llevar a cabo la señalización preventiva y reglamentaria en obra se realizó la instalación de 2 señales en obra con el fin de informar al público en general que en dicha zona se están realizando intervenciones.



Imagen. Señal preventiva y reglamentaria

✓ **Valla institucional**

Con el fin de informar a la población en general acerca del proyecto que se adelanta en el Municipio de Viterbo, se instaló la correspondiente valla informativa del proyecto en el lugar de intervención, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Señal informativa del proyecto

✓ **Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas**

Consecuentemente llevadas a cabo las actividades preliminares, se procedió con la demolición de las losas de pavimento rígido a reponer, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Demolición de pavimento rígido

✓ **Corte de máquina disco**

Junto con la demolición del pavimento rígido se realizó llevó a cabo el corte del pavimento rígido con maquina cortadora de disco, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Corte de pavimento rígido con maquina cortadora de disco.

✓ **Excavación en material conglomerado y en material común**

Consecuentemente llevadas a cabo las actividades de demolición mecánica y retiro de material sobrante, se continuó con la ejecución de la actividad de excavación en material conglomerado y material común, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Excavación en material conglomerado y material común.

✓ **Suministro e instalación de tubería de 12" pvc alcantarillado**

Para este punto de intervención se realizó la reposición de tubería de 12" Novafort, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

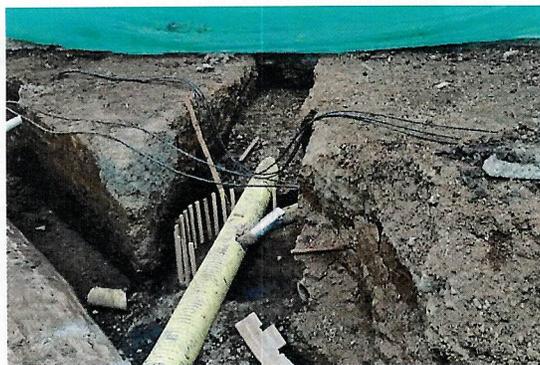


Imagen. Reposición de tubería de 12" PVC alcantarillado.

- ✓ **Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla.**

Se realizó la construcción de la cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Construcción cámara de caída.

- ✓ **Estructura en concreto reforzado para protección del Box Couvert (no incluye acero de refuerzo).**
Con el fin de proteger el Box Couvert que atraviesa el área de intervención, se realizó una estructura en concreto reforzado de protección adicional para dicho Box Couvert, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Estructura en concreto reforzado para protección del Box Couvert

- ✓ **Llenos compactados con material del sitio**
Posterior a la excavación en material común para la reposición de la tubería de acueducto, se procedió con la actividad de llenos compactados con material del sitio para conformar el nivel de subrasante del terreno.



Imagen. Llenos compactados con material del sitio para conformación de la subrasante.

✓ **Llenos con material granular sub base tipo INVIAS**

Consecuentemente llevadas a cabo las actividades de llenos compactados con material de sitio se procedió con la conformación de la estructura del pavimento con material granular de subbase tipo INVIAS, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Llenos con material granular subbase tipo INVIA

✓ **Suministro, transporte e instalación Pavimento en concreto MR42 hecho en obra**

Una vez terminadas las actividades de suministro, extensión y compactación de la subbase granular para la conformación de la estructura de soporte se dio inicio a las actividades de suministro, transporte e instalación de pavimento en concreto MR42 premezclado, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Pavimentación final Carrera 7 Entre Calles 7 Y 6 - Frente a la Registraduría.

2. FRENTE DE OBRA No. 2

OBRA 2: REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO.

Actividades ejecutadas:

✓ **Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros**

Con el fin de tener una protección adecuada tanto para la ejecución de las actividades en obra como del personal laborando en obra y las personas ajenas a esta, se realizó el respectivo cerramiento en tela verde con soportes en guadua cada 2 m, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

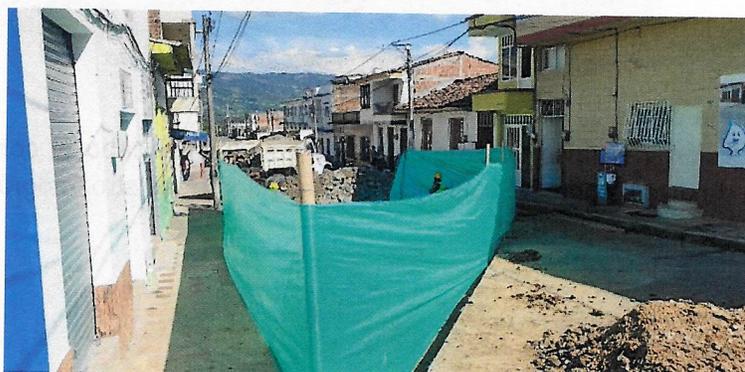


Imagen. Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.

✓ **Señal preventiva y reglamentaria**

Consecuentemente para llevar a cabo la señalización preventiva y reglamentaria en obra se realizó la instalación de 2 señales en obra con el fin de informar al público en general que en dicha zona se están realizando intervenciones.



Imagen. Señal preventiva y reglamentaria.

- ✓ **Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas**
Consecuentemente llevadas a cabo las actividades preliminares, se procedió con la demolición de las losas de pavimento rígido a reponer, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Demolición de pavimento rígido

- ✓ **Corte de máquina disco**
Junto con la demolición del pavimento rígido se realizó llevó a cabo el corte del pavimento rígido con maquina cortadora de disco, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Corte de pavimento rígido con maquina cortadora de disco.

- ✓ **Excavación en material conglomerado y en material común**
Consecuentemente llevadas a cabo las actividades de demolición mecánica y retiro de material sobrante, se continuó con la ejecución de la actividad de excavación en material conglomerado y material común, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Excavación en material común para reposición de tubería de acueducto.

✓ **Llenos compactados con material del sitio**

Posterior a la excavación en material común para la reposición de la tubería de acueducto, se procedió con la actividad de llenos compactados con material del sitio para conformar el nivel de subrasante del terreno.



Imagen. Llenos compactados con material del sitio para conformación de la subrasante.

✓ **Llenos con material granular subbase tipo INVIAS**

Consecuentemente llevadas a cabo las actividades de llenos compactados con material de sitio se procedió con la conformación de la estructura del pavimento con material granular de subbase tipo INVIAS, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Llenos con material granular subbase tipo INVIAS.

✓ **Suministro, transporte e instalación Pavimento en concreto MR42 hecho en obra**

Una vez terminadas las actividades de suministro, extensión y compactación de la subbase granular para la conformación de la estructura de soporte se dio inicio a las actividades de suministro, transporte e instalación de pavimento en concreto MR42 premezclado, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Pavimentación final Calle 7 entre Carreras 7 Y 8.

3. FRENTE DE OBRA No. 3

OBRA 3: REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO.

Actividades ejecutadas:

✓ **Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros**

Con el fin de tener una protección adecuada tanto para la ejecución de las actividades en obra como del personal laborando en obra y las personas ajenas a esta, se realizó el respectivo cerramiento en tela verde con soportes en guadua cada 2 m, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.

✓ **Señal preventiva y reglamentaria**

Consecuentemente para llevar a cabo la señalización preventiva y reglamentaria en obra se realizó la instalación de 2 señales en obra con el fin de informar al público en general que en dicha zona se están realizando intervenciones.



Imagen. Señal preventiva y reglamentaria

✓ **Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas**

Consecuentemente llevadas a cabo las actividades preliminares, se procedió con la demolición de las losas de pavimento rígido a reponer, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Demolición de pavimento rígido

✓ **Corte de máquina disco**

Junto con la demolición del pavimento rígido se realizó llevó a cabo el corte del pavimento rígido con maquina cortadora de disco, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Corte de pavimento rígido con maquina cortadora de disco.

✓ **Excavación en material conglomerado y en material común**

Consecuentemente llevadas a cabo las actividades de demolición mecánica y retiro de material sobrante, se continuó con la ejecución de la actividad de excavación en material conglomerado y material común, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Excavación en material común para reposición de tubería de acueducto.

✓ **Llenos compactados con material del sitio**

Posterior a la excavación en material común para la reposición de la tubería de acueducto, se procedió con la actividad de llenos compactados con material del sitio para conformar el nivel de subrasante del terreno.



Imagen. Llenos compactados con material del sitio para conformación de la subrasante.

✓ **Llenos con material granular subbase tipo INVIAS**

Consecuentemente llevadas a cabo las actividades de llenos compactados con material de sitio se procedió con la conformación de la estructura del pavimento con material granular de subbase tipo INVIAS, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Llenos con material granular subbase tipo INVIAS.

✓ **Suministro, transporte e instalación Pavimento en concreto MR42 hecho en obra**

Una vez terminadas las actividades de suministro, extensión y compactación de la subbase granular para la conformación de la estructura de soporte se dio inicio a las actividades de suministro, transporte e instalación de pavimento en concreto MR42 premezclado, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Imagen. Pavimentación final Calle 6 entre Carreras 6 Y 7.

LINO ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ
CONTRATISTA

| | |
|------------------------------------|---|
| FAL-07 Versión 01 Marzo 2018 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS - ALCANTARILLADO |
| CONTRATO No 0214 DE 2020 | MUNICIPIO SAMANA |

| ID TRAMO | TIPO DE ALCANTARILLADO | COMPONENTE DE RED | DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA | DIAMETRO | LONG(m) | MATERIAL | TIPO DE INSTALACION | CERTIFICACION DE TUBERIA | NUMERO DE CERTIFICADO | ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO | # LOTE | FABRICANTE | NIT | FECHA DE INSTALACION | DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR | MATERIAL TUBERIA ANTERIOR | LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m) |
|-------------|------------------------|-----------------------------|--|----------|---------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| La Plazuela | COMBINADO | RED MENOR DE ALCANTARILLADO | RED MENOR DE ALCANTARILLADO | 6" | 23,8 | PVC | Instalación con apertura de zanja | SI | | ALIASIS | 10112T | DURMAN | 800033159 | DD/MM/AAAA 11/10/2020 | | | |
| La Plazuela | COMBINADO | RED MENOR DE ALCANTARILLADO | RED MENOR DE ALCANTARILLADO | 12" | 235,9 | PVC | Instalación con apertura de zanja | SI | | ALIASIS | 10125T | DURMAN | 800033159 | 10/09/2020 | | | |

| | |
|---|--|
| NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR ANAX QUINTERO VASQUEZ | NOMBRE CONTRATISTA LINO ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ |
| FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR  | FIRMA CONTRATISTA  |

VISTO BUENO DE REGISTRO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

| CONTRATO No.: 0214 DE 2020 | | ACTA No: 2 FINAL | | FECHA CORTE: 04 DE ENERO DEL 2021 | | | | | | |
|--|---|--|------|---|----------------|--------|--------------|--------|-----------|----------|
| OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIÓ LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS | | FECHA INICIACIÓN: 07 DE OCTUBRE DEL 2020 | | FECHA VENCIMIENTO: 04 DE ENERO DEL 2021 | | | | | | |
| MUNICIPIO: SAMANA CALDAS | | VALOR CONTRATO: \$ 205.182.043 | | VALOR CONTRATO + ADICION: 246.889.825 | | | | | | |
| CONTRATISTA: LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ | | VALOR OBRA: \$ 150.996.794 | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ | | SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ | | FECHA: 20 DE ENERO DEL 2021 | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIÓ LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CONTRACTUAL | | | ACTA 1 PARCIAL | | ACTA 2 FINAL | | % EJECUT | |
| | | UN | CAN | VR UNIT | VR TOTAL | CAN | VR TOTAL | CAN | | VR TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo (Incluye plano record) | ml | 300 | 7.372 | 2.211.600 | 250 | 1.843.000 | (14,1) | (103.945) | -5% |
| 1,2 | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros | ml | 610 | 12.105 | 7.384.050 | 550 | 6.657.750 | - | - | 0% |
| 1,3 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 4 | 237.573 | 950.292 | 4 | 950.292 | - | - | 0% |
| 1,4 | Instalación de valla institucional 2x4 | und | 1 | 769.047 | 769.047 | 1 | 769.047 | - | - | 0% |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | |
| 2,1 | Corte con disco abrasivo | ml | 200 | 13.890 | 2.778.000 | 147 | 2.041.830 | 35,5 | 493.095 | 18% |
| 2,2 | Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas | m³ | 15 | 104.961 | 1.574.415 | 14,80 | 1.553.423 | 2,40 | 251.906 | 16% |
| 3 | EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 3,1 | En material común de 0 a 2m | m³ | 432 | 29.440 | 12.718.080 | 269,24 | 7.926.426 | 19,80 | 582.912 | 5% |
| 3,2 | En material común de 2,1 a 4m | m³ | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,3 | Entibado horizontal Tipo I | ml | 150 | 35.720 | 5.358.000 | 40,00 | 1.428.800 | - | - | 0% |
| 3,4 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor | m³ | 30 | 36.722 | 1.101.660 | 120 | 4.406.640 | 47 | 1.723.731 | 156% |
| 3,5 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| 3,6 | Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias | ml | 120 | 13.317 | 1.598.040 | 23,80 | 316.945 | - | - | 0% |
| 3,7 | Instalación de tubería PVC corrugada de 12" | ml | 300 | 26.638 | 7.991.400 | 240 | 6.393.120 | (4,1) | (109.216) | -1% |
| 3,8 | Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla | ml | 16,5 | 637.410 | 10.517.265 | 16,2 | 10.326.042 | - | - | 0% |
| 3,9 | Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para 12 toneladas | Un | 11 | 560.360 | 6.163.960 | 9 | 5.043.240 | - | - | 0% |
| 3,10 | Bases y Cañuelas | Un | 11 | 540.445 | 5.944.895 | 9 | 4.864.005 | - | - | 0% |
| 3,113 | Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto | und | 20 | 408.751 | 8.175.020 | 7 | 2.861.257 | - | - | 0% |
| 3,12 | Instalación de silletras de 12"x6" | und | 20 | 64.652 | 1.293.040 | 7 | 452.564 | - | - | 0% |
| 3,13 | Empalme a cámara D = 1,2 concreto de 300 PSI | und | 20 | 90.310 | 1.806.200 | 20 | 1.806.200 | - | - | 0% |
| 3,14 | Empalme a cajas de inspeccion concreto de 300 PSI | und | 20 | 60.618 | 1.212.360 | 7 | 424.326 | - | - | 0% |
| 4 | LEENOS | | | | | | | | | |
| 4,1 | Arena para base y atraque | m³ | 28 | 98.321 | 2.752.988 | 48,60 | 4.778.401 | - | - | 0% |
| 4,2 | Lleno compactado con material de seleccionado de excavacion | m³ | 432 | 24.161 | 10.437.552 | 258,37 | 6.242.544 | 14 | 338.254 | 3% |
| 4,3 | Sub base para pavimento | m³ | 18 | 185.280 | 3.335.040 | 18,0 | 3.335.040 | 3 | 555.840 | 17% |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE |
|------|-------------|--------|---------|
| 1912 | ... | ... | ... |
| 1913 | ... | ... | ... |
| 1914 | ... | ... | ... |
| 1915 | ... | ... | ... |
| 1916 | ... | ... | ... |
| 1917 | ... | ... | ... |
| 1918 | ... | ... | ... |
| 1919 | ... | ... | ... |
| 1920 | ... | ... | ... |
| 1921 | ... | ... | ... |
| 1922 | ... | ... | ... |
| 1923 | ... | ... | ... |
| 1924 | ... | ... | ... |
| 1925 | ... | ... | ... |
| 1926 | ... | ... | ... |
| 1927 | ... | ... | ... |
| 1928 | ... | ... | ... |
| 1929 | ... | ... | ... |
| 1930 | ... | ... | ... |
| 1931 | ... | ... | ... |
| 1932 | ... | ... | ... |
| 1933 | ... | ... | ... |
| 1934 | ... | ... | ... |
| 1935 | ... | ... | ... |
| 1936 | ... | ... | ... |
| 1937 | ... | ... | ... |
| 1938 | ... | ... | ... |
| 1939 | ... | ... | ... |
| 1940 | ... | ... | ... |
| 1941 | ... | ... | ... |
| 1942 | ... | ... | ... |
| 1943 | ... | ... | ... |
| 1944 | ... | ... | ... |
| 1945 | ... | ... | ... |
| 1946 | ... | ... | ... |
| 1947 | ... | ... | ... |
| 1948 | ... | ... | ... |
| 1949 | ... | ... | ... |
| 1950 | ... | ... | ... |
| 1951 | ... | ... | ... |
| 1952 | ... | ... | ... |
| 1953 | ... | ... | ... |
| 1954 | ... | ... | ... |
| 1955 | ... | ... | ... |
| 1956 | ... | ... | ... |
| 1957 | ... | ... | ... |
| 1958 | ... | ... | ... |
| 1959 | ... | ... | ... |
| 1960 | ... | ... | ... |
| 1961 | ... | ... | ... |
| 1962 | ... | ... | ... |
| 1963 | ... | ... | ... |
| 1964 | ... | ... | ... |
| 1965 | ... | ... | ... |
| 1966 | ... | ... | ... |
| 1967 | ... | ... | ... |
| 1968 | ... | ... | ... |
| 1969 | ... | ... | ... |
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |
| 1981 | ... | ... | ... |
| 1982 | ... | ... | ... |
| 1983 | ... | ... | ... |
| 1984 | ... | ... | ... |
| 1985 | ... | ... | ... |
| 1986 | ... | ... | ... |
| 1987 | ... | ... | ... |
| 1988 | ... | ... | ... |
| 1989 | ... | ... | ... |
| 1990 | ... | ... | ... |
| 1991 | ... | ... | ... |
| 1992 | ... | ... | ... |
| 1993 | ... | ... | ... |
| 1994 | ... | ... | ... |
| 1995 | ... | ... | ... |
| 1996 | ... | ... | ... |
| 1997 | ... | ... | ... |
| 1998 | ... | ... | ... |
| 1999 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 2001 | ... | ... | ... |
| 2002 | ... | ... | ... |
| 2003 | ... | ... | ... |
| 2004 | ... | ... | ... |
| 2005 | ... | ... | ... |
| 2006 | ... | ... | ... |
| 2007 | ... | ... | ... |
| 2008 | ... | ... | ... |
| 2009 | ... | ... | ... |
| 2010 | ... | ... | ... |
| 2011 | ... | ... | ... |
| 2012 | ... | ... | ... |
| 2013 | ... | ... | ... |
| 2014 | ... | ... | ... |
| 2015 | ... | ... | ... |
| 2016 | ... | ... | ... |
| 2017 | ... | ... | ... |
| 2018 | ... | ... | ... |
| 2019 | ... | ... | ... |
| 2020 | ... | ... | ... |
| 2021 | ... | ... | ... |
| 2022 | ... | ... | ... |
| 2023 | ... | ... | ... |
| 2024 | ... | ... | ... |
| 2025 | ... | ... | ... |
| 2026 | ... | ... | ... |
| 2027 | ... | ... | ... |
| 2028 | ... | ... | ... |
| 2029 | ... | ... | ... |
| 2030 | ... | ... | ... |
| 2031 | ... | ... | ... |
| 2032 | ... | ... | ... |
| 2033 | ... | ... | ... |
| 2034 | ... | ... | ... |
| 2035 | ... | ... | ... |
| 2036 | ... | ... | ... |
| 2037 | ... | ... | ... |
| 2038 | ... | ... | ... |
| 2039 | ... | ... | ... |
| 2040 | ... | ... | ... |
| 2041 | ... | ... | ... |
| 2042 | ... | ... | ... |
| 2043 | ... | ... | ... |
| 2044 | ... | ... | ... |
| 2045 | ... | ... | ... |
| 2046 | ... | ... | ... |
| 2047 | ... | ... | ... |
| 2048 | ... | ... | ... |
| 2049 | ... | ... | ... |
| 2050 | ... | ... | ... |


 ...
 ...


 ...
 ...

C

C
