

Jurídico

# CONTRATO Y AÑO	RESOLUCIÓN 0402/2018 540/2018	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	104.385.056 /	
CONTRATISTA	LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA /			2. VALOR ADICION (+)	0	
NIT O CC:	10227007 /			3. VALOR TOTAL (1+2)	104.385.056 /	
CDP (#, rubro y fecha)	00904 2018/09/25 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
RP (#, rubro y fecha)	001028 2018/10/11 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	104.239.956 /	
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	145.100 /	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (100M DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA,					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIE NTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>						
					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	/
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					X	/
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	/
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	/
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	/
8- Ensayos de densidad.					X	/
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X	/
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECCOP

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


28-12-2018

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta original	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Copia del Registro Presupuestal	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0	0	0
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ACTA No 1 Y FINAL**

**CONTRATO N°:** RESOLUCIÓN 0402/2018  
**MODALIDAD DE CONTRATACION:** DIRECTA  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
**OBJETO:** CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (100M DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA-ACUEDUCTO CHINCHINA  
**CONTRATISTA:** LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA  
**C.C.** 10227007  
**MUNICIPIO:** CHINCHINA  
**COSTO INICIAL:** \$ 104.385.056  
**ADICION** \$ 0  
**COSTO CONTRATO** \$ 104.239.956  
**VALOR EJECUTADO** \$ 104.239.956  
**SALDO NO EJECUTADO** \$ 145.100  
**RECURSOS:** PROPIOS  
**SUPERVISOR** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ  
**CDP:** 00904 2018/09/25  
**RP** 001028 2018/10/11

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Noviembre de 2018, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA contratista, con el fin de realizar el acta 1 y final de la Resolucion 0402contrato1/2018.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



**GERARDO A. RAMIREZ**  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P




**LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA**  
Contratista

CONT #		RESOLUCIÓN 0402/2018	CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA	
OBJETO:		CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (100M DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL			ACTA 1			% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	Localización y replanteo	gl	1	200.000	200.000	1,00	200.000	100%
2	Excavaciones de 0- 2 m					-	-	
2.1	Material comun	m3	100	32.000	3.200.000	20,50	656.000	21%
2.2	Conglomerado	m3	120	35.000	4.200.000	223,90	7.836.500	187%
2.3	Roca	m3	30	80.000	2.400.000	13,60	1.088.000	45%
3	LLENOS							
3.1	Con arena	m3	60	80.000	4.800.000	36,00	2.880.000	60%
3.2	Con material de la excavacion	m3	167	20.000	3.340.000	204,12	4.082.400	122%
3.3	Afirmado	m3	23	70.000	1.610.000	14,80	1.036.000	64%
4	Instalacion de tubería de diametro 14"	ml	198	25.000	4.950.000	180,00	4.500.000	91%
5	Empalmes de diametro 14"	un	2	450.000	900.000	2,00	900.000	100%
6	Anclajes en 4 tubos diametro 1 1/2" L =1,50 m	un	2	400.000	800.000	2,00	800.000	100%
7	Concreto anclaje 280 kg/ cm2	m3	2	850.000	1.700.000	3,40	2.890.000	170%
8	Cerco en alambre de puas y guadua	ml	5	18.000	90.000	12,00	216.000	240%
9	Camara diametro 1,20 m y altura 1,50m con aro tapa para ventosa	UN	1	1.600.000	1.600.000	1,60	2.560.000	160%
	TOTAL				29.790.000		29.644.900	
	COSTO DIRECTO				22.749.141		22.638.335	
	ADMINISTRACION		24%		5.450.794		5.433.200	
	IMPREVISTO		1%		227.491		226.383	
	UTILIDADES		5%		1.137.457		1.131.917	
	IVA SOBRE UTILIDADES		19%		216.117		215.064	
	TOTAL				29.790.000		29.644.900	
	SUMINISTROS							
1	Tubería diametro 14" RDE 21 Biaxial ( 200 psi)	ml	198	280.254	55.490.292	198,00	55.490.292	100%


CONT #		RESOLUCIÓN 0402/2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P		CONTRATISTA		LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA			
OBJETO:		CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (100M DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA								
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			EJECUTADO		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
2	Codos 14x 22 1/2 HD JH	UN	2	1.892.000	3.784.000	2,00	3.784.000	2,00	3.784.000	100%
3	Uniones Universales R1-R2( 41cms) PVC-AC	un	2	950.000	1.900.000	2,00	1.900.000	2,00	1.900.000	100%
4	Suministros cplarin de 14 * con ventosa plastica automatica de 2"	un	1	500.000	500.000	1,00	500.000	1,00	500.000	100%
	TOTAL INCLUYE IVA DE 19%				61.674.292		61.674.292		61.674.292	
	ADMINISTRACION				9.251.144		9.251.144		9.251.144	
	UTILIDADES			15%	3.083.715		3.083.715		3.083.715	
	IVA SOBRE UTILIDADES			5%	585.906		585.906		585.906	
	TOTAL			19%	74.595.056		74.595.056		74.595.056	
	TOTAL				104.385.056		104.385.056		104.239.956	

RESUMEN DEL CONTRATO	
COSTO DEL CONTRATO	
ADICION	\$ 104.385.056
ACTA 1 Y FINAL	
VALOR EJECUTADO	\$ 104.239.956
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 104.239.956
SUMAS IGUALES	\$ 145.100
	\$ 104.385.056

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
SUPERVISOR  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA  
CONTRATISTA

5

CONTRATO No		RESOLUCIÓN 0402/2018		OBJETO		CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (LOOM DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA						
CONTRATISTA		LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ				
ITEM		Localización y replanteo				UNIDAD		VALOR UNITARIO		200000 VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	LARGO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,00					ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL
ACTA 1	1,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-					
ITEM		Material comun				UNIDAD		VALOR UNITARIO		32000 VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	7,0	0,8	1,95	-	10,92	-	10,92	desde camara ventosa (balsa 122,9 a 129,9)				ACTA 1
-	15,0	0,8	0,80	-	9,60	-	9,60	abalsa 129,9 a 144,9				ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL
ACTA 1	20,5	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-					
ITEM		Conglomerado				UNIDAD		VALOR UNITARIO		35000 VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	22,0	0,8	1,40	-	13,44	-	13,44	inicio para empalme uo				ACTA 1
-	103,9	0,8	1,40	-	116,37	-	116,37	to=112-4m+115,9				ACTA 2
-	7,0	0,8	1,95	-	10,92	-	10,92	cruce de via				ACTA FINAL
-	7,0	0,8	1,40	-	7,84	-	7,84	desde el codo hasta placa huella				ACTA 1
-	5,0	1,1	1,00	-	6,30	-	6,30	siguio lateral buscando tubería para empalme				ACTA 2
-	7,0	1,1	1,00	-	14,84	-	14,84	sobre excavacion en la camara ventosa				ACTA FINAL
0,80	22,0	0,8	2,70	-	58,72	-	58,72	abalsa 144,9 a 166,9				ACTA 1
0,80	5,0	1,5	2,70	-	16,20	-	16,20	abalsa 166,9 abalsa 171,9 sobre ancho para manipulacion del empalme				ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL
ACTA 1	221,9	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-					
ITEM		Roca				UNIDAD		VALOR UNITARIO		80000 VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
0,20	22,0	0,8	2,70	-	9,50	-	9,50	abalsa 144,9 a 166,9				ACTA 1
0,20	5,0	1,5	2,70	-	4,05	-	4,05	abalsa 166,9 abalsa 171,9 sobre ancho para manipulacion del empalme				ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL
ACTA 1	15,6	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-					
ITEM		Con arena				UNIDAD		VALOR UNITARIO		20000 VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	180,0	0,8	0,10	-	14,40	-	14,40	30 tubos filtrados				ACTA 1
-	180,0	0,8	0,15	-	21,60	-	21,60					ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-					

CONTRATO No		RESOLUCIÓN 0402/2018	OBJETO	CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES [100M DE LA CENTRAL] VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA									
CONTRATISTA		LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA					INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ				
ACTA 1	56,000	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Con material de la excavacion						UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	25000	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	258,00	1,00	1,00		258,00		258,00	excavacion				ACTA 1	
	(56,00)	1,00	1,00		(56,00)		(56,00)	arena					
	(180,00)	1,00	0,10		(17,88)		(17,88)	volumen tubo excavacion-arena-volumen del tubo					
ACTA 1	204,320	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Afirmado						UNIDAD	#REFI	VALOR UNITARIO		#REFI <th>VALOR TOTAL</th> <td></td>	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	123,00	0,80	0,15		14,76		14,76	conformacion				ACTA 1	
ACTA 1	14,8	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Instalacion de tuberla de diametro 14"						UNIDAD	#REFI	VALOR UNITARIO		#REFI <th>VALOR TOTAL</th> <td></td>	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	180,0					180,0	180,00	30 tubos instalados				ACTA 1	
ACTA 1	180,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Empalmes de diametro 14"						UNIDAD	m3	VALOR UNITARIO	85000	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	2,0					2,0	2,00					ACTA 1	
ACTA 1	2,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Anclajes en 4 tubos diametro 1 1/2" L=1,50 m						UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	18000	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	2,0					2,0	2,00	al principio y final				ACTA 1	
ACTA 1		ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
												ACTA 2	
ACTA 1		ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
												ACTA FINAL	
ACTA 1		ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								

CONTRATO No		RESOLUCIÓN 0402/2018		OBJETO		CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (DOM DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA					
CONTRATISTA		LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
ACTA 1	2.0	ACTA 2		-		ACTA FINAL		-			
ITEM	Concreto anclaje 280 kg/ cm2						UNIDAD	UH	VALOR UNITARIO	160000	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES			
2.00	2.8	0.8	0.80	-	1.58	-	3.58	cuatro anclajes 2 en los extremos y dos codos			
2.00	(1.0)	1.0	0.10	-	(0.20)	-	(0.20)	volumen tubo			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACTA 2	3.4	ACTA 1		-		ACTA FINAL		-			
ITEM	Cercos en alambre de puer y guardas						UNIDAD	#REFI	VALOR UNITARIO	#REFI	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES			
-	12.0	-	-	-	-	12.0	12.00	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACTA 2	12.0	ACTA 1		-		ACTA FINAL		-			
ITEM	Camara diametro 1,20 m y altura 1,50m con aro tapa para ventosa						UNIDAD	#REFI	VALOR UNITARIO	#REFI	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES			
-	1.6	-	-	-	-	1.6	1.60	se construyo camara de 2,5 y la especificacion es de 1,5, se construyo para sobre altura evitar la inundacion			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACTA 2	1.6	ACTA 1		-		ACTA FINAL		-			
SUMINISTROS											
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES			
Tuberia diametro 14" RDE 21 Bixtal (200 psi)											
-	199.0	-	-	-	-	199.0	199.00	-			
-	-	-	-	-	-	-	199.00	-			
-	-	-	-	-	-	-	199.00	-			
-	-	-	-	-	-	-	199.00	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACTA 1	199.0	ACTA 2		-		ACTA FINAL		-			
ITEM	Codos 14 x 22 1/2 HD JH						UNIDAD	#REFI	VALOR UNITARIO	#REFI	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES			
-	2.0	-	-	-	-	2.0	2.00	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACTA 1	2.0	ACTA 2		-		ACTA FINAL		-			
ITEM	Uniones Universales R1-R2(41cms) PVC-AC						UNIDAD	#REFI	VALOR UNITARIO	#REFI	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES			
-	2.0	-	-	-	-	2.0	2.00	Calle 10 Cra 4 ANDRES GUTIERREZ			
-	-	-	-	-	-	-	-	CALLEJON ANTONIO VILLADA			

CONTRATO No.	RESOLUCIÓN 0402/2018	OBJETO	CONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (100M DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA							
CONTRATISTA	LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA					INTERVENTOR	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
							CALLE PRINCIPAL No 9-16 LUIS VILLADA			
									ACTA 1	
									ACTA 2	
									ACTA FINAL	
ACTA 2	2.0	ACTA 1		ACTA FINAL						
ITEM	Suministros cpliarin de 14 " con ventosa plastica automatica de 2"					UNIDAD	#REF1	VALOR UNITARIO	#REF1	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
	1.0					1.0	1.00			
										ACTA 1
										ACTA 2
										ACTA FINAL
ACTA 1	1.0	ACTA 2		ACTA FINAL						



**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS  
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS**

**CERTIFICACION PENSIÓN**


Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, al señor(a) **LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **10227007**, con Número de Afiliación: **910227007000**, esta Administradora mediante resolución No. **579** de **2010** le concedió pensión de **JUBILACION** registrando fecha de ingreso a nómina **Marzo** de **2010**.

Que para la NOMINA de **Noviembre** de **2018** en la Entidad **7-BANCOLOMBIA ABONO CUENTA - 859-MANIZALES 2** No. de Cuenta **85956721861**, al pensionado(a) **AGUDELO OSPINA** se giraron los siguientes valores:

<b>DEVENGADOS</b>		<b>DEDUCIDOS</b>	
<b>VALOR PENSION</b>	<b>\$ 4,052,680.00</b>	<b>SALUD NUEVA EPS S.A.</b>	<b>\$ 486,400.00</b>
<b>MESADA ADICIONAL</b>	<b>\$ 4,052,680.00</b>	<b>PRESTAMO DAVIVIENDA</b>	<b>\$ 1,453,000.00</b>
<b>TOTAL DEVENGADOS</b>	<b>\$ 8,105,360.00</b>	<b>TOTAL DEDUCIDOS</b>	<b>\$ 1,939,400.00</b>
		<b>NETO GIRADO</b>	<b>\$ 6,165,960.00</b>

Estado: **ACTIVO**

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá, portal, el día 27 de diciembre de 2018.



**DORIS PATARROYO PATARROYO**

Director(a) de Nómina de Pensionados





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 10227007		AGUDELO OSPINA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV. 19 78 61	MANIZALES-CALDAS	8910893		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Salud	Pension	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-11	365835980	8486030070	I	2018/12/04	2018/11/15	BANICO DAVIVIENDA	0	\$783,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$783,500	\$0	\$0	\$0	\$783,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$783,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$783,500</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT: 10227007	3	AGUDELO OSPINA LUIS ALBERTO	B - MENOS DE 200 LOTIZANTES	01	AV 19 78 61 BR TERRAZAS DE CAMPO HERMOSO	MANIZALES-CALDAS	8910893	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2018-11	392000501	E	8486553903	2018/12/04	2018/12/05	BANCO DANRIVINDA	1	\$8,391,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	48	\$4,329,600	\$3,400	\$0	\$4,333,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$538,000	\$400	\$0	\$538,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$997,500	\$800	\$0	\$998,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$1,139,100	\$900	\$0	\$1,140,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,655,000	\$1,300	\$0	\$1,656,300	
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	48	\$1,885,000	\$1,400	\$0	\$1,886,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				-48	\$1,885,000	\$1,400	\$0	\$1,886,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	48	\$1,084,600	\$900	\$0	\$1,085,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				48	\$1,084,600	\$900	\$0	\$1,085,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$34,500	\$100	\$0	\$34,600	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	\$102,400	\$100	\$0	\$102,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$91,600	\$100	\$0	\$91,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$5,300	\$100	\$0	\$5,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$73,200	\$100	\$0	\$73,300	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$5,300	\$100	\$0	\$5,400	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$299,000	\$300	\$0	\$299,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$385,100	\$300	\$0	\$385,400	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	\$33,400	\$100	\$0	\$33,500	
SALUDVIDA S.A.- EPS MOVILIDAD	EPS033	830,074,184	5	2	\$37,000	\$100	\$0	\$37,100	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$17,800	\$100	\$0	\$17,900	
<b>TOTAL</b>				<b>48</b>	<b>\$8,383,800</b>	<b>\$7,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$8,391,000</b>	





UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 Conocimiento para todos los Colombianos  
 www.sena.edu.co NIT 899999034-1


¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido  
 máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
 caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
 generar un nuevo cupón.

61978196		
19	12	2018
24 12 2018		

Nombre ó Razón Social : **LUIS ALBERTO**      Identificación : **10227007**  
 Dirección : **AVDA. 19 7B-61**      Telefono : **3006524798**  
TEODAZAC

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$156,250.00
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$156,250.00
	IVA	
	TOTAL →	\$156,250.00

Observaciones  
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.  
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)  
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).  
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.  
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)61978196(3900)156250(96)20181224

BANCOLOMBIA  
 RECAUDO Fecha: 20-12-2018 09:30 Costo: 0.00  
 Dev: 29232 - SENAFIC  
 Suc: 969 - CENTRO DE PAGOS MANIZALES  
 Ciudad: MANIZALES  
 Caj: 095 Suc: 121  
 Valor Tot: \$ 156,250.00  
 Forma de Pago Efectivo  
 Pagador: 10227007  
 Ref: 61978196

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61978196

Ciudad: **MANIZALES**      Fecha: **20/12/18**      Nit o Cedula: **10227007**      Telefono: **3006524798**  
 Nombre del Pagador/Cliente: **LUIS ALBERTO**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$156,250.00

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034  
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC  
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10227007
Primer Nombre ó Razón Social	LUIS ALBERTO
Primer Apellido (si es Persona natural)	AGUDELO OSPINA ✓
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	AVDA. 19 7B-61 TERRAZAS CAMPOHERMOSO
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3006524798
Correo electrónico	pepsicolo007@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0460-00402-2018
Número Contrato de Obra	0460-0402-2018
Nombre Obra	EMERGENCIA EMPOCALDAS
Fecha Inicio Obra	26/11/2018
Fecha Terminación Obra	17/12/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ANSERMA RISARALDA CHINCHINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$25,254,596.00
Costo Total Mano de Obra	\$461,116.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$156,248.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$156,248.00
Total Pagado	\$156,248.00
Valor Total	\$156,250.00
IP Origen	172.31.45.108
Nro. Transacción eCollect	61978196
Fecha Proceso	19/12/2018 04:14:25 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



# Luis Alberto Agudelo Ospina

Ingeniero Civil - Mat. 17202-20389 Cds  
 Nit. 10.227.007-3 Régimen Común  
 Av. 19 N° 7B-61 Tn 2 cel. 300 652 4798 Manizales

FECHA 28 12 2018

FACTURA DE VENTA

N° 102

N° de formulario DIAN 18762011875706 Fecha 2018/12/18 Autoriza Num. del 101 al 200 Vigencia 18 meses

Señor(es):	EMPOCABOBS. S.A. E.S.P.	C.C ó NIT:	890-803.239.9
Dirección:	Cra 23 N-75-82	Tel:	8867080
		Ciudad:	M, B

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	- ACTA N-01 y FINAL SEGUN RESOLUCIÓN N: 00402. EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIVICHINA CALDAS CONTRA INUNDACION POR EMERGENCIAS URGENTE SECTOR TABAS PAZ, SURABOY & SUR SURDE (100 MTS DE LA CENTRAL) UTA SANTIAGO DE CHIVICHINA.	CD A	

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio, según Art. 774 del código de comercio modificado por Art. 5 Ley 1231 de 2008 y causara intereses moratorios a la letra máxima permitida por ley

SUBTOTAL	\$ 103.438.986
I.V.A.	\$ 800.970
TOTAL	\$ 104.239.956

Firma Recibido

C.C.

10.227007 M, B

Oficinas Manizales Quintana Aritas s/n 30.357 105-7 Tel 887489

 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<b>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</b>	<b>VERSION: 1</b>
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS "</b> <b>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ), VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO CHINCHINA, CALDAS"</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE DE 2018</b>

El presente informe tiene como fin dar a conocer las actividades desarrolladas dentro de la ejecución y solución de la emergencia presentada en el Acueducto del Municipio de Chinchiná Caldas.

**"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"**  
**"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ), VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO CHINCHINA, CALDAS"**

La Emergencia fue atendida entre los días 18 de Octubre y el 30 de Noviembre de 2018. (Plazo de ejecución 45 días calendario)

Se reemplazó un tramo de tubería fallado debido a un derrumbe que se presentó en la zona, la tubería de asbesto cemento (14") fue arrastrada por el material del deslizamiento, provocando la suspensión del servicio de agua potable al Municipio de Chinchiná, la emergencia se atendió temporalmente por personal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.con el fin de restablecer el servicio, lo cual se consiguió el mismo día.

Correspondió al contratista, instalar tubería Biaxial en PVC de 14" , tubería que fue suministrada por este y que arribo al sitio el día 9 de noviembre, fecha en la que se iniciaron las actividades correspondientes para su correcta instalación y puesta en servicio.

El registro grafico que a continuación se presenta evidencia las obras ejecutadas y la calidad de la misma.



 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  "RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"  "CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  CHINCHINA, CALDAS"</p>	<p>FECHA:  DICIEMBRE DE  2018</p> <p>PAGINA: 2 DE  13</p>




 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  "RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"</p>	<p>FECHA:  DICIEMBRE DE  2018</p>
	<p>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  CHINCHINA, CALDAS"</p>	<p>PAGINA: 3 DE  13</p>



 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  "RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS "</p>	<p>FECHA:  DICIEMBRE DE  2018</p>
	<p>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  CHINCHINA, CALDAS"</p>	<p>PAGINA: 4 DE  13</p>



EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO E INSTALACION TUBERIA

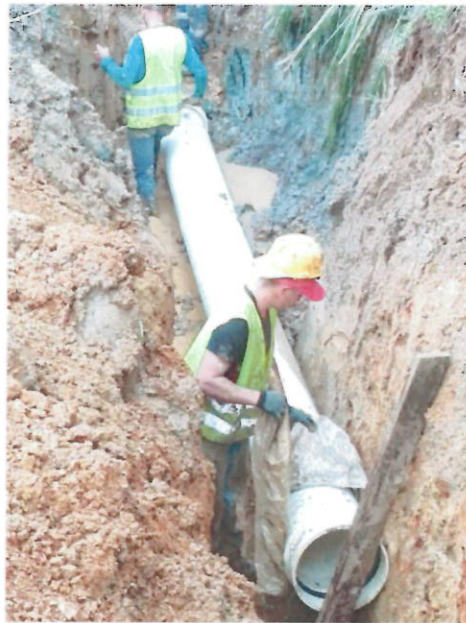

 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  "RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS "</p>	<p>FECHA:  DICIEMBRE DE  2018</p>
	<p>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  CHINCHINA, CALDAS"</p>	<p>PAGINA: 5 DE  13</p>



EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO - ROCA

# LAAO

INGENIERO CIVIL

INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018

VERSION: 1

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  
DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  
EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"  
"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  
VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  
SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  
VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  
CHINCHINA, CALDAS"

FECHA:  
DICIEMBRE DE  
2018

PAGINA: 6 DE  
13



## CAMA DE ARENA PARA TUBERIA

---

AVENIDA 19 7B - 61 TEL: 8910893 - 300 6524798  
Email: [pepsicolo007@yahoo.es](mailto:pepsicolo007@yahoo.es) MANIZALES (CALDAS)

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or a similar character, located at the bottom right of the page.

 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<b>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</b>	<b>VERSION: 1</b>
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS "</b> <b>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ), VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO CHINCHINA, CALDAS"</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE DE 2018</b>





 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  "RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"  "CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  CHINCHINA, CALDAS"</p>	<p>FECHA:  DICIEMBRE DE  2018</p>
		<p>PAGINA: 8 DE  13</p>



ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CODO 45



# LAAO

INGENIERO CIVIL

INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018

VERSION: 1

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  
DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  
EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"  
"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  
VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  
SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  
VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  
CHINCHINA, CALDAS"


FECHA:  
DICIEMBRE DE  
2018

PAGINA: 9 DE  
13



VACIADO CONCRETO ANCLAJE

AVENIDA 19 7B - 61 TEL: 8910893 - 300 6524798  
Email: [pepsicolo007@yahoo.es](mailto:pepsicolo007@yahoo.es) MANIZALES (CALDAS)

 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<b>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</b>	<b>VERSION: 1</b>
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS "</b> <b>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ), VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO CHINCHINA, CALDAS"</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE DE 2018</b>
		<b>PAGINA: 10 DE 13</b>

**INSTALACION TUBERIA LADERA**



**ACARREO TUBERIA TRAMO LADERA**

AVENIDA 19 7B - 61 TEL: 8910893 - 300 6524798  
 Email: [pepsicolo007@yahoo.es](mailto:pepsicolo007@yahoo.es) MANIZALES (CALDAS)

5


<h1>LAAO</h1> <p>INGENIERO CIVIL</p>	<b>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</b>	<b>VERSION: 1</b>
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE DE 2018</b>
	<b>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ), VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO CHINCHINA, CALDAS"</b>	<b>PAGINA: 11 DE 13</b>

**VACIADO CAMARA PARA VENTOSA CONCRETO ACELERADO**



**EXCAVACIONES TRAMO EMPALME (ROCA)**



 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  "RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE  DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA  EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"  "CONSTRUCCION POR EMERGENCIA,  VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A  SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ),  VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO  CHINCHINA, CALDAS"</p>	<p>FECHA:  DICIEMBRE DE  2018</p> <p>PAGINA: 12 DE  13</p>



TUBERIA PARA ANCLAJE



 <p>INGENIERO CIVIL</p>	<b>INFORME FINAL EMERGENCIA 0402-2018</b>	<b>VERSION: 1</b>
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>"RESOLUCION 00402, POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS "</b> <b>"CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES ( 100 MTS DE LA CENTRAL ), VIA SANTAROSA - CHINCHINA, ACUEDUCTO CHINCHINA, CALDAS"</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE DE 2018</b>





# EMPOCALDAS: RESOLUCIÓN EMERGENCIA 00402 -2018

## CHINCHINA - CALDAS

# LAAO

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS No 002-2018  
FECHA: DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	IMCABA-CIDAD	HORAS EXTRAS	SUELDO				DEDUCCIONES			NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
						BASICO	HORAS EXTRAS	AUX. TRANS	SUELDO	SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL DEDUCIDO		
										SALUD	PENSION			
CARLOS ARLEY GONZALEZ BERNAL	OFICIAL	\$ 1,200,000	12	-	-	\$ 480,000	0	\$ 35,284	\$ 515,284	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ 36,400	\$ 476,664	<i>Carlos A. Cardona</i>
JOSE ANTONIO CARDONA	AYUDANTE	\$ 781,242	12	-	-	\$ 312,497	0	\$ 35,284	\$ 347,781	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 25,000	\$ 322,781	<i>Jose A. Cardona</i>
DARWIN ANDRES CARDONA CALLEGO	AYUDANTE	\$ 781,242	12	-	-	\$ 312,497	0	\$ 35,284	\$ 347,781	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 25,000	\$ 322,781	<i>Darwin Cardona</i>
JUAN DAVID CARDONA GIRALDO	AYUDANTE	\$ 781,242	12	-	-	\$ 312,497	0	\$ 35,284	\$ 347,781	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 25,000	\$ 322,781	<i>Juan David C. G</i>
JAIMÉ DE JESUS DIAZ CRUZ	AYUDANTE	\$ 781,242	12	-	-	\$ 312,497	0	\$ 35,284	\$ 347,781	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 25,000	\$ 322,781	<i>Jaimé de Jesús Díaz Cruz</i>
JUAN PABLO GARCIA RAMIREZ	AYUDANTE	\$ 781,242	12	-	-	\$ 312,497	0	\$ 35,284	\$ 347,781	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 25,000	\$ 322,781	<i>J.P.G</i>
HERMAN EDILBERTO ADINO CUBILLOS	AYUDANTE	\$ 781,242	12	-	-	\$ 312,497	0	\$ 35,284	\$ 347,781	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 25,000	\$ 322,781	<i>Herman Edilberto Adino</i>
JUAN CARLOS MOSQUERA MARIN	AYUDANTE	\$ 781,242	12	-	-	\$ 312,497	0	\$ 35,284	\$ 347,781	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 25,000	\$ 322,781	<i>Juan C. Mosquera</i>
<b>TOTALES</b>		\$ 6,668,664	\$ 96	\$ -	\$ -	\$ 2,667,478	\$ -	\$ 282,275	\$ 2,949,753	\$ 106,699	\$ 106,699	\$ 213,398	\$ 2,736,355	

ELABORO:  APROBO: 

# EMPOCALDAS: RESOLUCIÓN EMERGENCIA 00402 -2018

## CHINCHINA - CALDAS

# LAAO

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS No 001-2018  
FECHA: DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	DIAS	INCAP. CIDAD	HORAS EXTRAS	SUELDO BASICO	BASICO	HORAS EXTRAS	AUX. TRANS	SUELDO	DEDUCCIONES			NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
											SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PENSION		
1	CARLOS ARLEY GONZALEZ BERNAL	OFICIAL	7	-	-	\$ 1.200.000	\$ 280.000	0	\$ 20.583	\$ 300.583	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 258.583	Palmer A. Garmashky	
2	JOSE ANTONIO CARDONA	AYUDANTE	7	-	-	\$ 781.242	\$ 182.290	0	\$ 20.583	\$ 202.872	\$ 10.417	\$ 10.417	\$ 182.039	Jose A. Durbona	
3	DARWIN ANDRES CARDONA GALLEGO	AYUDANTE	7	-	-	\$ 781.242	\$ 182.290	0	\$ 20.583	\$ 202.872	\$ 10.417	\$ 10.417	\$ 182.039	Darwin Cardona	
4	JUAN DAVID CARDONA GIRALDO	AYUDANTE	7	-	-	\$ 781.242	\$ 182.290	0	\$ 20.583	\$ 202.872	\$ 10.417	\$ 10.417	\$ 182.039	Juan David C.G	
5	JAIME DE JESUS DIAZ CRUZ	AYUDANTE	7	-	-	\$ 781.242	\$ 182.290	0	\$ 20.583	\$ 202.872	\$ 10.417	\$ 10.417	\$ 182.039	Jaime de Jesus Diaz Cruz	
6	JUAN PABLO GARCIA RAMIREZ	AYUDANTE	7	-	-	\$ 781.242	\$ 182.290	0	\$ 20.583	\$ 202.872	\$ 10.417	\$ 10.417	\$ 182.039	J.P.G	
7	HERNAN EDILBERTOLADINO CUBILLOS	AYUDANTE	7	-	-	\$ 781.242	\$ 182.290	0	\$ 20.583	\$ 202.872	\$ 10.417	\$ 10.417	\$ 182.039	Hernan Edilberto Cubillos	
8	JUAN CARLOS MOSQUERA MARIN	AYUDANTE	7	-	-	\$ 781.242	\$ 182.290	0	\$ 20.583	\$ 202.872	\$ 10.417	\$ 10.417	\$ 182.039	Juan Carlos Mosquera	
9															
						TOTALES	\$ 6.658.694	\$ -	\$ -	\$ 1.720.689	\$ 88.916	\$ 88.916	\$ 1.542.857		

ELABORO:  APROBO: 



 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	30/11/2018	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	RESOLUCIÓN 0402/2018
Objeto:	CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (100M DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA
Nombre Contratista:	LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA
Fecha del contrato:	11/10/2018
Plazo de ejecución:	45
Valor inicial:	104.385.056,00
Fecha de iniciación:	18/10/2018
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	30/11/2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1,1 Avance Físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1,2 Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		EJECUTADO	
		UN	CANT	CANT	VALOR
1	Localización y replanteo	gl	1	1,00	200.000
2	Excavaciones de 0- 2 m	0	0	-	-
2.1	Material comun	m3	100	20,50	656.000
2.2	Conglomerado	m3	120	223,90	7.836.500
2.3	Roca	m3	30	13,60	1.088.000
3	LLENOS	0	0	-	-
3.1	Con arena	m3	60	36,00	2.880.000
3.2	Con material de la excavacion	m3	167	204,12	4.082.400
3.3	Afirmado	m3	23	14,80	1.036.000
4	Instalacion de tubería de diametro 14"	ml	198	180,00	4.500.000
5	Empalmes de diametro 14"	un	2	2,00	900.000
6	Anclajes en 4 tubos diametro 1 1/2" L=1,50	un	2	2,00	800.000
7	Concreto anclaje 280 kg/ cm2	m3	2	3,40	2.890.000
8	Cerco en alambre de puas y guadua	ml	5	12,00	216.000
9	Camara diametro 1,20 m y altura 1,50m co	UN	1	1,60	2.560.000
0	TOTAL	0	0	-	29.644.900
0	COSTO DIRECTO	0	0	-	22.638.335



F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL			
0	ADMINISTRACION	0	0,24	-	5.433.200
0	IMPREVISTO	0	0,01	-	226.383
0	UTILIDADES	0	0,05	-	1.131.917
0	IVA SOBRE UTILIDADES	0	0,19	-	215.064
0	TOTAL	0	0	-	29.644.900
0	SUMINISTROS	0	0	-	-
1	Tuberia diametro 14" RDE 21 Biaxial ( 200 p	ml	198	198,00	55.490.292
2	Codos 14 x 22 1/2 HD JH	UN	2	2,00	3.784.000
3	Uniones Universales R1-R2( 41cms) PVC-AC	un	2	2,00	1.900.000
4	Suministros cpilarin de 14 " con ventosa pla	un	1	1,00	500.000
0	TOTAL INCLUYE IVA DE 19%	0	0	-	61.674.292
0	ADMINISTRACION	0	0,15	-	9.251.144
0	UTILIDADES	0	0,05	-	3.083.715
0	IVA SOBRE UTILIDADES	0	0,19	-	585.906
0	TOTAL	0	0	-	74.595.056
0	0	0	0	-	-
0	TOTAL	0	0	-	104.239.956

### 1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	45 DIAS
Tiempo total transcurrido:	45 DIAS
Avance Porcentual:	100%

### 1.4 Registro fotografico (puede presentarse como anexo o incluirlo en el informe

### 1.5 Problematicas con la obra

La obra se desarrolla normalmente se procede con las excavaciones en las cunetas en una longitud de 107 metros se cruza la via y se construye camara para ventosa, se continua en busqueda del tubo anterior talud abajo hasta encontrarlo en una longitud aproximada de 60 metros allis se proceden a los empalmes subsanado la emergencia presentada

### 1.6 Avance Financiero


Inversión Contratada:	104.385.056
Inversión ejecutada en el periodo:	104.239.956
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	104.239.956
Porcentaje total ejecutado:	100%

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	42-44-101111762
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT	42-40-101028382

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	11/10/2018	25/02/2019	\$ 31.315.516,80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	11/10/2018	25/11/2021	\$ 20.877.011,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS		\$ 20.877.011,20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI	2 AÑOS 1 MES 15 DIAS		\$ 20.877.011,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	11/10/2018	25/02/2019	\$ 31.315.516,80


### 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Natural)

3. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (para los casos donde verifique el incumplimiento de algun item, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situacion)

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN							
	INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL							
Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS
15/11/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
27/11/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica								

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

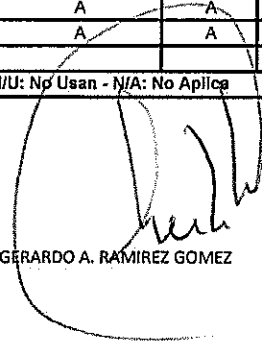




RESOLUCION NUMERO **00540**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 0402 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura Publica N°. 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura Publica N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

**CONSIDERANDO**

Que mediante Resolución No.00402 del 11 de Octubre del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el **Municipio de Chinchina, Caldas.**

*Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de Chinchina, fueron sustentadas mediante "oficio e informe de fecha 10 de octubre del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional de Chinchina Oscar Salazar, manifiesta "que se debe declara la emergencia en el municipio de Chinchina por daño en el tubo madre por un deslizamiento en el sector de tarapaca dejando sin servicio la conducción hacia la planta de Campo alegre con lo cual afecta la continuidad del servicio a la población urbana y así atender de manera inmediata el suceso y garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia en el servicio."*

*Así mismo, mediante oficio OM 8034 de fecha 10 de Octubre del 2018 enviado por el Jefe de Operación y Mantenimiento al señor Gerente solicita se declare la situación de emergencia en el municipio de Chinchina, lo anterior debido a que se recibido oficio e informe de fecha 10 de octubre del 2018 debidamente firmado por el administrador de la seccional Oscar Salazar, donde manifiesta que a las 6 a.m se recibió una llamada de un residente de tarapaca informando acerca de un daño en el tubo madre de la conducción, al desplazar trabajadores de mantenimiento al lugar se observó que allí se presentaba un deslizamiento que se llevo un tubo completo de asbesto cemento de 14" y desprendió un pedazo de tubo contiguo dejando sin servicio esa conducción teniendo que trabajar la planta a media maquina.*

Se observó igualmente en ese lugar que encima de la conducción se construyo una casa y se estaba sacando un banqueo para la construcción de otra casa hecho que desestabilizo el terreno y produjo un deslizamiento el cual se encuentra muy cerca del rio campo alegre



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co

26 DIC 2018



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

RESOLUCION NUMERO

000500

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 0402 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).

Que el daño en la red de distribución fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al **Municipio Chinchina, Caldas.**

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación del ingeniero **LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA.**

Que las cantidades para atender la Emergencia en el **Municipio de Chinchina, Caldas,** se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 11 de Octubre del 2018

Que dicha contratación se ejecuta con recursos propios de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Que el trabajo consistió en Construcción por emergencia variante sector tarapaca entrada a San Andres (100m de la central) vía Santa Rosa Chinchina-acueducto Chinchina

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 001028 por un valor de \$104.385.056

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de . **(\$104.239.956) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.**

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

26 DIC 2018



Gobernación  
de CALDAS

EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 0402 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS**

EMPOCALDAS S.A.E.S.P										
CONT#	RESOLUCIÓN 0402/2018	CONTRATISTA			LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA					
OBJETO:	CONSTRUCCION POR EMERGENCIA, VARIANTE SECTOR TARAPACA, ENTRADA A SAN ANDRES (100M DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA CHINCHINA- ACUEDUCTO CHINCHINA									
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	Localización y replanteo	pl	1	200.000	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	100%
2	Excavaciones de 0- 2 m									
2.1	Material comun	m3	100	32.000	3.200.000	20,50	656.000	20,50	656.000	21%
2.2	Conglomerado	m3	120	35.000	4.200.000	223,90	7.836.500	223,90	7.836.500	187%
2.3	Roca	m3	30	80.000	2.400.000	13,60	1.088.000	13,60	1.088.000	45%
3	LLENOS									
3.1	Con arena	m3	60	80.000	4.800.000	36,00	2.880.000	36,00	2.880.000	60%
3.2	Con material de la excavacion	m3	167	20.000	3.340.000	204,12	4.082.400	204,12	4.082.400	122%
3.3	Almado	m3	23	70.000	1.610.000	14,80	1.036.000	14,80	1.036.000	64%
4	Instalacion de tuberia de diametro 14"	ml	198	25.000	4.950.000	180,00	4.500.000	180,00	4.500.000	91%
5	Empalmes de diametro 14"	un	2	450.000	900.000	2,00	900.000	2,00	900.000	100%
6	Andajes en 4 Libros diametro 1 1/2" L =1,50 m	un	2	400.000	800.000	2,00	800.000	2,00	800.000	100%
7	Concreto andaje 280 kg/ cm2	m3	2	850.000	1.700.000	3,40	2.890.000	3,40	2.890.000	170%
8	Carco en alambre de puas y guadua	m2	5	18.000	90.000	12,00	216.000	12,00	216.000	240%
9	Camara diametro 1,20 m y altura 1,50m con aro tapa para vanlosa	UN	1	1.600.000	1.600.000	1,60	2.560.000	1,60	2.560.000	160%
<b>TOTAL</b>					<b>29.790.000</b>		<b>29.644.900</b>		<b>29.644.900</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>22.749.141</b>		<b>22.638.335</b>		<b>22.638.335</b>	
ADMINISTRACION						24%		5.433.200		5.433.200
IMPREVISTO						1%		226.383		226.383
UTILIDADES						5%		1.131.917		1.131.917
IVA SOBRE UTILIDADES						19%				
<b>TOTAL</b>					<b>216.117</b>		<b>215.064</b>		<b>215.064</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>29.790.000</b>		<b>29.644.900</b>		<b>29.644.900</b>	
<b>SUMINISTROS</b>										
1	Tuberia diametro 14" RDE 21 Biaxial ( 200 psi)	ml	198	280.254	55.490.292	198,00	55.490.292	198,00	55.490.292	100%
2	Codos 14 x 22 1/2 HD JH	UN	2	1.892.000	3.784.000	2,00	3.784.000	2,00	3.784.000	100%
3	Uniones Universales R1-R2( 4cms) PVC-AC	un	2	950.000	1.900.000	2,00	1.900.000	2,00	1.900.000	100%
4	Suministro coplan de 14" con venosa plastica automatica de 2"	un	1	500.000	500.000	1,00	500.000	1,00	500.000	100%
<b>TOTAL INCLUYE IVA DE 19%</b>					<b>61.674.292</b>		<b>61.674.292</b>		<b>61.674.292</b>	
ADMINISTRACION						15%		9.251.144		9.251.144
UTILIDADES						5%		3.083.715		3.083.715
IVA SOBRE UTILIDADES						19%				
<b>TOTAL</b>					<b>585.906</b>		<b>585.906</b>		<b>585.906</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>74.595.056</b>		<b>74.595.056</b>		<b>74.595.056</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>104.385.056</b>		<b>104.239.956</b>		<b>104.239.956</b>	

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al ingeniero LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA, contratista, por un valor de **CIENTO CUATRO MILLONES**

28 DIC 2018



Carrera 23 # 75-82, Manzales, Caldas  
 PBX :(+576) 886 7080  
 NIT: 890.803.239-9  
 empo@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1

## RESOLUCION NUMERO

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 0402 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$104.239.956.00) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer al ingeniero **LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA** con cédula de ciudadanía No. 10.227.007, la suma de **CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MCTE. (\$104.239.956.00) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES**, previos los descuentos de Ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

**ARTICULO TERCERO:** Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al ingeniero **LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA** con cédula de ciudadanía No. 10.227.007, la suma de **CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MCTE. (\$104.239.956.00) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES**, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

## NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

26 DIC 2018

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
GERENTE

**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Jefe Sección Contratación



Gobernación  
de CALDAS  
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1
