

	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA			
# CONTRATO Y AÑO	ACTO 013/2020	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	41.938.475
CONTRATISTA	HECTOR FABIO LADINO			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	75.094.889			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.938.475
CDP (#, rubro y fecha)	00765 DEL 29/09/2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000828 DEL 06/10/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	41.938.475
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN LA VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					N/A
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X
<p>Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOPI.</p> <p>Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.</p>					
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE			 FIRMA		
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA					# FOLIOS
Factura original o Documento equivalente					X
Acta parcial o final del contrato.					X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)					X
Copia del registro presupuestal					X
Fecha de presentación _____					
DATOS DEL SUPERVISOR					
ARLEX QUINTERO VASQUEZ		INGENIERO DE ZONA		 FIRMA	
NOMBRE		CARGO			
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS					
58323681358		AHORROS		BANCOLOMBIA	
CUENTA		TIPO DE CUENTA		BANCO	

1

2

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 19288684
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2020-12-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LADINO HECTOR FABIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75094889	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 57 D N 9C 06	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	HEFAL14@GMAIL.CO M	TELÉFONO	
FAX	8725099	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 11	Año: 2020	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		\$1.126.522		19288684

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-15990209	01	No	No	No	17	1	Fijo	CARDENAS PINEDA EUDORO		\$877.803
CC-9872451	01	No	No	No	17	1	Fijo	CASTAÑEDA ARIAS DANIEL		\$877.803
CC-1053842353	01	No	No	No	17	1	Fijo	CORTES RODRIGUEZ JORGE ELIECER		\$877.803
CC-1057787974	01	No	No	No	17	1	Fijo	GONZALEZ RIOS JUAN ESTEBAN		\$877.803
CC-1055917880	01	No	No	No	17	1	Fijo	GONZALEZ SALDARRIAGA JHON JAIRO		\$877.803
CC-10251527	01	No	No	No	17	1	Fijo	GUAYARA GOMEZ NICOLAS		\$877.803
CC-1002800639	01	No	No	No	17	1	Fijo	JIMENEZ LOPEZ OSCAR ALBERTO		\$877.803
CC-1193321589	01	No	No	No	17	1	Fijo	MORALES PATIÑO MANUEL ALFREDO		\$877.803
CC-1002731985	01	No	No	No	17	1	Fijo	RINCON TORRES JHON ALEXANDER		\$877.803
CC-1193311997	01	No	No	No	17	1	Fijo	RUIZ RIOS LUIS ALBERTO		\$877.803
CC-1057786667	01	No	No	No	17	1	Integral	SALAZAR MARTINEZ MARIA ISABEL		\$877.803
CC-1057782531	01	No	No	No	17	1	Fijo	USME GAVIRIA ELKIN HUMBERTO		\$877.803

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D A D A S	T T T V	Fecha Nov Vap	V V S	E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
																											NOVEDADES	
CC - 15990209	X	2020-11-09	X	2020-11-09																					0			
CC - 9872451	X	2020-11-09	X	2020-11-09																						0		
CC - 1053842353	X	2020-11-09	X	2020-11-13																						0		
CC - 1057787974	X	2020-11-09	X	2020-11-13																						0		
CC - 1055917880	X	2020-11-09	X	2020-11-09																						0		
CC - 10251527	X	2020-11-09	X	2020-11-13																						0		
CC - 1002800639	X	2020-11-09	X	2020-11-09																						0		
CC - 1193321589	X	2020-11-13	X	2020-11-14																						0		
CC - 1002731985	X	2020-11-09	X	2020-11-09																						0		
CC - 1193311997	X	2020-11-12	X	2020-11-14																						0		
CC - 1057786667	X	2020-11-09	X	2020-11-13																						0		
CC - 1057782531	X	2020-11-09	X	2020-11-13																						0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFF	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 15990209	FORVENIR	1	\$29.261	0.1600000	\$4.700	\$0	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9872451	COLFONDOS	1	\$29.261	0.1600000	\$4.700	\$0	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1053842353	PROTECCION	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1057787974	PROTECCION	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1055917880	PORVENIR	1	\$29.261	0.1600000	\$4.700	\$0	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0
CC - 10251527	PORVENIR	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1002800639	PORVENIR	1	\$29.261	0.1600000	\$4.700	\$0	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1193321589	PORVENIR	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1002731985	PORVENIR	1	\$29.261	0.1600000	\$4.700	\$0	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1193311997	PORVENIR	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1057786667	PORVENIR	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1057782531	PORVENIR	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cote	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cote	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 15990209	SALUD TOTAL	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$29.261	100	0.0696000	\$2.100
CC - 9872451	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$29.261	100	0.0696000	\$2.100
CC - 1053842353	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	100	0.0696000	\$10.200
CC - 1057787974	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	100	0.0696000	\$10.200
CC - 1055917880	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$29.261	100	0.0696000	\$2.100
CC - 10251527	SALUD TOTAL	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	100	0.0696000	\$10.200
CC - 1002800639	ESSC ASMET SALUD	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$29.261	100	0.0696000	\$2.100
CC - 1193321589	ESSC ASMET SALUD	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	100	0.0696000	\$10.200
CC - 1002731985	ESSC ASMET SALUD	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$29.261	100	0.0696000	\$2.100
CC - 1193311997	ESSC ASMET SALUD	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	100	0.0696000	\$10.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	BPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CF	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057786667	NUOVA E.P.S. S.A.	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	100	0.0696000	\$10.200
CC - 1057782531	SALUD TOTAL	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	100	0.0696000	\$10.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-15990209	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9872451	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053842353	CCF DE CALDAS	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057787974	CCF DE CALDAS	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1055917830	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10251527	CCF DE CALDAS	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002806639	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1193321589	CCF DE CALDAS	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002731985	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1193311997	CCF DE CALDAS	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057786667	CCF DE CALDAS	5	\$102.411	0.0400000	\$4.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057782531	CCF DE CALDAS	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11													
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
PORVENIR	9	\$136.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$136.300		
COLFONDOS	1	\$4.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$4.700		
PROTECCION	2	\$47.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$47.000		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	4	\$14.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.200	0	\$0	\$0	\$14.200	\$0	0	\$0	\$0	\$14.200	\$0	\$0	\$14.200
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$5.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$5.900	0	\$0	\$0	\$5.900	\$0	0	\$0	\$0	\$5.900	\$0	\$0	\$5.900
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$7.100	0	\$0	\$0	\$7.100	\$0	0	\$0	\$0	\$7.100	\$0	\$0	\$7.100
SALUD TOTAL	3	\$13.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$13.000	0	\$0	\$0	\$13.000	\$0	0	\$0	\$0	\$13.000	\$0	\$0	\$13.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$7.100	0	\$0	\$0	\$7.100	\$0	0	\$0	\$0	\$7.100	\$0	\$0	\$7.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGOS INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	12	\$81.900	0	\$0	\$0	\$81.900	0	\$0	\$81.900	0	\$0	\$0	\$81.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	
CCF DE CALDAS	12	\$45.500	0	\$0	\$45.500	
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$47.300
PENSIONES	3	\$188.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$81.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$45.500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$362.700

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: VICTOR MAURICIO HENAO ARIAS

Nro. de recibo: 19288684

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.10.137

Concepto: CC

Razón Social: 75094889

Fecha y hora de la transacción: Martes 1 de Diciembre de 2020 03:10:54 PM

Nro. de comprobante: 0000090299


Valor pagado: \$ 362,700.00

Cuenta: *****1149

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 381 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1888 379 9714 - en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtele de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

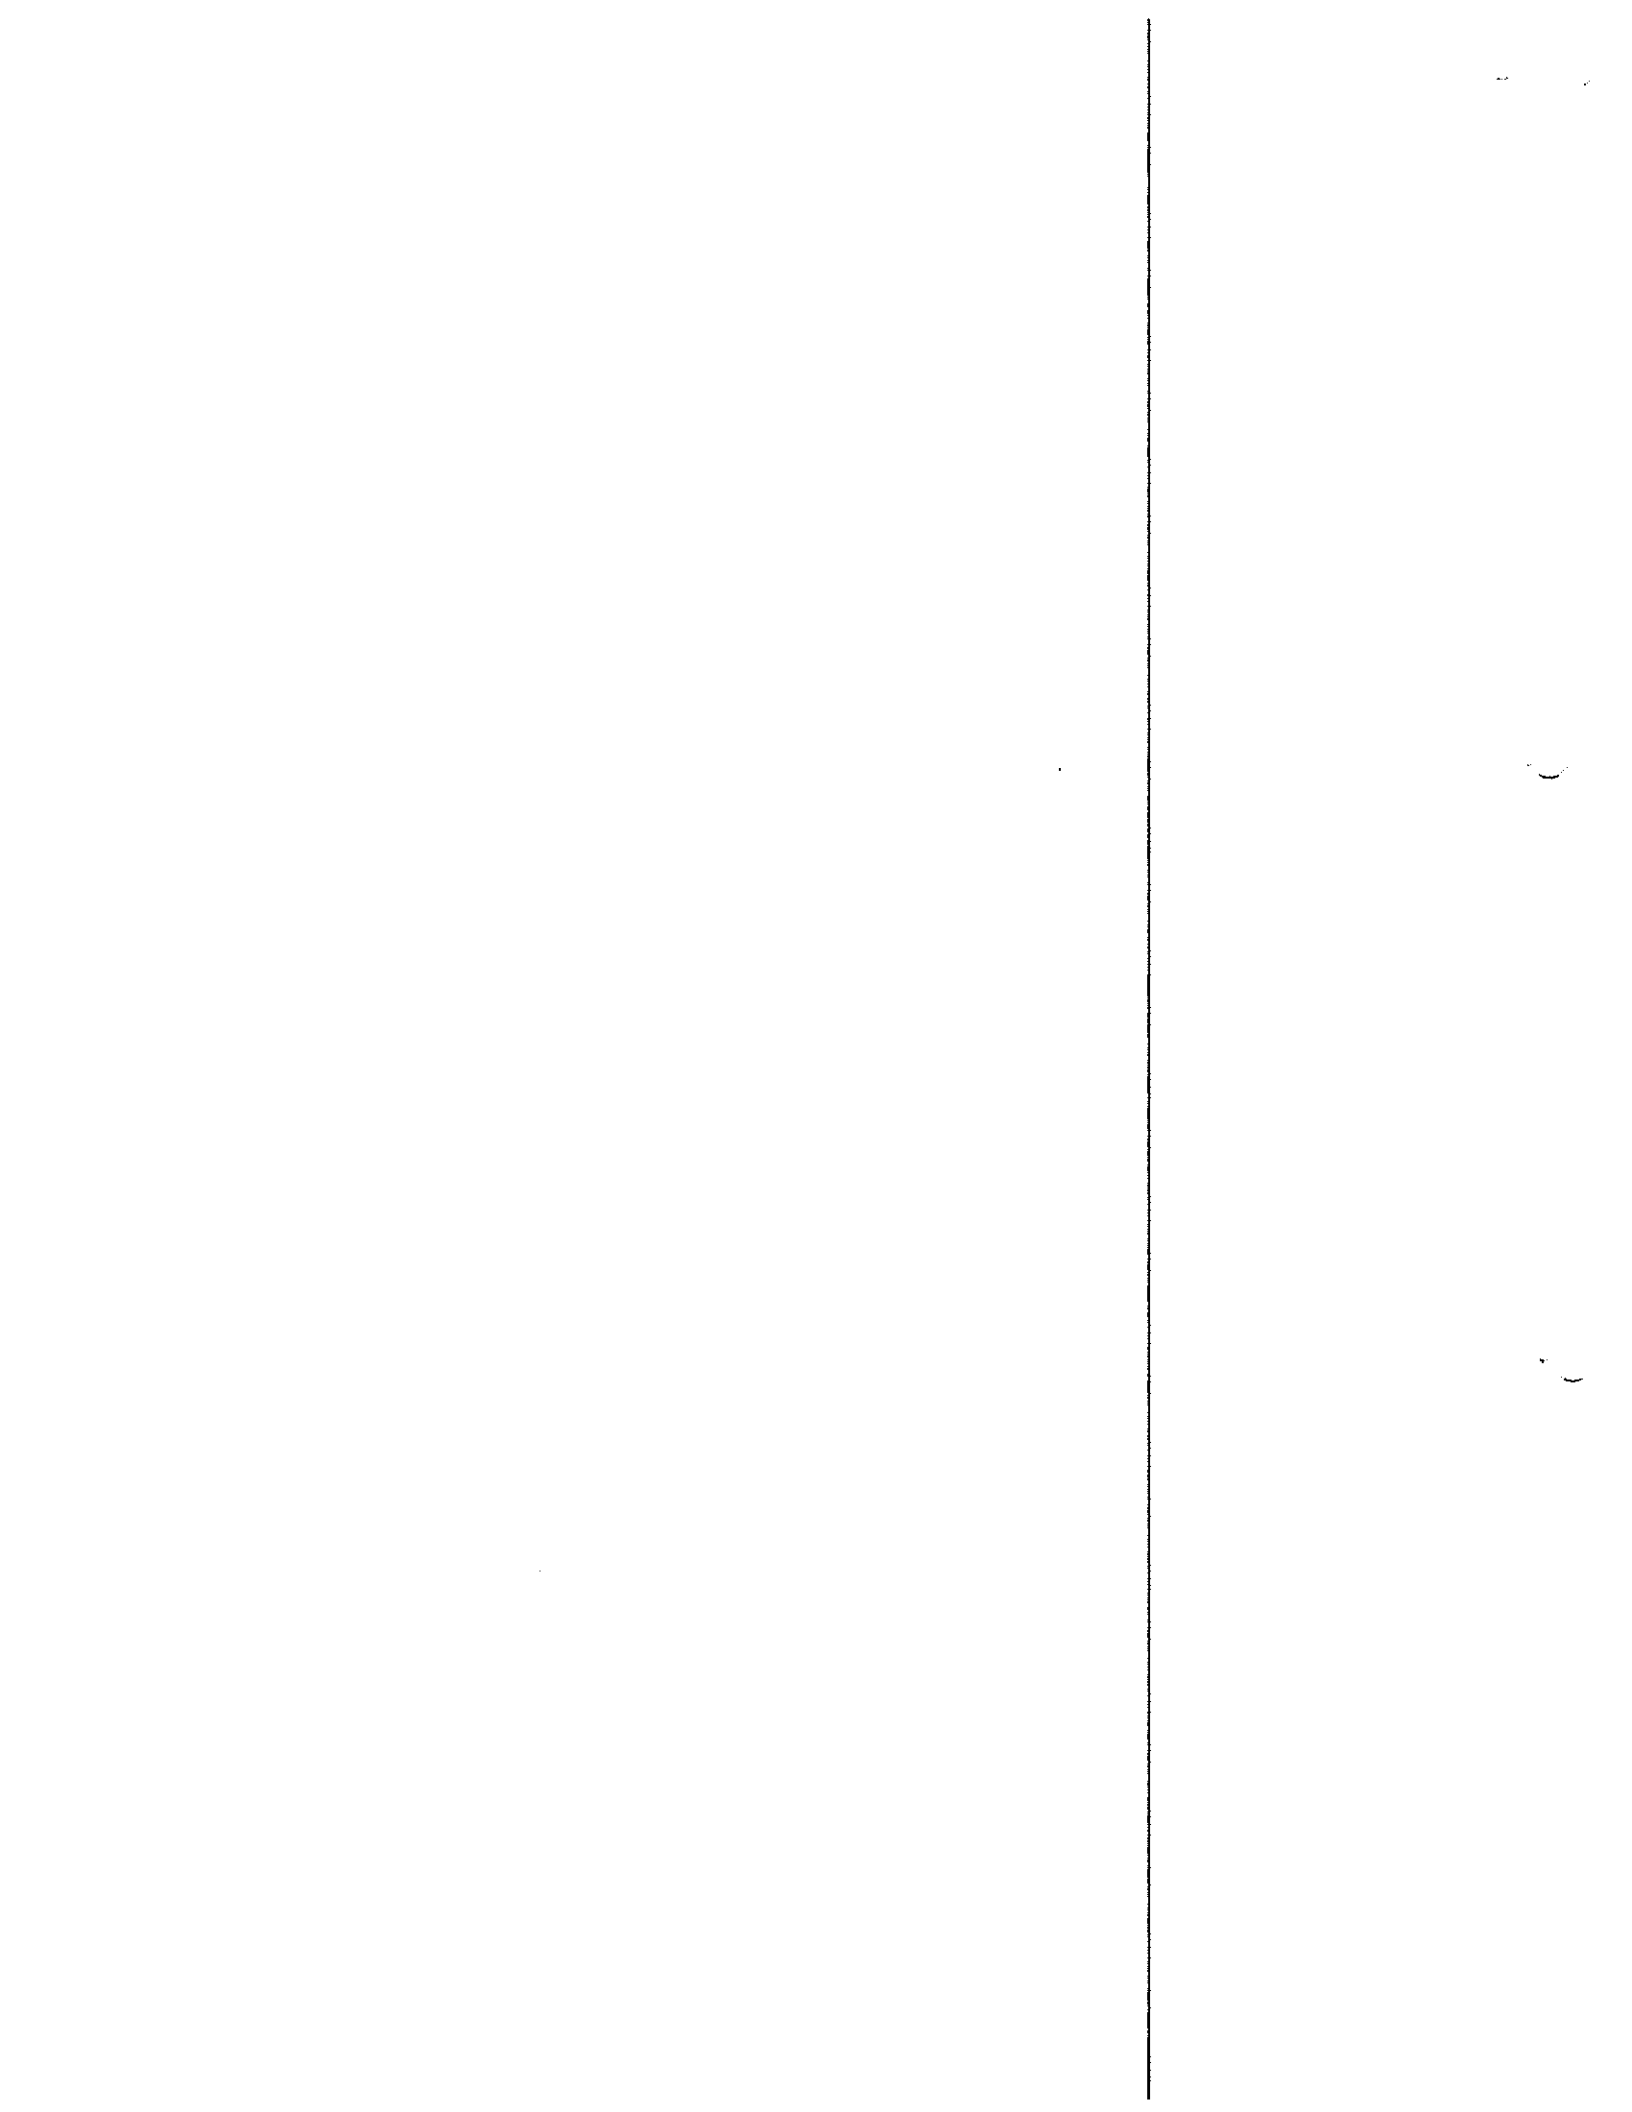

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 869999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado; en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.


TICKET		
68277470		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	12	2020
FECHA VENCIMIENTO		
06	12	2020

Nombre o Razon Social : HECTOR FABIO **Identificación :** 75094889

Dirección : CL 57 D Nro 9 C **Telefono :** 3184927741

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 096900028636 FECHA: 2020/12/02 HORA: 08:06:38 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 14 TOTAL EFE: \$ 131,700.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 131,700.00 NRO. FACTURA 6815758	VALOR. FACTURA \$ 131,700.00
CIENTO TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$131,700.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$131,700.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6815758(3900)00000131700(96)20201206



CONVENIO No 29232

TICKET No. 68277470


Ciudad Manizales 01 12 20 Nit o Cedula 75094889 Telefono 3184927741

Nombre del Pagador / Cliente
HECTOR FABIO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:


Número de Identificación	75094889
Primer Nombre ó Razón Social	HECTOR FABIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	LADINO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CL 57 D Nro 9 C 06 CASA 89
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3184927741
Correo electrónico	hefal14@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	013-2020
Número Contrato de Obra	013-2020
Nombre Obra	EMER MANZANARES013-2020
Fecha Inicio Obra	01/11/2020
Fecha Terminación Obra	07/11/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANZANARES
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$41,938,475.00
Costo Total Mano de Obra	\$980,652.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$131,670.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Total Pagado	\$131,670.00
Valor Total	\$131,700.00
Nro. Transacción eCollect	68277470
Fecha Proceso	01/12/2020 04:24:24 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.


[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)

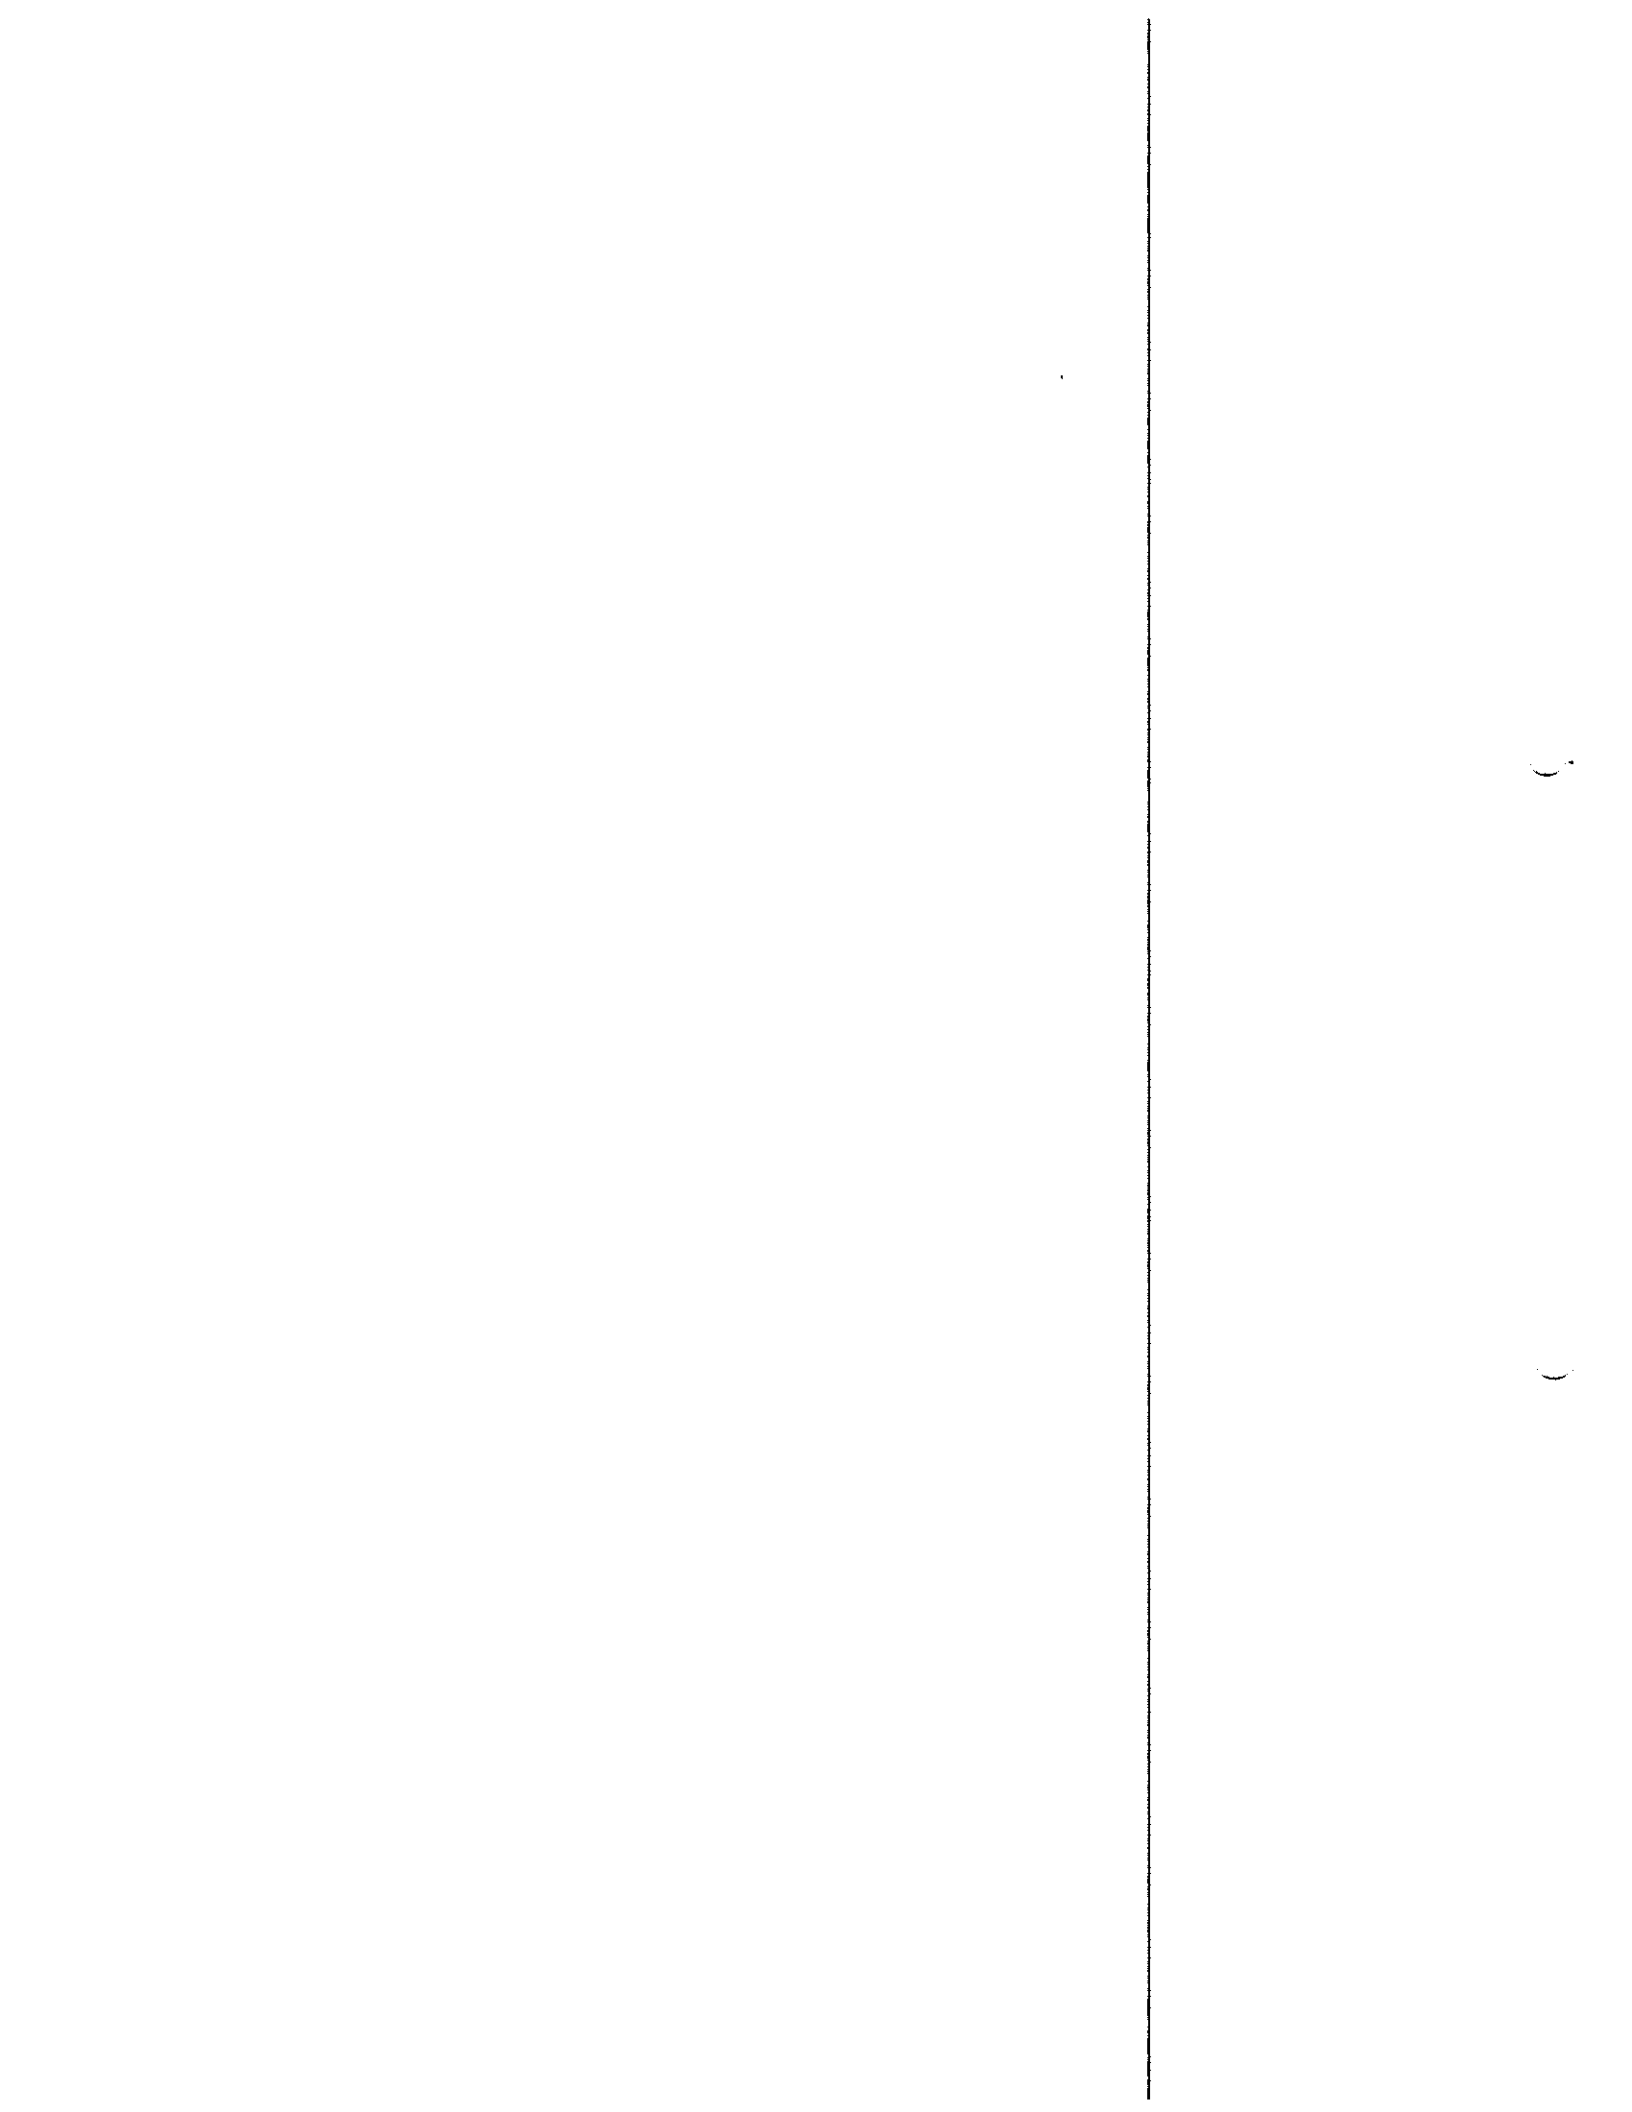

Espacio para
Logo Corporativo

HECTOR FABIO LADINO
NIT 75.094.889-6
CL 57 D 9C 06 CA 89 MZ 5 ET II MRADOR DE
LA CAROLA
Tel: (000) 3128324251
Manizales - Colombia
hefal14@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-4

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT 890.803.239-9
Dirección CR 23 75 82

Teléfono (036) 8867080
Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/12/2020, 15:39
Expedición 21/12/2020, 15:40
Vencimiento 14/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo
1	CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN LA VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS	1.00	31,077,047.00	0.00	0 %
2	ADMINISTRACION	1.00	8,701,573.12	0.00	0 %
3	IMPREVISTO 1%	1.00	310,771.00	0.00	0 %
4	UTILIDAD 5%	1.00	1,849,083.88	295,231.88	19 %

Valor en Letras:
Cuaranta y un millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte


Total Bruto 41,643,243.12
IVA 19% 295,231.88
Total a Pagar 41,938,475.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-14 por \$ 41,938,475.00

Observaciones:

Elaborado y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

A la fecha de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías expresadas en los precios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764008013333 aprobado en 20201124 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses No responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 0,0037 CUIFE: 995961af930fc83fe3a881c2e6558f379e8c48ea06deb683dab25dcca038ce8d26a79314f3463a20b67a9657d202c4b3




EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

\ INFORME DE OBRA

\ ACTO N° 013-2020

**“CAMBIO DE TUBERÍA POR EMERGENCIA
EN LA CONDUCCIÓN EL PALO EN LA
VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE
MANZANARES, CALDAS”**

**\ CONTRATISTA: HÉCTOR FABIO LADINO
SUPERVISOR: ARLEX QUINTEROVASQUEZ**

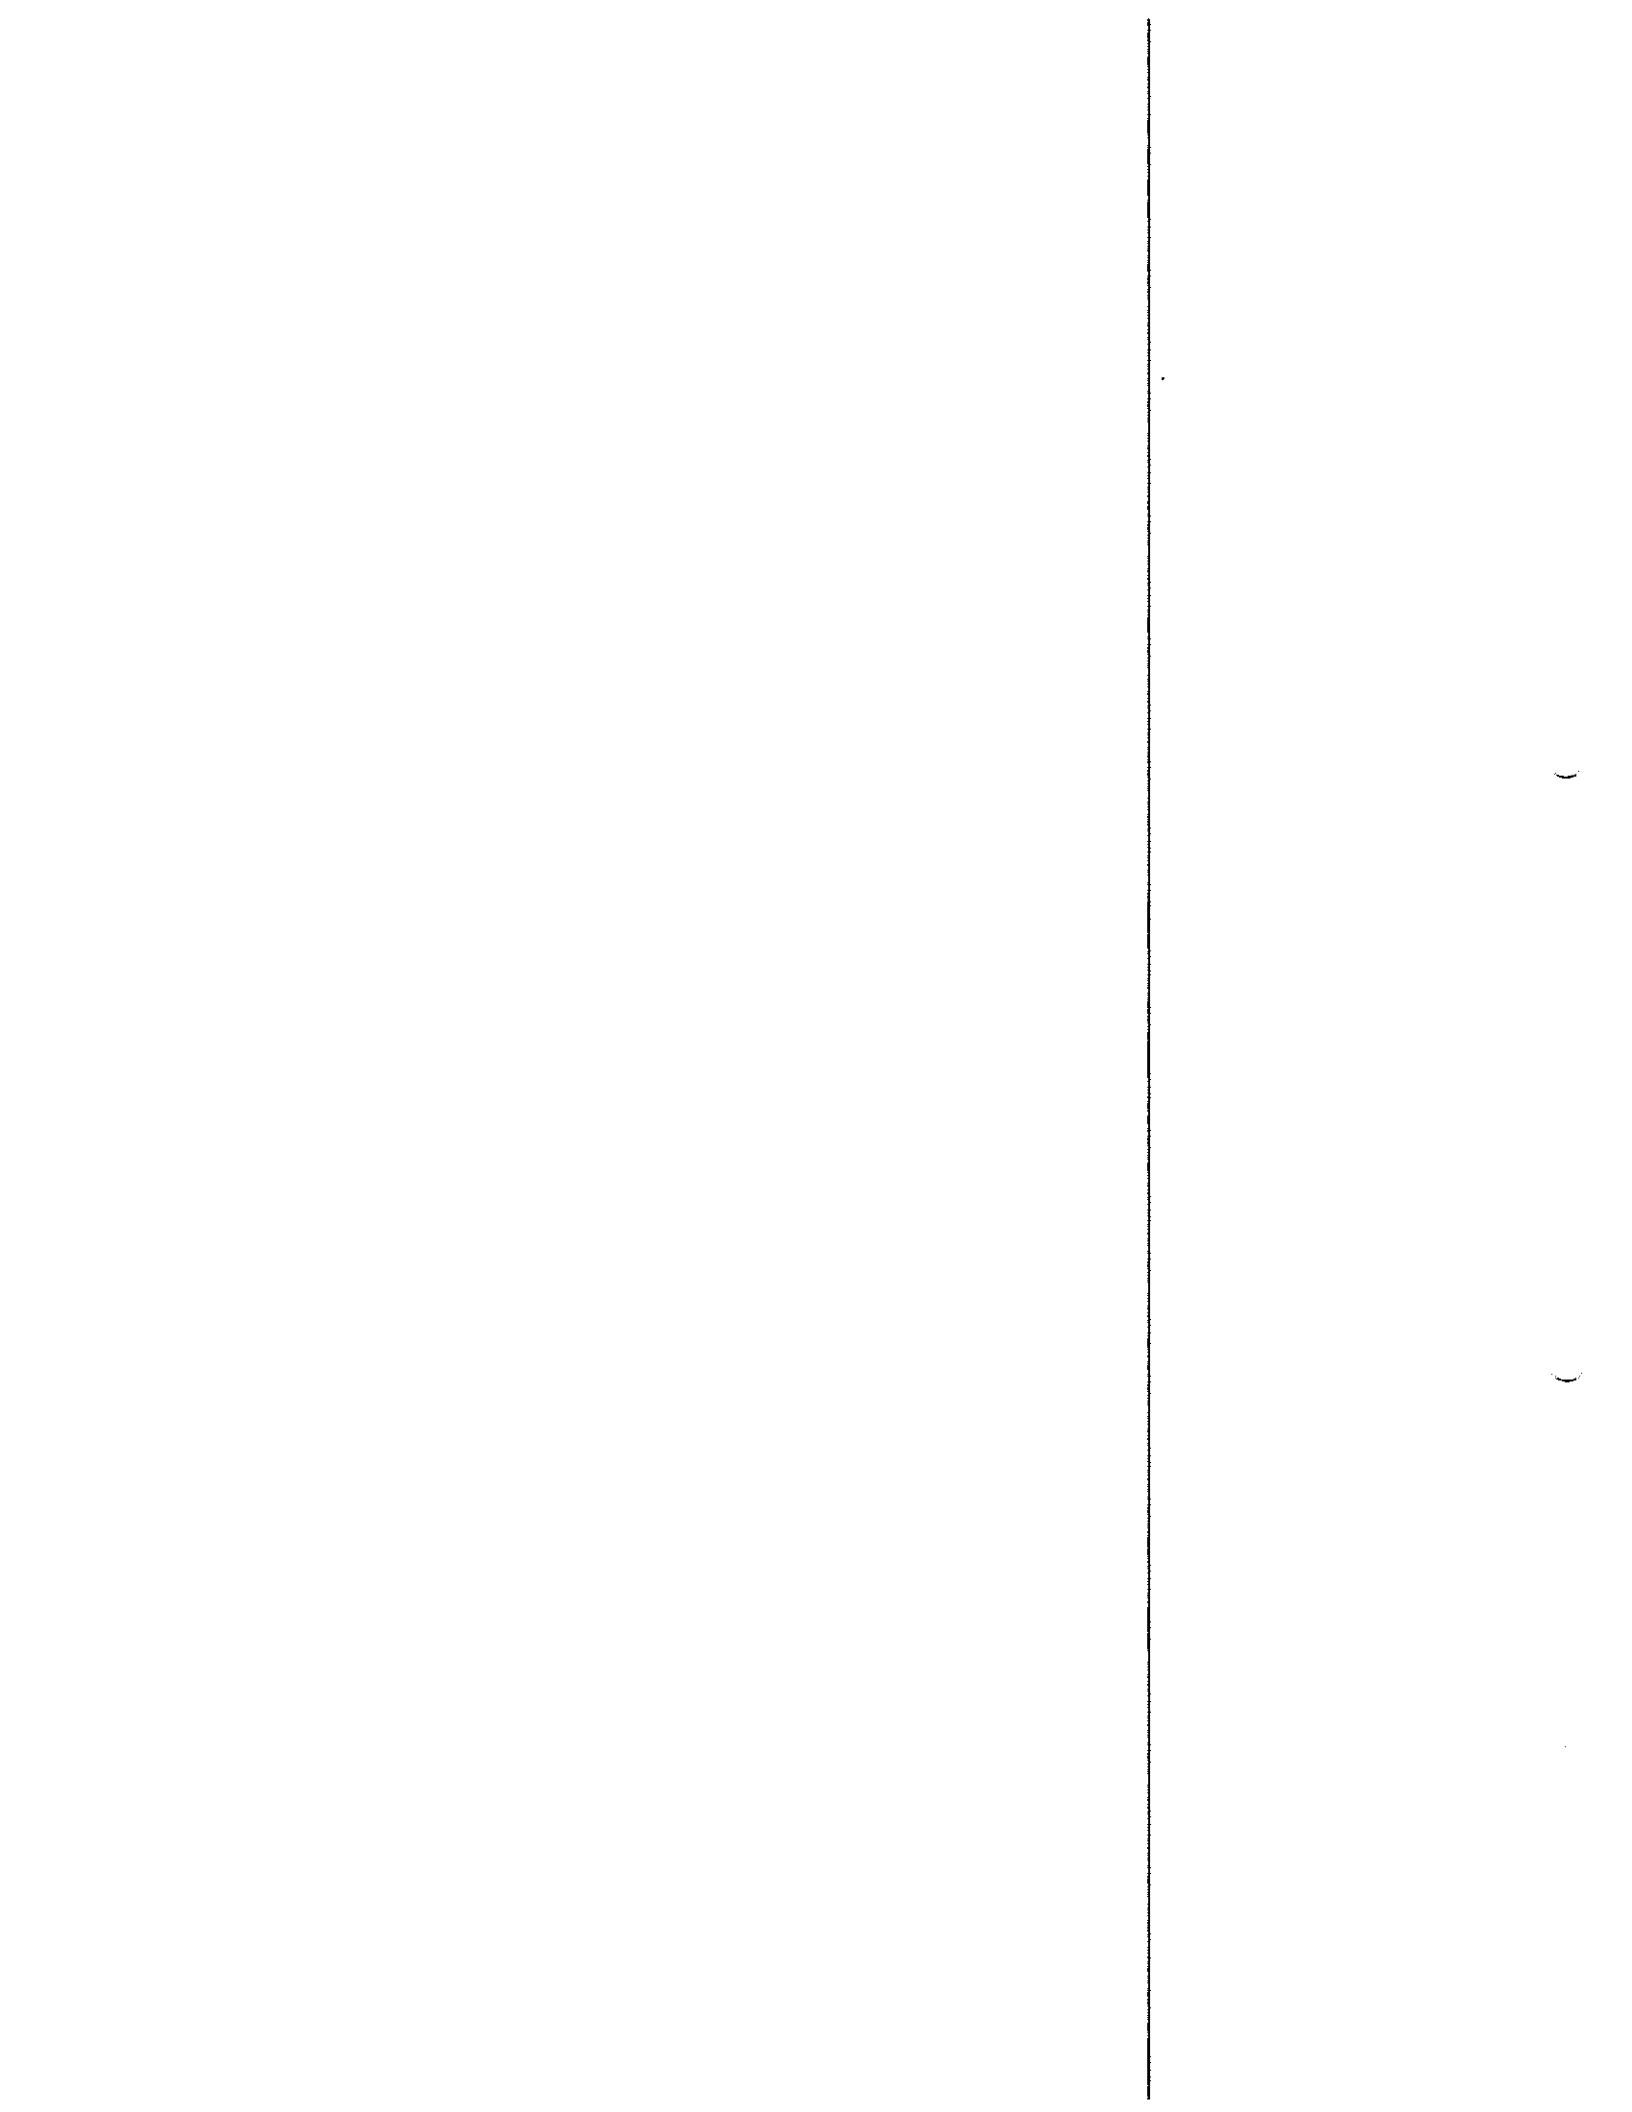

Información básica

Nombre del Municipio

MANZANARES

Apelativo

Ciudad Cordial de Colombia

Fecha de Fundación **1864**

Fundadores

Bartolomé Gaviria, Ramón Valencia y Pedro Campuzano

Municipio desde **1879**

Altura **1.863 MSNM**

Temperatura Promedio **20° C**

Extensión **210 Km2**

Población **18.143 Habitantes**

Distancia en kilómetros **117 km A Manizales**

Gentilicio

Manzanareño O Manzanareña


LUGAR DE DESARROLLO DE LAS OBRAS



La obra se realiza en dos predios ubicados en zona rural conocidos como Finca San Antonio y Finca Villa Milia, por lo cuales se encontraba el paso de la tubería de 8" en AC y las cuales se propone para la sustitución por tubería de PVC del mismo diámetro.

Se dió inicio a las actividades propias de la obra, realizando con el Maestro de Obra e Ingeniero contratista un recorrido por el trazado actual de la tubería por la cual se extendió la nueva tubería de PVC y se iniciaron las actividades de excavación para despejar el empalme actual de polietileno con AC de desde donde se dio inicio a la reposición de la tubería.

Se continuó durante las primeras jornadas en esta actividad en la cual se encontró que el empalme donde se iniciaron las actividades tuvo algunas dificultades en el arranque debido a la rigidez de la tubería, situación que se solucionó en obra, con el propósito de continuar con el empalme de tubería.



En el proceso de instalación se observó la necesidad de accesorios para poder continuar próximos al trazado original de la línea de conducción, para lo cual se requirió a la empresa para el suministro de los accesorios requeridos, en este caso 3 codos de 22.5°, para ser usados en cambios de dirección, tanto vertical como horizontal.

Durante el proceso de excavación se encontraron accesorios (uniones de reparación) en varios tramos, los cuales fueron debidamente relacionados y entregados a la empresa.

En el desarrollo de la obra se tuvieron dificultades con las lluvias durante todos los días presentándose de manera intensa sobre todo en horas de la tarde.

En la finca San Antonio, se dio la necesidad de construir un muro en tierra armada con sacos de suelo cemento 10:1 y una columneta en concreto con el propósito de estabilizar una zona erosionada y brindar protección lateral al tubo, a su vez brindarle protección contra la intemperie.

Al finalizar la obra luego del proceso de lleno compactado, se realiza una limpieza general de las zonas intervenidas, se retiran los avisos de obra y demás elementos utilizados para el desarrollo de la misma.

Trazabilidad de la tubería: 12211200301 2 todo el lote de tubería



HÉCTOR FABIO LADINO

Contratista

C.C.75.094.889

T.P. 17202120679CLD

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto N°1 Excavación zona empalme AC y Polietileno



Foto N°2 Proceso de excavación de la tubería de AC



Foto N°3 Proceso de excavación uso de EPP




Foto N°4 Proceso de excavación en la línea de conducción



Foto N°5 Empalme 1 Finca San Antonio



Foto N°6 Empalme tubo a tubo



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto N°7 Instalación de accesorio Codo de 22.5° Finca San Antonio



Foto N°8 Instalación de segundo accesorio codo de 22.5° y unión de empalme camino



Foto N°9 Instalación de tercer accesorio codo de 22.5° Finca Villa Milia



Foto N°10 Empalme entre tubería PVC y tubería de AC Finca Villa Milia



Foto N°11 Trincho en sacos de suelo cemento para contención lateral de tubo Finca San Antonio




Foto N°12 Trincho en sacos de suelo cemento para contención lateral de tubo Finca San Antonio con columneta en concreto simple

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto N°13 Esquema aproximado de la instalación de la tubería de PVC de 8" en los predios intervenidos



Manzanares, 23 de noviembre de 2020

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Manzanares

Asunto: Entrega de accesorios segunda mano obra emergencia.


Según el asunto de la referencia me permito hacer entrega de los siguientes accesorios y elementos encontrados en obra y los cuales corresponden a la tubería que existía antes de la realización de la reposición de la tubería de PVC de 8 pulgadas.

- 14 unión universal
- 3 empaques
- 1 ventosa
- 1 adaptador bridado

Cordial saludo

P.P. M. Isabel S.M
ING HECTOR FABIO LADINO
C.C 75094889
CONTRATISTA

Recibí
Weimar Muñoz L.
23/11-2020
16:07



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE GESTION SOCIAL

ACTO 0013-2020

**“CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN
EL PALO EN LA VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE
MANZANARES, CALDAS”**


CONTRATISTA: HECTOR FABIO LADINO

TRABAJADORA SOCIAL: NATALIA SANCHEZ ORTEGON

SUPERVISOR: ING. ARLES QUINTERO

empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar



ACTO 0013

“CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN EL PALO EN LA VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS”

El día 17 de Octubre del 2020, se realizó visita inicial en el sitio de la obra, realizando recorrido y reconocimiento del trazado actual de la tubería de acueducto, verificando los predios que estarán involucrados en el desarrollo de las actividades; en esta visita, participan los encargados de los predios, la profesional social y el área técnica por parte del contratista (Ingeniero y Maestro de obra).


Durante la visita se realizó la socialización inicial del contrato, informando el objeto del contrato, el contratista a cargo y el tiempo de ejecución del mismo.

FINCA SAN ANTONIO

En la finca San Antonio, se realiza el recorrido con el señor Pedro Alfredo Restrepo, quien conoce el trazado de la tubería actual de acueducto que pasa por el predio, indicando que la tubería ha presentado varios daños durante los últimos años, afectando su terreno y sus cultivos, manifestando estar de acuerdo con la realización de la obra.


En el recorrido del trazado de la tubería se puede observar que gran parte de este, ya cuenta con el espacio o camino de tránsito marcado, debido a los múltiples daños presentados en la red, el resto del predio cuenta con cultivos de café.

Al finalizar la visita el encargado autorizó el inicio de las actividades; por ello el 19 de Octubre del 2020, el personal se presentó en el sitio para iniciar con las actividades, pero pese a su previa autorización, el encargado de predio, niega el ingreso del personal, manifestando que antes de iniciar es necesario que se aclare el tema de la servidumbre y las afectaciones que se presentaran con el desarrollo del contrato; esta solicitud es trasladada por el contratista directamente a Empocaldas S.A.E.S.P. quien realiza la evaluación de la servidumbre a través de la lonja y llegan a un acuerdo con el encargado del predio, quien avala el ingreso del personal.



FOTOS INICIALES





FOTOS FINALES

El día 07 de Noviembre del 2020 se realizó el recorrido de cierre de obra, en compañía del encargado del predio, quien manifiesta estar de acuerdo en las condiciones en que queda su predio y se da por terminadas todas las actividades la obra, como constancia de ello se firma el acta de cierre.






FINCA VILLA MILIA

En la finca Villa Milia, se realiza el recorrido con el señor Diego Jiménez, a quien se le explica donde pasa la tubería y hasta qué punto del predio llegaría la obra, a lo cual, el señor autoriza el ingreso y el inicio de las actividades, pero al salir del predio, el dueño de la finca se comunica con la profesional social e indica que el no autoriza el ingreso hasta que Empocaldas S.A.E.S.P.; Se comuniqué con él y le realice el respectivo retroactivo por la servidumbre y por las afectaciones causadas con la realización de la obra; Dicha solicitud es trasladada por el contratista directamente a Empocaldas S.A.E.S.P. quien realiza la evaluación de la servidumbre a través de la lonja y llegan a un acuerdo con el encargado del predio, quien avala el ingreso del personal.

FOTOS INICIALES





FOTOS FINALES


El día 07 de Noviembre del 2020 se realizó el recorrido de cierre de obra, en compañía del encargado del predio, quien manifiesta estar de acuerdo en las condiciones en que queda su predio y se da por terminadas todas las actividades la obra, como constancia de ello se firma el acta de cierre.



Natalia Sánchez Ortégón.

Natalia Sánchez Ortégón

PROFESIONAL SOCIAL





F-AC-47
Versión 1
Marzo 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
CONTROL DE LA GESTION

ACTA DE REUNION INICIAL-GESTION SOCIAL


ASUNTO	Socialización inicial de obra con los propietarios de los predios.		
CONTRATO	Acto 0013	CONTRATISTA	Hector Fabio Ladino
GESTION SOCIAL	Natalia Sánchez Ortega	SUPERVISION	Arles Quintero

DESARROLLO

El día 17 de Octubre del 2020 se realiza visita inicial al sitio de la obra y se hace recorrido con los encargados de los predios, para con reconocimiento del trazado actual de la tubería del acueducto, durante la visita se identifica que la obra involucra dos fincas, una es la finca San Antonio quien el encargado es el señor Pedro Algebro Restrepo y la finca Villa milia cuyo encargado es el señor Diego Jimenez. Durante la reunión se explica a los señores, del es el objeto del contrato, el tiempo de ejecución y el contratista a cargo de la obra, la cual, busca cambiar la tubería que se encuentra en cemento por tubería PVC de 8" debido a la emergencia que presenta la tubería existente.

Las dos personas a cargo de los predios, generan inquietud frente al reconocimiento por parte de empocaldas, sobre la servidumbre, afectaciones causadas en anteriores daños en la tubería y afectaciones generadas con el desarrollo del contrato en sus cultivos de café. Por parte del contratista, se les explica que ese tema de afectaciones, no es manejado dentro del contrato, pero la solicitud es trasladada a la entidad para que envíen el personal capacitado para ello.

Los dos encargados dan su autorización para que el contratista inicie con las actividades de obra y el ingreso del personal a los predios, quedando pendiente el tema de la servidumbre y las afectaciones.

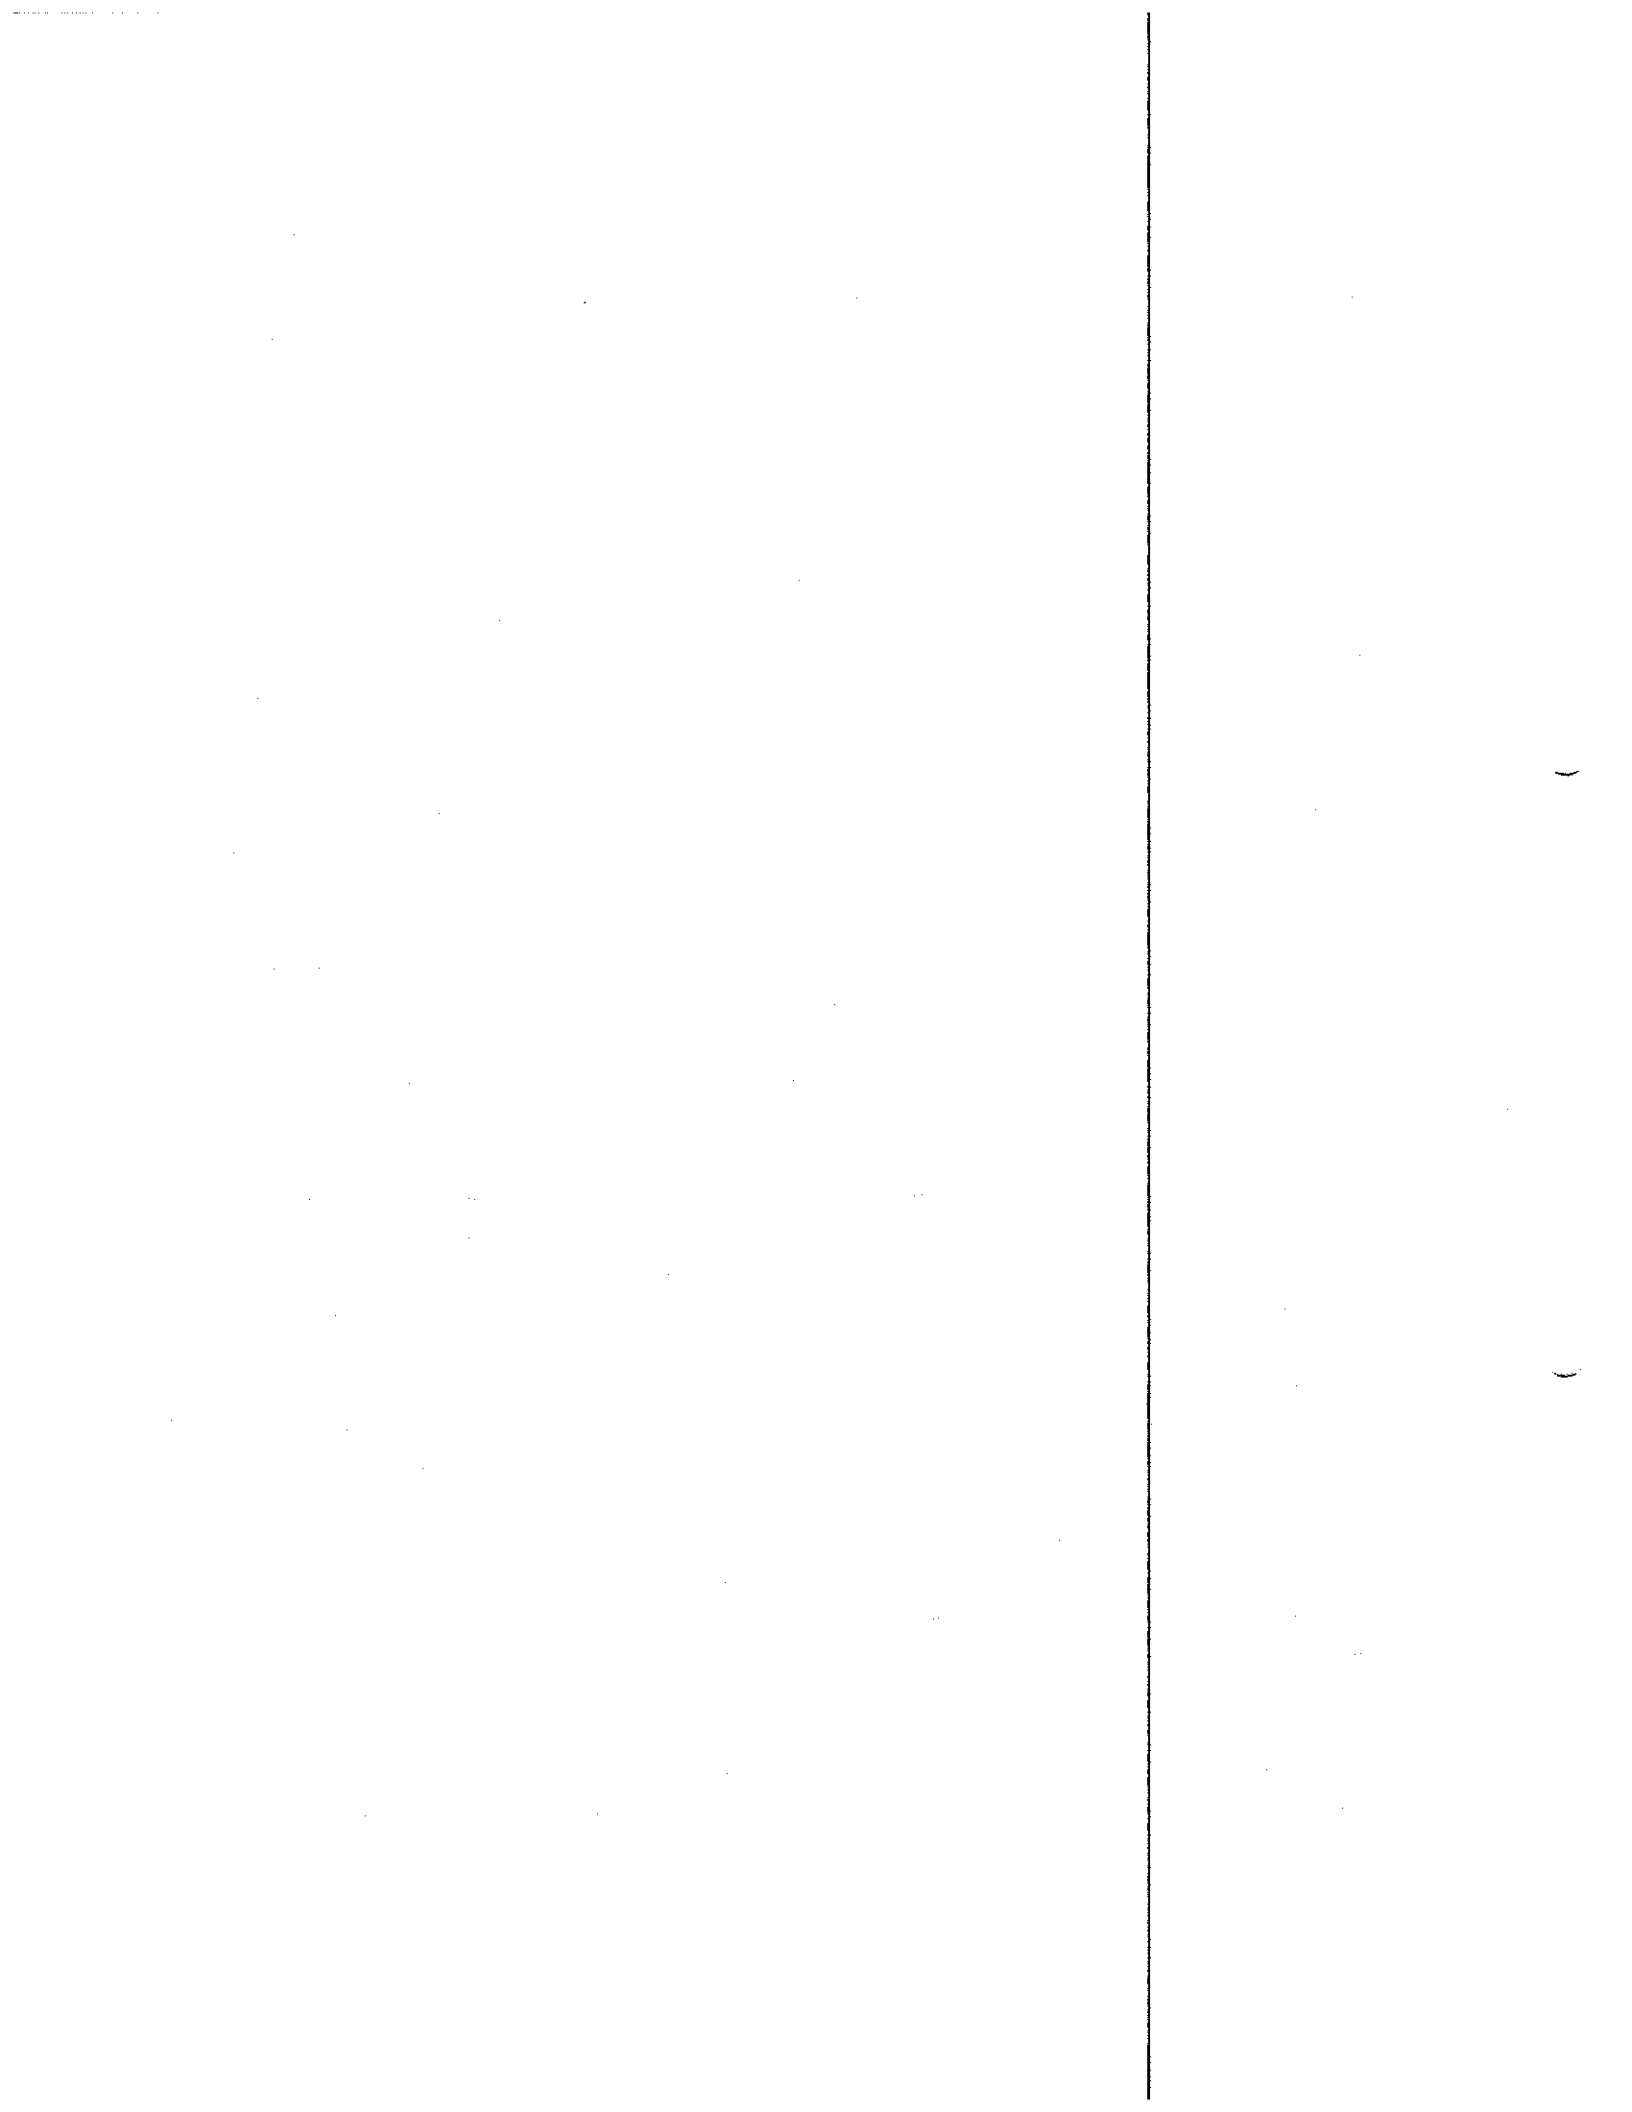

ASUNTO	Socialización inicial de obra con los propietarios de la obra.		
CONTRATO	Acto 003	CONTRATISTA	Ing. Hector Fabio Ladrino.
GESTION SOCIAL	Natalia Sanchez Ortegon	SUPERVISION	Arles Quintero
DIRECCION	Vereda Alto Bonito		

ASISTENTES			
NOMBRE Y APELLIDOS	CONTACTO	DIRECCION	FIRMA
1 Diego Sanchez Ortiz	3136031244	Alto Bonito "Pisgona"	[Signature]
2 Pedro Alfredo Bastida	322270 6763	Cra 4 Establo	[Signature]
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



F-GC-41
Versión 2
Marzo 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

GESTIÓN SOCIAL EN OBRAS - ACTA DE ENTREGA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

Cambio de tubería por emergencia en la conducción el Palo en la Vereda Alto Bonito en el Municipio de Manzanares, Caldas

CONTRATISTA	Hector Fabio Ladino			INTERVENTORIA	Arles Quintero
FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA	
BARRIO				CORREGIMIENTO / VEREDA	Alto Bonito
NUMERO DEL CONTRATO	Acto 0013	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	Natalia Sanchez Ortega		

Para constancia se firma en el Municipio de Manzanares el día ___ del mes ___ del año

En representación de la comunidad y demás personas participantes en la entrega.

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD


NOMBRE	CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
Pedro Alfredo Restrepo	191841169	Cra 4ª Estable	322276163	
Diego Suarez	35093468	Alto Bonito 'Pisano'	2176021240	

Contratista
Natalia Sanchez
Profesional Gestion Social

Administración Municipal

Supervisión externa

Supervisor EMPOCALDAS S.A E.S.P

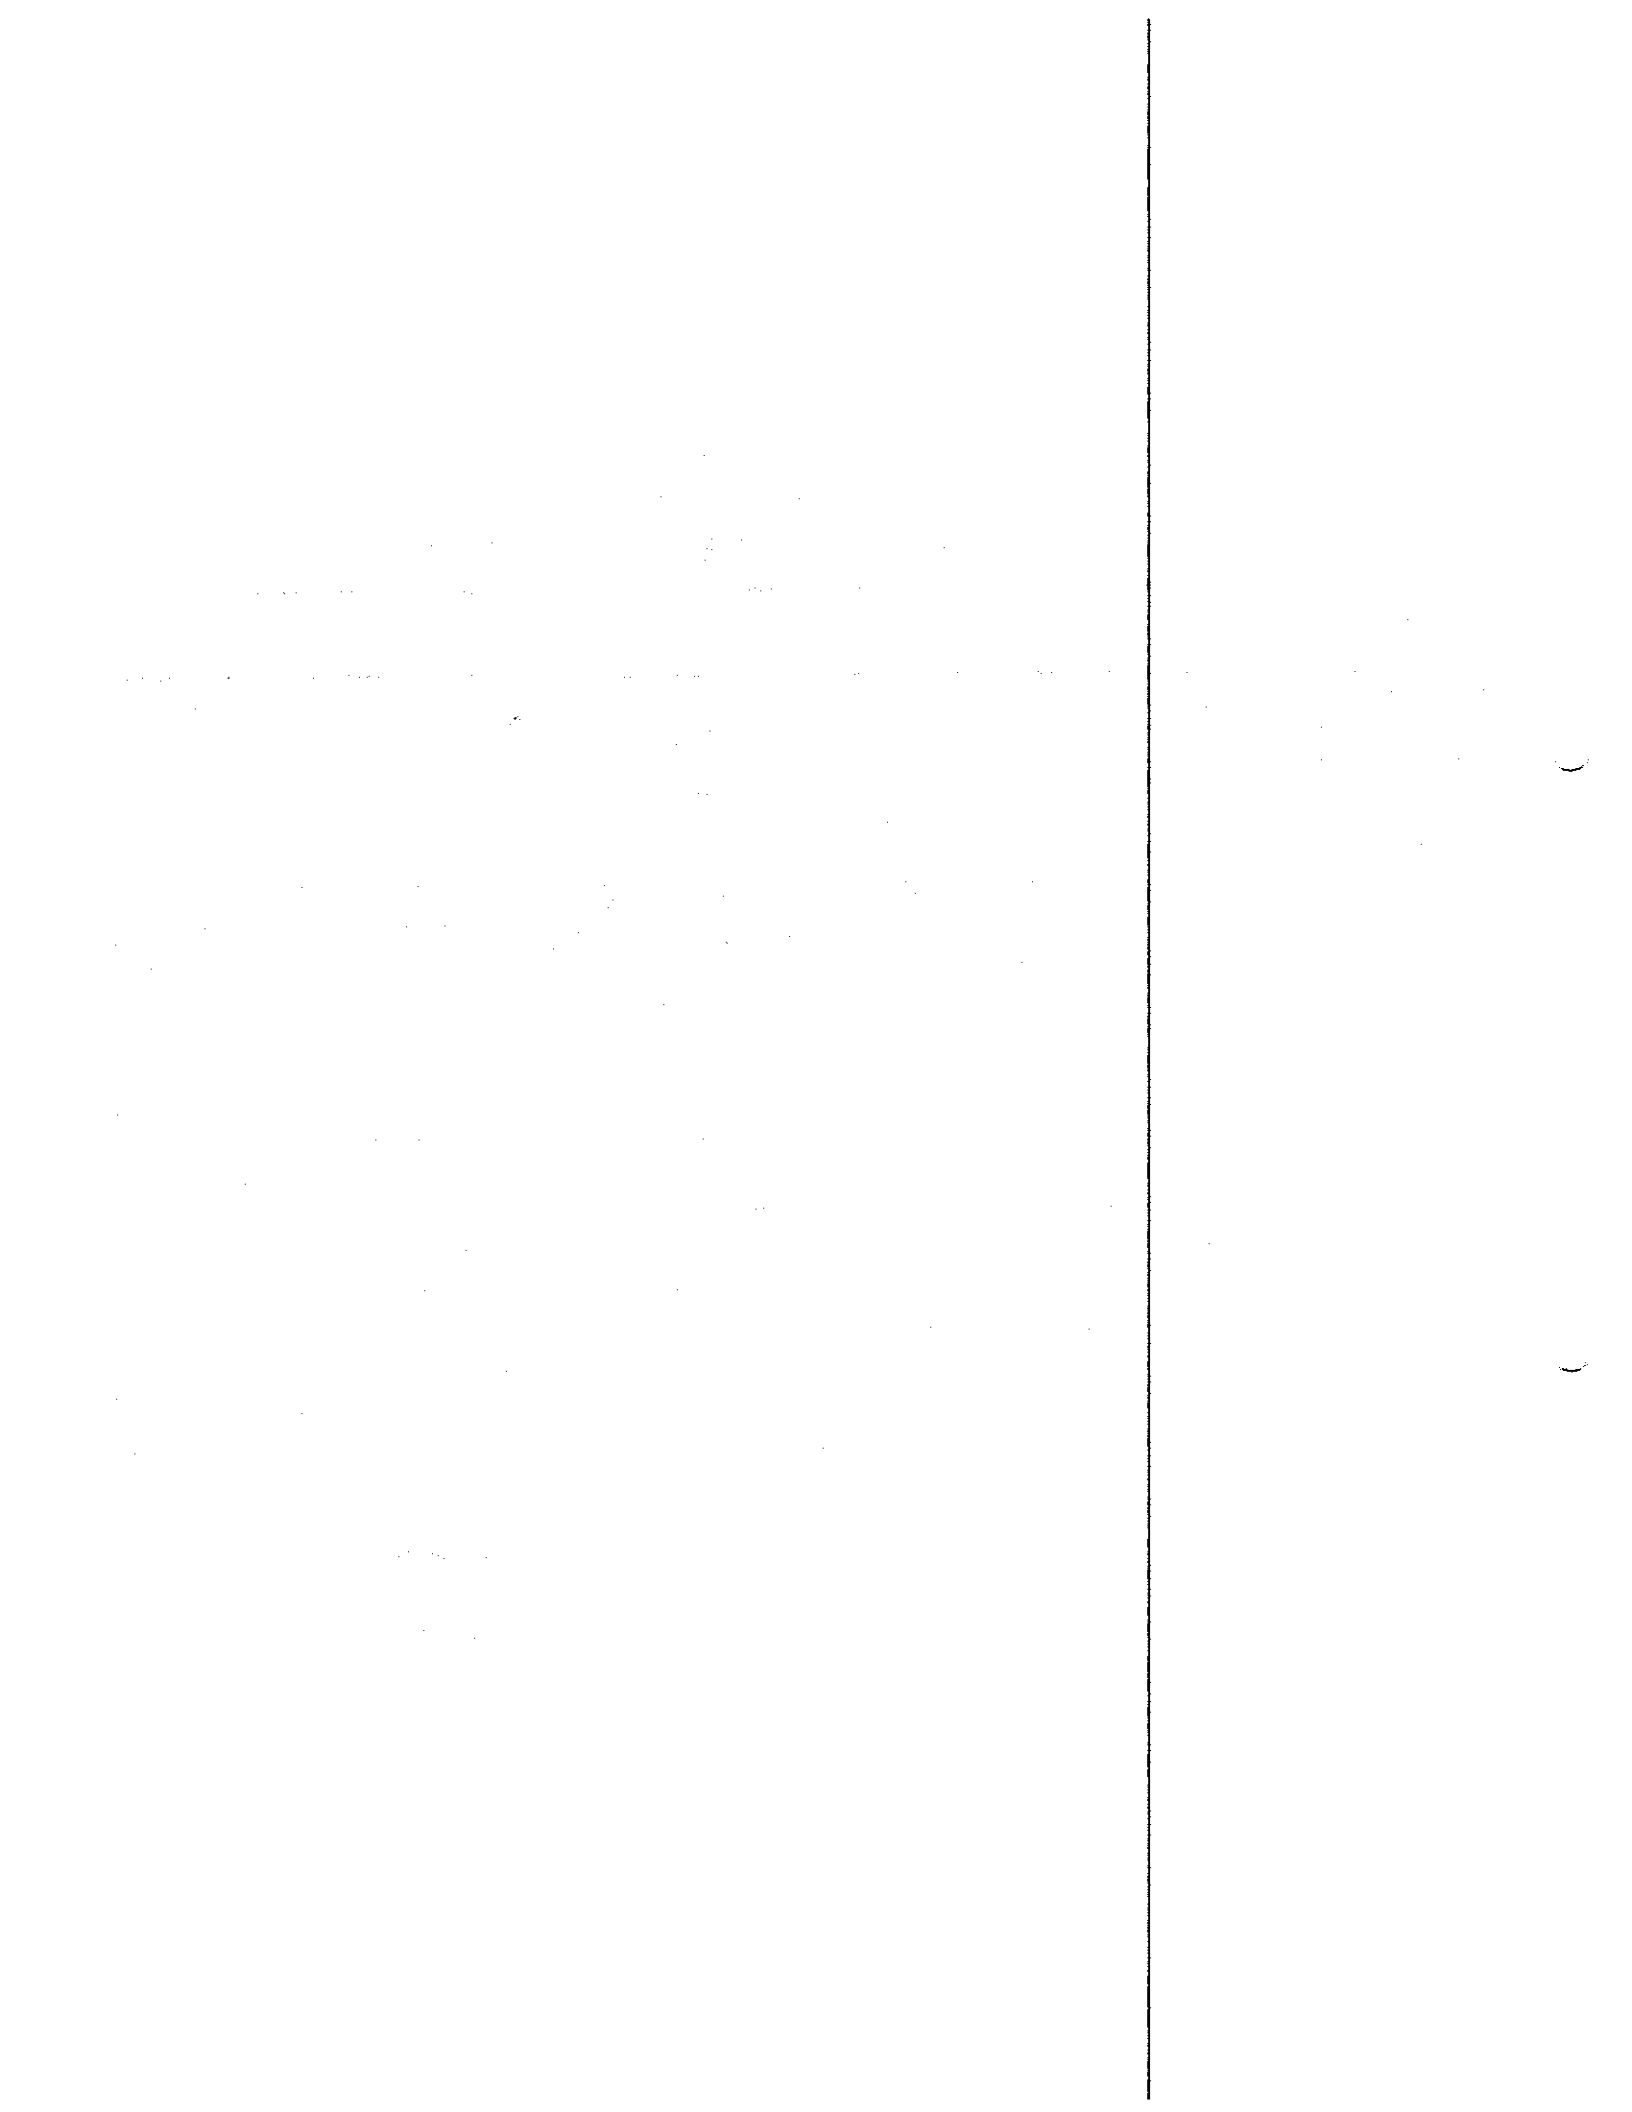



F-AC-47
Versión 1
Marzo 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTROL DE LA GESTION

ACTA DE REUNION INICIAL-GESTION SOCIAL

ASUNTO	Reunión de cierre de obra.		
CONTRATO	Acto 0013	CONTRATISTA	Hector Fabio Lujano
GESTION SOCIAL	Natalia Sanchez Ⓞ	SUPERVISION	Aries Quintero


DESARROLLO

Se realiza reunión con el encargado de la finca Villa milia, el señor Diego Jimenez, donde se realiza cambio de la tubería de alcantarillado por emergencia.

Durante la reunión se deja constancia sobre la finalización de las actividades de obra, cumpliendo con el objeto del contrato y el tiempo estimado.

Con la firma del acta, se deja constancia que el contratista cumplió con el contrato y finalizó a satisfacción del propietario.

Natalia Sanchez Ortegón

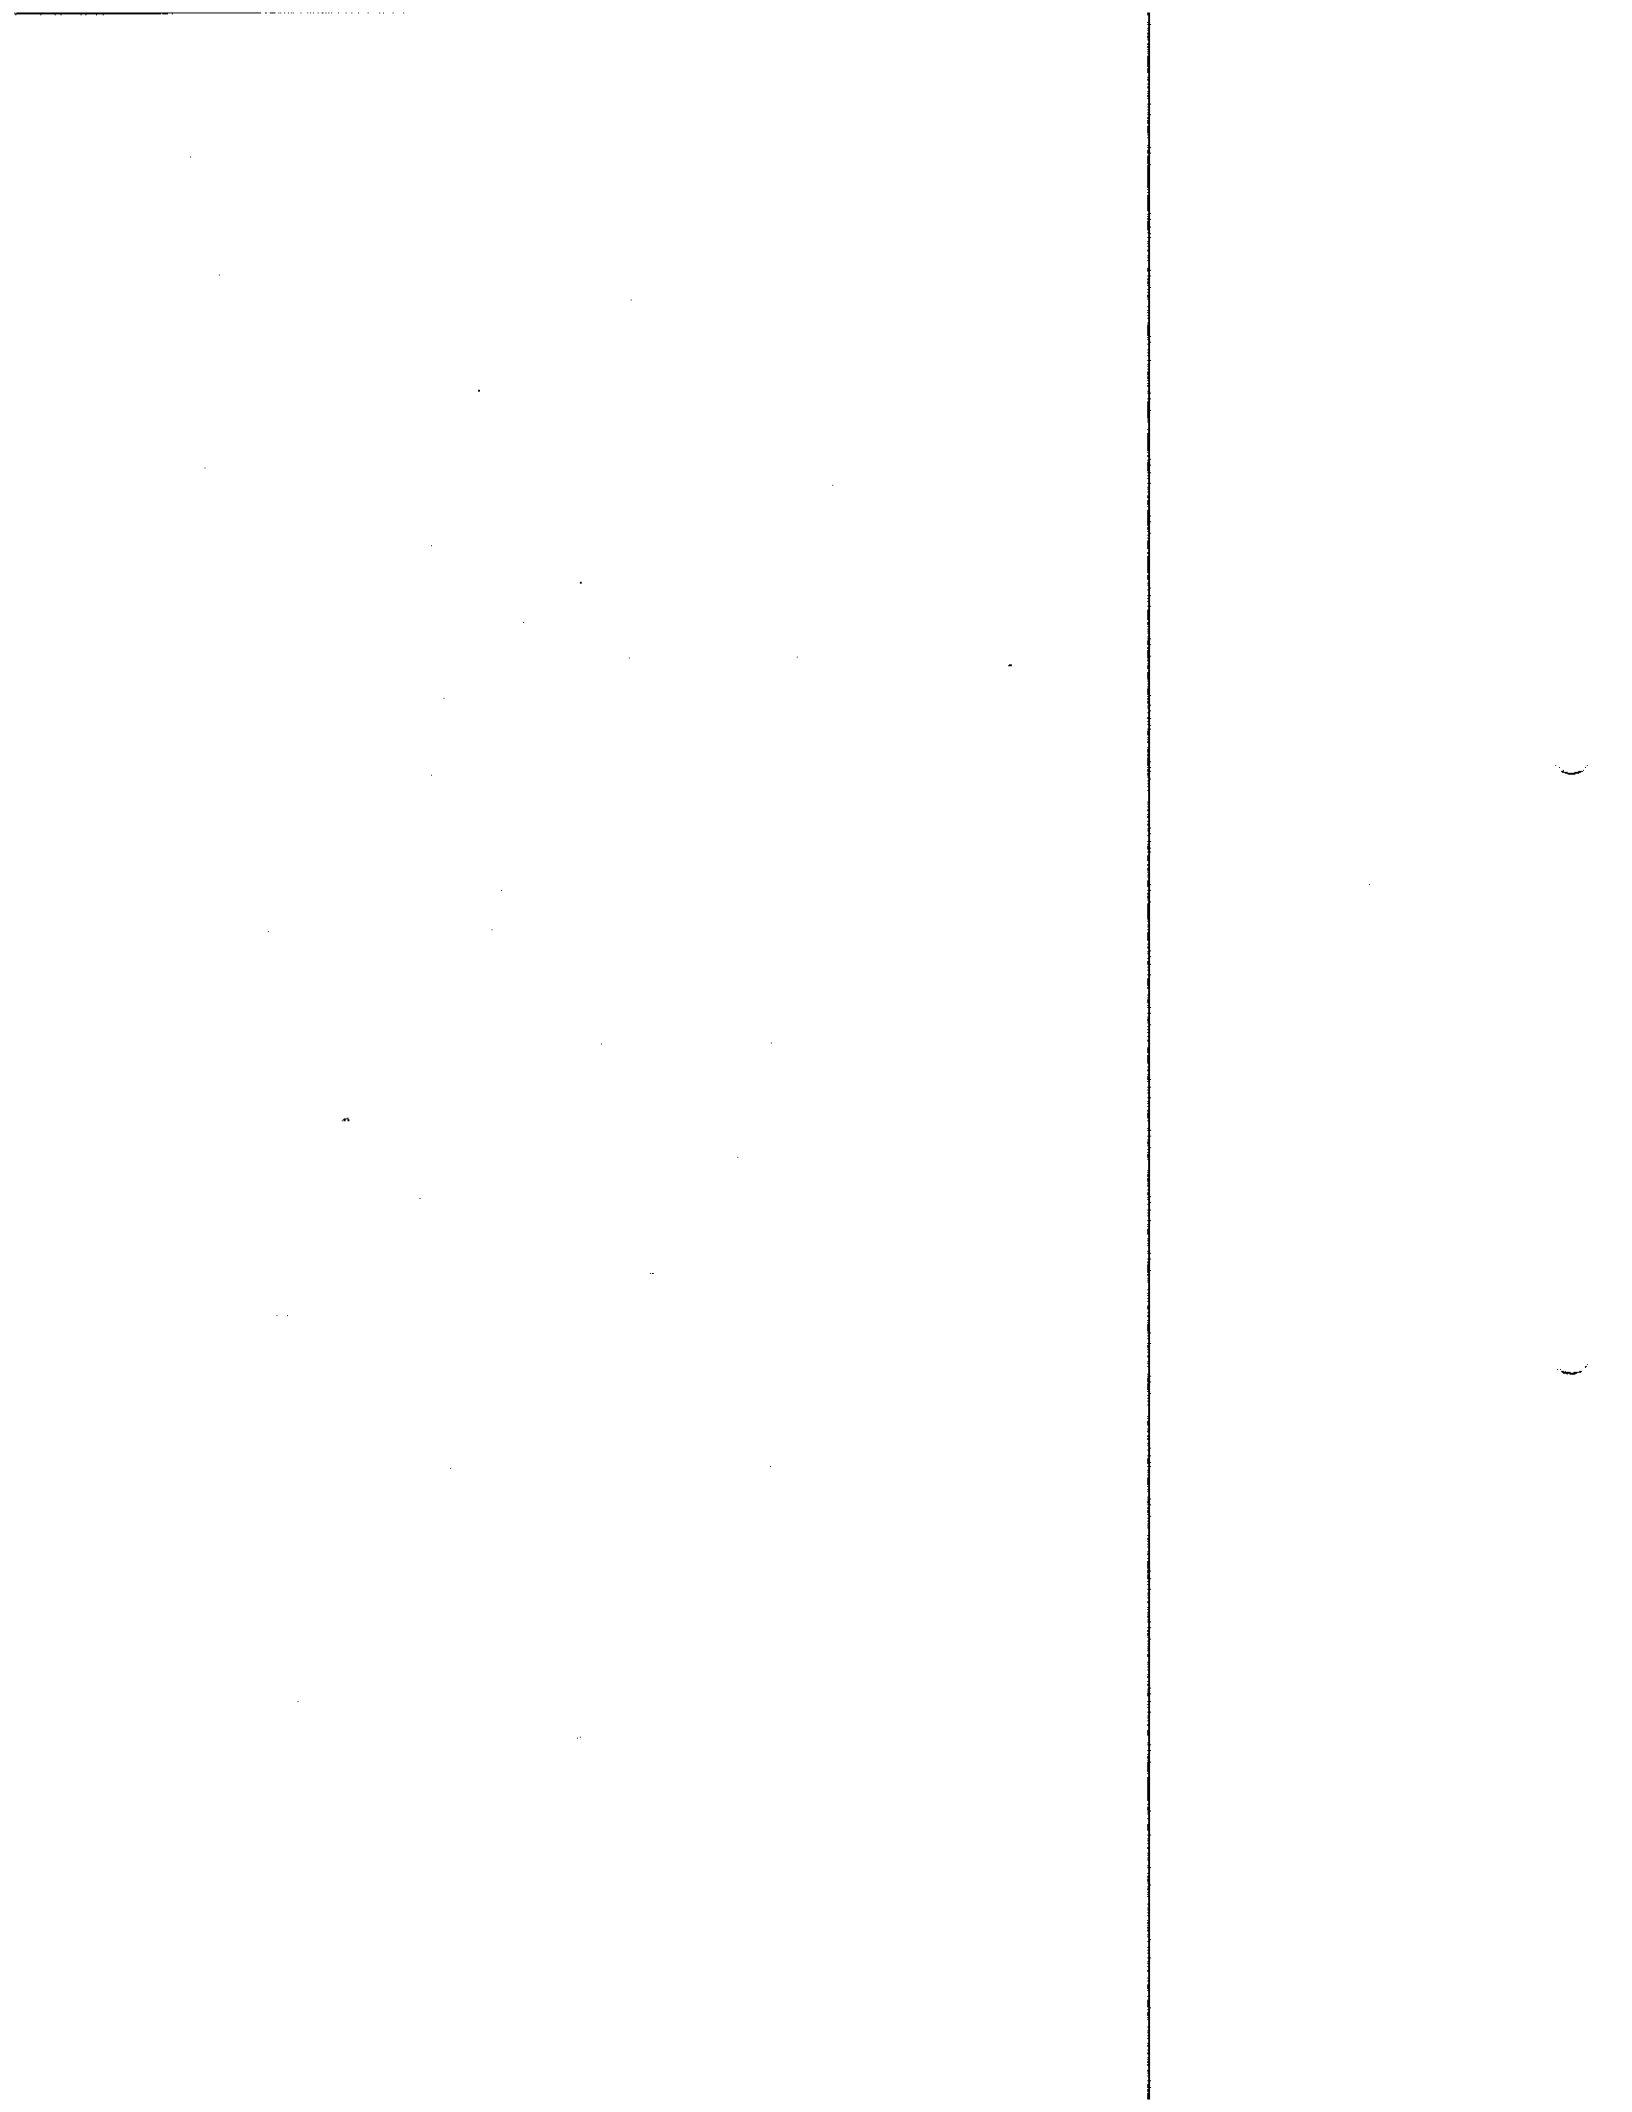



F-AC-47
Versión 1
Marzo 2020

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
CONTROL DE LA GESTION

ACTA DE REUNION INICIAL-GESTION SOCIAL


ASUNTO	Reunión de cierre de obra, con los propietarios de los predios		
CONTRATO	Acto 0013-2020	CONTRATISTA	Hector Fabio Ladino
GESTION SOCIAL	Natalia Sánchez Ortega	SUPERVISION	Arles Quintero

DESARROLLO

Se realiza reunión con el señor Pedro Alfredo Restrepo propietario de la finca San Antonio, donde se realizó el cambio de la tubería de acueducto por emergencia.
Durante la reunión se deja constancia que se finalizaron las actividades de obra, cumpliendo con el objetivo del contrato, en el tiempo estimado.
Con la firma del acta se deja constancia que el contratista cumplió con el contrato y finalizó a satisfacción del propietario.
El encargado del predio quiere dejar constancia que con la entidad Empocaldas S.A.E.S.P. no lo han enviado el documento donde se define el valor reconocido por la servidumbre y el tránsito peatonal localizado en su predio, a cuyo acuerdo se deja constancia para dar inicio y culminación a la obra.

Natalia Sánchez Ortega

Pedro Alfredo Restrepo

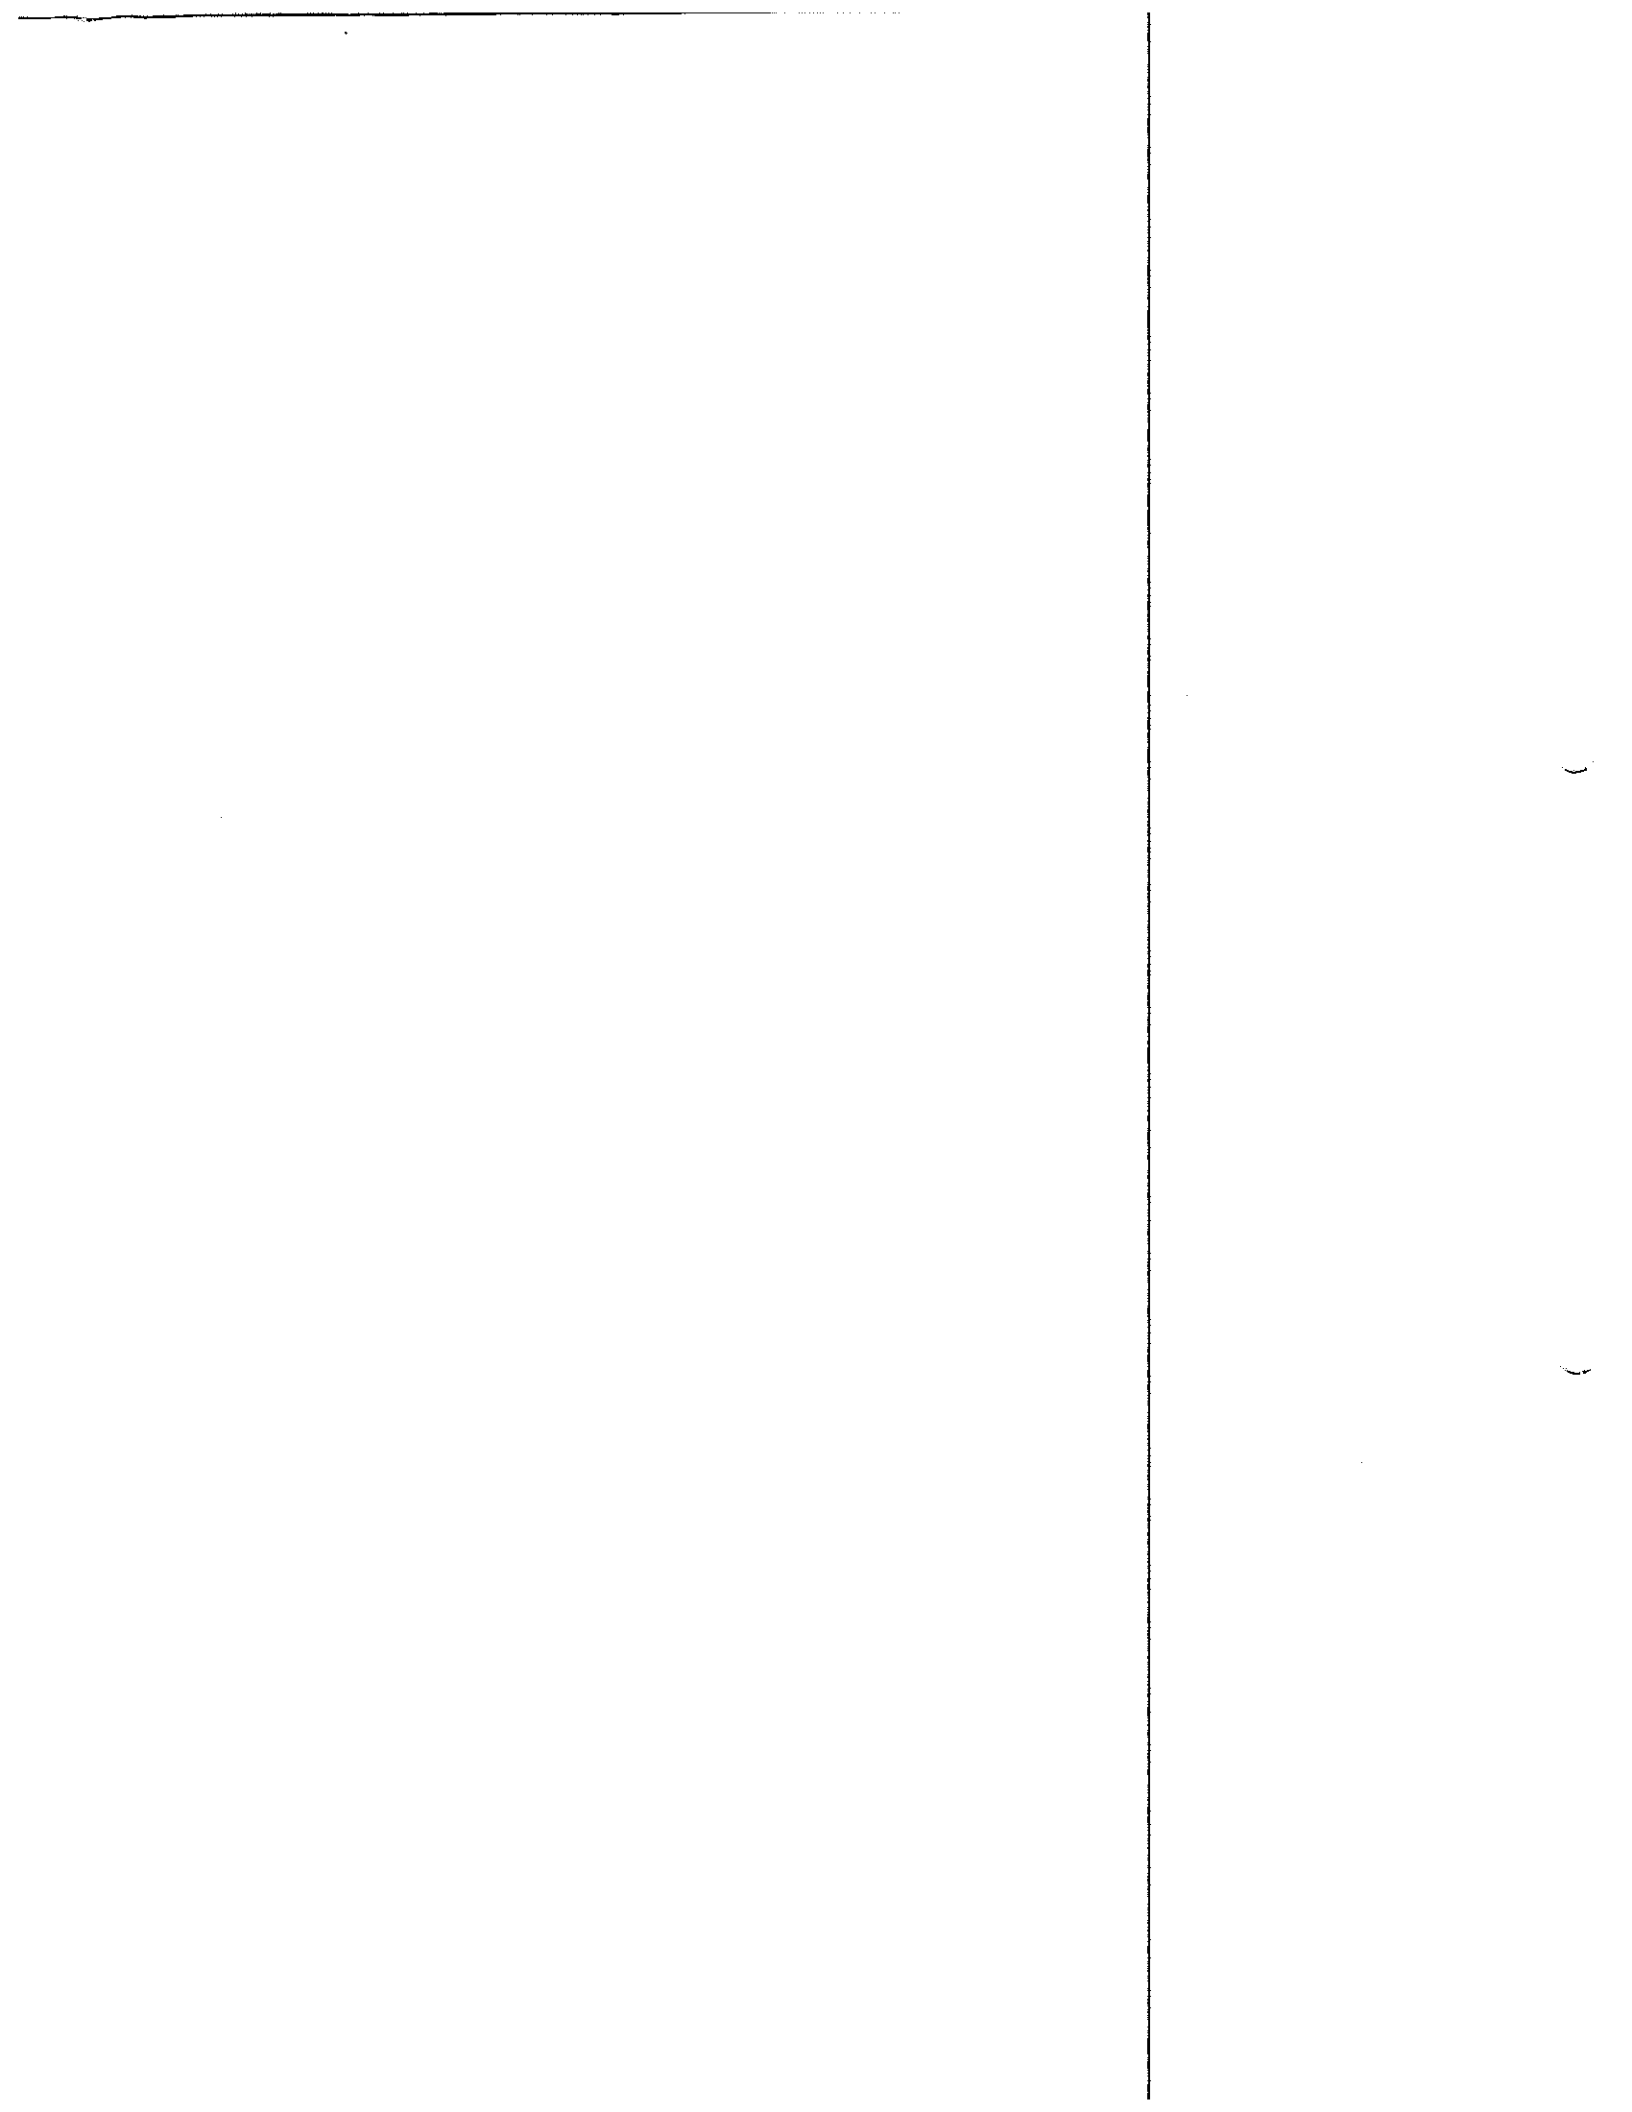

Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

INFORME SEMANAL SST No 1

CONTRATO ACTO No 013 DE 2020

**CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN
LA VEREDA ALTO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS**

INFORME SEMANAL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Manzanares Caldas

Hector Fabio Ladino


NIT: 75.094.889

INTRODUCCION

Las obra de mejoramiento e ingeniería en general generan importantes impactos en la salud de las personas que deben ser regulados a través del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia salud y seguridad en el trabajo (siso) por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementando durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra. todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otras) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de mejoramiento y mantenimiento de acuerdo al alcantarillado, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar conciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

Es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo para ello el CONTRATO ACTO No 13 de 2020 se encuentra comprometido en todas las áreas que promueven el proyecto.

El cumplimiento de ello el CONTRATO ACTO No 13 de 2020 realiza el control y seguimiento a cada una de las etapas constructivas del proyecto de manera que se puedan evidenciar acciones en pro y/o en contra de la salud de los trabajadores y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generan cambios positivos que finalmente contribuyan a preservar la integridad física de los trabajadores en el presente documento se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo del mes de noviembre de 2020



Hector Fabio Ladino


NIT: 75.094.889

LOCALIZACION

A continuación relacionan los tramos en los que ha intervenido hasta la fecha del presente informe:

TRAMO 1: Manzanares vereda alto bonito

INFORMACION CONTRACTUAL DEL PROYECTO
Información general del contrato de obra
Nombre del contrato ACTO No 013 DE 2020
Contratista: Héctor Fabio Ladino
Objetivo CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN LA VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS



Hector Fabio Ladino


NIT: 75.094.889

2 GESTION SST

2.1 actividades constructivas

En el periodo de éste informe se adelantaron labores constructivas objeto del contrato de obra, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución

- * Se elabora informe sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- * Se efectuaron inducciones a los trabajadores que ingresaron en el periodo.
- * Se da cumplimiento a la elaboración de los informes y formatos propios del seguimiento.
- * Se realizó acompañamiento en campo de las diferentes maniobras que se efectúan dentro de la obra.
- * Para la presente semana no presentaron accidentes de trabajo.
- * Se hace acompañamiento en actividades de mantenimiento de vías de acceso para el transporte de los materiales.
- * Se realiza recorrido para reconocimiento en el sector donde se realiza la intervención.

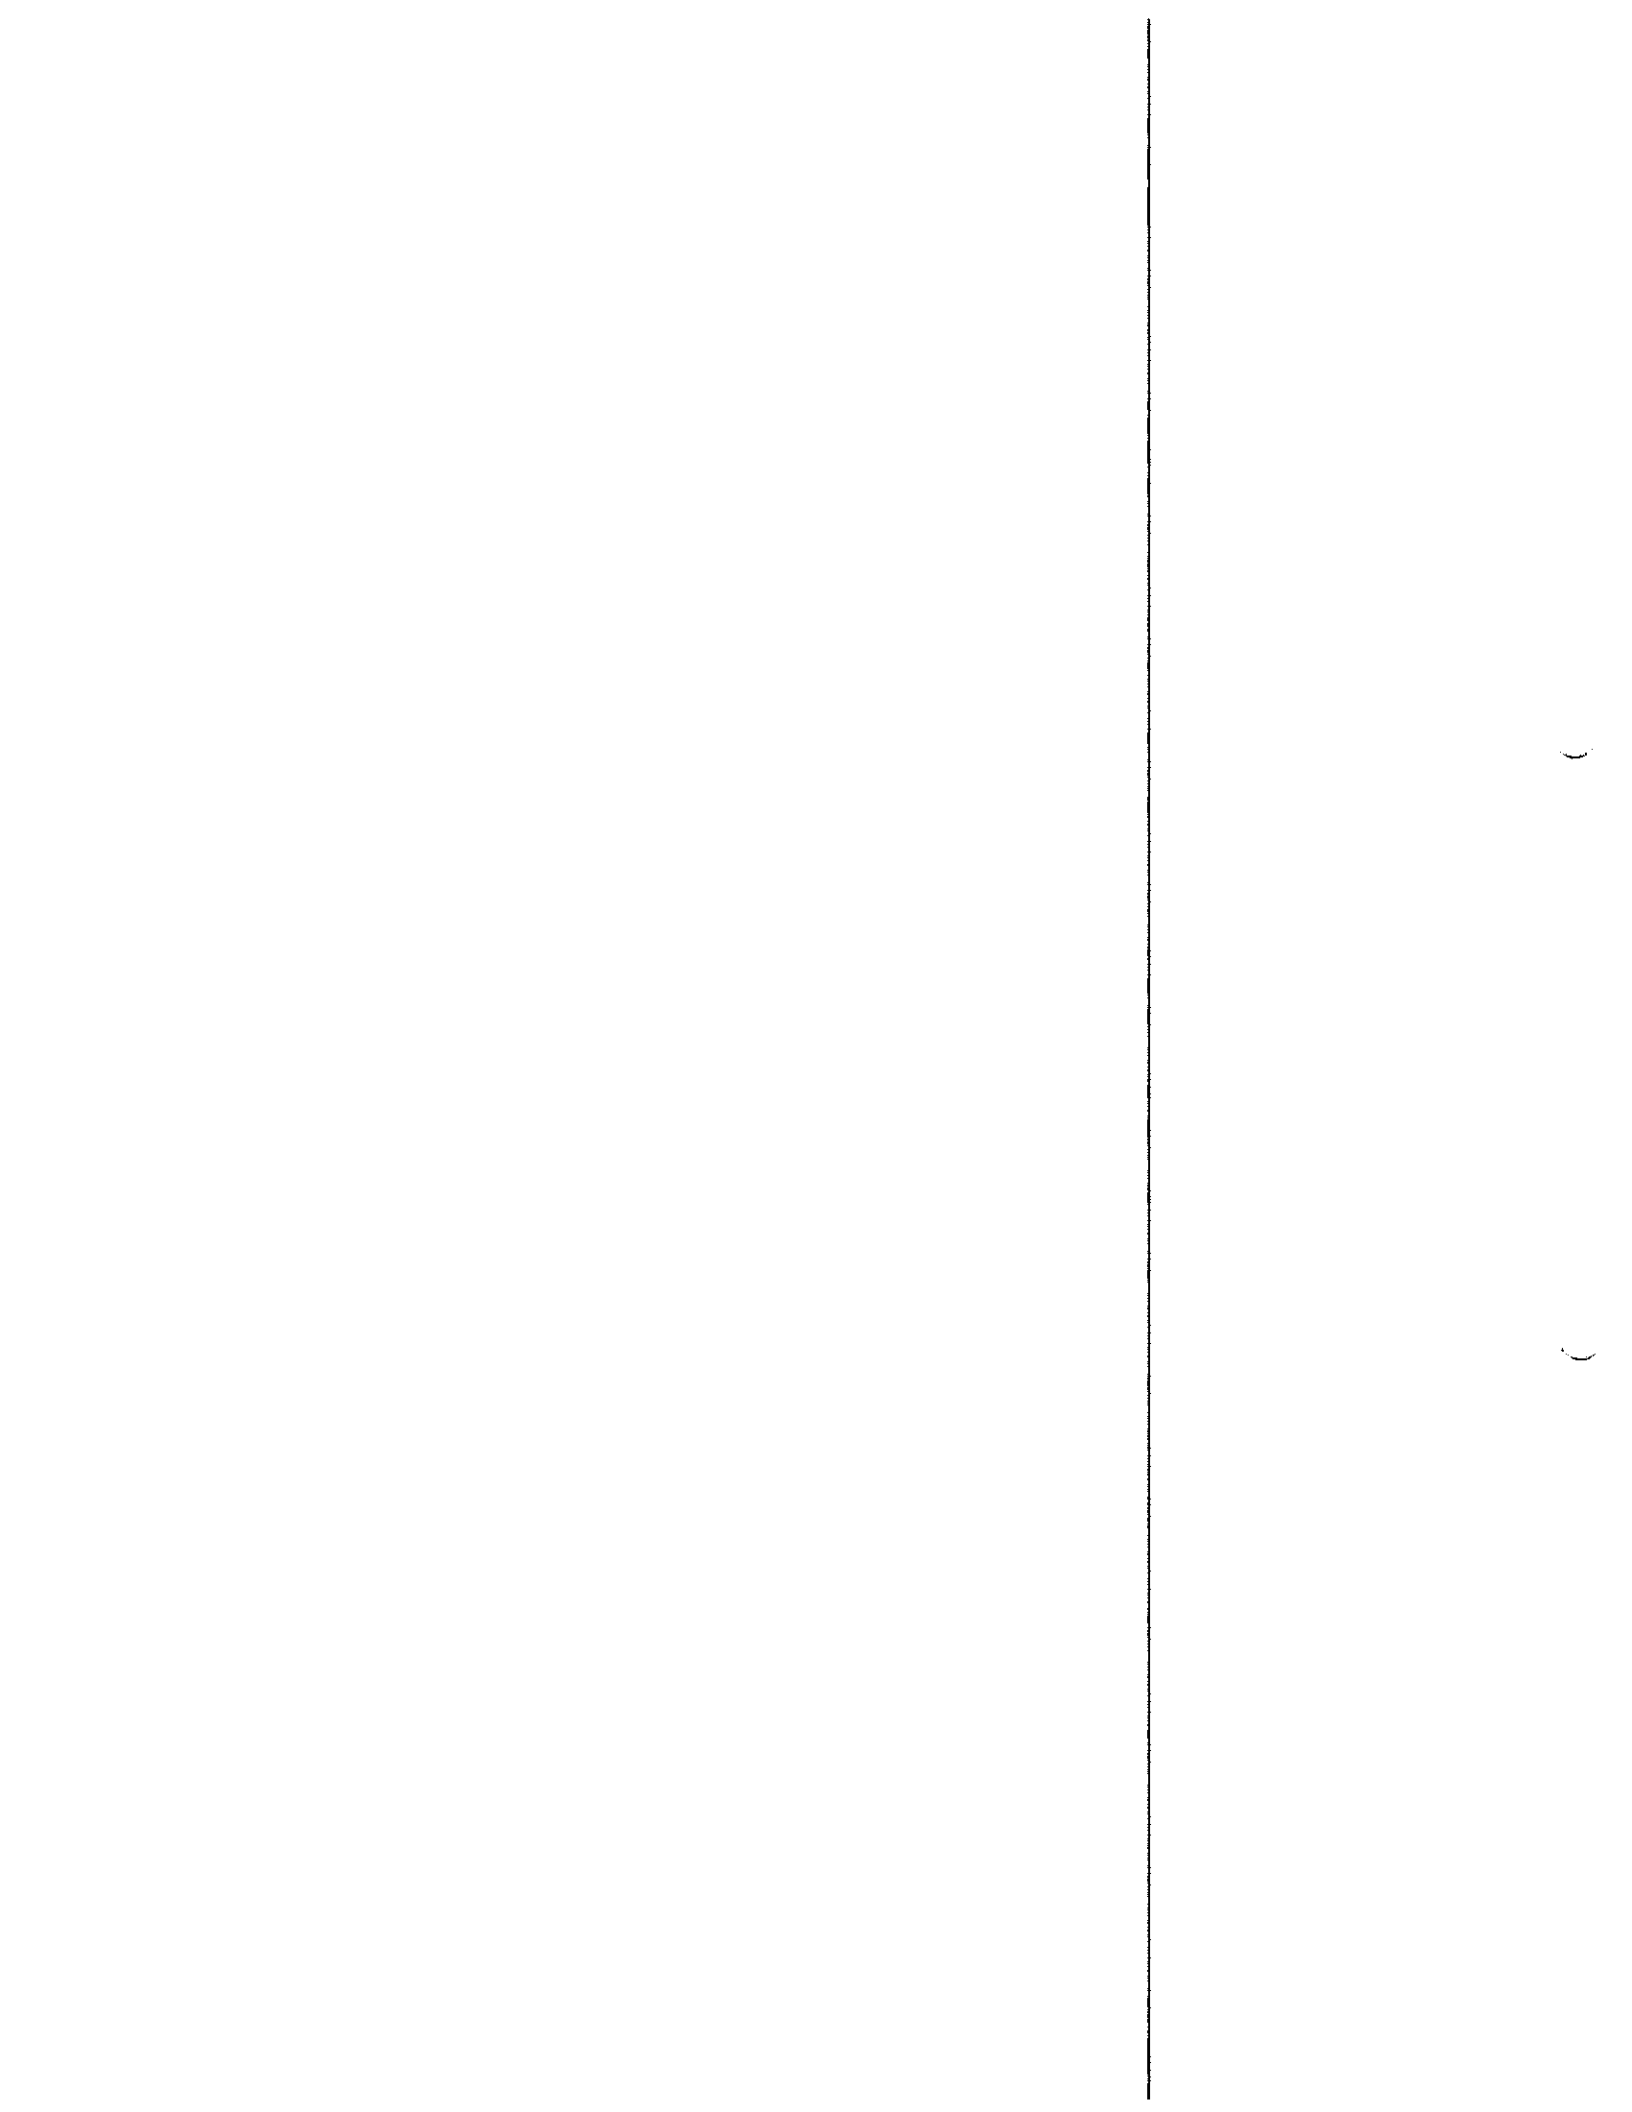

Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

2.2 afiliación

Para todo el personal del contratista se revisa que se realicen las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social.

Se realizó la inducción, la notificación de riesgos, y el soporte de entrega de la dotación y elementos de protección del personal nuevo que ingreso.

2.3 Inspecciones

La inspección de obra tendrá por tarea fundamental, velar en cada instancia del proceso constructivo, por los intereses del ordenante o propietario d la obra , y en particular, velara porque tanto los métodos constructivos , materiales y mano de obra empleados permitan alcanzar los objetivos establecidos para el proyecto.

2.4 registro y entrega de dotación EPP de cada trabajador

En este periodo se les entrega casco, gafas de seguridad, guantes, tapabocas, chaleco, impermeable.

Tabla 1 entrega de EPP

cantidad	Elemento
7	Casco
7	Gafas de seguridad
7 pares	Guantes
7	Tapabocas
7	Chaleco
7	impermeable

Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN S&SO

Todo el personal que laborara en la obra incluyendo al personal administrativo y operativo se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social integral (SGSSI) administradora de riesgos profesionales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondos de pensión (AF)

Se garantizó que, durante el periodo de este informe del contrato, se cumpliera con la realización de talleres de inducción, capacitación para todo el personal que laboro en la obra, actividad y riesgos a los que están expuestos, que contengan entre otros aspectos cada uno de los componentes de la gestión S&SO y de acuerdo con el plan de manejo ambiental y la actualización del panorama de factores de riesgo.

3. Plan de señalización


Se realizó pedido de señalización para las áreas de intervención directa con el fin de garantizar condiciones seguras para la movilidad del transeúnte.

Control de accidentalidad en obra

Durante el periodo de la semana no se presentaron accidentes de trabajo

REGISTRO DE INDUCCIONES

No	CHARLA	CANTIDAD AITNT	FCHA
1	Inducción de ingreso a obra, socialización del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, protocolo covid 19		09 de noviembre 2020
2	Inducción de ingreso a la obra, socialización del sistema de gestión del riesgo, protocolo covid 19	4	10 de noviembre 2020




Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

Anexo registro fotográfico






Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889



María Isabel Salazar M.
MARÍA ISABEL SALAZAR MARTÍNEZ
Trabajador S&SO
C.C. 1057786667



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889


INFORME SEMANAL SST No 2

CONTRATO ACTO No 013 DE 2020

**CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN
LA VEREDA ALTO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS**

INFORME SEMANAL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Manzanares Caldas




INTRODUCCION

Las obra de mejoramiento e ingeniería en general generan importantes impactos en la salud de las personas que deben ser regulados a través del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia salud y seguridad en el trabajo (siso) por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementando durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra. todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otras) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de mejoramiento y mantenimiento de acuerdo al alcantarillado, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar conciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

Es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo para ello el CONTRATO ACTO No 13 de 2020 se encuentra comprometido en todas las áreas que promueven el proyecto.

El cumplimiento de ello el CONTRATO ACTO No 13 de 2020 realiza el control y seguimiento a cada una de las etapas constructivas del proyecto de manera que se puedan evidenciar acciones en pro y/o en contra de la salud de los trabajadores y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generan cambios positivos que finalmente contribuyan a preservar la integridad física de los trabajadores en el presente documento se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo del mes de noviembre de 2020.



Hector Fabio Ladino


NIT: 75.094.889

LOCALIZACION

A continuación relacionan los tramos en los que ha intervenido hasta la fecha del presente informe:

TRAMO 1: Manzanares vereda alto bonito

INFORMACION CONTRACTUAL DEL PROYECTO	
Información general del contrato de obra	
Nombre del contrato	ACTO No 013 DE 2020
Contratista	Héctor Fabio Ladino
Objetivo CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN LA VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS	



Hector Fabio Ladino


NIT: 75.094.889

2 GESTION SST

2.1 actividades constructivas

En el periodo de éste informe se adelantaron labores constructivas objeto del contrato de obra, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución

- * Se elabora informe sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- * Se da cumplimiento a la elaboración de los informes y formatos propios del seguimiento.
- * Se realizó acompañamiento en campo de las diferentes maniobras que se efectúan dentro de la obra.
- * Para la presente semana no presentaron accidentes de trabajo.
- * Se hace acompañamiento en actividades de mantenimiento de vías de acceso para el transporte de los materiales.
- * Se realiza verificación de pagos de seguridad social parafiscales de todo el personal que labora en la obra garantizando de esta manera la cobertura con el sistema de seguridad social.
- * Para el protocolo Covid 19 a la entrada se realiza toma de temperatura, se revisa el uso correcto del tapabocas, lavado de manos, desinfección del calzado y herramientas con amonio cuaternario.
- * Se realizaron encuestas Covid y compromisos de autocuidado.



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

2.2 afiliación

Para todo el personal del contratista se revisa que se realicen las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social.

2.3 Inspecciones

La inspección de obra tendrá por tarea fundamental, velar en cada instancia del proceso constructivo, por los intereses del ordenante o propietario de la obra, y en particular, velara porque tanto los métodos constructivos, materiales y mano de obra empleados permitan alcanzar los objetivos establecidos para el proyecto.

Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN S&SO

Todo el personal que laborara en la obra incluyendo al personal administrativo y operativo se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social integral (SGSSI) administradora de riesgos profesionales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondos de pensión (AF)


Se garantizó que, durante el periodo de este informe del contrato, se cumpliera con la realización de talleres de inducción, capacitación para todo el personal que laboro en la obra actividad y riesgos a los que están expuestos, que contengan entre otros aspectos cada uno de los componentes de la gestión S&SO y de acuerdo con el plan de manejo ambiental y la actualización del panorama de factores de riesgo.

3. Plan de señalización

Se realizó pedido de señalización para las áreas de intervención directa con el fin de garantizar condiciones seguras para la movilidad del transeúnte.

Control de accidentalidad en obra

Durante el periodo de la semana no se presentaron accidentes de trabajo




Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OBRA

1. Excavación de brecha en material común.
2. Instalación de tubería pvc de 8 pulgadas para agua potable.
3. Lleno con material de sitio.




Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

Anexo registro fotográfico





Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889




María Isabel Salazar M.

MARÍA ISABEL SALAZAR MARTÍNEZ

Trabajador S&SO

C.C. 1057786667



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889


INFORME FINAL SST

CONTRATO ACTO No 013 DE 2020

**CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN
LA VEREDA ALTO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS**

INFORME FINAL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Manzanares Caldas



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889


INTRODUCCION

Tras la declaración del pasado mes de enero por parte de la OMS en la que se informaba del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas, y que todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce COVID-19, suponiendo dicha enfermedad una emergencia de salud pública de importancia internacional, el ministerio de salud y las entidades territoriales han venido realizando un seguimiento constante de la situación y evolución del covid-19 para adoptar las medidas de prevención y contención necesarias.

Las obra de mejoramiento e ingeniería en general generan importantes impactos en la salud de las personas que deben ser regulados a través del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia salud y seguridad en el trabajo (siso) por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementando durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra. todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otras) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de mejoramiento y mantenimiento de acuerdo al alcantarillado, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar conciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

Es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo para ello el CONTRATO ACTO No 13 de 2020 se encuentra comprometido en todas las áreas que promueven el proyecto.


El cumplimiento de ello el CONTRATO ACTO No 13 de 2020 realiza el control y seguimiento a cada una de las etapas constructivas del proyecto de manera que se puedan evidenciar acciones en pro y/o en contra de la salud de los trabajadores y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generan



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

cambios positivos que finalmente contribuyan a preservar la integridad física de los trabajadores en el presente documento se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo del mes de noviembre de 2020.



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OBRA


1. Excavación de brecha en material común.
2. Instalación de tubería pvc de 8 pulgadas para agua potable.
3. Lleno con material de sitio.

LOCALIZACION

A continuación relacionan los tramos en los que ha intervenido hasta la fecha del presente informe:

TRAMO 1: Manzanares vereda alto bonito

INFORMACION CONTRACTUAL DEL PROYECTO
Información general del contrato de obra
Nombre del contrato ACTO No 013 DE 2020
Contratista: Héctor Fabio Ladino
Objetivo CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION EL PALO EN LA VEREDA ALTO BONITO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS



Hector Fabio Ladino


NIT: 75.094.889

2 GESTION SST

2.1 actividades constructivas

En el periodo de éste informe se adelantaron labores constructivas objeto del contrato de obra, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución

- * Se elabora informe sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- * Se da cumplimiento a la elaboración de los informes y formatos propios del seguimiento.
- * Se realizó acompañamiento en campo de las diferentes maniobras que se efectúan dentro de la obra.
- * Para la presente semana no presentaron accidentes de trabajo.
- * Se hace acompañamiento en actividades de mantenimiento de vías de acceso para el transporte de los materiales.
- * Se realiza verificación de pagos de seguridad social parafiscales de todo el personal que labora en la obra garantizando de esta manera la cobertura con el sistema de seguridad social.
- * Para el protocolo Covid 19 a la entrada se realiza toma de temperatura, se revisa el uso correcto del tapabocas, lavado de manos, desinfección del calzado y herramientas con amonio cuaternario.
- * Se realizaron encuestas Covid y compromisos de autocuidado.



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

2.2 afiliación

Para todo el personal del contratista se revisa que se realicen las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social.

2.3 Inspecciones

La inspección de obra tendrá por tarea fundamental, velar en cada instancia del proceso constructivo, por los intereses del ordenante o propietario de la obra, y en particular, velara porque tanto los métodos constructivos, materiales y mano de obra empleados permitan alcanzar los objetivos establecidos para el proyecto.

Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN S&SO

Todo el personal que laborara en la obra incluyendo al personal administrativo y operativo se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social integral (SGSSI) administradora de riesgos profesionales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondos de pensión (AF)


Se garantizó que, durante el periodo de este informe del contrato, se cumpliera con la realización de talleres de inducción, capacitación para todo el personal que laboro en la obra, actividad y riesgos a los que están expuestos, que contengan entre otros aspectos cada uno de los componentes de la gestión S&SO y de acuerdo con el plan de manejo ambiental y la actualización del panorama de factores de riesgo.

3. Plan de señalización

Se realizó pedido de señalización para las áreas de intervención directa con el fin de garantizar condiciones seguras para la movilidad del transeúnte.

Control de accidentalidad en obra

Durante el periodo de la semana no se presentaron accidentes de trabajo




Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

INDICADORES
INFORMACION DE GESTION

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Número de trabajadores que ingresaron a la obra	7	Se verifica estado de afiliaciones antes del ingreso a la obra EPS y ARL.
2	Numero de inducciones	2	
3	Número de incidentes	0	
4	Número de accidentes	0	



Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SOBRE MEDIDAS PRERVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA PREVENIR Y REDUCIR LA ESPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID.19)

INTRODUCCION

Tras la declaración del pasado mes de enero por parte de la OMS en la que se informaba del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas, y que todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce COVID-19, suponiendo dicha enfermedad una emergencia de salud pública de importancia internacional, el ministerio de salud y las entidades territoriales han venido realizando un seguimiento constante de la situación y evolución del covid-19 para adoptar las medidas de prevención y contención necesarias.

OBJETIVO GENERAL

Coordinar y organizar sectorial e intersectorialmente la implementación de acciones de prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y programación del covid.19 y la ocurrencia de casos en los diferentes proyectos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Establecer una ruta de atención ante COVID.19 para el personal de proyecto y fomentar controles de prevención para ayudar a aplanar la curva de contagio en el país.
- Proteger la salud y seguridad de toda la población trabajadora
- Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad de las actividades desarrolladas.
- Identificar oportunamente síntomas de COVID.19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889

Anexo registro fotográfico






Hector Fabio Ladino

NIT: 75.094.889



Mania Isabel Salazar M
MARÍA ISABEL SALAZAR MARTÍNEZ
Trabajador S&SO
C.C. 1057786667



CHARLAS SG- SST

Nombre Capacitador:





MARIA ISABEL SALAZAR MARTINEZ


Fecha:

Descripción del tema tratado:

lugar

MANZANARES CALDAS

No.	NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Alexander	Rincon Torres	1002431085	Jhon Alexander R.
2	Jorge Checcv	Cortez Rodriguez	1053242353	
3	J. HON SAIBO	GONZALEZ SAIDA	1055947880	J HON SAIBO
4	los Alberto	Ruiz Bono	4493311994	
5	E/kin.	usque Gaviria	1057782531	
6	Juan Esteban	Gonzalez Rios	1057782994	
7	MANUEL ALFREDO	MANUEL PATINO	1.193.321.589	manuel
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				




GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROCESO		ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL												FECHA				
FORMATO		NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	COLABORADORES	Casco	Gafas de Seguridad	Guantes de cañaza grs	guantes caucho	Tapa oídos	Tapabocas	Batas caucho	Orejeras copa	guantes nayo/n		Pantalon	Bata		
DATOS FUNCIONARIO																		
		Jhon Jairo Gonzales	1055917880			X	X			X						X	Jhon Jairo SAIBG	09/11/2020
		Jhon Alexandra Pinco	1002731985			X	X			X						X	Jhon Alex SaibG	09/11/2020
		Jorge Eliezer Cortes R	1053842358			X	X			X						X		09/11/2020
		Manuel Alfredo Morales	1193321581			X	X			X						X	Manuel A SaibG	10/11/2020
		Luis Alberto Ruiz	1193511977			X	X			X						X	Luis Alberto Ruiz	10/11/2020
		Juan Eskeban Gonzales	1053787774			X	X			X						X		10/11/2020
		Elkin Osme Gaviria	1053782531			X	X			X						X		10/11/2020

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ACQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:


- Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizado.
- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación y utilización por oficio o actividades.
- Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo o pérdida del mismo.



COMPROMISO DE AUTOCUIDADO FRENTE AL COVID-19


Yo Jorge Elicer Cortes Rodriguez
identificado con C.C. 1053842353 con el
cargo colaborador me comprometo a cumplir con las
normas y procedimientos establecidos por la Legislación Nacional Vigente y por el
Ingeniero Héctor Fabio Ladino para prevenir un contagio por COVID-19.

Por lo anterior me comprometo a lavarme adecuadamente las manos mínimo cada
3 horas, usar de manera permanente el tapabocas, hablar sólo lo necesario con los
compañeros de trabajo, no socializar con ninguna persona en el traslado de mi casa
al trabajo y viceversa, no compartir alimentos, recipientes e hidratación, mantener
una distancia mínima de 2 mts con las demás personas, usar correctamente los
elementos de protección personal, hacer una disposición correcta de los residuos
sólidos en los puntos ecológicos, seguir con buena actitud las instrucciones
impartidas por el personal SST (Seguridad y salud en el trabajo) de la obra, reportar
inmediatamente cualquier síntoma relacionado con el COVID-19 tanto en obra como
en su residencia, realizar cambio de ropa de trabajo diariamente y no lavarla junto
con otras prendas de la familia, mantener adecuada desinfección de superficies,
vehículos, calzado, herramientas, el uso del celular en la obra no es permitido, el
carné de trabajo es de uso personal e intransferible, usarlo únicamente para fines
laborales y no para diligencias personales.


Firma del Trabajador

C.C. 1053842353

Fecha: 09/11/2020



COMPROMISO DE AUTOCUIDADO FRENTE AL COVID-19

Yo Juan Esteban Gonzales Pios
identificado con C.C. 1057787974 con el
cargo colaborador me comprometo a cumplir con las
normas y procedimientos establecidos por la Legislación Nacional Vigente y por el
Ingeniero Héctor Fabio Ladino para prevenir un contagio por COVID-19.


Por lo anterior me comprometo a lavarme adecuadamente las manos mínimo cada
3 horas, usar de manera permanente el tapabocas, hablar sólo lo necesario con
los compañeros de trabajo, no socializar con ninguna persona en el traslado de mi
casa al trabajo y viceversa, no compartir alimentos, recipientes e hidratación,
mantener una distancia mínima de 2 mts con las demás personas, usar
correctamente los elementos de protección personal, hacer una disposición
correcta de los residuos sólidos en los puntos ecológicos, seguir con buena actitud
las instrucciones impartidas por el personal SST (Seguridad y salud en el trabajo)
de la obra, reportar inmediatamente cualquier síntoma relacionado con el COVID-
19 tanto en obra como en su residencia, realizar cambio de ropa de trabajo
diariamente y no lavarla junto con otras prendas de la familia, mantener adecuada
desinfección de superficies, vehículos, calzado, herramientas, el uso del celular en
la obra no es permitido, el carné de trabajo es de uso personal e intransferible,
usarlo únicamente para fines laborales y no para diligencias personales.



Firma del Trabajador

C.C. 1057787974.


Fecha: 10 Noviembre 2020



COMPROMISO DE AUTOCUIDADO FRENTE AL COVID-19


Yo Elkin Usme Gaviria
identificado con C.C. 1057702531 con el
cargo colaborador me comprometo a cumplir con las
normas y procedimientos establecidos por la Legislación Nacional Vigente y por el
Ingeniero Héctor Fabio Ladino para prevenir un contagio por COVID-19.

Por lo anterior me comprometo a lavarme adecuadamente las manos mínimo cada
3 horas, usar de manera permanente el tapabocas, hablar sólo lo necesario con
los compañeros de trabajo, no socializar con ninguna persona en el traslado de mi
casa al trabajo y viceversa, no compartir alimentos, recipientes e hidratación,
mantener una distancia mínima de 2 mts con las demás personas, usar
correctamente los elementos de protección personal, hacer una disposición
correcta de los residuos sólidos en los puntos ecológicos, seguir con buena actitud
las instrucciones impartidas por el personal SST (Seguridad y salud en el trabajo)
de la obra, reportar inmediatamente cualquier síntoma relacionado con el COVID-
19 tanto en obra como en su residencia, realizar cambio de ropa de trabajo
diariamente y no lavarla junto con otras prendas de la familia, mantener adecuada
desinfección de superficies, vehículos, calzado, herramientas, el uso del celular en
la obra no es permitido, el carné de trabajo es de uso personal e intransferible,
usarlo únicamente para fines laborales y no para diligencias personales.



Firma del Trabajador
C.C. 1057702531

Fecha:



COMPROMISO DE AUTOCUIDADO FRENTE AL COVID-19

Yo Luis Alberto Ruiz Rios

identificado con C.C. 1193311997 con el cargo Colaborador me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Legislación Nacional Vigente y por el Ingeniero Héctor Fabio Ladino para prevenir un contagio por COVID-19.

Por lo anterior me comprometo a lavarme adecuadamente las manos mínimo cada 3 horas, usar de manera permanente el tapabocas, hablar sólo lo necesario con los compañeros de trabajo, no socializar con ninguna persona en el traslado de mi casa al trabajo y viceversa, no compartir alimentos, recipientes e hidratación, mantener una distancia mínima de 2 mts con las demás personas, usar correctamente los elementos de protección personal, hacer una disposición correcta de los residuos sólidos en los puntos ecológicos, seguir con buena actitud las instrucciones impartidas por el personal SST (Seguridad y salud en el trabajo) de la obra, reportar inmediatamente cualquier síntoma relacionado con el COVID-19 tanto en obra como en su residencia, realizar cambio de ropa de trabajo diariamente y no lavarla junto con otras prendas de la familia, mantener adecuada desinfección de superficies, vehículos, calzado, herramientas, el uso del celular en la obra no es permitido, el carné de trabajo es de uso personal e intransferible, usarlo únicamente para fines laborales y no para diligencias personales.

Luis Alberto Ruiz Rios
Firma del Trabajador

C.C. 1193311997

Fecha:

COMPROMISO DE AUTOCUIDADO FRENTE AL COVID-19

Yo Manuel Alfredo Morales Patiño
identificado con C.C. 1193321589 con el
cargo Colaborador me comprometo a cumplir con las
normas y procedimientos establecidos por la Legislación Nacional Vigente y por el
Ingeniero Héctor Fabio Ladino para prevenir un contagio por COVID-19.


Por lo anterior me comprometo a lavarme adecuadamente las manos mínimo cada
3 horas, usar de manera permanente el tapabocas, hablar sólo lo necesario con los
compañeros de trabajo, no socializar con ninguna persona en el traslado de mi casa
al trabajo y viceversa, no compartir alimentos, recipientes e hidratación, mantener
una distancia mínima de 2 mts con las demás personas, usar correctamente los
elementos de protección personal, hacer una disposición correcta de los residuos
sólidos en los puntos ecológicos, seguir con buena actitud las instrucciones
impartidas por el personal SST (Seguridad y salud en el trabajo) de la obra, reportar
inmediatamente cualquier síntoma relacionado con el COVID-19 tanto en obra como
en su residencia, realizar cambio de ropa de trabajo diariamente y no lavarla junto
con otras prendas de la familia, mantener adecuada desinfección de superficies,
vehículos, calzado, herramientas, el uso del celular en la obra no es permitido, el
carné de trabajo es de uso personal e intransferible, usarlo únicamente para fines
laborales y no para diligencias personales.

Manuel Alfredo Morales

Firma del Trabajador

C.C. 1.193.321.589

Fecha:




ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19

Nombres y apellidos: Jorge Elicer Cortes Rodriguez
Cedula: 1053842353 Cargo: colaborador Edad: 25
Lugar de residencia: Mamánare
Fecha: 09/11/2020 Hora: 7:00

1. ¿Ha presentado síntomas de náuseas, vómito y diarrea? (SI ___ NO
¿Hace cuánto? _____ ¿Por cuánto tiempo? _____
2. ¿Ha tenido fiebre superior a 37,3 grados C.? SI ___ NO
¿Por cuántos días? _____
3. ¿Ha tenido dolor de garganta? SI ___ NO ¿Por cuánto Tiempo? _____
4. ¿Ha presentado dolor de cabeza? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo?


5. ¿Ha tenido mareos? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
6. ¿Ha presentado Tos? SI ___ NO ¿Es seca? ___ ¿Húmeda? ___ ¿Produce flema?
___ ¿De qué color? _____ ¿Con sangre? ___ ¿Por cuánto tiempo?

7. ¿Dificultad para respirar? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
8. ¿Le ha dolido el pecho? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
9. ¿Le han dolido los músculos? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
10. ¿Ha tenido disminución del apetito? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo?

Firma del colaborador:  Cedula: 1053842353

Nombre, apellido y firma de quien atiende: Maria Isabel S.M 1057786667

Nota: El presente documento debe diligenciarse en caso de que algún ítem de la encuesta del formato de asistencia dé una respuesta positiva y/o en caso de tener sospecha sobre algún caso positivo. Después del diligenciamiento se deben reportar los síntomas a la Línea 123 y por la aplicación CoronAAP



ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19

Nombres y apellidos: Jhon Alexander Pincon Torres
Cedula: 1002731985 Cargo: colaborador Edad: _____
Lugar de residencia: Manzanales
Fecha: 09 Noviembre 2020 Hora: 7:00 Am

1. ¿Ha presentado síntomas de nauseas, vómito y diarrea? (SI ___ NO ___)
¿Hace cuánto? _____ ¿Por cuánto tiempo? _____
2. ¿Ha tenido fiebre superior a 37,3 grados C.? SI ___ NO ___
¿Por cuantos días? _____
3. ¿Ha tenido dolor de garganta? SI ___ NO ___ ¿Por cuánto Tiempo? _____
4. ¿Ha presentado dolor de cabeza? SI ___ NO ___ ¿Por cuánto tiempo?

5. ¿Ha tenido mareo? SI ___ NO ___ ¿Por cuánto tiempo? _____
6. ¿Ha presentado Tos? SI ___ NO ___ ¿Es seca? ___ ¿Húmeda? ___ ¿Produce flema?
___ ¿De qué color? _____ ¿Con sangre? ___ ¿Por cuánto tiempo?

7. ¿Dificultad para respirar? SI ___ NO ___ ¿Por cuánto tiempo? _____
8. ¿Le ha dolido el pecho? SI ___ NO ___ ¿Por cuánto tiempo? _____
9. ¿Le han dolido los músculos? SI ___ NO ___ ¿Por cuánto tiempo? _____
10. ¿Ha tenido disminución del apetito? SI ___ NO ___ ¿Por cuánto tiempo?

Firma del colaborador: _____ Cedula: _____

Nombre, apellido y firma de quien atiende: María Isabel Salazar M

Nota: El presente documento debe diligenciarse en caso de que algún ítem de la encuesta del formato de asistencia dé una respuesta positiva y/o en caso de tener sospecha sobre algún caso positivo. Después del diligenciamiento se deben reportar los síntomas a la Línea 123 y por la aplicación CoronAAP

ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19

Nombres y apellidos: Manuel Alfredo Morales Patiño
Cedula: 1193321589 Cargo: colaborador Edad: 18
Lugar de residencia: Marulanda
Fecha: 10 Noviembre 2020 Hora: 7:00 AM

1. ¿Ha presentado síntomas de náuseas, vómito y diarrea? (SI ___ NO X)
¿Hace cuánto? _____ ¿Por cuánto tiempo? _____
2. ¿Ha tenido fiebre superior a 37,3 grados C.? SI ___ NO X
¿Por cuántos días? _____
3. ¿Ha tenido dolor de garganta? SI ___ NO X ¿Por cuánto Tiempo? _____
4. ¿Ha presentado dolor de cabeza? SI X NO ___ ¿Por cuánto tiempo?


5. ¿Ha tenido mareo? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
6. ¿Ha presentado Tos? SI ___ NO X ¿Es seca? ___ ¿Húmeda? ___ ¿Produce flema?
___ ¿De qué color? _____ ¿Con sangre? ___ ¿Por cuánto tiempo?

7. ¿Dificultad para respirar? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
8. ¿Le ha dolido el pecho? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
9. ¿Le han dolido los músculos? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
10. ¿Ha tenido disminución del apetito? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo?

Firma del colaborador: Manuel Alfredo Morales Cedula: 1193.321.589

Nombre, apellido y firma de quien atiende: Maria Isabel Salazar M

Nota: El presente documento debe diligenciarse en caso de que algún ítem de la encuesta del formato de asistencia dé una respuesta positiva y/o en caso de tener sospecha sobre algún caso positivo. Después del diligenciamiento se deben reportar los síntomas a la Línea 123 y por la aplicación CoronAAP



ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19

Nombres y apellidos: Luis Alberto Ruiz Rios
Cedula: 1193311997 Cargo: colaborador Edad: 18
Lugar de residencia: Marulanda
Fecha: 10 Noviembre Hora: 7:00 AM

1. ¿Ha presentado síntomas de nauseas, vómito y diarrea? (SI ___ NO X
¿Hace cuánto? _____ ¿Por cuánto tiempo? _____
2. ¿Ha tenido fiebre superior a 37,3 grados C.? SI ___ NO X
¿Por cuantos días? _____
3. ¿Ha tenido dolor de garganta? SI ___ NO X ¿Por cuánto Tiempo? _____
4. ¿Ha presentado dolor de cabeza? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo?

5. ¿Ha tenido mareo? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
6. ¿Ha presentado Tos? SI ___ NO X ¿Es seca? ___ ¿Húmeda? ___ ¿Produce flema?
___ ¿De qué color? _____ ¿Con sangre? ___ ¿Por cuánto tiempo?

7. ¿Dificultad para respirar? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
8. ¿Le ha dolido el pecho? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
9. ¿Le han dolido los músculos? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo? _____
10. ¿Ha tenido disminución del apetito? SI ___ NO X ¿Por cuánto tiempo?

Firma del colaborador: Luis Alberto Ruiz Cedula: 1193311997

Nombre, apellido y firma de quien atiende: Maria Isabel Salazar M

Nota: El presente documento debe diligenciarse en caso de que algún ítem de la encuesta del formato de asistencia dé una respuesta positiva y/o en caso de tener sospecha sobre algún caso positivo. Después del diligenciamiento se deben reportar los síntomas a la Línea 123 y por la aplicación CoronAAP


ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19

Nombres y apellidos: Elkin Humberto Usme Gaviria
Cedula: 1057782531 Cargo: colaborador Edad: 32
Lugar de residencia: Manizales
Fecha: _____ Hora: _____

1. ¿Ha presentado síntomas de náuseas, vómito y diarrea? (SI ___ NO
¿Hace cuánto? _____ ¿Por cuánto tiempo? _____
2. ¿Ha tenido fiebre superior a 37,3 grados C.? SI ___ NO
¿Por cuántos días? _____
3. ¿Ha tenido dolor de garganta? SI ___ NO ¿Por cuánto Tiempo? _____
4. ¿Ha presentado dolor de cabeza? SI NO ___ ¿Por cuánto tiempo?


5. ¿Ha tenido mareo? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
6. ¿Ha presentado Tos? SI ___ NO ¿Es seca? ___ ¿Húmeda? ___ ¿Produce flema?
___ ¿De qué color? _____ ¿Con sangre? ___ ¿Por cuánto tiempo?

7. ¿Dificultad para respirar? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
8. ¿Le ha dolido el pecho? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
9. ¿Le han dolido los músculos? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
10. ¿Ha tenido disminución del apetito? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo?

Firma del colaborador:  Cedula: 1057782531

Nombre, apellido y firma de quien atiende: Marva Isabel S.M

Nota: El presente documento debe diligenciarse en caso de que algún ítem de la encuesta del formato de asistencia dé una respuesta positiva y/o en caso de tener sospecha sobre algún caso positivo. Después del diligenciamiento se deben reportar los síntomas a la Línea 123 y por la aplicación CoronaAAP




ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19

Nombres y apellidos: Juan Esteban Gonzalez Rios
Cedula: 1057787974 Cargo: colaborador Edad: 22
Lugar de residencia: Manzanares
Fecha: 10 Noviembre 2020 Hora: 7:00 Am

1. ¿Ha presentado síntomas de nauseas, vómito y diarrea? (SI ___ NO
¿Hace cuánto? _____ ¿Por cuánto tiempo? _____
2. ¿Ha tenido fiebre superior a 37,3 grados C.? SI ___ NO
¿Por cuantos días? _____
3. ¿Ha tenido dolor de garganta? SI ___ NO ¿Por cuánto Tiempo? _____
4. ¿Ha presentado dolor de cabeza? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo?


5. ¿Ha tenido mareo? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
6. ¿Ha presentado Tos? SI ___ NO ¿Es seca? ___ ¿Húmeda? ___ ¿Produce flema?
___ ¿De qué color? _____ ¿Con sangre? ___ ¿Por cuánto tiempo?

7. ¿Dificultad para respirar? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
8. ¿Le ha dolido el pecho? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
9. ¿Le han dolido los músculos? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo? _____
10. ¿Ha tenido disminución del apetito? SI ___ NO ¿Por cuánto tiempo?

Firma del colaborador:  Cedula: 1057787974

Nombre, apellido y firma de quien atiende: M. Isabel S.M

Nota: El presente documento debe diligenciarse en caso de que algún ítem de la encuesta del formato de asistencia dé una respuesta positiva y/o en caso de tener sospecha sobre algún caso positivo. Después del diligenciamiento se deben reportar los síntomas a la Línea 123 y por la aplicación CoronAAP



CONTRATISTA:
HÉCTOR FABIO LADINO

ENTIDAD CONTRATANTE
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Nómina para Pago de Sueldos No. 00001

LUGAR DE TRABAJO
Nombre: REPOSICIÓN TUBERÍA 8° EL PALO ALTO BONITO
Dirección: VEREDA ALTO BONITO
Ciudad: MANZANARES

Contrato No. 013 de 2020
Teléfono: 3184927741
Depto: CALDAS


Fecha: 14 nov 2020
Período pago del: 9 nov 2020
al: 14 nov 2020

NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	SALARIO MES	JX. TRANSP. MI	DÍAS TRAB.	SUELDO BÁSICO	AUX. TRANSP.	NETO PAGADO	Recibi Conforme (firma y c.c.)
CARDENAS PINEDA EUDORO	15990209	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR
CASTAÑEDA ARIAS DANIEL	9872451	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR
CORTES RODRIGUEZ JORGE ELIECER	1053842353	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	5	\$ 146,300.00	\$ 17,142.00	\$ 163,442.00	
GONZALEZ RIOS JUAN ESTEBAN	1057787974	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	5	\$ 146,300.00	\$ 17,142.00	\$ 163,442.00	
GONZALEZ SALDARRIAGA JHON JAIRO	1055917880	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR
GUAYARA GOMEZ NICOLAS	10251527	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	5	\$ 146,300.00	\$ 17,142.00	\$ 163,442.00	
JIMENEZ LOPEZ OSCAR ALBERTO	1002800639	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR
MORALES PATIÑO MANUEL ALFREDO	1193321589	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	5	\$ 146,300.00	\$ 17,142.00	\$ 163,442.00	
RINCON TORRES JHON ALEXANDER	1002731985	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR
RUIZ RIOS LUIS ALBERTO	1193311997	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	5	\$ 146,300.00	\$ 17,142.00	\$ 163,442.00	
SALAZAR MARTINEZ MARIA ISABEL	1057786667	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	5	\$ 146,300.00	\$ 17,142.00	\$ 163,442.00	
USME GAVIRIA ELKIN HUMBERTO	1057782531	\$ 877,803.00	\$ 102,854.00	5	\$ 146,300.00	\$ 17,142.00	\$ 163,442.00	

TOTALES =

\$ 1,024,100.00 \$ 119,994.00 \$ 1,144,094.00

APROBADO





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	20/11/2020	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Acto 013/2020
Objeto:	Cambio de tubería por emergencia en la conducción el palo en la vereda alto bonito en el Municipio de Manzanares Caldas
Nombre Contratista:	Héctor Fabio ladino
Representante legal:	Héctor Fabio ladino
Fecha del contrato:	06 de octubre del 2020
Plazo de ejecución:	30 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 41.938.475
Fecha de iniciación:	09 de Octubre del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	07 de Noviembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Manzanares	Acueducto	0.15

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	30
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)




1.5. Problemáticas con la obra

No se encontraron problemáticas durante la ejecución de la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 41.938.475
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 41.938.475
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %
Inversión total ejecutada:	\$ 41.938.475
Porcentaje total ejecutado:	100 %

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	42-45-101045295	08/10/2020	08/02/2021	\$ 12.581.542.50
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s.a	42-45-101045295	08/10/2020	08/11/2023	\$ 8.387.695.00
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s.a	42-45-101045292	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 8.387.695.00
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s.a	42-40-101034554	08/10/2020	08/02/2021	\$ 12.581.542.50

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Cárdenas Pineda Eudoro	X	X	X	X	X
Castañeda Arias Daniel	X	X	X	X	X
Cortes Rodríguez Jorge Eliecer	X	X	X	X	X
Gonzales Ríos Juan Esteban	X	X	X	X	X
Gonzales Saldarriaga Jhon Jairo	X	X	X	X	X
Guayara Gómez Nicolás	X	X	X	X	X
Jiménez López óscar	X	X	X	X	X
Morales Patiño Manuel	X	X	X	X	X
Rincón Torres Jhon Alexander	X	X	X	X	X
Salazar Martínez María Isabel	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019


GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
13/10/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores Municipio de Manzanara caldas

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE POLI(CLORURO DE VINILO) ORIENTADO

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en el Autopista Medellín Km. 2 - 600 metros
Entrada por la vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

*Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín Km. 2 - 600 metros
Entrada por la vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia*

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5425 (2012)

Tubos de presión de poli(cloruro de vinilo) orientado, PVCO

Oriented poly (vinyl chloride), PVCO, pressure pipe

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC - CER199062
Certificate

Fecha de Aprobación: 2012-07-30
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2015-07-31
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-07-29
Expiration Date:

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:




ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ES-4-PD-04-P-001

Este certificado es propiedad de ICONTEC y no debe ser utilizado sin el consentimiento escrito de ICONTEC.

ICONTEC INTERNACIONAL S.A. Carrera 37 no. 52 - 96 Bogotá D.C. - Colombia


Mónica Vivas
Directora de Evaluación de la Conformidad
Conformity Assessment Director



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA, TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA UNIÓN TIPO RIEBER, TUBERÍA PRESIÓN EXTREMO LISO, TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO, ACCESORIOS TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO, TUBO SANITARIO, TUBO VENTILACIÓN, ACCESORIOS PARA TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA, ACCESORIOS PRESIÓN AGUA POTABLE, ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN, TUBERÍA PRESIÓN SUPRAXIAL PVC CON CAMPANA, TUBERÍA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA, TUBERÍA CORRUGADA ALCANTARILLADO ACAMPANADA, ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO, ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA

Fabricado por **PVC GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín Kilómetro 2 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **PVC GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín Kilómetro 2 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Reglamento técnico de tuberías y accesorios

Technical regulation about pipes and accessories

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR -CER602683
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-04-13
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-04-12
Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:




ID #0677
ISO/IEC 17065

Product Certification Body

ES-1-PD-04-F-001 Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

ICONTEC INTERNACIONAL carrera 37 nro. 59 - 95, Bogotá D.C. Colombia




EMPOCALDAS S.A.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO
 TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ACUEDUCTO

CONTRATO No	ACTO 013 de 2020	MUNICIPIO	MANZANARES CAIDAS
-------------	------------------	-----------	-------------------

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR MUNICIPAL (RUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Conduccion	EL PALO - ALTO BOMITO	8"	150	PVC	Instalacion con abertura de ficha		SI	NITC 5425	DNAC ANSI	122112003012	P.V.C. GEBBER S.A.	850 502 509	6/11/2020	8"	AC	150

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	AREX QUINTEIRO VASQUEZ	HECTOR FAJIO LADINO
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR		
NUMERO CONTRATISTA		
FIRMA CONTRATISTA		

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION
 COORDINADOR ACUEDUCTO




EMPOCALDAS S.A.E.S.P										
CONTRATO No: ACTO 013 DE 2020		ACTA: No: 1 Y FINAL		FECHA CORTE: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020						
OBJETO: CAMBIO DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN EL PALO EN LA VEREDA ALTOBONITO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS		FECHA INICIACION: 09 DE OCTUBRE DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2020						
MUNICIPIO: MANZANARES CALDAS		VALOR CONTRATO: 41.938.475		VALOR CONTRATO + ADICION:						
CONTRATISTA: HECTOR FABIO LADINO		VALOR OBRA: 41.938.475								
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR FABIO LADINO		SUPERVISION: ARIEX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020						
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL		ACTA 1 Y FINAL		% EJECUT				
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL		CAN	VR TOTAL		
1	PRELIMINARES									
2	Localización y replanteo	mts	150	5.858	878.700	150	878.700			100%
3	EXCAVACIONES									
4	En material común de 0 A 2 m	m3	60	27.896	1.673.760	81,1	2.263.514			135%
5	En Roca	m3	10	70.000	700.000	9,6	672.000			96%
6	En conglomerado	m3	20	40.000	800.000	16	640.000			80%
7	Dispersión de material sobrante	m3	15	23.320	349.800	13	303.160			87%
8	ESTRUCTURA DE ACUEDUCTO									
9	Suministro e instalación de tubería PVC de 8" RDE 21 200 PSI incluye sobre acarreo en vehículo y al hombro	mts	150	161.900	24.285.000	150	24.285.000			100%
10	Empalme de tubería de PVC a Polietileno	Und	1	1.100.000	1.100.000	1	1.100.000			100%
11	Empalme a tubería de PVC a AC	Und	1	450.000	450.000	1	450.000			100%
12	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálicos de 2 m c/u de largo y alambre galvanizado	Und	2	565.000	1.130.000	2	1.130.000			100%
13	LLENOS									
14	Lleno compactado con material de la obra	m3	50	21.786	1.089.300	89	1.938.954			178%
15	Vehículo para transporte de personal	dia	15	300.000	4.500.000	15	4.500.000			100%
16	Acompañamiento social durante la obra	mes	1	1.873.915	1.873.915	1	1.873.915			100%
17	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AITU	gl	1,0	1.500.000	1.500.000	-	-			0%
18	Trabajador síso	mes	0,50	3.216.000	1.608.000	0,5	1.608.000			100%

TOTAL OBRA					41.938.475	41.643.243
TOTAL COSTO DIRECTO					31.297.369	31.077.047
ADMINISTRACION	%	28			8.763.263	8.701.573
IMPREVISTOS	%	1			312.974	310.770
UTILIDADES	%	5			1.564.868	1.553.852
SUMA ANTES DE IVA					41.938.475	41.643.243
IVA SOBRE UTILIDADES	%	19				295.232
TOTAL					41.938.475	41.938.475

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	41.938.475
VALOR ADICION	
VALOR ACTA 1 Y FINAL	41.938.475
VALOR ACTAS	41.938.475
SALDO NO EJECUTADO	0
SUMAS IGUALES	41.938.475

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	


 ARL QUINTERO SUAREZ
 SUPERVISOR
 EMP/POCALDAS S. A. E.S.P


 HECTOR FABIO LADINO
 CONTRATISTA

