

Jurisdicción

# CONTRATO Y AÑO	249 de 2021	Acta N°	2 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	170.040.521
				2. VALOR ADICION	83.711.199
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			3. VALOR TOTAL (1+2)	253.751.720
NIT O CC:	10,280,643-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	135.466.580
CDP (#, rubro y fecha)	00247 de 222/01/18 y 00334 de 2022/01/18 RUBRO 2320101001030808			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	118.223.727
RP (#, rubro y fecha)	000197 de 2022/01/19 y 000283 de 2022/01/19 RUBRO 2320101001030808			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	61.413
OBJETO DEL CONTRATO:	"REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CRA 8 ENTRE CALLES 19 B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS"				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.




 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
086160012067	CUENTA CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 10-02-22

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	73749829	1301120865	27/01/2022

Número de Identificación

10280643

Primer Nombre ó Razón Social

JAVIER DE JESUS

Primer Apellido (si es Persona natural)

GARCIA PAREJA

Tipo de documento

03

Dígito de Verificación (Si es persona**Naturaleza Juridica**

03

Departamento

17

Ciudad Capital

1700100

Dirección de Domicilio

CALLE 64A 21 50 of 1507 edf portal del c

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Localización

1

Teléfono de Contacto

+57,8861419

Correo electrónico

javiergarciapareja@hotmail.com

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional

17

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra**Número Contrato de Obra**

249-2021

Nombre Obra

REPOSICION REDES ACUED. y ALCA

Fecha Inicio Obra

08/11/2021

Fecha Terminación Obra

15/01/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

SUPIA CALDAS

Tipo FIC

01

Año Periodo a Pagar

2021

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total de Obra a Todo Costo

253751000.00

Costo Total Mano de Obra

14807000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

20

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

454263.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

454263.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	73749829	1301120865	27/01/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **10280643**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.28.101.52**

**Su transacción fue
APROBADA por la**

Total Pagado **\$ 454,263.00** ✓

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 454,263.00	\$ 454,263.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

- Localización y replanteo de red de alcantarillado.
- Excavaciones en Roca y conglomerado.
- Instalacion de tubería Tipo Novafort de 16 y 12 pulgadas.
- Instalacion tubería de $\varnothing= 6''$ para domiciliarias de alcantarillado
- Localizacion y replanteo reposicion red de acueducto de 2 a 3'' de diámetro.
- Reposicion red de acueducto de 2 a 3'' de diámetro.
- Reposicion de acometidas domiciliarias de acueducto, en tubería PF + UAD de $\frac{1}{2}$ pulgada.
- Puesta en funcionamiento del servicio de acueducto de los 57 usuarios a los que se le hicieron las conexiones domiciliarias nuevas.
- Retiro y reistalacion hidrante diametro $\varnothing= 3''$
- Instalacion de dos valvulas de acueducto de $\varnothing= 3''$
- Llenos con material seleccionado del sitio
- Llenos con material de prestamo, afirmado.
- Construcción de Cajas en concreto para domiciliarias de alcantarillado
- Retiro de material Sobrante en volqueta

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

Ingeniero Civil

✓ 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Valla informativa





Conexiones domiciliarias de alcantarillado, en este caso se empleó silla T



Entibado de las paredes, para evitar accidentes por derrumbamiento de las paredes.






Demolición pavimento para instalación tubería de acueducto PVC Ø= 3"



Excavación Para conexiones domiciliarias de acueducto.



Excavaciones para conexiones domiciliarias de acueducto, se pree excavan con excavadora y se terminan a mano para colocar la cama de arena.

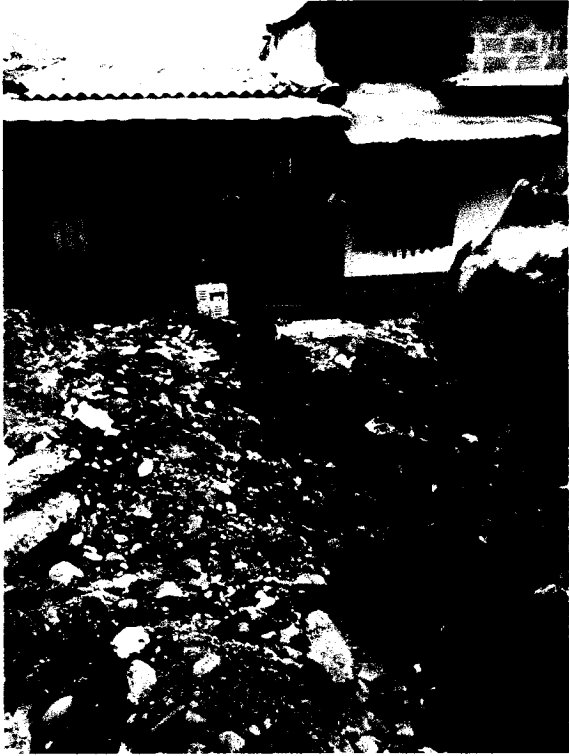

Empalme carrera 8 calle 22



Empalme Carrera 8 calle 21



Instalación de Válvula y continuación tubería de 2" Cra 8 calle 19 B




Carrera 8 calle 20 empalme mediante cruceta costado izquierdo.



Anclaje Tee de 3 x 2



Cama de arena tubería Ø= 3" PVC acueducto

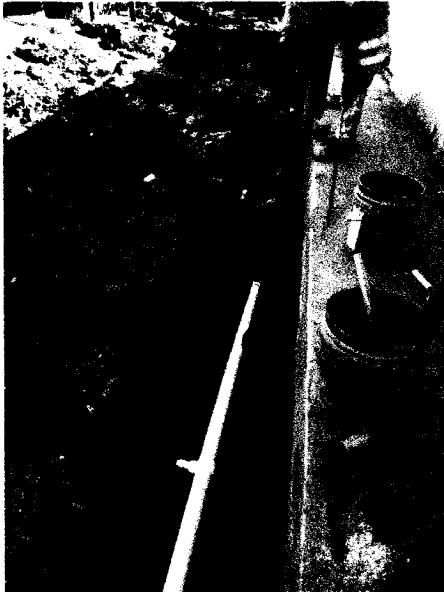

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Contratista.

Handwritten signature

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: HERSIBIAN QUINTERO GONZALEZ	Cédula: 75088263
Cargo: No Aplica	Cuenta: 07072851566
Dirección: VEREDA LAS GUACAS - Cel.3166996477	Municipio: Manizales

Liquidación No.10052 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-19-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4	-	DESCUENTO EPS		11,733
SALARIO ORDINARIO		293,333	DESCUENTO AFP		11,733
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		196,799	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		23,466
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		490,132			
TOTAL A PAGAR HERSIBIAN :					\$466,666

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		2,200,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		2,200,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	72	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		220,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		116,111			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		116,111			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		735			
TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA HERSIBIAN :					\$452,957

TOTAL A PAGAR:

\$919,623

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

HERSIBIAN QUINTERO GONZALEZ
C.C.75088263

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**DATOS DEL EMPLEADO:**

Nombre: CARLOS ALFONSO ORTIZ	Cédula: 1060591189
Cargo: No Aplica	Cuenta: 36814501901
Dirección: LA VEGA 1 CS 104 - Cel.3233442933	Municipio: Supia

Liquidación No.10053 - Período Desde: 01-01-2022 **Hasta:** 01-19-2022**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4		DESCUENTO EPS		5,333
SALARIO ORDINARIO		133,333	DESCUENTO AFP		5,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		15,623	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		10,666
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		16,667			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		165,623			
TOTAL A PAGAR CARLOS ALFONSO:					\$154,957

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV,		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	72	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		100,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		373			
TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA CARLOS ALFONSO:					\$218,297

TOTAL A PAGAR:**\$373,254**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Carlos Alfonso Ortiz

CARLOS ALFONSO ORTIZ
C.C.1060591189

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: EDESIO DE JESUS ZAMBRANO VELASQUEZ	Cédula: 1053875209
Cargo: No Aplica	Cuenta: 03126454721
Dirección: CR 21 63 89 - Cel.3126454721	Municipio: Supia

Liquidación No.10054 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-19-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4		DESCUENTO EPS		5,333
SALARIO ORDINARIO		133,333	DESCUENTO AFP		5,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		15,623	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		10,666
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		33,333			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		192,289			
TOTAL A PAGAR EDESIO DE JESUS:					\$171,623

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:


CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV.		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS'		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	55	


PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		76,389			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		373			
TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA EDESIO DE JESUS:					\$194,686

TOTAL A PAGAR: \$366,309

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.




EDESIO DE JESUS ZAMBRANO VELASQUEZ
C.C.1053875209

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**DATOS DEL EMPLEADO:**

Nombre: JHON JAIRO RIOS QUINCHIA	Cédula: 76235136
Cargo: No Aplica	Cuenta: 488425380356
Dirección: CR 8 CL 19 CS 4 - Cel.3148781847	Municipio: Supia

Liquidación No.10057 - Período Desde: 01-01-2022 **Hasta:** 01-19-2022**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4		DESCUENTO EPS		5,333
SALARIO ORDINARIO		133,333	DESCUENTO AFP		5,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		15,623	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		10,666
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		33,333			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		182,289			
TOTAL A PAGAR JHON JAIRO:					\$171,623

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS)		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	17	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	17	
DIAS PARA VACACIONES	54	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		75,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		52,755			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		299			
TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JHON JAIRO:					\$187,016

TOTAL A PAGAR:**\$358,639**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.



Jhon Jairo Rios
 JHON JAIRO RIOS QUINCHIA
 C.C.76235136

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JOSE MANUEL CASTAÑEDA LOTERO	Cédula: 15931834
Cargo: No Aplica	Cuenta: 488425143788
Dirección: LA VEGA 1 CS 61 - Cel.31113125636	Municipio: Supia

Liquidación No.10058 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-19-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4		DESCUENTO EPS		5,333
SALARIO ORDINARIO		133,333	DESCUENTO AFP		5,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		15,623	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		10,666
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		33,333			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		182,289			
TOTAL A PAGAR JOSE MANUEL:					\$171,623

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS'		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	72	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		100,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		373			
TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JOSE MANUEL:					\$218,297

TOTAL A PAGAR:

\$389,920

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JOSE MANUEL CASTAÑEDA LOTERO
C.C.15931834

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JUAN SEBASTIAN CASTAÑO ESCUDERO	Cédula: 1002899901
Cargo: No Aplica	Cuenta: 36814817291
Dirección: CR 9 25 46 - Cel.3218910294	Municipio: Supia

Liquidación No.10059 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-18-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	3		DESCUENTO EPS		4,000
SALARIO ORDINARIO		100,000	DESCUENTO AFP		4,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		11,717	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		8,000
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		16,667			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		128,384			

TOTAL A PAGAR JUAN SEBASTIAN: \$120,384

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	18	
DIAS PARA CESANTIAS	18	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	18	
DIAS PARA VACACIONES	71	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		98,611			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		55,859			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		55,859			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		335			

TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JUAN SEBASTIAN: \$210,664

TOTAL A PAGAR:

\$331,048

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Sebastian Castaño E.

JUAN SEBASTIAN CASTAÑO ESCUDERO
C.C.1002899901

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT.: 10.280.643-2

CONTRATO 249-2021 EMPOCALDAS - REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CR 8 ENTRE CALLES 19 B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

NÓMINA No.: 05

FECHA: DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021

	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	AUXILIO ALIMENTACIÓN	AUXILIO TRANSP	TOTAL DEVENG	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	TOTAL	RECIBÍ CONFORME
											4.0%	4.0%	DEDUC.	A PAGAR	
✓ 1	YEFERSON JULIAN ALVAREZ BARRANTES	1,128,594,764	AYUDANTE	908,526	5.00	151,421		-	3,548	154,969	6,067	6,057	12,114	142,855	<i>Yeferson</i>
					5	151,421		-	3,548	154,969	6,057	6,057	12,114	142,855	

Jesús

Wib

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT.: 10.280.843-2

CONTRATO 249-2021 EMPOCALDAS - REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CR 8 ENTRE CALLES 19 B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

NÓMINA No.: 07

FECHA: DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021

	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	DÍAS LAB.	VALOR QUINC.	AUXILIO ALIMENTACIÓN	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	TOTAL	RECIBI CONFORME
										4.0%	4.8%	DEDUC.	A PAGAR	
1	JORGE EDWIN BERMUDEZ GUEVARA	15.933.207	AYUDANTE	908,528	4.00	121,137		14,194	135,331	4,845	4,845	9,690	125,641	Jorge Edwin Bermudez
					4	121,137		14,194	135,331	4,845	4,845	9,690	125,641	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
 NIT.: 10.280.643-2
 CONTRATO 249-2021 EMPICALDAS - REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CR 8 ENTRE CALLES 18 B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
 NÓMINA NO.: 09
 FECHA: DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	DÍAS LAB.	VALOR	AUXILIO ALIMENTACIÓN	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENG	SALUD	PENSIÓN	DEDUC.	TOTAL	RESERVA CONFORME	
													A. I.A.S.A.	TOTAL
1 HERIBIAN QUINTERO GONZALEZ	75.088.283	MAESTRO DE OBRA	2.200.000	15,00	1.100.000	388.000		1.100.000	44.000	44.000	88.000	1.100.000		
2 MAURICIO ESCOBAR ZATAPA	75.088.488	OFICIAL	1.500.000	15,00	750.000	51.414	58.586	808.586	30.000	30.000	60.000	800.000		
3 CARLOS ALFONSO ORTIZ	1.080.591.189	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000		58.586	558.586	20.000	20.000	40.000	518.586		
4 EDESIO DE JESUS ZAMBRANO VELASQUEZ	1.053.875.209	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000		58.586	558.586	20.000	20.000	40.000	518.586		
5 JHON JAIRO RIOS QUINCHIA	76.238.136	AYUDANTE	1.000.000	13,00	433.333	50.775	58.586	484.108	17.333	17.333	34.666	449.442		
6 JOSE MANUEL CASTAÑEDA LOTERO	15.931.834	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000	50.000	58.586	558.586	20.000	20.000	40.000	568.586		
7 JUAN SEBASTIAN CASTAÑO ESCUDERO	1.002.899.801	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000		58.586	558.586	20.000	20.000	40.000	518.586		
8 LUIS FERNANDO ARAANGO CORRALES	16.812.039	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000		58.586	558.586	20.000	20.000	40.000	518.586		
9 SANTAGO CARTAGENA CASTAÑO	1.002.853.957	AYUDANTE	1.000.000	13,00	433.333	50.775	58.586	484.108	17.333	17.333	34.666	449.442		
10 FRANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	70.076.401	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000		58.586	575.545	20.000	0	20.000	555.545		
11 HERNAN GOMEZ GALLO	10.196.299	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000		58.586	558.586	20.000	20.000	40.000	518.586		
								6.803.962	248.666	228.666	477.332	6.115.945		

7/10

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures in the left margin of the table, including names like 'Luis Fernando Araango', 'Heribian Quintero', and 'Mauricio Escobar']

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT.: 10.280.643-2

CONTRATO 249-2021 EMPOCALDAS - REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CR 8 ENTRE CALLES 19 B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

NÓMINA No.:

FECHA: DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2022

	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	DÍAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	AUXILIO ALIMENTACIÓN	AUXILIO TRANSP	TOTAL DEVENG	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	TOTAL	RECIBÍ CONFORME
											4,0%	4,0%	DEDUC.	A PAGAR	
1	ORLANDO PARDO CASTILLA	15.928.645	AYUDANTE	1.000.000	9,00	300.000		-	35.152	335.152	12.000	12.000	24.000	311.152	<i>Orlando Pardo</i>
					9	300.000		-	35.152	335.152	12.000	12.000	24.000	311.152	

Jes:

MSB

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT.: 10.280.643-2

CONTRATO 249-2021 EMPICALDAS - REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CR 8 ENTRE CALLES 19 B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

NOMINA No.: 10

FECHA: DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2022

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	DÍAS LAB. QUINC.	VALOR AUXILIO ALIMENTACION	AUXILIO TRANSP. PENSION	DEVOL. APORTE PENSION	TOTAL DEVENG	SALUD	PENSION	DEDUC.	TOTAL	TOTAL	RENTA INFORME
HERSIAN QUINTERO GONZALEZ	75.088.283	MAESTRO DE OBRA	2.200.000	4,00	293.333	199.799	-	293.333	11.733	11.733	23.489	466.566		
CARLOS ALFONSO ORTIZ	1.050.981.189	AYUDANTE	1.000.000	4,00	133.333	16.667	15.623	148.956	5.333	5.333	10.969	154.957		
EDSIO DE JESUS ZAMBRANO VELASQUEZ	1.053.875.209	AYUDANTE	1.000.000	4,00	133.333	33.333	15.623	148.956	5.333	5.333	10.969	174.623		
JHON JAIR RIOS QUINCHIA	76.235.136	AYUDANTE	1.000.000	4,00	133.333	33.333	15.623	148.956	5.333	5.333	10.969	171.623		
JOSE MANUEL CASTAÑEDA LOTERO	15.931.834	AYUDANTE	1.000.000	4,00	133.333	33.333	15.623	148.956	5.333	5.333	10.969	171.623		
JUAN SEBASTIAN CASTAÑO ESCUDERO	1.002.899.901	AYUDANTE	1.000.000	3,00	100.000	16.667	11.717	111.717	4.000	4.000	8.000	120.384		
LUIS FERNANDO ARANGO CORRALES	18.612.039	AYUDANTE	1.000.000	4,00	133.333	-	15.623	148.956	5.333	5.333	10.969	138.290		
SANTAGO CARTAGENA CASTAÑO	1.002.653.957	AYUDANTE	1.000.000	3,00	100.000	33.333	11.717	111.717	4.000	4.000	8.000	137.050		
FRANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	70.079.401	AYUDANTE	1.000.000	4,00	133.333	33.333	15.623	148.956	5.333	5.333	10.969	176.956		
HERNAN GOMEZ GALLO	10.196.298	AYUDANTE	1.000.000	3,00	100.000	-	11.717	111.717	4.000	4.000	8.000	109.717		
				37	1.393.331	396.798	128.889	1.522.220	55.731	50.396	106.129	1.812.889		

9/11

[Handwritten signature]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Autoliquidación y Consolidación

Suaporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-11, 03:22:53 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Período Cotización: diciembre de 2021 Período Servicio: diciembre de 2021 Número Planilla: 53484517

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER DE JESUS GARCIA P
Documento	CC10280643
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	1
Total Afiliados	1
Identificación	ARP
Dirección	CR 21 #64 A - 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA
Teléfono	8934273
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE


Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Identificación	Apeados y Membres	Tpo Cotización	Subpo Cotización	NO	NET	INT	PRE	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	Total
CC 10280643	JAVIER DE JESUS GARCIA	PAEJA	00																			\$ 3,646,000

III. TOTALES

IBC Pension	\$ 10,000,000	IBC Salud	\$ 10,000,000	IBC Riesgos	\$ 10,000,000	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pension	\$ 1,700,000	Aportes Salud	\$ 1,250,000	Aportes Riesgos	\$ 696,000	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Sens	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ECAF	\$ 0	Aportes con Educación	\$ 0	Incapacidades (Licencias, Salidas a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 3,646,000	TOTAL FINAL	\$ 3,646,000
-------------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------------	-----------	------	-----------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	------------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	--------------	-------------	--------------

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	02	Fecha del informe	20/01/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	249 de 2021
Objeto:	Reposición redes de acueducto y alcantarillado en los sectores carrera 8 entre calles 19B a 22 en el Municipio de Supia – Caldas.
Nombre Contratista:	Javier de Jesús García Pareja
Fecha del contrato:	Octubre 20 de 2021
Plazo de ejecución:	60 Días calendario
Valor inicial:	\$ 170.040.521.oo
Fecha de iniciación:	Octubre 27 de 2021
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	Diciembre 25 de 2021
Nueva fecha de terminación:	Enero 24 de 2022
Adición (en valor):	\$ 83.711.199.oo
Prórroga (en tiempo):	30 Días calendario
Supervisor:	Johann Manuel Sabogal Ramírez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	\$ 118.223.727.oo (46.59 %)
Avance físico Acumulado	\$ 253.690.307.oo (99.98 %)

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

Hacer reposición de acueducto y alcantarillado en la Cra 8 entre calles 19 B y 22, que por la antigüedad de las redes, ameritan su cambio, estas actividades se llevan a cabo con dificultad por el tipo de suelo hallado en el sitio, deposito aluvial con gravas y enormes rocas para su excavación.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

- Localización y replanteo de red de alcantarillado.
- Excavaciones en Roca y conglomerado.
- Instalación de tubería Tipo Novafort de 16 y 12 pulgadas.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- Instalación tubería de $\varnothing=6''$ para domiciliarias de alcantarillado
- Localización y replanteo reposición red de acueducto de 2 a 3" de diámetro.
- Reposición red de acueducto de 2 a 3" de diámetro.
- Reposición de acometidas domiciliarias de acueducto, en tubería PF + UAD de $\frac{1}{2}$ pulgada.
- Puesta en funcionamiento del servicio de acueducto de los 57 usuarios a los que se le hicieron las conexiones domiciliarias nuevas.
- Retiro y reinstalación hidrante diámetro $\varnothing=3''$
- Instalación de dos válvulas de acueducto de $\varnothing=3''$
- Llenos con material seleccionado del sitio
- Llenos con material de préstamo, afirmado.
- Construcción de Cajas en concreto para domiciliarias de alcantarillado
- Retiro de material Sobrante en volqueta

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SUPIA	ACUEDUCTO	0.1955

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	90 días
Tiempo total transcurrido:	84 días
Avance Porcentual:	93.33 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)


Se presenta al final de este informe.

1.5. Problemáticas con la obra

El aspecto mas importante tiene que ver con el tipo de suelo encontrado, que corresponde a un deposito aluvial compuesto por gravas y enormes rocas lo que hizo muy complejo las excavaciones y la instalación de las tuberías tanto para la reposición del alcantarillado como el acueducto y sus conexiones domiciliarias.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 253.751.720.00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 118.223.727.00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	46.59 %
Inversión total ejecutada:	\$ 253.690.307.00

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Porcentaje total ejecutado:	99.98 %
-----------------------------	---------

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros Mundial	EC-100021297	19/12/2021	24/04/2022	\$76.125.516.00
Salarios y prestaciones sociales	Seguros Mundial	EC-100021297	19/12/2021	24/01/2025	\$50.750.344.00
Estabilidad de la obra	Seguros Mundial	EC-100021297	24/01/2022	24/01/2027	\$50.750.344.00
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros Mundial	EC-100003371	20/10/2021	24/04/2022	\$76.125.516.00

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
HERSIBIAN QUINTERO GONZALEZ	POSITIVA	MEDIMAS	COLPENSIONES	ok	ok
MAURICIO ESCOBAR ZAPATA	POSITIVA	S.TOTAL	PORVENIR	ok	ok
YEFERSON JULIAN ALVAREZ BARRANTES	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok
CARLOS ALFONSO ORTIZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
JHON JAMES CALVO OSPINA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok
JUAN SEBASTIAN CASTAÑO ESCUDERO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok
ORLANDO PARDO CASTILLA	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	ok	ok
JORGE EDWIN BERMUDEZ GUEVARA	POSITIVA	MEDIMAS	COLPENSIONES	ok	ok
JOSE MANUEL CASTAÑEDA LOTERO	POSITIVA	ASMET	PROTECCIÓN	ok	ok
DANIEL ALBERTO RUA ANDICA	POSITIVA	MALLAMAS	PORVENIR	ok	ok
SNEIDER PAZ HERNANDEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok
ALBEIRO MORENO	POSITIVA	NUEVA EPS	PENSIONADO COLPENSIONES	ok	ok
JHON JAIRO RIOS QUINCHIA	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
JHON SEBASTIAN MONTOYA MESA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok
EDESIO DE JESUS ZAMBRANO VELASQUEZ	POSITIVA	MALLAMAS	PROTECCIÓN	ok	ok
LUIS FERNANDO ARANGO CORRALES	POSITIVA	ASMET	PROTECCIÓN	ok	ok
YONIER ALEXANDER ARANGO RAMOS	POSITIVA	ASMET	PORVENIR	ok	ok



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

SANTIAGO CARTAGENA CASTAÑO	POSITIVA	MALLAMAS	PORVENIR	ok	ok
FRANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	POSITIVA	ASMET	COLPENSIONES	ok	ok
HERNAN GOMEZ GALLO	POSITIVA	MALLAMAS	COLPENSIONES	ok	ok

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

NOMBRE	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	POSITIVA	SURA	COLPENSIONES	ok	ok

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Enero 11 de 2022	A		A	A	N/U	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación) Se anexa con el acta de obra.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

		Madres cabeza de familia			
		Personal con limitaciones físicas			
TOTALES					
Personal Interventoría			Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas				
	Negritudes				
	Madres cabeza de familia				
	Personal con limitaciones físicas				
Mano de Obra No Calificada	Indígenas				
	Negritudes				
	Madres cabeza de familia				
	Personal con limitaciones físicas				
TOTALES					

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Ingeniero Zona occidente
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO:



Instalación tubería de acueducto PVC diámetro $\varnothing= 3"$



Excavaciones para conexiones domiciliarias.




Empalme Carrera 8 calle 21



Instalación de Válvula y continuación tubería de 2" Cra 8 calle 19 B Ver anclaje en concreto y sujeción con varillas de acero.



Anclaje codo gran radio de 90° diámetro $\varnothing= 3"$

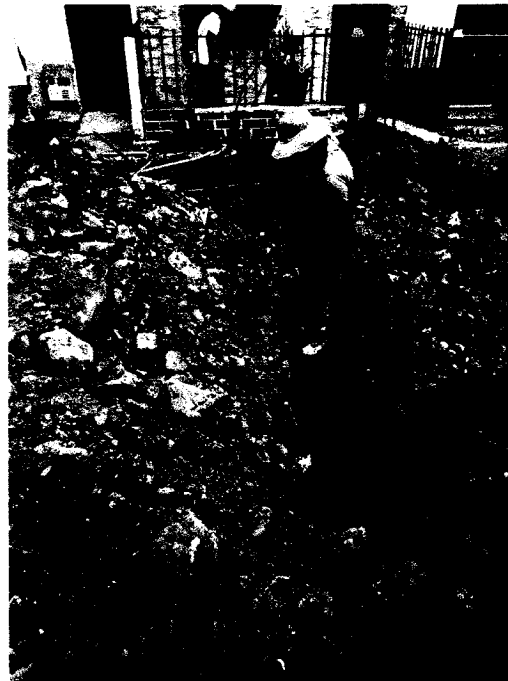


Proceso instalación conexiones domiciliarias de Acueducto.

Manizales, 28 de enero de 2022

EL SUSCRITO INGENIERO:

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
CERTIFICA QUE


Que me encuentro a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses con el sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por todo concepto con los aportes parafiscales de acuerdo a los requerimientos del Artículo 50 de la Ley 789 – 02 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.




JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Ingeniero Civil
M. P. No. 17202 – 66562 CLD
C.C. No. 10.280.643 de Manizales



ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HORILUCCO (MUS)	CENTRACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICACION DEL PRODUCTO	OMASIMMO	# LOTE	FABRICANTE	MT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
19 B a 22	Red Menor	Barrio Reman Barco Cra 8 entre Calles 19 B a 22	3"	95	PVC	Instalacion con apertura de zanja		SI	NTC 2295	ICONTEC	104290	DUMMAN	800031596	16/01/2022	2"	PVC	95
19 B a 22	Red Menor	Barrio Reman Barco Cra 8 entre Calles 19 B a 22	3"	100	PVC	Instalacion con apertura de zanja		SI	NTC 2295	ICONTEC	8779N	DUMMAN	800031596	17/01/2022	2"	PVC	100

NOMBRE CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
FIRMA CONTRATISTA	

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR	
VISTO BUENO DE RECIBO DE LA INFORMACION - COMANDANTE ACUEDUCTO	

CONTRATO No. 249 de 2021

MUNICIPIO SUPIA

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CENTRACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICA	ORGANISMO PRODUCTOR	# LOTE	FABRICANTE	HT	RECIBO DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
Tramo 4 Cra 8 Calle 21 y 21A	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	12"	27,5	PVC	Instalación con apertura de zanja		10222N	DURMAN	8000331596	1/12/2021	12"	CONCRETO	27,5		
Tramo 5 Cra 8 Calle 21 A y 21 B	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	12"	28,5	PVC	Instalación con apertura de zanja		10222N	DURMAN	8000331596	4/12/2021	12"	CONCRETO	28,5		
Tramo 6 Cra 8 entre calle 21B y 22	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	12"	22,5	PVC	Instalación con apertura de zanja		10222N	DURMAN	8000331596	9/12/2021	12"	CONCRETO	22,5		
Instalaciones Domiciliares	SANTARMO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6"	169,5	PVC	Instalación con apertura de zanja		9737T	DURMAN	8000331596	13/12/2021	Valores 4" y 6"	CONCRETO	169,5		

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

NOMBRE CONTRATISTA
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

FIRMA CONTRATISTA

Supia, enero 19 de 2022

Señores:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Señora SANDRA PATRICIA GIRALDO


Administradora Supia


ASUNTO: Devolucion elementos de acueducto,

A continuacion se relacionan elementos devueltos de la obra del barrio Renan Barco, ejecutada por el Ingeniero JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Union de 3" PVC cuello largo para tuberia de acueducto	und	4	Suministradas en Oficina de Empocaldas Viterbo
2	Acople universal de 3"	und	4	Nuevas $+1=4$
3	Acople universal de 2"	und	1	Recuperada via
4	Codo de 45 ° PVC de 2"	und	2	Nuevos

Cordialmente


JAVIER ARMANDO GAIRANDO PÉREZ
Ing, Residente de Obra
contratista
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA


Recibido
Enero 19-2022

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SUPIA - CALDAS



CONTRATO N°: 249 de 2021	ACTA N°.: 2 Y FINAL	FECHA CORTE: ENERO 20 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado EN LOS SECTORES CARRERA 8 ENTRE CALLES 19B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 27 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO: ENERO 24 DE 2022
MUNICIPIO: SUPIA CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 170.040.521,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 253.751.720,00
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	VALOR OBRA N°.2 \$ 118.223.727	
CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	SUPERVISION: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA: ENERO 20 DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1.	PRELIMINARES											
1.1	Localización y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record)	mts	180,00	5.500	128,50	706.750,00	51,30	283.250,00	28,61	180,00	990.000,00	100,00
1.2	Cerramiento en polsombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plástica.	mts	400,00	9.200	374,00	3.440.800,00	0,00	0,00	0,00	374,00	3.440.800,00	93,50
1.3	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	530.000	1,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	530.000,00	100,00
1.4	Señalización reglamentaria Verticales en lamina soportada en base de concreto	und	16,00	180.000	4,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	720.000,00	25,00
2	DEMOLICIONES VARIAS											
2.1	Demolición de concreto asfáltico de (0,05 a 0,15 m)	m3	40,00	89.000	142,43	12.676.270,00	7,11	641.690,00	18,03	149,64	13.317.960,00	374,10
3	SOBRECARREOS											
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	90,00	28.000	1.036,72	29.028.160,00	117,08	3.302.040,00	131,03	1.154,65	32.330.200,00	1.282,94
4	EXCAVACIONES											
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	775,20	22.000	0,00	0,00	226,61	4.985.420,00	29,23	226,61	4.985.420,00	29,23
4.2	Excavaciones en roca	m3	60,00	60.000	848,88	50.932.800,00	226,61	4.023.000,00	111,75	915,93	54.955.800,00	1.526,55
4.3	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	30,00	30.000	373,70	11.211.000,00	117,08	119.700,00	13,30	377,69	11.330.700,00	1.258,97
5	RELLENOS COMPACTADOS											
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	775,20	18.600	373,70	6.950.820,00	226,61	6.757.938,00	46,87	737,03	13.708.758,00	95,08
5.2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	m3	60,00	80.000	0,00	0,00	226,61	51.948.800,00	1.082,27	649,36	51.948.800,00	1.082,27
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS											
6.2	Sub-base tipo INVIAS, Incluye Proctor modificado, Densidad. Compactos con medio mecánico	m3	93,60	165.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Sustitucion en arena limpia para tuberías	m3	45,00	80.000	50,98	4.078.400,00	226,61	1.132.000,00	31,44	65,13	5.210.400,00	144,73

Jan 4. Ex = 236.61 + 1520.23 = 1756.84
 Ret = 122.00 + 1431.52 = 2653.52
 = 1154.65
 = 149.64
 = 649.26
 = 854.12
 MA

CONTRATO N.º: 249 DE 2021	ACTA N.º: 2 Y FINAL	FECHA CORTE: ENERO 20 DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: ENERO 24 DE 2022	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 253.751.720,00	FECHA: ENERO 20 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CARRERA 8 ENTRE CALLES 19B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS		SUPERVISION: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ			
MUNICIPIO: SUPIA CALDAS		REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			
VALOR OBRA N.º: \$ 118.223.727		VALOR OBRA N.º: \$ 170.040.521,00			

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTES ACTA			% EJECUC.	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% OBRA	EJECUTADO	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL										
7	ALCANTARILLADOS																				
7.1	Instalacion tubería corrugada PVC-5 de 160 mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	360,00	10.600	99,30	1.052.580,00	189,50	1.796.700,00	47,08	268,80	2.849.280,00	74,67									
7.2	Instalacion tubería corrugada PVC-5 de 315 mm (12"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	100,00	24.000	27,50	660.000,00	51,00	1.224.000,00	51,00	78,50	1.884.000,00	78,50									
7.3	Instalacion tubería corrugada PVC-5 de 400 mm (16"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	80,00	31.000	99,00	3.069.000,00	0,00		0,00	99,00	3.069.000,00	123,75									
7.4	Empalmes a Cámaras d=1,20 m	Und	12,00	80.000	9,00	720.000,00	1,00	240.000,00	25,00	12,00	960.000,00	100,00									
7.5	Empalmes a Cajas de Inspeccion	Und	4,00	52.000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00									
7.6	Cámaras de Inspeccion D= 1,20 -Concreto 21 Mpa	ml	2,00	580.000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00									
7.8	Base/ cámara cámara D=1,20 m en concreto 3000 psi	Und	4,00	450.000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00									
7.9	Suministro e Instalacion Tapa D=0,60m en HF	Und	7,00	432.000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00									
8	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, incluye tapa reforzada	und	60,00	317.000	20,00	6.340.000,00	18,00	10.461.000,00	55,00	53,00	16.801.000,00	88,33									
8.1	Instalacion de sifia yee de 12 x 6"	Und	40,00	50.000	0,00		0,00		60,00	24,00	1.200.000,00	60,00									
8.2	Instalacion de sifia yee de 16 x 6"	Und	20,00	50.000	20,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	45,00	29,00	1.450.000,00	145,00									
9	ORBRAS ACUEDUCTO																				
9.1	suministro e instalacion acometida domiciliaria de acueducto	und	60,00	50.000	0,00		0,00		95,00	57,00	2.850.000,00	95,00									
9.2	Empalmes red de acueducto	und	2,00	150.000	0,00		0,00		450,00	9,00	1.350.000,00	450,00									
9.3	Instalacion tubería de 3"	ml	180,00	6.145	0,00		0,00		108,61	195,50	1.201.348,00	108,61									
9.5	Anclaje de tubería de acueducto	Und	1,00	300.000	0,00		0,00		1.000,00	10,00	3.000.000,00	1.000,00									
9	TRABAJUO DE SOCIALIZACION																				
9.1	Trabajador SISO	mes	1,00	2.000.000	0,50	1.000.000,00	1,00	4.000.000,00	200,00	2,50	5.000.000,00	250,00									
9.2	Trabajador Social-todo el proceso domiciliarias y socializacion de la obra	mes	1,00	1.350.000	1,00	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00	100,00	2,00	2.700.000,00	200,00									
9.3	Protocolo de Bioseguridad COVIC 19	gib	1,00	5.000.000	0,00		0,00		192,770,00	0,038554	192.770,00	3,86									
	ORBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS																				
NP - 1	Entibado horizontal tipo 2	m2	360,00	34.261	0,00		0,00		5.803,813,00	169,40	5.803,813,00	47,06									
NP - 2	Selección de material en campo para llenos (separación de rocas)	m3	950,00	5.937	0,00		0,00		3.587,729,00	604,30	3.587,729,00	69,61									
NP - 3	Retiro y recuperacion de hidrante	und	1,00	196.496	0,00		0,00		196,496,00	1,00	196,496,00	100,00									
NP - 4	Reinstalacion hidrante	und	1,00	298.187	0,00		0,00		298,187,00	1,00	298,187,00	100,00									
NP - 5	Instalacion de valvulas de 3"	und	2,00	250.523	0,00		0,00		501,046,00	2,00	501,046,00	100,00									
NP - 6	Instalacion copos novafort de 90" diametro g= 6" Para domiciliarias	und	10,00	49.988	0,00		0,00		499,880,00	10,00	499,880,00	100,00									

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SUPIA - CALDAS



CONTRATO N°: 249 de 2021	ACTA N°.: 2 Y FINAL	FECHA CORTE: ENERO 20 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CARRERA 8 ENTRE CALLES 19B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 27 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO: ENERO 24 DE 2022
MUNICIPIO: SUPIA CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 170.040.521,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 253.751.720,00
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	VALOR OBRA N°.2 \$ 118.223.727	
CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	SUPERVISION: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA: ENERO 20 DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
	SUMINISTROS											
1	Tuberia para acueducto PVC de 3" pulgadas	m	60	24.366			60	1.461.960,0	100,00	60,00	1.461.960,00	100,00
2	Tuberia para acueducto PVC de 2" pulgadas	m	12	10.646			12	127.752,0	100,00	12,00	127.752,00	100,00
3	Tuberia PF + UAD de 1/2 " pulgada para domiciliarias acueducto	m	180	1.778			180	320.040,0	100,00	180,00	320.040,00	100,00
4	Registro de Corte de 1/2" para domiciliarias de acueducto	und	31	17.924			31	555.644,0	100,00	31,00	555.644,00	100,00
5	Tee de 3 x 2 en HF para acueducto	und	5	97.020			5	485.100,0	100,00	5,00	485.100,00	100,00
6	Tee de 3 x 3 en HF para acueducto	und	2	260.000			2	520.000,0	100,00	2,00	520.000,00	100,00
7	Reduccion de 3 a 2 en HF para acueducto	und	1	200.000			1	200.000,0	100,00	1,00	200.000,00	100,00
8	Adaptador hembra 1/2 PF+UAD	und	31	2.480			31	76.880,0	100,00	31,00	76.880,00	100,00
9	Adaptador Macho 1/2 PF+UAD	und	10	1.782			10	17.820,0	100,00	10,00	17.820,00	100,00
10	Tapon soldado presion de 3"	und	1	17.250			1	17.250,0	100,00	1,00	17.250,00	100,00
11	Codo 45° presion de 3" (Semicodos)	und	2	29.500			2	59.000,0	100,00	2,00	59.000,00	100,00
12	Buje presion de 3 x2	und	1	14.790			1	14.790,0	100,00	1,00	14.790,00	100,00
13	Codo gran radio de 90° diametro Ø=3 PVC	und	1	200.000			1	200.000,0	100,00	1,00	200.000,00	100,00
	COSTO ANTES DE IVA							4.056.236			4.056.236	
	I.V.A. 19 %							770.684,84			770.684,84	
	TOTAL SUMINISTROS							4.826.921			4.826.921	

COSTO TOTAL OBRA MAS SUMINISTROS	118.223.727	253.690.307
---	--------------------	--------------------

Javier

JMR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SUPIA - CALDAS




CONTRATO N°: 249 de 2021	ACTA N°: 2 Y FINAL	FECHA CORTE: ENERO 20 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CARRERA 8 ENTRE CALLES 19B A 22 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 27 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO: ENERO 24 DE 2022
MUNICIPIO: SUPIA CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 170.040.521,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 253.751.720,00
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	VALOR OBRA N°2 \$ 118.223.727	
CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	SUPERVISION: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA: ENERO 20 DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
COSTO DIRECTO				124.901.220		99.505.347		83.294.260			182.799.607	
ADMINISTRACION	%	28		34.972.342		27.861.497		23.322.393			51.183.891	
IMPREVISTOS	%	1		1.249.012		995.053		832.943			1.827.997	
UTILIDADES	%	6		7.494.073		5.970.321		4.997.656			10.967.976	
SUMA ANTES IVA				168.616.647		134.332.219		112.447.252			246.779.471	
I. V. A.	%	19		1.423.874		1.134.361		949.554,64			2.083.915,44	
VALOR TOTAL OBRA CIVIL				170.040.521		135.466.580		113.396.807			248.863.386	
SUMINISTROS												
COSTO ANTES DE IVA								\$ 4.056.236			\$ 4.056.236	
I.V.A. 19 %								\$ 770.684,84			\$ 770.684,84	
TOTAL SUMINISTROS								\$ 4.826.921			\$ 4.826.921	
VALOR TOTAL IVA OBRA MAS SUMINISTROS								\$ 1.720.239			\$ 2.854.600	
COSTO TOTAL OBRA MAS SUMINISTROS								\$ 118.223.727			\$ 253.690.307	

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 170.040.521,0
Valor Adición No. 01		\$ 83.711.199,0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL	\$ 135.466.580,0	
VALOR ACTA No. 02 FINAL	\$ 118.223.727,0	
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO	\$ -	
SUMA	\$ 253.690.307,0	\$ 253.751.720,0
Saldo del Contrato	\$ 61.413,0	
SUMAS IGUALES	\$ 253.751.720,0	\$ 253.751.720,0


 JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
 Contratista


 JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
 INGENIERO ZONA OCCIDENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

7/14

20,70	Tramo 1 Cra 8 entre calles 198 y 20	34,50	0,10	6,00	20,70															
46,25	Tramo 2 cra 8 entre calle 20 y 20	71,00	0,10	36,50	46,25															
63,95	Tramo 3 Cra 8 entre CII 20 y 21	100,50	0,10	29,50	63,95															
79,35	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21	128,50	0,10	28,00	79,35															

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
						(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.1	Demolicion de concreto asfaltico de (0,05 a 0,15 m)	M3	142,43	7,21	149,64

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
29	10					(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	Señalización reglamentaria Verticales en lamina soportada en base de concreto	UNIDAD	4,00	0,00	4,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
						(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	UND	1,00	0,00	1,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
						(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Cerramiento en poliosombra Vite verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plástica.	ML	374,00	0,00	374,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
						(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Localización y replanteo de redes (incluivamiento del sector y plano record)	ML	128,50	51,50	180,00

CONTRATO N°:	249 DE 2021	PRE-ACTA:	2
CONTRATISTA:	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	FECHA INICIACION:	27 de octubre de 2021
INTERVENTORIA:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	FECHA TERMINACION:	24 de enero de 2022

29,00	6,00	0,10	17,40	96,75	Tramo 5 Cra 8 entre calle 21 y 21B
22,50	6,00	0,10	13,50	110,25	Tramo 5 Cra 8 entre calle 21B y 22
					Pavimento Rígido
34,50	1,00	0,17	5,87	116,12	CONCRETO HIDRAULICO Tramo 1 Cra 8 entre calles 19B y 20
36,50	1,00	0,17	6,21	122,32	CONCRETO HIDRAULICO Tramo 2 cra 8 entre calle 20 y 20
29,50	1,00	0,17	5,02	127,34	CONCRETO HIDRAULICO Tramo 3 Cra 8 entre Cll 20 y 21
28,00	1,00	0,17	4,76	132,10	CONCRETO HIDRAULICO Tramo 4 Cra 8 entre calle 21 y 21
29,00	1,00	0,17	4,93	137,03	CONCRETO HIDRAULICO Tramo 5 Cra 8 entre calle 21 y 21B
22,50	1,00	0,17	3,83	140,85	CONCRETO HIDRAULICO Tramo 6 Cra 8 entre calle 21B y 22
					Demolicion Anden Para cajas Domilicarias alambriado
					TRAMO 1
	0,80	0,08	0,05	140,90	CD Domiciliaria casa 19B 7D 7E
	1,00	0,10	0,10	141,00	CD casa azul
	0,90	0,80	0,09	141,07	CI casa 5
	1,00	0,85	0,09	141,15	CI casa 4
	1,00	1,00	0,10	141,25	CI casa 3
	0,80	0,80	0,08	141,30	CI casa 2
				141,30	TRAMO 2
	1,00	0,10	0,10	141,40	CD casa 20-06
	0,90	0,80	0,09	141,47	CD casa 20-10
	1,00	1,00	0,10	141,57	CD casa 20-14
	0,80	0,80	0,08	141,62	CD casa 20-18
	1,00	0,10	0,10	141,72	CD casa 20-22
	0,90	0,80	0,09	141,78	CD casa 20-26
	1,00	1,00	0,10	141,88	CD casa 20-30
	0,80	0,80	0,08	141,93	CI casa 20 - 11
	1,00	1,00	0,10	142,03	CI casa 20 - 13
	0,80	1,00	0,08	142,11	CI casa 20 - 17
	1,00	1,00	0,10	142,21	CI casa 20 - 19
	0,80	0,80	0,08	142,27	CI casa 20 - 21
				142,27	TRAMO 3
	1,00	0,10	0,10	142,37	CD casa 20 - 46
	0,90	0,80	0,09	142,43	CD casa 20 - 42
				142,43	Domicilias Tramo 5 y 6
	0,80	0,80	0,08	142,48	CD 1
	1,00	1,00	0,10	142,58	CD 2
	0,90	0,80	0,09	142,65	CD 3
	1,00	0,85	0,10	142,73	CD 4
	1,00	1,00	0,10	142,83	CD 5
	0,80	0,80	0,08	142,88	CI 21-30
	0,90	0,80	0,09	142,95	CI 21-34
	1,00	1,00	0,10	143,05	CI 21-38
	0,90	0,80	0,09	143,11	CI 21-48
	1,00	1,00	0,10	143,21	CI 21-46
	0,80	0,80	0,08	143,26	CI 21-50
	1,00	1,00	0,10	143,36	CI 21-54
	0,90	0,80	0,09	143,43	CI 21-58
	1,00	1,00	0,10	143,53	CI 21-62
	0,80	0,80	0,08	143,58	CI 21-60
	1,00	1,00	0,10	143,68	CI 21-70
	0,80	1,00	0,08	143,76	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21
	1,00	1,00	0,10	143,86	CD - 21-20
	0,80	0,80	0,08	143,91	CD - 21-16
	1,00	1,00	0,10	143,98	CD - 21-12
	0,90	0,80	0,09	144,08	CD - 21-10
	1,00	1,00	0,10	144,14	CD - 21-08
	1,00	1,00	0,10	144,24	CD - 21-02
	0,90	0,80	0,09	144,30	CI - 1
	1,00	1,00	0,10	144,40	CI - 2
	0,80	0,80	0,08	144,46	Tramo 3 Cra 8 entre Cll 20 y 21
	1,00	1,00	0,10	144,56	CI - 20 A 8-04
	0,80	1,00	0,08	144,64	CI - 20 A 8-03
	1,00	1,00	0,10	144,74	CD - 20-34
	0,80	0,80	0,08	144,79	CD - 20-38
	0,90	0,80	0,08	144,85	CD - 20-50
	1,00	1,00	0,10	144,95	CD - 20-54
	0,90	0,80	0,09	145,02	CD - 20-58
					DEMOLICION PARA DOMICILIARIAS ACUEDUCTO COSTADO DERECHO
37	2,50	0,50	4,63	149,64	
					PAGADO ACTA 01
				142,43	CANTIDAD DE PAGO
					7,21

MR

