

jurídica

# CONTRATO Y AÑO	RESOLUCION DE EMERGENCIA 00426 DE 2018.- Y RESOLUCION DE PAGO No. 0488 DE DICIEMBRE 5 DE 2018.	Acta Nº	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	7.458.920
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	7.458.920
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00904 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2108			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.158.420
RP (#, rubro y fecha)	001084 DE 26 OCTUBRE DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	300.500
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		N/A	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 21/12/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	N/A

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-12-03, 02:30:21 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 38395960
 Periodo Cotización: noviembre de 2018 Periodo Servicio: diciembre de 2018

PAGADO 03/12/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA		
Documento	CC4413512	Dirección	CRA 10 No 2 -13
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8501947
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CHINCHINA	Departamento	CALDAS
Representante Legal	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO		
		Identificación	CC4413512
		Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellido y Nombre	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	00426 ✓
Número Contrato de Obra	009
Nombre Obra	MARQUETALIA ✓
Fecha Inicio Obra	01/11/2018
Fecha Terminación Obra	30/11/2018 ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	MARQUETALIA ✓
Tipo FIC	Mensual ✓
Año Periodo a Pagar	2018 ✓
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$7,158,420.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,158,420.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$78,124.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$78,124.00
Total Pagado	\$78,124.00
Valor del Pago	\$78,124.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61898569
Fecha de Creación	04/12/2018 10:01:43 a.m.

4/12/2018

Pago eCollect 61898569

Banco
Número de Confirmación/CUS
Estado de la Transacción

BANCO DAVIVIENDA
391679686
APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 1 Y FINAL

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES 06/12/2018

NOMBRES Y APELLIDOS:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

CEDULA O NIT:

4.413.512

DIRECCION:

CARRERA 10 # 2-13

TEL: 3148446597

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

RESOLUCION DECLARATORIA DE EMERGENCIA 426/2018 CUYO OBJETO ES: REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

SUBTOTAL: \$ 7.158.420

RETENCION RENTA:

IVA ASUMIDO ():

TOTAL A PAGAR: \$ 7.158.420

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 4413512


NOMINA PAGA PAGO DE SALARIOS

RESOLUCION NO. 426 / 2018

OBJETO: Reparación por emergencia Vereda la Quiébra finca del Sacerdote Alberto Arisatzabal en el municipio de Marquetalia Caldas

PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE: 31 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DÍAS TRABAJADOS	BASICO	HORAS EXTRAS	AUX. TRANSP.	SUELDO	DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA DE RECIBO
									SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN	TOTAL DESCUENTO		
									SALUD				
1	VALLEO GIRALDO JUAN DAVID	AYUDANTE	781242	10	260.414			260.414				260.414	Juan David Valleo G.
2	RINCON CORTES VICTOR MANUEL	AYUDANTE	781242	10	260.414			260.414				260.414	Victor Manuel Rincon
3	CARMONA OROZCO YESID	AYUDANTE	781242	10	260.414			260.414				260.414	Yesid Carmona
4	DUQUE BETANCURT FREDY	AYUDANTE	781242	10	260.414			260.414				260.414	FREDY DUQUE B
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

ELABORADO: 

APROBADO: 



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	DICIEMBRE 03 DE 2018	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	OCTUBRE 26 DE 2018
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 7.458.920,00
Fecha de iniciación:	OCTUBRE 31 DE 2018
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	NOVIEMBRE 09 DE 2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	95.97%
Avance físico Acumulado	95.97%

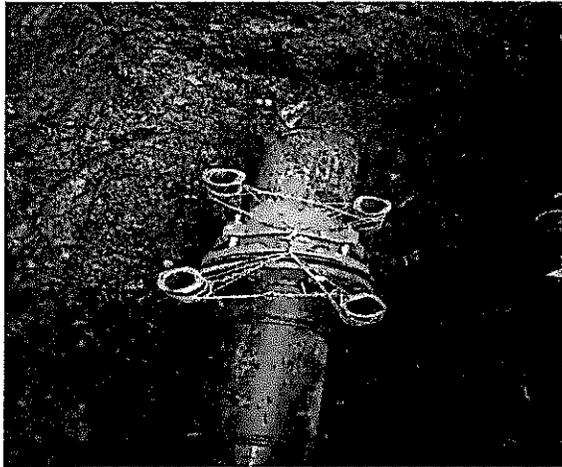
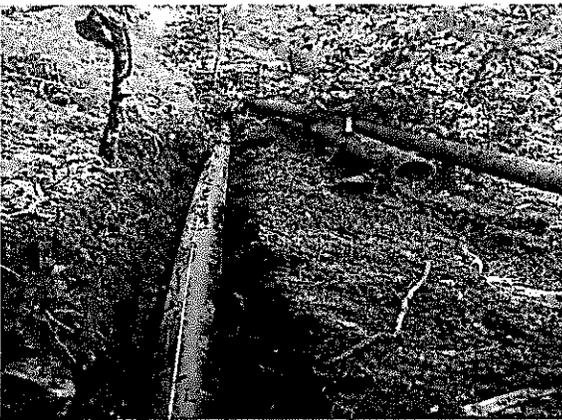
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10
Tiempo total transcurrido:	10
Avance Porcentual:	100 %

AR

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



Handwritten signature or initials



1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-Se presenta deslizamiento de masas de tierra afectando un tramo de la Conducción San Juan en el sector la Quiebra, con ruptura en la tubería existente de Asbesto Cemento. Dando lugar a racionamiento de agua potable al municipio de Marquetalia al disminuirse el suministro de agua a la planta de tratamiento.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El trabajo consistió en reponer un tramo de 60 metros de tubería de asbesto cemento existente y cambiarse por tubería de polietileno de 6" debidamente termo fusionada Con sus respectivos accesorios para este tipo de obras

-Al hacerse el Cambio por tubería de polietileno de 6", se garantiza que el talud recupera su estabilidad al presentar saturamiento en las masas de tierra.

Inversión Contratada:	7.458.920
Inversión ejecutada en el periodo:	7.158.420
Porcentaje ejecutado en el periodo:	95.97%
Inversión total ejecutada:	7.158.420
Porcentaje total ejecutado:	95.97%

CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales					
Estabilidad y Calidad de la Obra					
Cumplimiento del Contrato					
Responsabilidad Civil					

Handwritten signature



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Por la cuantía no se requiere Pólizas.

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X).

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FC
Director de Obra					
Ingeniero Residente					
Ingeniero zona	X	X	X	X	X
Operador Retroexcavadora-Contratista					
Contratista	X	X	X	X	X
Personal de Mantenimiento Empocaldas					

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
NOVIEMBRE 02 DE 2018	A	A	A	A	N/A	A	A	N/A


Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	RESOLUCIÓN No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	REPARACIÓN POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
NIT o C.C.	4.413.512
MUNICIPIO	MARQUETALIA, CALDAS.-
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 5.737.631
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 1.147.526
IMPREVISTOS 5%	\$ 286.882
UTILIDAD 5 %	\$ 286.882
I.V.A. 19 %	\$ 0.000
VALOR TOTAL	\$ 7.458.920
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.158.420
SALDO NO EJECUTADO	\$ 300.500
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISOR	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00904 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2018
RP	001084 DE OCTUBRE 26 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los Nueve (09) días del mes de Noviembre de 2018, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, como Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL Según Contrato EMERGENCIA RESOLUCIÓN No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
Interventor


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL MARQUETALIA - CALDAS -

CONTRATO No: RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: NOVIEMBRE 09 DE 2018
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE	FECHA INICIACION: OCTUBRE 31 DE 2018	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 09 DE 2018
ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 7.458.920,00	VALOR CONTRATO + ADICION:
MUNICIPIO : MARQUETALIA, CALDAS.-	VALOR ADICION No. 1:	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: DICIEMBRE 03 DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	
2	Localización y Replanteo	m3	60,00	4.843	0,000	0,000	60,00	290.580,0	60,00	290.580	100,00
4	Excavación en material común de 0 a 2 m.	m3	40,00	24.440	0,000	0,000	22,37	546.723,0	22,37	546.723	55,93
5	Dispersión material sobrante	m3	10,00	30.415	0,000	0,000	0,39	11.862,0	0,39	11.862	3,90
7	Instalación y termo fusión de tubería de Polietileno de 6" incluye sobre acarreo al hombro y en bestia.	ml	60,00	42.000	0,000	0,000	60,00	2.520.000,0	60,00	2.520.000	100,00
8	Termo fusión de portaflanche de 6"	und	2,00	200.000	0,000	0,000	2,00	400.000,0	2,00	400.000	100,00
9	Empalmes a tubería existente Incluye empaques y tornillería	und	2,00	390.000	0,000	0,000	2,00	780.000,0	2,00	780.000	100,00
10	Anclajes de tubería. Incluye tubería galvanizada de 1 1/2" y alambre galvanizado	und	2,00	390.000	0,000	0,000	3,00	1.170.000,0	3,00	1.170.000	150,00
12	Lleno compactado con material de la Obra	m3	30,00	20.553	0,000	0,000	21,98	451.755,0	21,98	451.755	73,27
13	Transporte de tubería de polietileno y sus accesorios de Chinchina a Marquetalia sitio de la Obra.	Viaje	1,00	790.000	0,000	0,000	1,25	987.500,0	1,25	987.500	125,00
							7.158.420		7.158.420		

COSTO DIRECTO	5.737.631
ADMINISTRACION %	1.147.526
IMPREVISTOS %	286.882
UTILIDADES %	286.882
SUMA ANTES IVA	7.458.920
I.V.A. %	0
TOTAL ACTA FINAL	7.458.920
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.	7.158.420

SON: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 7.158.420) MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	7.458.920
Valor Adición No. 01	7.158.420
Valor Acta FINAL	0
Valor Acta No. DE 2018)	7.158.420
SUMA	300.500
Saldo del Contrato	7.458.920

Handwritten signature

SUMAS IGUALES



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL MAQUETALIA - CALDAS -

CONTRATO No: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: NOVIEMBRE 09 DE 2018
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA CUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 31 DE 2018	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 09 DE 2018
ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 7.458.920,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
MUNICIPIO - MARQUETALIA, CALDAS.-	VALOR ADICION No. 1:	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: DICIEMBRE 03 DE 2018

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo	0	0
Amortización Valor Acta FINAL (Fecha: DICIEMBRE 03 DE 2018)	0	0
Amortización Valor Acta (Fecha: DE 2018)	0	0
SUMA	0	0
Saldo Anticipo	0	0
SUMAS IGUALES	0	0

X 
Nombre: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista.


Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



CONTRATO No.	RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00428 DE OCTUBRE 26 DE 2018	PRE-ACTA No.	01 FINAL
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	FECHA:	DICIEMBRE 03 DE 2018
INTERVENTORIA:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA INICIACION:	OCTUBRE 31 DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO: REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL, EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS			

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y Replanteo	ML		60,00	60,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				60				60,00	60,00	
								0,00	60,00	
									CANTIDAD DE PAGO	60,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Excavacion en material común de 0 a 2 m.	M3		22,37	22,37

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				61,00	0,50	0,70	21,35		21,35	Longitud de la zanja
				0,60	1,00	0,70	0,42		21,77	Apliques de finir trayectoria tubería existente
				0,60	1,00	0,70	0,60		22,37	Apliques de finir trayectoria tubería existente
							0,00	0,00	22,37	
									CANTIDAD DE PAGO	22,37

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Dispersión material sobrante	M2		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							21,35	0,00	21,35	4- Excavaciones
							-20,96	0,00	0,39	12- llenos
									CANTIDAD DE PAGO	0,39

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Instalación y termo fusión de tubería de Polietileno de 6" Incluye sobre acarreo al hombro y en bestia.	ML		60,00	60,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				60,00			0,00	60,00	60,00	
							0,00	0,00	60,00	
									CANTIDAD DE PAGO	60,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Termo fusión de portaflanche de 6"	UND		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	2,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Empalmes a tubería existente incluye empaques y tornillería	UND		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	2,00	0,00	A TUBERIA EXISTE DE POLIETILENO A ASBESTO CEMENTO
							0,00	0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

Handwritten signature

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Anclajes de tubería. Incluye tubería galvanizada de 1 1/2" y alambre galvanizado	UND		3,00	3,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0	3,00	3,00	
							0	0,00	3,00	
							0	0,00	3,00	
CANTIDAD DE PAGO									3,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Lleno compactado con material de la Obra	M3		21,98	21,98

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				63	0,5	0,7	22,05	0,00	22,05	Llenos Zanja
				60		-0,0182	-1,092	0,00	20,96	menos tubo de 6"
				0,60	1,00	0,70	0,42	0,00	21,38	Apiques definir trayectoria tubería existente
				0,60	1,00	0,70	0,60	0,00	21,98	Apiques definir trayectoria tubería existente
							0	0,00	21,98	
CANTIDAD DE PAGO									21,98	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	Transporte de tubería de polietileno y sus accesorios de Chinchina a Marquetalia sitio de la Obra.	Viaje		1,25	1,25

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	VIAJE	ACUMULADO	
							0	1,00	1,00	Chinchina a marquetalia de tubería y accesorios
							0	0,25	1,00	Transporte de otros equipos para termofusion.
								0,00	1,00	
							0	0,00	1,00	
CANTIDAD DE PAGO									1,25	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
				0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
							0		0,00	
							0		0,00	
							0		0,00	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

Contratista 

Supervisor 



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	Octubre 26 de 2018 - en las horas de la Mañana.
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	La emergencia se Ejecuta entre Octubre 31 a Noviembre 09 de 2018, periodo en que se realizaron los trabajos contratados mediante Resolución No. 00426 de 2018 y se restablece la Normalidad del Sistema de la red de Acueducto en el sector de la Quiébra en la finca del sacerdote Alberto Aristizabal, municipio de Marquetalia, Caldas.-
BREVE DESCRIPCION	Se presenta deslizamiento del talud, dando lugar a daño en la red de 6" en asbesto cemento, reponiéndose por tubería de Polietileno de 6" en una longitud de 60 metros
POSIBLES CAUSAS	El deslizamiento del talud provoca el daño en la red existente de 6", dando lugar a la reposición de inmediato.
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Al producirse el deslizamiento de las masas de tierra se produce daños en la conducción existente y por ende la suspensión del suministro de agua a la planta de tratamientos, provocando racionamiento de agua potable al municipio de Marquetalia.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	La problemática presentada, afectó 2356 usuarios.

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia	x		Imprevisto
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?	x		
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	x		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	x		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		x	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	x		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	x		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?		x	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		x	

Fecha de la evaluación

NOVIEMBRE 12 DE 2018

ABEL ROJAS RUBIANO- Ingeniero Zona.
Nombre y Cargo de quien evalúa


Firma



RESOLUCIÓN No. 00426

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 00426 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura N°. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00426 del 26 de octubre del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el **Municipio de Marquetalia, Caldas.**

Que mediante *oficio e informe de la señora administradora de la seccional de Marquetalia Adriana Carolina Gómez, de fecha 26 de octubre del 2018, así mismo oficio OM 8919 enviado por el Jefe Depto Operación y Mantenimiento, donde manifiesta que en la seccional existe un deslizamiento que se presentó en un tramo de la conducción San Juan, sector la Quiebra ocasionando ruptura de la tubería, tubería que se encuentra en asbesto cemento, generando esto que la planta quede fuera de servicio y sea suspendido el servicio de agua potable a la comunidad del municipio. Se hace urgente reponer 60m por tubería de Polietileno, para mitigar el riesgo de un futuro deslizamiento que pueda afectar la vía (Manzanares- Marquetalia) y la integridad de las personas que transitan por allí*. EMPOCALDAS SA ESP, no cuenta con el equipo para realizar la termo fusión, por lo anterior es necesario contratar a un tercero para que realice la reparación de la tubería de polietileno de alta densidad.

EMPOCALDAS SA ESP, no cuenta con el equipo para realizar la termo fusión, por lo anterior se hizo necesario contratar a un tercero para que realizará la reparación de la tubería de polietileno de alta densidad.

Que la situación de la "URGENCIA" se presentó de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio". (Artículo 46).

05 DIC 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

No 00488



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 00426 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

Que el daño en la conducción, fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al Municipio de Marquetalia, Caldas.

Que, para superar la situación antes anotada, se contrató al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Municipio de Marquetalia, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 26 de octubre del 2018.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió en Reparación por emergencia Vereda la Quiebra finca del Sacerdote Alberto Aristizabal en el municipio de Marquetalia Caldas

Que se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 001084 por un valor de \$7.548.920.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$7.158.420) incluido AIU.

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

CONTRATO No: RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: NOVIEMBRE 09 DE 2018
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 31 DE 2018	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 09 DE 2018
	VALOR CONTRATO: \$ 7.458.920,00	VALOR CONTRATO + ADICIONAL



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

No 00488



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 00426 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

MUNICIPIO : MARQUETALIA, CALDAS.-	VALOR ADICION No. 1:	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: DICIEMBRE 03 DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBR A
			CANTIDA D	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDA D	VR. PARCIAL	% EIECUC .	CANTIDA D	VR. TOTAL	
2	Localización y Replanteo	ml	60,00	4.843	0,000	0	60,00	290.580,0		60,00	290.580	100,00
4	Excavacion en material común de 0 a 2 m.	m3	40,00	24.440	0,00	0	22,37	546.723,0		22,37	546.723	55,93
5	Dispercion material sobrante	m3	10,00	30.415	0,00	0	0,39	11.862,0		0,39	11.862	3,90
7	Instalación y termo fusión de tubería de Polietileno de 6" Incluye sobre acarreo al hombro y en bestia.	ml	60,00	42.000	0,00	0	60,00	2.520.000,0		60,00	2.520.000	100,00
8	Termo fusión de portaflanche de 6"	und	2,00	200.000	0,00	0	2,00	400.000,0		2,00	400.000	100,00
9	Empalmes a tubería existente incluye empaques y tornillería	und	2,00	390.000	0,00	0	2,00	780.000,0		2,00	780.000	100,00
10	Anclajes de tubería. Incluye tubería galvanizada de 1 1/2" y alambre	und	2,00	390.000	0,00	0	3,00	1.170.000,0		3,00	1.170.000	150,00



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empocal@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

00488



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 00426 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

	galvanizado												
12	Lleno compactado con material de la Obra	m3	30,00	20.553	0,00	0	21,98	451.755,0		21,98	451.755	73,27	
13	Transporte de tubería de polietileno y sus accesorios de Chinchina a Marquetalia sitio de la Obra.	Viaje	1,00	790.000	0,00	0	1,25	987.500,0		1,25	987.500	125,00	
								7.158.420					7.158.420

COSTO DIRECTO		5.737.631	5.506.477
ADMINISTRACION %	20	1.147.526	1.101.295
IMPREVISTOS %	5	286.882	275.324
UTILIDADES %	5	286.882	275.324
SUMA ANTES IVA		7.458.920	7.158.420
I. V. A. %	0	0	0
TOTAL ACTA FINAL		7.458.920	7.158.420
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.		7.158.420	

05 DIC 2018

SON: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 7.158.420) MCTE.



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1

No 00488



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 00426 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato		7.458.920
Valor Adición No. 01		
Valor Acta FINAL (Fecha: DICIEMBRE 03 DE 2018)	7.158.420	
Valor Acta No. (Fecha: DE 2018)	0	
SUMA	7.158.420	
Saldo del Contrato	300.500	
SUMAS IGUALES	7.458.920	7.458.920

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, contratista, por un valor de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$7.158.420) incluido AIU.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$7.158.420) incluido AIU, previos los descuentos de Ley.

05 DIC 2018

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



000488



RESOLUCION No.


"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO DE LA RESOLUCION NUMERO 00426 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de **SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$7.158.420) incluido AIU**, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

05 DIC 2018


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1
