



F-GC-22
Versión 10
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0228 de 2021	Acta N°	01 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	149.800.796	
				2. VALOR ADICION	0	
CONTRATISTA	FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL			3. VALOR TOTAL (1+2)	149.800.796	
NIT O CC:	NIT 900.689.760-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00175 / 230101039801 / 15-01-2021 y 00724 / 230101039801 / 18-08-2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	63.244.813	
RP (#, rubro y fecha)	000991 / 230101039801 / 23-09-2021			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	86.555.983	
OBJETO DEL CONTRATO:	ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE PREDIOS, REFORESTACION, ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DE MICROCUENCAS Y TALLERES AMBIENTALES, EN LAS MICROCUENCAS ABASTecedorAS DE LOS ACUEDUCTOS ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.					
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO CI 197/2021 - CORPOCALDAS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1409 / 1301139			
DOCUMENTO VERIFICADOS						
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N.A.	
3- Pagos al FIC					N.A.	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					N.A.	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					N.A.	
8- Ensayos de densidad.					N.A.	
9- Diseño de Mezclas.					N.A.	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N.A.	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N.A.	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N.A.	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N.A.	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X	
15- Acta parcial o final del contrato.					X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 7/12/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
Andrés Felipe Grisales Sánchez	Coordinador Gestión Ambiental	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CORRIENTE	218136075	BANCO DE BOGOTA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Recibido
14-12-21

Factura Electrónica De Venta #FVE-10
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 13/12/2021 11:25 AM
Fecha de Generación: 13/12/2021 11:25 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIA	Receptor : EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Razon Social: FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL	Razon Social EMPOCALDAS S.A E.S.P.
NIT: 900689760-1	NIT: 8908032399-1
Teléfono: + (57) 313 6035156	Teléfono: N/A
Correo Electrónico: visionsocialysostenible@gmail.com	Correo Electrónico: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
Dirección: CR 23 25 32 OF 322 ED ESPONSION MANIZALES CALDAS	Dirección: Av. Santander #75-82
Departamento: CALDAS	País: Colombia
Municipio: MANIZALES	Departamento: CALDAS
	Municipio: MANIZALES



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	fv04	Empocaldas 288 COMPONENTE A CON AIU	COMPONENTE A CON AIU	1	cada	44,496,017	44,496,017	0	44,496,017
2	fv05	Empocaldas 288 COMPONENTE B IVA 19%	COMPONENTE B GABADO 19%	1	cada	6,800,000	6,800,000	1,292,000	8,092,000

Detalle de AIU		Detalle de Venta	
Administracion (17.00 %):	COP 7,564,323	Subtotal :	COP 51,296,017
Imprevisto (1.00 %):	COP 444,960	Descuento :	COP 0
Utilidad (5.00 %):	COP 2,224,801	Monto Bruto :	COP 51,296,017
Total Aiu (23.00 %):	COP 10,234,084	Monto IVA :	COP 1,714,712
		Total Venta:	COP 63,244,813
		Total a pagar :	COP 63,244,813

Detalles:

Son: SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON SIETE CENTAVOS
Primer pago contrato 288
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BANCO DE BOGOTA 218136075 (Pesos)

CUFE :

a72027e0d7f04244d8f423bcc1a4e99c15d9e92ddf2136fb06825bf1108d729d6648ab0b48521dd54bf28d3466afb320

Firma Digital:

NMCSxe3Z/uDMWa7EK74c5loNwxm3f3+33T+uJj6OuYIAwp+Dlev4DY6g1RqVSRlnQJOMzQJC2ULQQ71Zs2FyPGIhE8Mb2QMRfpr2sqjI2E271RyZMfjMcCOUzBnswpyQARMcJwXEICffWdDjzdhayqdfjHfVMKHSMNqDvO4rb1JFrdKLM0ropTROVjLlaD1FwMEj3Oz4CmDTve8GY9KEjfkT03TeQCXngGfKhLmugd8jEtGFYUJ2VXRojNTxjS3eS2Dw4KY1NKtngCR56Cm+mY8R4311c887r1NhsAKXPEtWmU0Du2gE8odr/0VdWeHjNs190FnN5tRd+qdTobvw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764022649541 entre los rangos de Facturación del 8 al 200 usando el prefijo FVE con vigencia entre las fechas 2021-12-10 al 2022-12-10.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

ACTA N°1 PARCIAL

CONTRATO: 228 DE 2021

CONTRATISTA: FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL

NIT: 900.689.760-1

OBJETO: ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE PREDIOS, REFORESTACION, ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DE MICROCUENCAS Y TALLERES AMBIENTALES, EN LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR: \$149.800.796 IVA INLUIDO.

RECURSOS: PROGRAMA REFORESTACION Y TRATAMIENTO MICROCUENCAS CI 197 DE 2021 – CORPOCALDAS.

En la ciudad de Manizales a los siete (7) días del mes de diciembre de 2021 se reunieron los señores: ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ como Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la Señora YUDITH ALEXANDRA MONCADA CUERVO como Representante Legal de la firma Contratista, con el fin de realizar el recibo del Acta N°1 Parcial.


COMPONENTE A					
N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
1	Aislamiento. Cerramientos y Línea amarillas, Cerca viva e inerte con guadua	4,616	Km	9.220.095	42.559.959
2	Reforestación	0,50	Ha	3.872.116	1.936.058
SUBTOTAL COMPONENTE A					44.496.017
			A	17%	7.564.323
			I	1%	444.960
			U	5%	2.224.801
			IVA	19%	422.712
SUBTOTAL COMPONENTE A - CON AIU E IVA					55.152.813




COMPONENTE B					
N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
3	Taller Tipo Conferencia	0	Taller	758.223	0
4	Dotación, Material Educativo y Publicitario	1	global	6.800.000	6.800.000
5	Estudio de Caracterización y Diagnostico del estado actual de la Microcuenca. Incluye estudio del estado actual de la Microcuenca mediante vuelos de drones.	0	Un	2.501.643,00	0
SUBTOTAL COMPONENTE B					6.800.000
IVA SOBRE COMPONENTE B				19%	1.292.000
SUBTOTAL COMPONENTE B - CON IVA					8.092.000
TOTAL COMPONENTE A + B					63.244.813

Total Acta N°1 Parcial = \$63.244.813,00.

No siendo otro el motivo de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.


ANDRÉS FELIPE GRISALES SANCHEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


YUDITH ALEXANDRA MONCADA CUERVO
Representante Legal
FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL
Contratista





En cuanto a labores de reforestación en esta microcuenca, en compañía del Administrador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. sede Victoria, se identificaron las áreas a reforestar, se calcula una necesidad en este aspecto de unas dos (2) hectáreas de las cuales a la actual fecha de corte se han ejecutado 0.5 Hectáreas.



Municipio:	San José
Microcuenca:	Buenavista

En la Microcuenca Buenavista abastecedora del acueducto del municipio de San José, Caldas, se realizó el recorrido y reconocimiento de los aislamientos a ejecutar para la protección de los relictos boscosos.

Se vienen realizando labores de rocería y consecución de la guadua, para la construcción de las cercas.


Municipio:	Victoria
Microcuenca:	Doña Juana

Al interior de la Microcuenca Doña Juana abastecedora del acueducto del municipio de Victoria, Caldas, se realizaron labores de rocería, ahoyado, trazado, suministro e instalación de postes de guadua inmunizando la parte inferior de dicho postes. Se realizó el respectivo estaconado y se instalaron tres hilos de alambre. Se pintó la parte superior de los estacones en amarillo e igualmente los tres hilos de alambre. En total se han construido 1050 metros de cerca.




Municipio:	Risaralda
Microcuenca:	Guacaica o Betania

Al interior de la Microcuenca Guacaica (también conocida como Betania) ubicada en el Municipio de Risaralda, se realizaron labores de rocería, ahoyado, trazado, suministro e instalación de postes de guadua inmunizando la parte inferior de dicho postes. Se realizó el respectivo estaconado y se instalaron tres hilos de alambre. Se pintó la parte superior de los estacones en amarillo e igualmente los tres hilos de alambre. En total se han construido 716 metros de cerca.

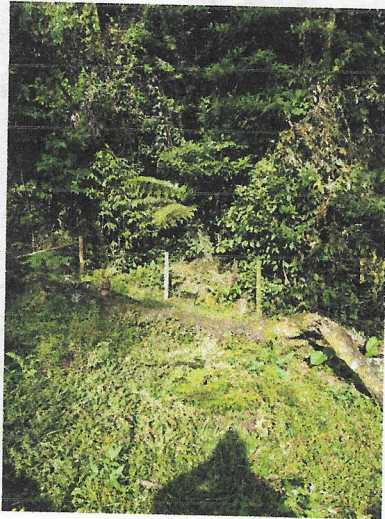

Municipio:	Risaralda
Microcuenca:	Chavarquía

Al interior de la Microcuenca Chavarquía abastecedora del acueducto del municipio de Risaralda, Caldas, se realizaron labores de rocería, ahoyado, trazado, suministro e instalación de postes de guadua inmunizando la parte inferior de dicho postes. Se realizó el respectivo estaconado y se instalaron tres hilos de alambre. Se pintó la parte superior de los estacones en amarillo e igualmente los tres hilos de alambre. En total se han construido 1750 metros de cerca.

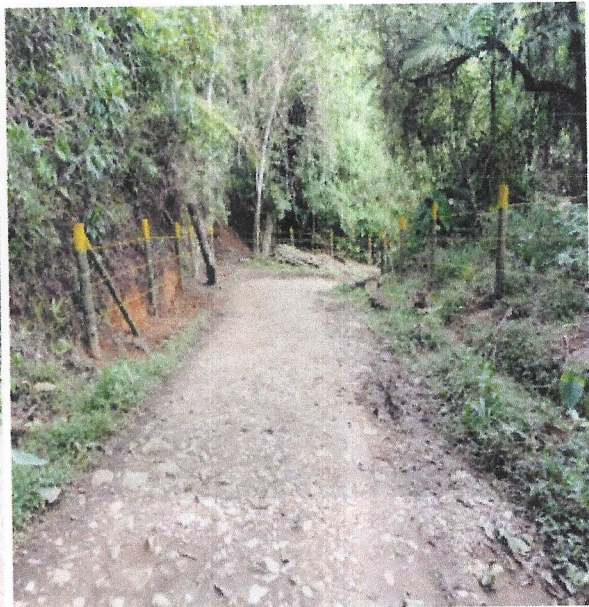



Dotación, Material Educativo y Publicitario:

Se realizó la adquisición de material educativo y publicitario, como pendones y plegables, los cuales se han venido entregando en eventos de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como difusión de las acciones ambientales, Segunda Feria de servicios de Gestión del Riesgo celebrada en el marco del mes Internacional de Reducción del Riesgo y la Semana Ambiental, y convenios que se tienen en pro de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.



Plegable



Municipio:	Viterbo
Microcuenca:	La Maquina

Al interior de la Microcuenca La Máquina abastecedora del acueducto del municipio de Viterbo, Caldas, se realizaron labores de rocería, ahoyado, trazado, suministro e instalación de postes de guadua inmunizando la parte inferior de dicho postes. Se realizó el respectivo estaconado y se instalaron tres hilos de alambre. Se pintó la parte superior de los estacones en amarillo e igualmente los tres hilos de alambre. En total se han construido 1100 metros de cerca.



Pendones

1.4 Avance Financiero:

Inversión Contratada:	\$149.800.796
Inversión ejecutada en el periodo:	\$63.244.813
Porcentaje de Inversión Ejecutada en el Periodo:	42.22%
Porcentaje de Inversión Ejecutada Acumulada:	42.22%

RESUMEN CONTRATO - ACTA N°1 PARCIAL		
VALOR CONTRATO	149.800.796	-
VALOR ACTA N°1 PARCIAL	-	63.244.813
VALOR MENOR AUN NO EJECUTADO	-	86.555.983
SUMAS IGUALES	149.800.796	149.800.796

ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

1.3 Informe y Registro Fotográfico:


Al interior de las microcuencas abastecedora de los acueductos de los municipios de Filadelfia, Risaralda, San José, Victoria y Viterbo, se han venido realizando cerramientos o aislamientos de predios para la protección de los relictos boscosos que cumplen las funciones de bosques protectores y de recarga hídrica. De esta manera se aporta al aseguramiento del abastecimiento futuro de agua para la población y a la protección de los recursos naturales.

A continuación se presentan las actividades ejecutadas en los diferentes municipios intervenidos.

Municipio:	Filadelfia
Microcuenca:	La Cristalina o Santa Rita

En la Microcuenca La Cristalina (también conocida como Santa Rita) abastecedora del acueducto del municipio de Filadelfia, Caldas, se realizó el recorrido y reconocimiento de los aislamientos a ejecutar para la protección de los relictos boscosos.

Se vienen realizando labores de rocería y consecución de la guadua, para la construcción de las cercas.

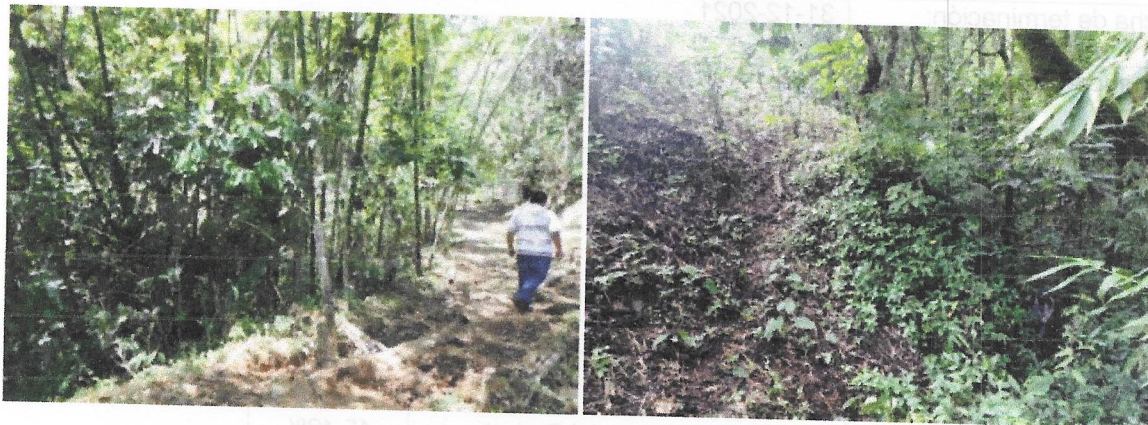

INFORME DE SUPERVISION ACTA N°1 PARCIAL

Informe Número	1	Fecha del informe	06-12-2021	Acta parcial	1	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato:	0228 de 2021
Objeto:	ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE PREDIOS, REFORESTACION, ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DE MICROCUENCAS Y TALLERES AMBIENTALES, EN LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratista:	FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL.
Fecha del contrato:	21-09-2021
Plazo de ejecución:	Ciento quince (115) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2021.
Valor inicial:	\$149.800.796 IVA INLUIDO.
Fecha de iniciación:	04-10-2021
Fecha de terminación:	31-12-2021
Recursos:	PROGRAMA REFORESTACION Y TRATAMIENTO MICROCUENCAS CI 197 DE 2021 – CORPOCALDAS.
Supervisor:	Coordinador Gestión Ambiental

1. AVANCE DEL CONTRATO:

1.1 Avance Físico:

Avance Físico del Periodo	45.48%
Avance Físico Acumulado	45.48%

1.2 Avance en Tiempo:

Plazo de Ejecución Inicial:	115 días
Plazo de Ejecución desde el Acta de Inicio	88 días
Tiempo total transcurrido:	63 días
Avance Porcentual:	71,59%





GESTIÓN FINANCIERA

F-GF-32
Versión: 06
2021-04-16

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO X

O.C

CONTRATO

0228 DE 2021

Acta N°

N°01 PARCIAL


CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301006 Reforestación	8.805.936	245.403,00	9.051.339	ACUEDUCTO	9.051.339	-	9.051.339
14043 FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301006 Reforestación	1.278.179	35.620,00	1.313.799	ACUEDUCTO	1.313.799	-	1.313.799
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301006 Reforestación	1.278.179	35.620,00	1.313.799	ACUEDUCTO	1.313.799	-	1.313.799
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301006 Reforestación	14.657.476	408.472,00	15.065.948	ACUEDUCTO	15.065.948	-	15.065.948
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301006 Reforestación	12.958.680	361.131,00	13.319.811	ACUEDUCTO	13.319.811	-	13.319.811
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	61.530.101	1.714.712	63.244.813	63.244.813	63.244.813
-------------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	61.530.101	1.714.712	63.244.813	63.244.813	63.244.813
----------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------

Fecha de presentación 7/11/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

Andrés Felipe Grisales Sánchez	Coordinador Gestión Ambiental
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	



FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL

CERTIFICADO DE APORTES PARA FISCALES

SEÑORES:

A QUIEN LE INTERESE

ASUNTO: Certificado paz y salvo aportes para fiscales

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 me permito certificar a ustedes bajo la gravedad de juramento que cuando a ello ha habido lugar que La FUNDACIÓN VISIÓN SOSTENIBLE Y SOCIAL identificado con NIT 900689760-1 y domicilio principal en la carrera 23 No 25 32 de la ciudad de MANIZALES., ha tenido obligaciones con el sistema de seguridad social, riesgos profesionales y pensión y las ha cumplido oportunamente y no tiene obligaciones pendientes con cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y el servicio nacional de aprendizaje SENA.

A la fecha he dado cumplimiento oportuno e integral a todas las obligaciones indicadas anteriormente durante los seis (6) meses.

Para constancia se expide el día 08 del mes de diciembre del 2021 y tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Cordialmente,

LUIS FERNANDP PAREJA
Revisor fiscal Fundación
TP 183782-T

YUDITH ALEXANDRA MONCADA
Representante Legal Fundación

FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL

Email: visionsocialysostenible@gmail.com

NIT 900689760-1

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183782-T

LUIS FERNANDO
PAREJA SUAREZ

C.C. 75104290

RESOLUCION INSCRIPCION 657
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



FECHA 20/11/2013

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

187810

184035

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.daga.com



BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL, identificada con Nit. 900.689.760-1. Posee en esta entidad el siguiente producto financiero:

CUENTA CORRIENTE ACTIVA No. 218136075, apertura el día 24 de Febrero de 2016.

Para constancia se expide en Manizales, el día 14 de Febrero de 2020.

Cordialmente;

LUZ ADRIANA GRAJALES
GERENTE OFICINA 218
C. CIAL CABLE PLAZA MANIZALES

