

# CONTRATO Y AÑO	228 DE 2023	Acta N°	PARCIAL 01	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 268,610,307.00
CONTRATISTA	CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	1,053,769,363			3. VALOR TOTAL (1+2)	268,610,307
CDP (#, rubro y fecha)	2024252 DEL 19 DE ENERO DE 2024			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	2024267 DEL 19 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	119,349,774
				6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	149,260,533
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 210/2023 MUNICIPIO DE SALAMINA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.	✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓	
8- Ensayos de densidad.	✓	
9- Diseño de Mezclas.	✓	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	✓	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	✓	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	✓	
15- Acta parcial o final del contrato.	✓	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	✓	

**Nota:** Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Giraldo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

09/02/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GOMEZ	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

09-02-24  
10.00

Se certifica que la empresa, identificada con CC-1053769363 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	500.800	0	500.800	
Período salud: 2023-11	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	391.300	0	391.300	
Planilla Nro.: 28512315 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2023-12-15	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 339510086	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 892.100</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-11	230201	800229739	PROTECCION	4	45	588.600	24.600	613.200	
Período salud: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	1	45	148.500	6.200	154.700	
Planilla Nro.: 28516950 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	45	238.100	10.000	248.100	
Clase de aportante: I	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	45	31.000	1.300	32.300	
Fecha transacción: 2024-01-26	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	45	167.600	7.000	174.600	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	45	84.400	3.600	88.000	
Transacción: 418897316	EPS005	800251440	SANITAS	1	45	41.600	1.800	43.400	
	14-11	890903790	ARL SURA	8	45	510.200	21.300	531.500	
	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	8	45	315.500	13.200	328.700	
	PASENA	899999034	SENA	0	45	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	45	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	45	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	45	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 2.214.500</b>

Se certifica que la empresa, identificada con CC-1053769363 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	1	21	185.600	3.600	189.200
Período salud: 2023-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	21	145.000	2.800	147.800
Planilla Nro.: 28905916 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	21	0	0	0
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	21	0	0	0
Fecha transacción: 2024-02-06	PASENA	899999034	SENA	0	21	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	21	0	0	0
Transacción: 440440810	PAESAP	899999054	ESAP	0	21	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	21	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 337.000</b>	

PAGADO

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	104325569	441885762	07/02/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1053769363**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **45.229.193.32**

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado **\$ 175,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 175,000.00	COP\$ 175,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO  
DAVIVIENDA

No. Transacción

104325569

No. Autorización/CUS

441885762

Fecha y Hora

07/02/2024

**Número de Identificación**

1053769363

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

MASSO VALENCIA

**Dígito de Verificación (Si es persona**

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CRA 21 No. 62-10

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

recursoshconstruentar@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

228-2023

**Nombre Obra**

CONSTRUC. ACUED Y ALCANT. SALA

**Fecha Terminación Obra**

15/02/2024

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

12

**Costo Total Mano de Obra**

5130600.00

**Valor Intereses Moratorios**

30000.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

CARLOS ANDRES

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,8858533

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

228-2023

**Fecha Inicio Obra**

09/11/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

SALAMINA CALDAS

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

268610307.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**


5

**Aporte FIC**

145000.00

**Valor del Pago**

145000.00



Carlos Andrés Masso  
Valencia  
NIT 1.053.769.363-3  
CL 51 E 20 44  
Tel: (606) 8959055  
Manizales - Colombia  
andresmasso@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 30

<b>Señores</b>	EMPOCALDAS SA EPS		
<b>NIT</b>	890.803.239-9	<b>Teléfono</b>	(606) 8867080 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CRA 23 75 82	<b>Ciudad</b>	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	08/02/2024, 15:13
<b>Expedición</b>	08/02/2024, 15:13
<b>Vencimiento</b>	08/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	88,439,995.00
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	25,647,599.00
3	UTILIDAD	1.00	5,262,180.00

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**

Ciento diecinueve millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 119,349,774.00


<b>Total Bruto</b>	118,509,594.00
<b>IVA 19%</b>	840,180.00
<b>Total a Pagar</b>	119,349,774.00

**Observaciones:**

ACTA 1 Y PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 228-2023 CON OBJETO " CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CRA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4, LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764058677241 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 26 al 50 Meses - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 5bc0dd28fec5f619f74f23737a26cee28094ec5e80ff47ab953124447f26ffe59008a72d1713f77299550c0ec8ba5b47



Carlos Andrés Masso  
Valencia  
NIT 1.053.769.363-3  
CL 51 E 20 44  
Tel: (606) 8959055  
Manizales - Colombia



Nota Crédito  
No. 1 1

Señores	EMPOCALDAS SA EPS		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(606) 8867080 - Ext. 000
Dirección	CRA 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-01-31
Factura de Venta	FE-29
Generación	31/01/2024, 15:35
Expedición	08/02/2024, 15:35
Vencimiento	31/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	88,439,995.00
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	25,647,599.00
3	UTILIDAD	1.00	5,262,180.00

Total items: 3

**Valor en Letras:**

Ciento diecinueve millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 119,349,774.00

Total Bruto	118,509,594.00
IVA 19%	840,180.00
<b>Total</b>	<b>119,349,774.00</b>

**Observaciones:**

CUDE: 746eca965093355d72e9ec8e6ca62a377d2123e8e61f81b394f2990f2467f5278b786148d9654a7021ceb8a3fd4541a7  
CUFE factura: 44bbfb0ae1219ce55326a09491741fb24f5cb13005bc44806d8edc749faee46a57b6aac2a5fbfbcce761aabf85d6631a5

<b>EMPOCALDAS A.S. E.SP.</b>			
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>			
<b>SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -</b>			
<b>CONTRATO No.:</b> 228 de 2023	<b>INFORME DE AVANCE DE OBRA</b>	<b>FECHA CORTE:</b> 20 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS			
<b>MUNICIPIO:</b> SALAMINA, CALDAS.	<b>VALOR CONTRATO:</b> \$ 268.610.307		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA			
<b>CONTRATISTA:</b> CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	<b>SUPERVISION:</b> JUAN CARLOS GOMEZ	<b>FECHA:</b> 20 DE DICIEMBRE DE 2023	

**INFORME DE OBRA N°1**

A continuación, se detalla el plazo contractual y la fecha de termino de la obra:

Fecha inicio de obra: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

Plazo contractual: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Total de días paralizados: N/A

Total de días ampliados: N/A

Fecha de terminación de la obra: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Total de días para ejecución de obras: 52 días

**AVANCE DE OBRA**

Avance acumulado ejecutado al 20 de diciembre del 2023: 44.43%



**INFORME DE OBRA N°1**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**FOTO 1. Demolición.**



**FOTO 2. Evacuación de escombros**



**FOTO 3. Retiro de escombros en volqueta.**

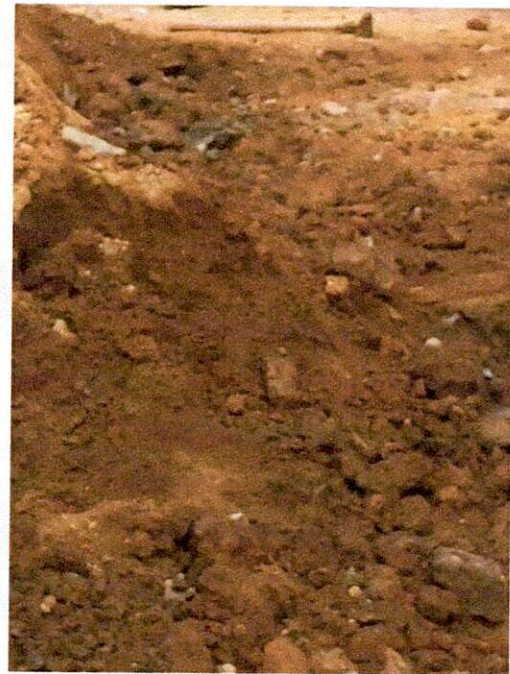


**FOTO 4. Excavaciones.**




**FOTO 5. Excavaciones.**



**FOTO 6. Nivelación.**

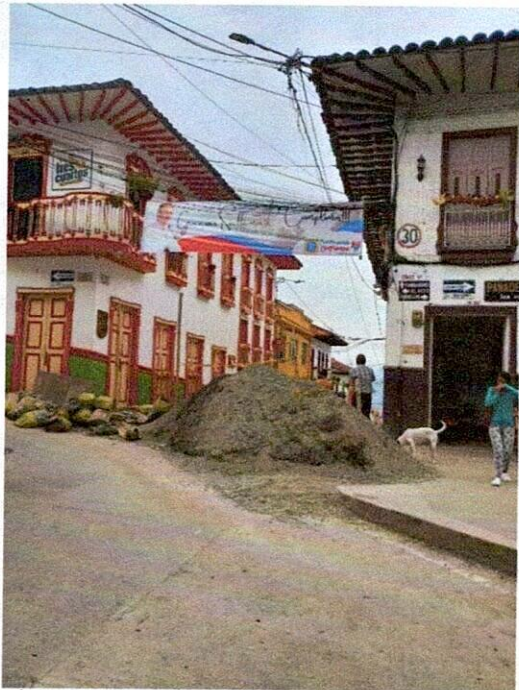

**FOTO 7. Dispersión de subbase.**

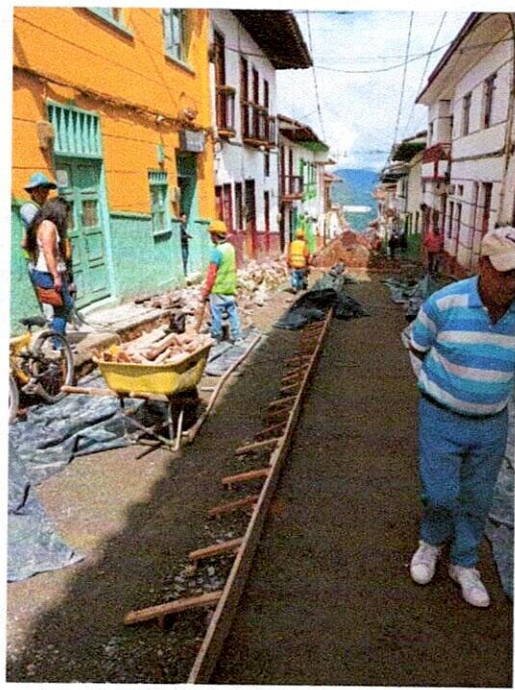

**FOTO 8. Dispersión de subbase.**



**FOTO 9. Dispersión de subbase**



**FOTO 10. Dispersión de subbase.**



**FOTO 11. Compactación de subbase.**



**FOTO 12. Instalación de formaleta.**



**FOTO 13. Instalación de formaleta.**



**FOTO 14. Instalación de formaleta.**



**FOTO 15. pasadores.**



**FOTO 16. Canastilla para dovelas.**



**FOTO 17. Dovelas.**



**FOTO 18. Vaciado de concreto.**



**FOTO 19. Nivelado del concreto**



**FOTO 20. Instalación de subbase andenes**



**FOTO 21. Concreto andenes**



**FOTO 22. Concreto andenes**



**FOTO 23. instalación de tapas de acueducto.**



**FOTO 24. Concreto andenes**

**NOVEDADES**

- Se recibió el sitio con el pavimento muy agrietado con hundimientos en algunas partes por el mal estado del pavimento.
- Se encuentra los andenes con grietas y quebrados en algunas partes.
- En algunas partes de la vía no hay andén.
- Se da inicio a los trabajos el día 4 de diciembre

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**Del 04 al 10 de diciembre 2023.**

- Se inicia a delimitar el área de la obra con señalización y cinta con bombones.
- Se inicia con las actividades de demolición del pavimento existente.
- Se inicia con el retiro de escombros de la demolición.
- Se realiza excavaciones para la instalación de subbase granular.
- Se inicia labores de excavación para la nivelación del terreno.
- Se realiza la evacuación de tierra sobrante de la excavación, por medio de volqueta.
- Se inicia con la instalación de sub - base granular.
- Se realiza la compactación para cada capa de sub - base granular.
- Se realiza el ensayo de densidad de cono y arena.
- Se inicia con la instalación de formaleta y rastrera para el vaciado

**Del 11 al 17 de diciembre 2023.**

- Se inicia con el vaciado pavimento MR-42
- Se realiza el retiro de formateles del vaciado.
- Se realiza corte de pavimento vaciado.
- instalación y compactación de sub base para andenes
- instalación de formaletas, cajas de medidores y vaciado de concreto Andenes.

# INFORME DE OBRA N°1

## • Avance de obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
1	DEMOLICIONES											
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico	ml	165,00	\$ 10.943,0	\$ 1.805.595,0	0		125,70	\$ 1.375.535,0	125,70	\$ 1.375.535,0	76,18%
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	45,00	\$ 119.508,0	\$ 5.377.860,0	0		59,58	\$ 7.120.287,0	59,58	\$ 7.120.287,0	132,40%
4	EXCAVACION											
5	En material común de 0 a 2m	m³	132,00	\$ 37.749,0	\$ 4.982.868,0	0		32,40	\$ 1.223.068,0	32,40	\$ 1.223.068,0	24,55%
6	En conglomerado	m³	12,00	\$ 41.774,0	\$ 501.288,0	0		48,41	\$ 2.022.070,0	48,41	\$ 2.022.070,0	403,38%
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	186,00	\$ 46.975,0	\$ 8.737.350,0	0		124,19	\$ 5.833.590,0	124,19	\$ 5.833.590,0	66,77%
8	LLENOS											
9	Sub base para pavimento	m³	48,00	\$ 207.780,0	\$ 9.973.440,0	0		64,61	\$ 13.423.627,0	64,61	\$ 13.423.627,0	134,59%
10	CONCRETOS											
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m³	26,60	\$ 841.710,0	\$ 22.389.486,0	0		23,40	\$ 19.696.014,0	23,40	\$ 19.696.014,0	87,97%
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m³	35,00	\$ 1.143.080,0	\$ 40.007.800,0	0		39,78	\$ 45.471.722,0	39,78	\$ 45.471.722,0	113,66%
13	ACERO											
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	1.210,00	\$ 12.188,0	\$ 14.747.480,0	0		823,08	\$ 10.031.748,0	823,08	\$ 10.031.748,0	68,02%
NP	ITEMES NO PRESISTOS											
NP1	suministro transporte e instalacion de caja hf para medidor de acueducto	UND		\$ 198.070,0				32,00	\$ 6.338.240,0	32,00	\$ 6.338.240,0	100,00%
NP2	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION , PERFORACIONES Y ANCLAJE PARA BARRAS DE 3/8 INCLUYE EPOXICO	UND		\$ 18.122,0				376,00	\$ 6.813.872,0	376,00	\$ 6.813.872,0	100,00%
	COSTO TOTAL				\$ 108.523.167,0		0,0		\$ 119.349.773,0		\$ 119.349.773,0	

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
1	DEMOLICIONES											
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico	ml	181,58	\$ 10.943,0	\$ 1.987.030,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	66,75	\$ 119.508,0	\$ 7.977.159,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
4	EXCAVACION											
5	En material común de 0 a 2m	m³	117,00	\$ 37.749,0	\$ 4.416.633,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
6	En conglomerado	m³	12,00	\$ 41.774,0	\$ 563.700,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	193,75	\$ 46.975,0	\$ 9.101.406,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
8	LLENOS											
9	Sub base para pavimento	m²	85,70	\$ 207.780,0	\$ 18.014.526,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
10	CONCRETOS											
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m³	21,00	\$ 841.710,0	\$ 17.675.910,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m³	62,20	\$ 1.143.080,0	\$ 71.099.576,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
13	ACERO											
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	2.400,00	\$ 12.188,0	\$ 29.251.200,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
	COSTO TOTAL				\$ 160.087.140,00		0,0		\$ 0,0		\$ 0,0	

COSTO TOTAL			\$ 268.610.307,0	\$ 0,0	\$ 119.349.773,0	\$ 119.349.773,0
COSTO DIRECTO			\$ 199.044.318,0	\$ 0,0	\$ 88.439.995,0	\$ 88.439.995,0
ADMINISTRACION %	29%		\$ 57.722.852,0	\$ 0,0	\$ 25.647.599,0	\$ 25.647.599,0
IMPREVISTOS %	0%		\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
UTILIDADES %	5%		\$ 9.952.216,0	\$ 0,0	\$ 4.422.000,0	\$ 4.422.000,0
SUMA ANTES IVA			\$ 266.719.386,0	\$ 0,0	\$ 118.509.594,0	\$ 118.509.594,0
I. V. A. %	19%		\$ 1.890.921,0	\$ 0,0	\$ 840.180,0	\$ 840.180,0
VALOR TOTAL OBRA			\$ 268.610.307,0	\$ 0,0	\$ 119.349.774,0	\$ 119.349.774,0
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 1					\$ 119.349.774,0	



**INFORME DE OBRA N°1**

• **Personal:**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO Y A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

PERIODO	DICIEMBRE																														
DESCRIPCION EQUIPO																															
PERSONAL CONTRATADO	CANT/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ING RESIDENTE	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
OFICIAL	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
AYUDANTE	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

• **Equipo:**

EQUIPO	CANTIDAD
MARTILLO DEMOLEDOR MANUAL	1
GENERADOR ELECTRICO	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO RODILLO	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	1
CONCRETADORA A GASOLINA 1.5 SACOS	1
AUTOCONCRETADORA 4m3	1
REGLA	1
VIBRADOR ELECTRICO	1
PULIDORA	1
FLOTA	1
RASTRILLO	1
RETRO EXCAVADORA TIPO PAJARITA	1



CARLOS ANDRÉS MASSO  
C.C 1.053.769.363  
CONTRATISTA

NOMINA OBRA No. 01

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 N EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCTA

PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE PAGO: 15/12/2023

No.	DATOS EMPLEADO		DEVENGADO										Subtotal de prestaciones	Total deducciones	Neto pagado	RECIBI CONFORME	
	Cedula	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Dias básicos	Sueldo básico	Sueldo devengado	Horas Extras diurnas	Horas Extras nocturnas	Recargo nocturno	Horas Extras festivo	Valor Horas Extras	SUBTOTAL					Total devengado
1	1.007.729.211	Anderson Andres Uribe Chelvero	Ayudante	12	1.160.000	464.000					464.000	520.000	18.560	18.560	37.120	482.880	Andres Uribe C
2	15.955.995	Heriberto Vallejo Valencia	Ayudante	12	1.160.000	464.000					464.000	520.000	18.560	18.560	37.120	482.880	HVV
3	10.243.597	Jairo Cesar Mejia Londino	Ayudante	11	1.160.000	425.333					425.333	476.667	17.013	17.013	34.027	442.640	Andres Uribe C
4	1.002.938.865	Santiago Belalcazar Zuluaga	Ayudante	12	1.160.000	464.000					464.000	520.000	18.560	18.560	37.120	482.880	Santiago B Zuluaga
5	15.957.006	Sinar Lopez Martinez	Ayudante	12	1.160.000	444.667					444.667	498.333	17.787	17.787	35.573	462.760	Sinar Lopez
7				0													
8				0													
9				0													
10				0													
<b>Totales</b>											2.262.000	2.535.000	90.480	90.480	180.960	2.354.040	

CARLOS ANDRES MASSO VALENCTA  
C.C. 1053.769.363

NOMINA OBRA No. 02

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 N EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.		PERIODO DE PAGO	DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA	NIT/CC	FECHA DE PAGO	30/12/2023
				C.C. 1053.769.363

No	Cedula	DATOS EMPLEADO		DEVENGADO											Neto pagado	RECIBI CONFORME							
		NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Sueldo básico	Dias	Sueldo devengado	Horas Extras Diurnas	Horas Extras Nocturnas	Horas Extras festivo	Recargo Nocturno	Horas Dominicales y festivo	Valor Horas Extra	SUBTOTAL	Subsidio de temporaria			Total devengado	Aporte Salud	Aporte Pension	Total deducciones			
1	1.007.729.211	Anderson Andres Uribe Obareco	Ayudante	1.160.000	13	502.667									502.667	60.667	563.333	20.107	20.107	40.213	523.120	Jairo Lopez	
2	15.955.985	Heriberto Vallejo Vaena	Ayudante	1.160.000	13	502.667									502.667	60.667	563.333	20.107	20.107	40.213	523.120	Jairo Lopez	
3	10.243.697	Julio Cesar Mejia Londoño	Ayudante	1.160.000	15	580.000									580.000	70.000	650.000	23.200	23.200	46.400	603.600	Jairo Lopez	
4	1.002.936.866	Santiago Ballastros Zuluaga	Ayudante	1.160.000	15	580.000									580.000	70.000	650.000	23.200	23.200	46.400	603.600	Santiago Ballastros	
5	15.957.906	Sinar Lopez Matinez	Ayudante	1.160.000	13	502.667									502.667	60.667	563.333	20.107	20.107	40.213	523.120	Sinar Lopez	
7					0	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
8					0	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
9					0	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
10					0	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totales</b>															<b>2.868.000</b>	<b>322.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>106.720</b>	<b>106.720</b>	<b>213.440</b>	<b>2.776.560</b>		

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
C.C. 1053.769.363

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACION DE CONTRATO No. 01**

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 N EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

ENTIDAD : ALCALDIA DE MANIZALES

Para todos los efectos legales los abajo firmantes declaramos que recibimos de JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ todas las prestaciones sociales por tiempo de servicios relacionados con la labor respectiva en la Construcción, quedamos en PAZ Y SALVO por todo concepto laboral, en especial en salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, dotaciones, incapacidades médicas y todos los asuntos inherentes al contrato laboral de trabajo y cualquier otro crédito originado en el vínculo que ahora se extingue u otros del mismo carácter que pudieren haber existido entre las partes con el trabajador, lo anterior debido a que renunciamos a nuestro cargo en el contrato de la referencia.

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2023

Nombre	Identificación	Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Dias Trabajados	Basico Mensual	Basico diario Diario	Cosantias	Intereses a las cesantias	Prima legal CANCELADA 20 DIC 2023	Vacaciones	Total	Firma y cédula
3 Julio Cesar Mejia Londoño	10.243.597	Ayudante	4/12/2023	31/12/2023	28	1.160.000	38.667	101.158	944	101.158	45.111	147.242	<i>John Cesar</i>
2							0	0	0	0	0	0	
8							0	0	0	0	0	0	

TOTAL

**\$ 147.242**



CONTRATISTA  
**CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**  
**C.C. 1053.769.363**



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	20/12/2023	Acta parcial 01	X	Acta final	
----------------	----	-------------------	------------	-----------------	---	------------	--

Número del contrato	228 DE 2023
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
Nombre Contratista:	CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
Representante Legal.	CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
Fecha del contrato:	28 DE JUNIO DE 2023
Plazo de ejecución:	52 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	<b>\$ 268.610.307</b>
Fecha de iniciación:	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	\$0
Valor Final:	<b>\$ 268.610.307</b>
Prórroga (en tiempo):	N/A
fecha de terminación final:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Supervisor:	JUAN CARLOS GOMEZ


## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	44.43%
Avance físico Acumulado	44.43%

### 1.2. Informe de actividades: (Se anexa resumen de ejecución de la obra).

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
N/A	N/A	N/A

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	52
Tiempo total transcurrido:	41
Avance Porcentual:	78.84%

Corte realizado con fecha del 20 de diciembre de 2023.

### 1.4. Registro fotográfico.

### 1.5. Problemáticas con la obra:

Por tratarse de un contrato de obras complementarias, no se pudo dar inicio físico sino hasta el mes de diciembre tiempo en el que el contratista predecesor termino.

## DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objeto principal del contrato es el CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 268.610.307
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 119.349.774
Porcentaje ejecutado en el periodo:	44.43%
Inversión total ejecutada:	\$ 119.349.774
Porcentaje total ejecutado:	44.43%

## 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101056797	09/11/2023	14/05/2027	\$53.722.061
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101056797		5 AÑOS	\$53.722.061
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101056797	09/11/2023	12/08/2024	\$80.583.092
Responsabilidad Civil	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40-101043585	09/11/2023	12/08/2024	\$80.583.092



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

**3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**  
(Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Inspectora SST	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

El contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto.

**4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)**  
SE ANEXAN CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL REP. LEGAL Y EL CONTADOR DE LA EMPRESA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

**5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN.**

El contratista cuenta con SGSST, el cual fue entregado al área encargada por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, se han realizado las inducciones y capacitaciones correspondientes, de acuerdo al SGSST.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓ	CAPACITACI ÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
NOVIEMBRE 01 DE 2023	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

**6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR** (Se Anexa Memorias de Cálculo en Preactas)



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

## 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0

### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población Beneficiada por cada Municipio se distribuye así:

MUNICIPIO	FRENTE No	OBJETO CONTRACTUAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
SALAMINA	1	OBRAS COMPLEMENTARIAS	DIRECTAMENTE: Población zona urbana de Salamina





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

**8. DOCUMENTOS ANEXOS**

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

JUAN CARLOS GOMEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO




**FOTO 1. Demolición.**



**FOTO 2. Evacuación de escombros**



**FOTO 3. Retiro de escombros en volqueta.**

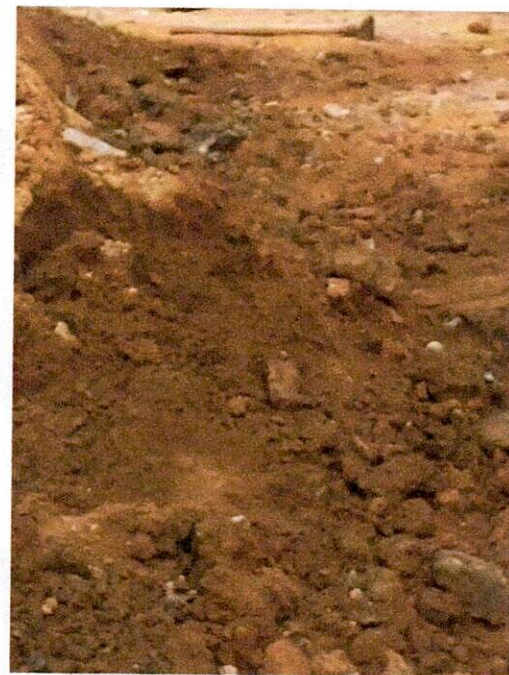

**FOTO 4. Excavaciones.**



FOTO 5. Excavaciones.



FOTO 6. Nivelación.



FOTO 7. Dispersión de subbase.


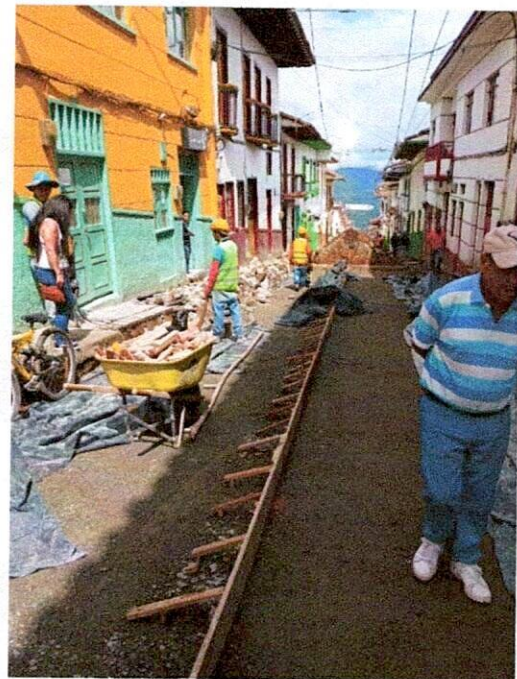


FOTO 8. Dispersión de subbase.



**FOTO 9. Dispersión de subbase**

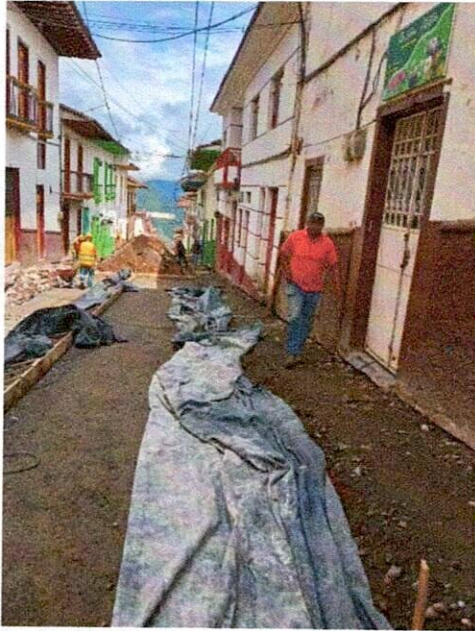





**FOTO 10. Dispersión de subbase.**



**FOTO 11. Compactación de subbase.**



**FOTO 12. Instalación de formaleta.**

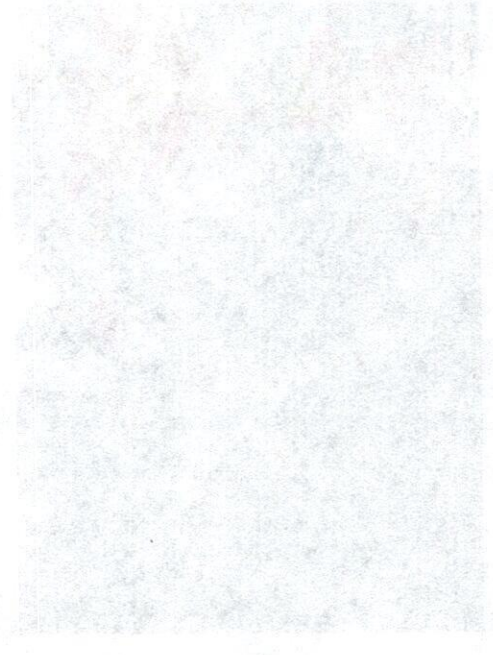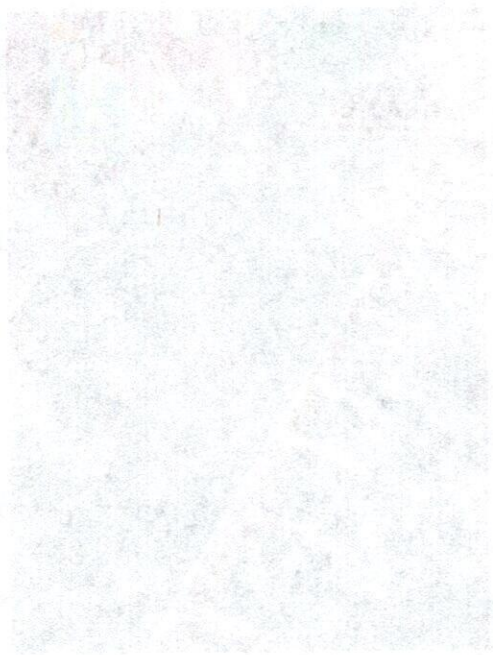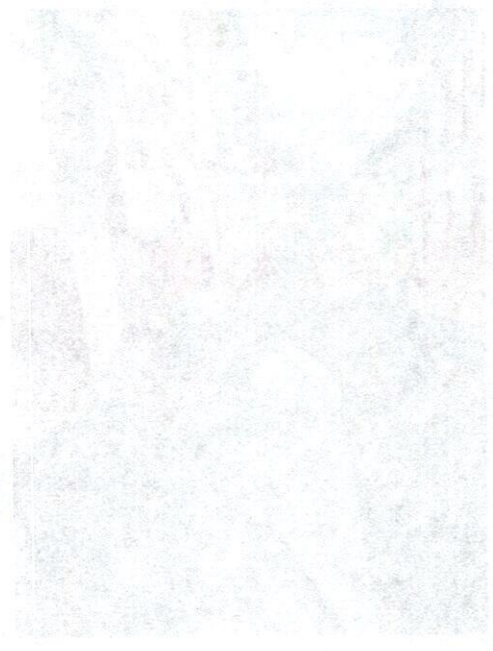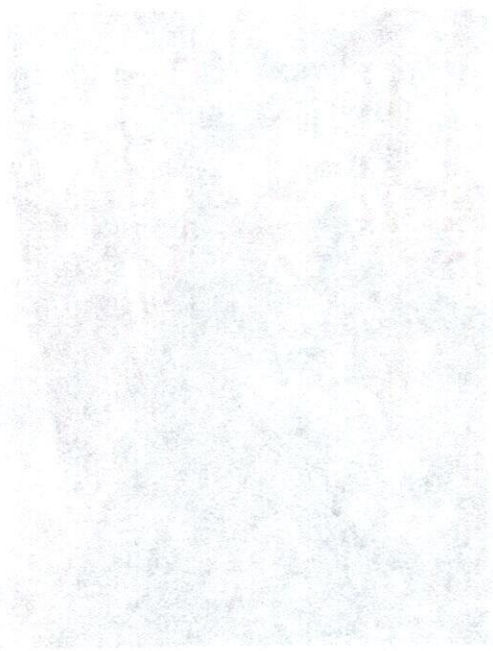



**FOTO 13. Instalación de formaleta.**






**FOTO 14. Instalación de formaleta.**



**FOTO 15. pasadores.**



**FOTO 16. Canastilla para dovelas.**

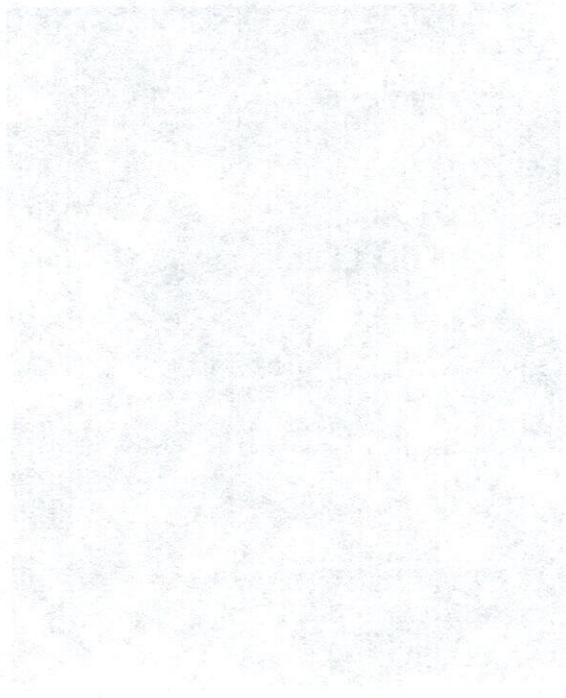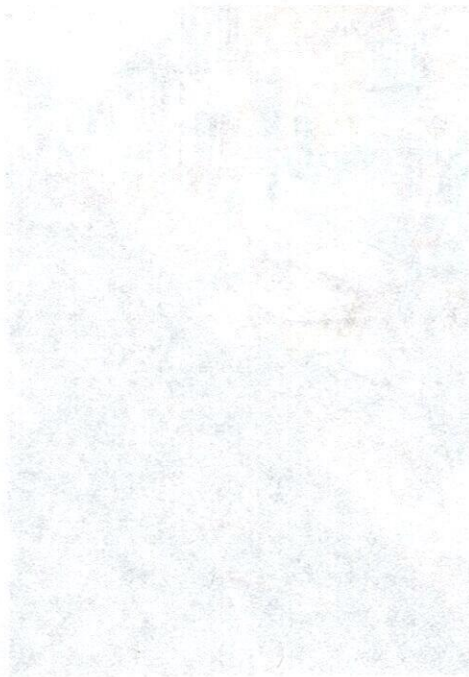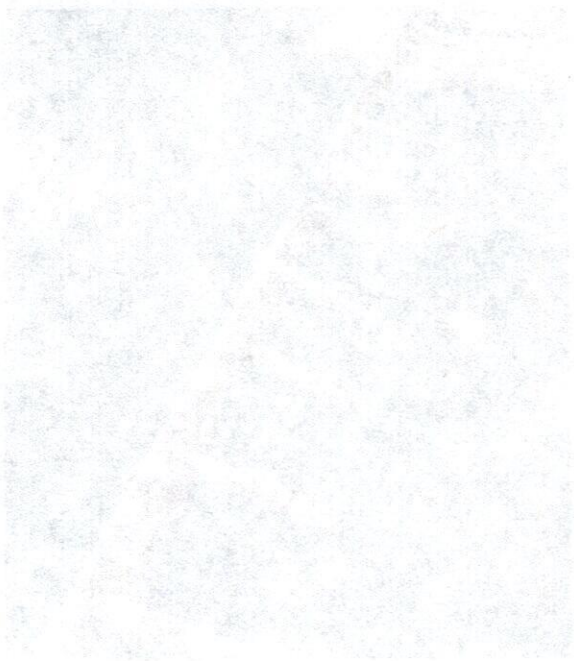




**FOTO 17. Dovelas.**



**FOTO 18. Vaciado de concreto.**







**FOTO 19. Nivelado del concreto**

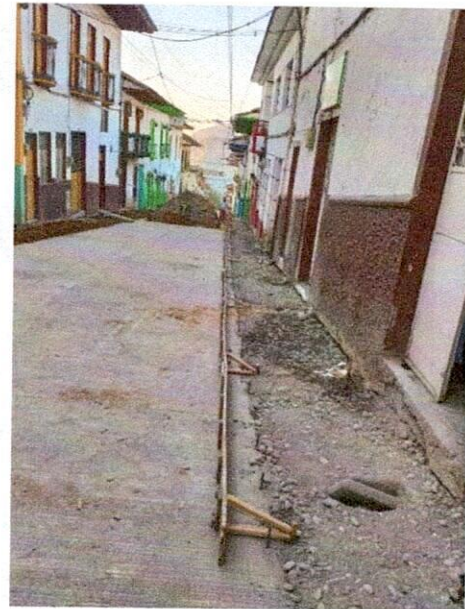

**FOTO 20. Instalación de subbase andenes**



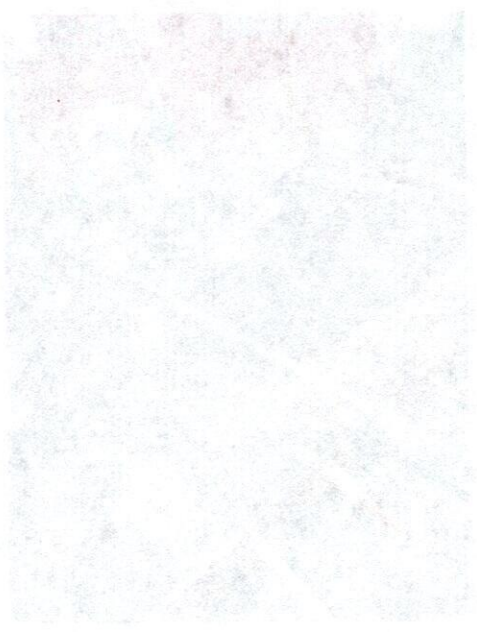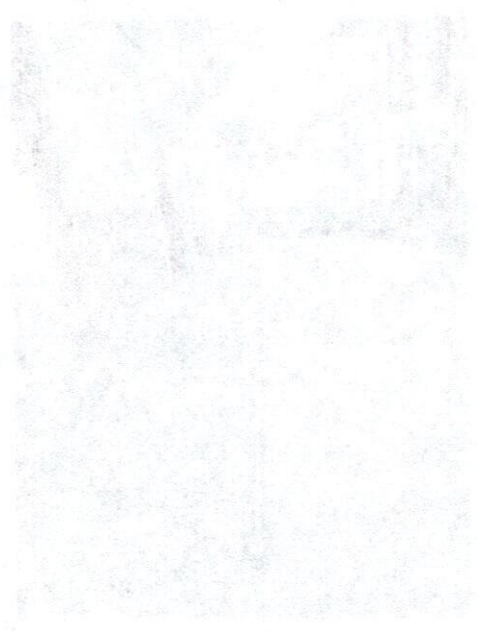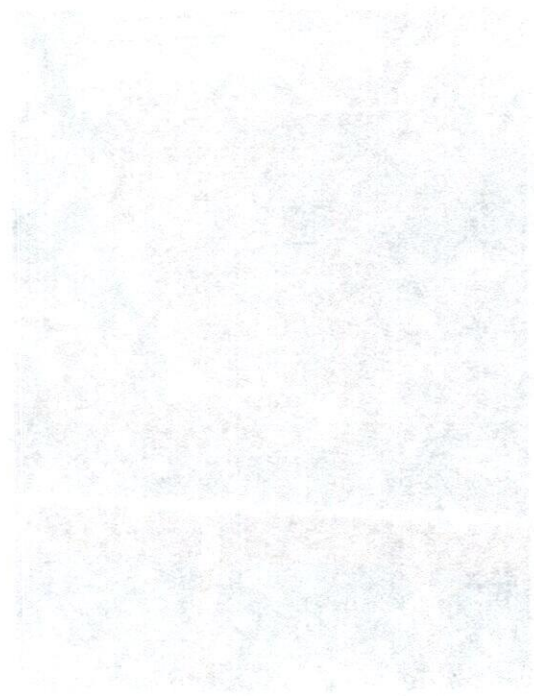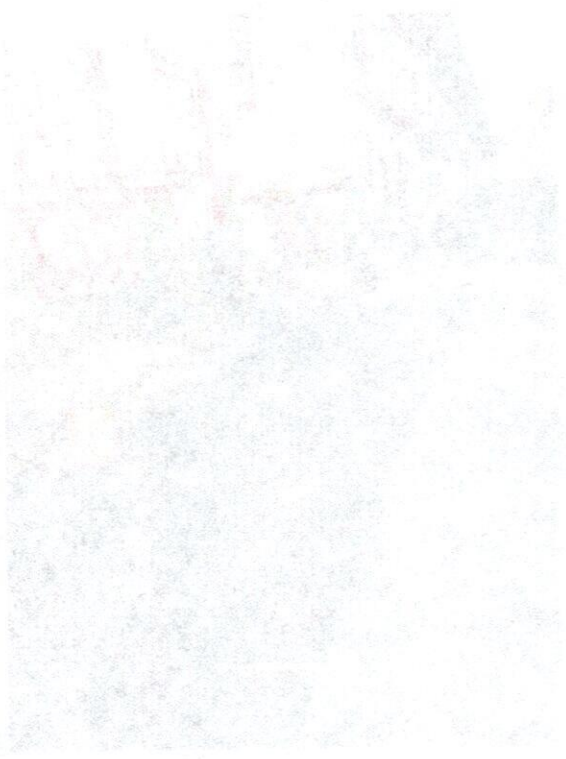



**FOTO 21. Concreto andenes**







**FOTO 22. Concreto andenes**



**FOTO 23. instalación de tapas de acueducto.**



**FOTO 24. Concreto andenes**

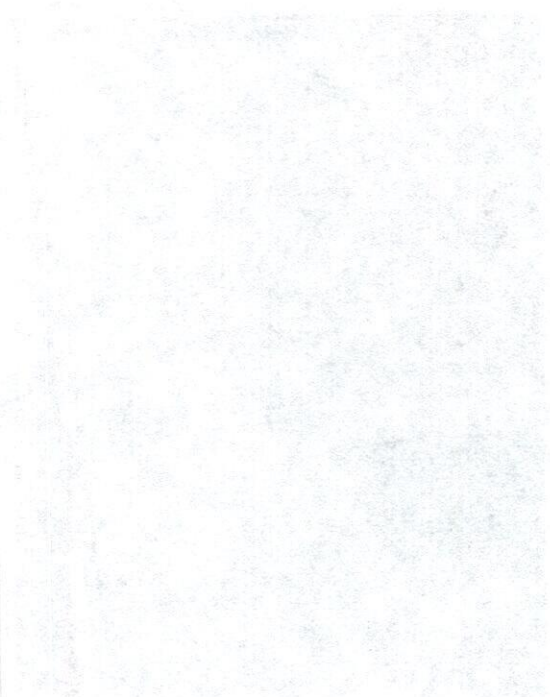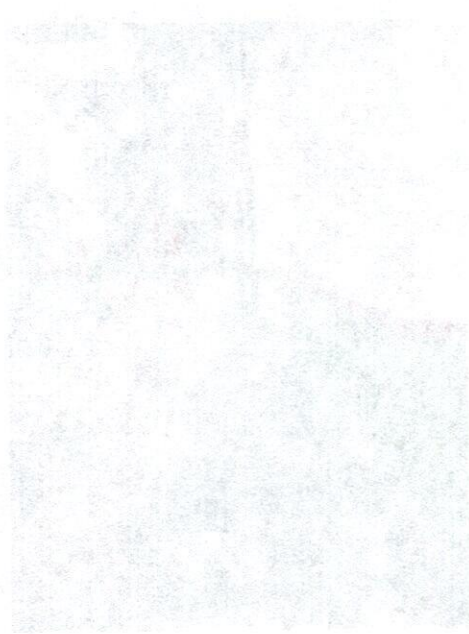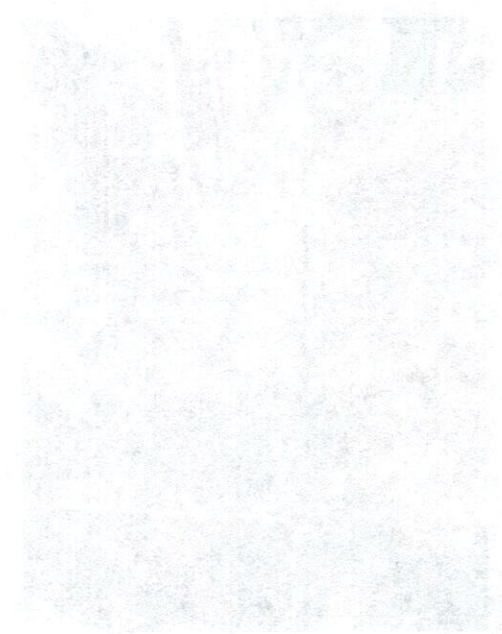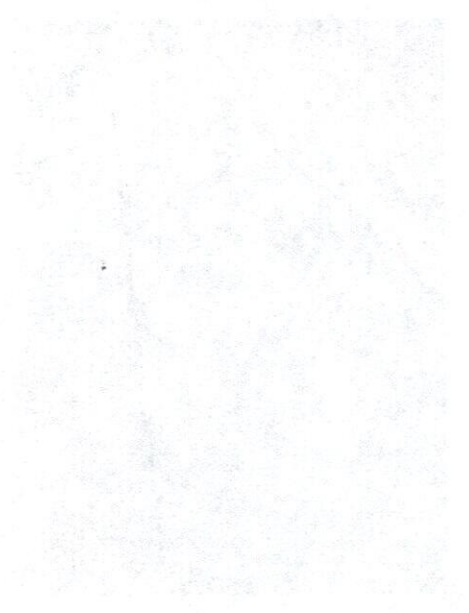

GEOTRANSVIAL S.A.S.

Nit. 900376530-0

Calle 4a3 # 19a - 47 B. Alcazares

Manizales (Caldas)



**DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV - E 161 - 13**

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

FECHA: 01/12/2023

DIRIGIDO: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

DESCRIPCIÓN: SUBBASE GRANULAR

LOCALIZACIÓN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 - SALAMINA, CALDAS

**DENSIDAD PROCTOR (gr/cm3) | 2.260**

PUNTO	K CONO (gr)	WARENA + FRASCO + CONO INICIAL (gr)	WARENA + FRASCO + CONO FINAL (gr)	WARENA EN EL HUECO (gr)	DENSIDAD ARENA (gr/cm3)	VOLUMEN HUECO (cm3)	PESO SUELO HUMEDO (gr)	HUMEDAD (%)	PESO SUELO SECO (gr)	DENSIDAD SUELO HUMEDO (gr/cm3)	DENSIDAD SUELO SECO (gr/cm3)	COMPACTACIÓN (%)	LOCALIZACIÓN
1	1515	6935	3246	2177	1.33	1636	3861	5.2	3670	2.36	2.24	99.6	CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4
2	1515	6847	3421	1912	1.33	1437	3529	5.0	3361	2.46	2.34	101.5	CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4
3	1515	6812	2876	2420	1.33	1820	4530	5.8	4282	2.49	2.35	100.6	CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO

MP. 01111-10567 CPITVC

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying trends and anomalies in the data.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors. It outlines various control measures such as segregation of duties, authorization requirements, and regular reconciliations. The document stresses that these controls are not only for protection but also for improving operational efficiency.

3. The third part of the document addresses the challenges of managing financial data in a complex and rapidly changing environment. It discusses the need for robust information systems and the importance of data security. The text also highlights the role of management in ensuring that the financial reporting process is transparent and reliable.

4. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for further action. It concludes by stating that a strong financial reporting system is fundamental to the success of any organization and that continuous improvement is necessary to stay ahead of the competition.


**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV - E-410 - 13**

<b>OBRA:</b>	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
<b>LOCALIZACIÓN:</b>	CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 SALAMINA - CALDAS
<b>DIRIGIDO A :</b>	CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

FECHA EXTRACCIÓN	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	PESO CILINDRO (gr)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	DENSIDAD (gr/cm <sup>3</sup> )	CARGA (kN)	ESFUERZO		RESISTENCIA (%)	RESISTENCIA PROMEDIO		RESISTENCIA A 28 DIAS (PSI)	ESTRUCTURA	ORIGEN DE LA MEZCLA	OBSERVACIONES	
								PSI	Kg/cm <sup>2</sup>		(%)	PSI					Kg/cm <sup>2</sup>
6/12/2023	13/12/2023	7	13629	15.3	30.5	2.38	433.5	3365	236	112			3000	CARRERA 6 CALLE 3 Y 4 ANDEN DERECHO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE	
6/12/2023	13/12/2023	7	13628	15.4	30.5	2.38	375.9	2880	202	96			3000	CARRERA 6 CALLE 3 Y 4 ANDEN DERECHO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE	
7/12/2023	14/12/2023	7	13548	15.5	30.7	2.39	546.3	4240	297	141			3000	CARRERA 6 CALLE 3 Y 4 ANDEN IZQUIERDO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE	
7/12/2023	14/12/2023	7	13618	15.5	30.6	2.36	478.0	3662	256	122			3000	CARRERA 6 CALLE 3 Y 4 ANDEN IZQUIERDO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE	

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON SUMINISTRADAS POR EL INTERESADO

ING. CRISTIANCAMILO DELGADO CARVAJAL  
MP 01111-10567 CPITVC

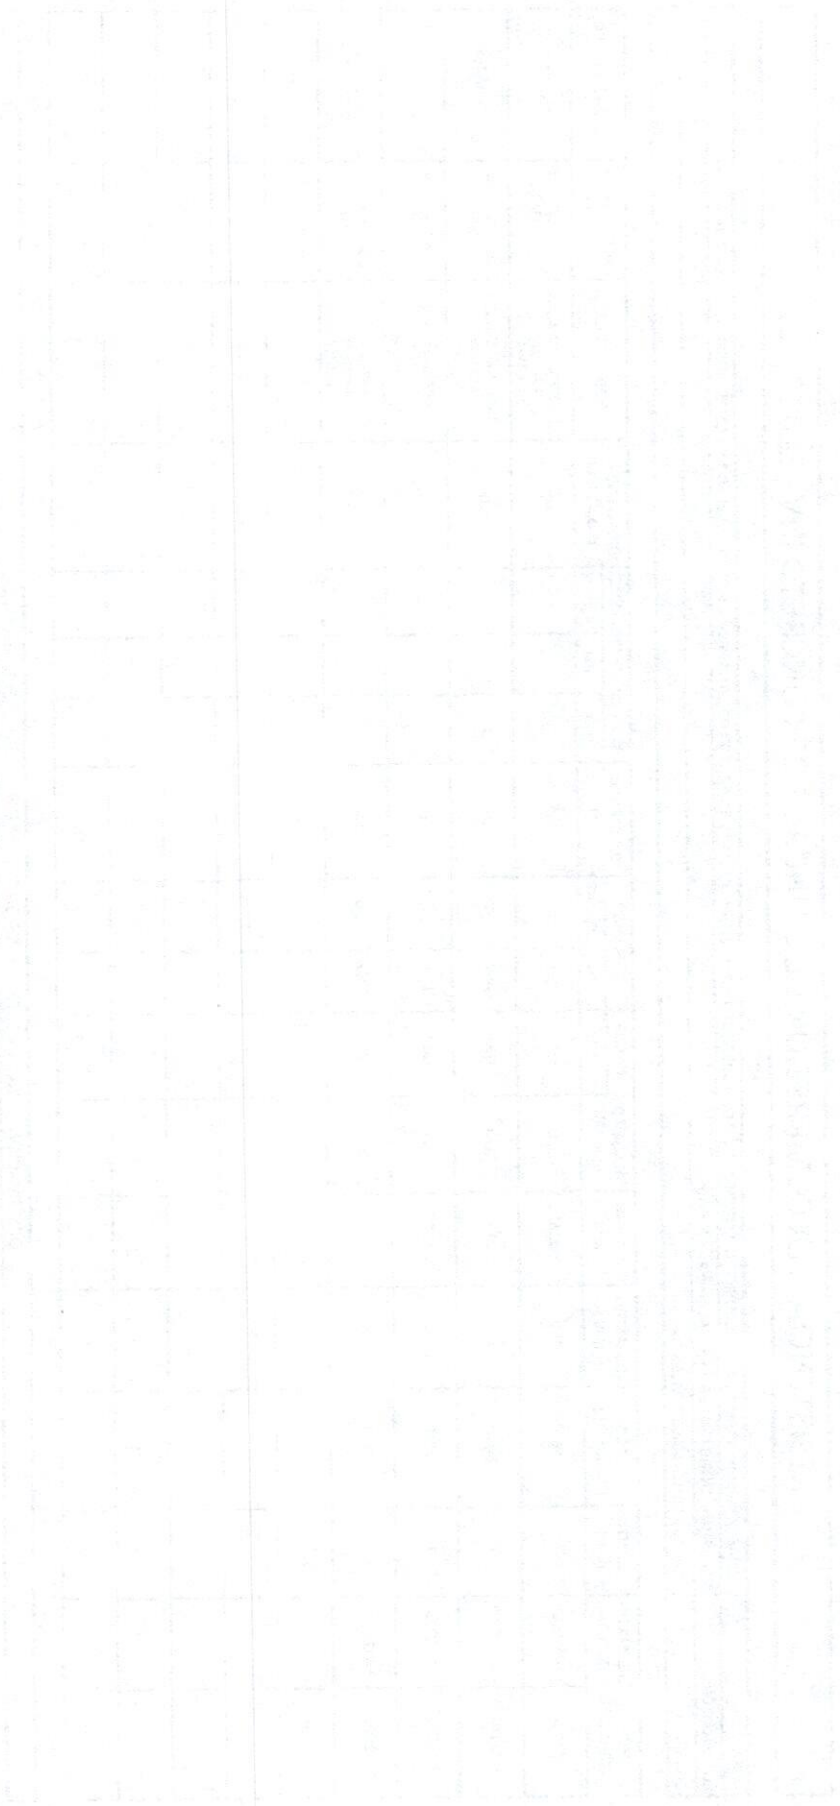



## DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

INTERESADO: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)

PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI

FECHA: OCTUBRE 2023

### MEZCLA PARA: 3000PSI

#### CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m <sup>3</sup> Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	159.0	Ton/m <sup>3</sup>	159.0 Litros
Cemento **	298.9		298.9 Kg
Mixto	1914.6	1.701	1.1255 m <sup>3</sup>

Consumo de cemento Portland en bultos de 42,5Kg /m<sup>3</sup> de concreto **7.03**

#### PROPORCIONES EN PESO DE MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0.53	(19-22) Litros
Cemento	1.00	42.5 Kg (1 bulto)
Mixto	6.41	272 Kg

#### CUBICACION DE MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm <sup>3</sup>	Proporciones al Volumen	No. Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	—	0.53	(19-22)	Litros
Cemento	32.7	1.00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	160.0	4.89	4	40cm x 40cm x 25.0 cm de alto

#### CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm <sup>3</sup>	Proporciones al Volumen	No. Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	—	0.53	(19-22)	Litros
Cemento	32.7	1.00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	160.0	4.89	8	Cuñetes

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

#### CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm <sup>3</sup>	Proporciones al Volumen	No. Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	—	0.53	(19-22)	Litros
Cemento	32.7	1.00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	160.0	4.89	19	Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construcción; volumen= 8,5 Lt

\* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : ARGOS U.E. 42,5Kg

\*\* La cantidad de agua se toma **siempre** con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para un Slump normal de 2 a 3 pulg sin aditivo.

**Para mejorar la manejabilidad y fluidez de la mezcla, se recomienda aditivos tipo sika según el caso**

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. DICKINSON DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED  
JAN 10 1964

*[Handwritten signature]*

RECEIVED  
JAN 10 1964

RECEIVED  
JAN 10 1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. DICKINSON DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

# ENSAYOS DE LABORATORIO PARA AGREGADOS PETREOS



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

INTERESADO: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)

PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI

FECHA: OCTUBRE 2023

**MEZCLA PARA: 3000psi**

### FRACCION RETENIDA TAMIZ 4

Determinación	1	2	3
Peso sat.sup.seco (gr)	1402.30	1324.80	1381.90
Peso en inmersión (gr)	876.50	827.70	863.40
Peso seco (gr)	1380.10	1303.30	1359.20
Grav. Esp. Bulk aparente	2.740	2.740	2.741
Gravedad Esp. Bulk	2.625	2.622	2.621
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2.667	2.665	2.665
ABSORCION (%)	1.6	1.6	1.7

D60 9.50  
D30 1.60  
D10 0.30

**Cu 31.7**  
**Cc 0.9**

FRACCION PASA TAMIZ 4 : 45.0%  
FRACCION RETENIDA TAMIZ 4 : 55.0%

\*\* La muestra se lavó por el tamiz 200

### ANALISIS GRANULOMETRICO

Peso seco inicial (g) : **5516.0**

Peso final fracciones (g): **5266.1**

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum	% pasa
2"				
1 1/2"				
1"	0.0	0.0	0.0	100.0
3/4"	842.8	15.3	15.3	84.7
1/2"	936.7	17.0	32.3	67.7
3/8"	446.8	8.1	40.4	59.6
No. 4	805.8	14.6	55.0	<b>45.0</b>
No. 8	517.6	9.4	64.4	35.6
No. 16	469.5	8.5	72.9	27.1
No. 30	468.3	8.5	81.4	18.6
No. 50	435.1	7.9	89.2	10.8
No. 100	241.4	4.4	93.6	6.4
No. 200	102.1	1.9	95.5	<b>4.5</b>
Pasa T- 200	249.9	4.5	100.0	0.0

### FRACCION PASANTE TAMIZ 4

Determinación	1	2	3
Matraz (No.)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
P sss. (gm)	363.40	362.90	367.10
P fws. (gm)	854.50	876.00	859.40
Temperatura (C)	20.3	20.2	20.1
P fw. (gm)	631.62	653.60	634.25
P seco (gm)	350.61	349.90	354.20
Grav. Esp. Bulk aparente	2.745	2.744	2.745
Gravedad Esp. Bulk	2.495	2.490	2.495
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2.586	2.583	2.586
ABSORCION (%)	3.6	3.7	3.6

### MASA UNITARIA SUELTA

Determinación	1	2
<b>Vol. recip. (cm3)</b>	<b>14957.0</b>	<b>14957.0</b>
Peso suelto (gm)	25465.0	25424.0
M.U.S. (gm/cm3)	1.703	1.700

### MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)

Determinación	1	2
Peso compacto(gm)	27958.0	27932.0
M.U.C. (gm/cm3)	1.869	1.867

### RESUMEN DE ENSAYOS DEL MIXTO

Grav. Esp. Bulk aparente gr/cm <sup>3</sup>	2.742
Gravedad especifica bulk gr/cm <sup>3</sup>	2.565
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. gr/cm <sup>3</sup>	2.629
ABSORCION (%)	2.6
M.U.S. (gm/cm3)	1.701
M.U.C. (gm/cm3)	1.868
CLASIFICACION S.U.C.S.	<b>GP</b>

OBSERVACIONES: Mixto de río triturado y clasificado, forma subangulosa de las partic

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ- Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

# DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND 3000PSI

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

INTERESADO: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)

PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI

FECHA: OCTUBRE 2023

## DATOS MATERIALES DE LA MEZCLA

Resistencia esperada en P.S.I.	3000PSI
Relación agua/cemento.	0.53
Contenido de cemento kg/m <sup>3</sup> de concreto	299
Agua para agregados SSS Lt/m <sup>3</sup> de concreto	159
Volumen absoluto de los agregados Lt/m <sup>3</sup> de concreto	746.6
Peso seco de los agregados Kg/m <sup>3</sup> de concreto	1914.6
Peso específico bulk del agregado mixto g/cm <sup>3</sup>	2.565
Humedad de absorcion del agregado mixto %	2.6
Peso unitario del agregado mixto compacto Ton/m <sup>3</sup>	1.868
Peso unitario del agregado mixto suelto Ton/m <sup>3</sup>	1.701
Peso específico del cemento Ton/m <sup>3</sup>	3.100



*Agustin Torres Jimenez*

TAMICES		AGREGADO	GRANULOMETRIA
Abertura Pulg.	Abertura mm		
		Ing. Sosten. % PASA.	IDEAL
2 1/2	62.500		
2	50.000		
1 1/2	37.500		
1	25.000	100.0	100.0
3/4	19.000	84.7	87.9
1/2	12.500	67.7	73.2
3/8	9.500	59.6	64.3
4	4.750	45.0	47.1
8	2.375	35.6	34.5
16	1.190	27.1	25.2
30	0.595	18.6	18.5
50	0.300	10.8	13.5
100	0.150	6.4	9.9
200	0.075	4.5	
<b>Módulo</b>		5.12	4.99

\*\* Los resultados y la presente dosificación de concreto corresponden a las muestras ensayadas

## PROPORCIONES DE LA MEZCLA - 3000PSI

Materiales	Volumen/m <sup>3</sup> Dm <sup>3</sup>	Peso/m <sup>3</sup> Kg	Proporciones en Volumen	Proporciones en Peso
Agua	159.0	159.0	0.53	0.53
Cemento	96.4	298.9	1.00	1.00
Mixto	746.6	1914.6	4.89	6.41

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

*de*

STATE OF CALIFORNIA - DEPARTMENT OF REVENUE

INVESTMENT STATEMENT FOR THE YEAR ENDING 12/31/1964

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00
1/15/64	INTEREST	1.25	101.25
2/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	201.25
2/15/64	INTEREST	1.25	202.50
3/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	302.50
3/15/64	INTEREST	1.25	303.75
4/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	403.75
4/15/64	INTEREST	1.25	405.00
5/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	505.00
5/15/64	INTEREST	1.25	506.25
6/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	606.25
6/15/64	INTEREST	1.25	607.50
7/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	707.50
7/15/64	INTEREST	1.25	708.75
8/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	808.75
8/15/64	INTEREST	1.25	810.00
9/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	910.00
9/15/64	INTEREST	1.25	911.25
10/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1011.25
10/15/64	INTEREST	1.25	1012.50
11/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1112.50
11/15/64	INTEREST	1.25	1113.75
12/1/64	STATE OF CALIFORNIA	100.00	1213.75
12/15/64	INTEREST	1.25	1215.00
12/31/64	TOTAL		1215.00

STATE OF CALIFORNIA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
J. J. [Signature]

GEOTRANSVIAL S.A.S.

Nit. 900376530-0

Calle 4a3 # 19a - 47 B. Alcazares  
Manizales (Caldas)



Soluciones Ingenieriles

**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE**  
INV - E- 414 - 13

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

LOCALIZACIÓN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 - SALAMINA, CALDAS

DIRIGIDO A: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LUZ ENTRE APOYOS (cm)	ALTURA (cm)	ANCHO (cm)	CARGA (KN)	MODULO DE ROTURA		RESISTENCIA MR (Kg/cm <sup>2</sup> )	ESTRUCTURA	ORIGEN DE LA MEZCLA	OBSERVACIONES
							Mpa	Kg/cm <sup>2</sup> %				
04/12/2023	11/12/2023	7	44.7	15.2	15.0	31.5	3.81	39	42	PAVIMENTO CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 CARRIL DERECHO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE
04/12/2023	11/12/2023	7	44.7	15.5	15.1	30.9	3.71	38	42	PAVIMENTO CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 CARRIL DERECHO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE
05/12/2023	12/12/2023	7	44.7	15.2	15.6	36.0	4.29	44	42	PAVIMENTO CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 CARRIL IZQUIERDO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE
05/12/2023	12/12/2023	7	44.7	15.1	15.1	31.7	4.12	42	42	PAVIMENTO CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 CARRIL IZQUIERDO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON SUMINISTRADAS POR EL INTERESADO

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL  
MP 01111-10567 CPITVC

The following information was obtained from a search of the records of the  
 Federal Bureau of Investigation, Bureau of Prisons, for the years 1948 and 1949:

Name of Person Being Searched	Date of Birth	Date of Release	Date of Parole	Date of Expiration of Sentence	Date of Expiration of Parole	Date of Expiration of Sentence and Parole	Name of Institution
WALTER H. BERRY	1/21/21	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	Federal Reformatory for Women Alderson, Md.
WALTER H. BERRY	1/21/21	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	Federal Reformatory for Women Alderson, Md.
WALTER H. BERRY	1/21/21	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	Federal Reformatory for Women Alderson, Md.
WALTER H. BERRY	1/21/21	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	Federal Reformatory for Women Alderson, Md.
WALTER H. BERRY	1/21/21	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	5/15/49	Federal Reformatory for Women Alderson, Md.

WALTER H. BERRY  
 1/21/21  
 5/15/49  
 5/15/49  
 5/15/49  
 5/15/49  
 5/15/49  
 5/15/49  
 Federal Reformatory for Women  
 Alderson, Md.



GESTIÓN FINANCIERA  
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32  
Versión: 09  
2023-01-14

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento


Orden de Compra  ✓  
Acta Número

Pág. 1 De 1


CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
219004	Salamina Compartido	1301107	Reposición de Redes	118,509,594.03	840,180.00	119,349,774.00	DISTRIBUIR	79,319,859.80	40,029,914.20
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				118,509,594.00	840,180.00	119,349,774.00		79,319,859.80	40,029,914.20
TOTAL FACTURA				118,509,594.00	840,180.00	119,349,774.00		79,319,859.80	40,029,914.20

Fecha de Presentación

Páginas  Fin

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE (E)	
NOMBRE	CARGO	



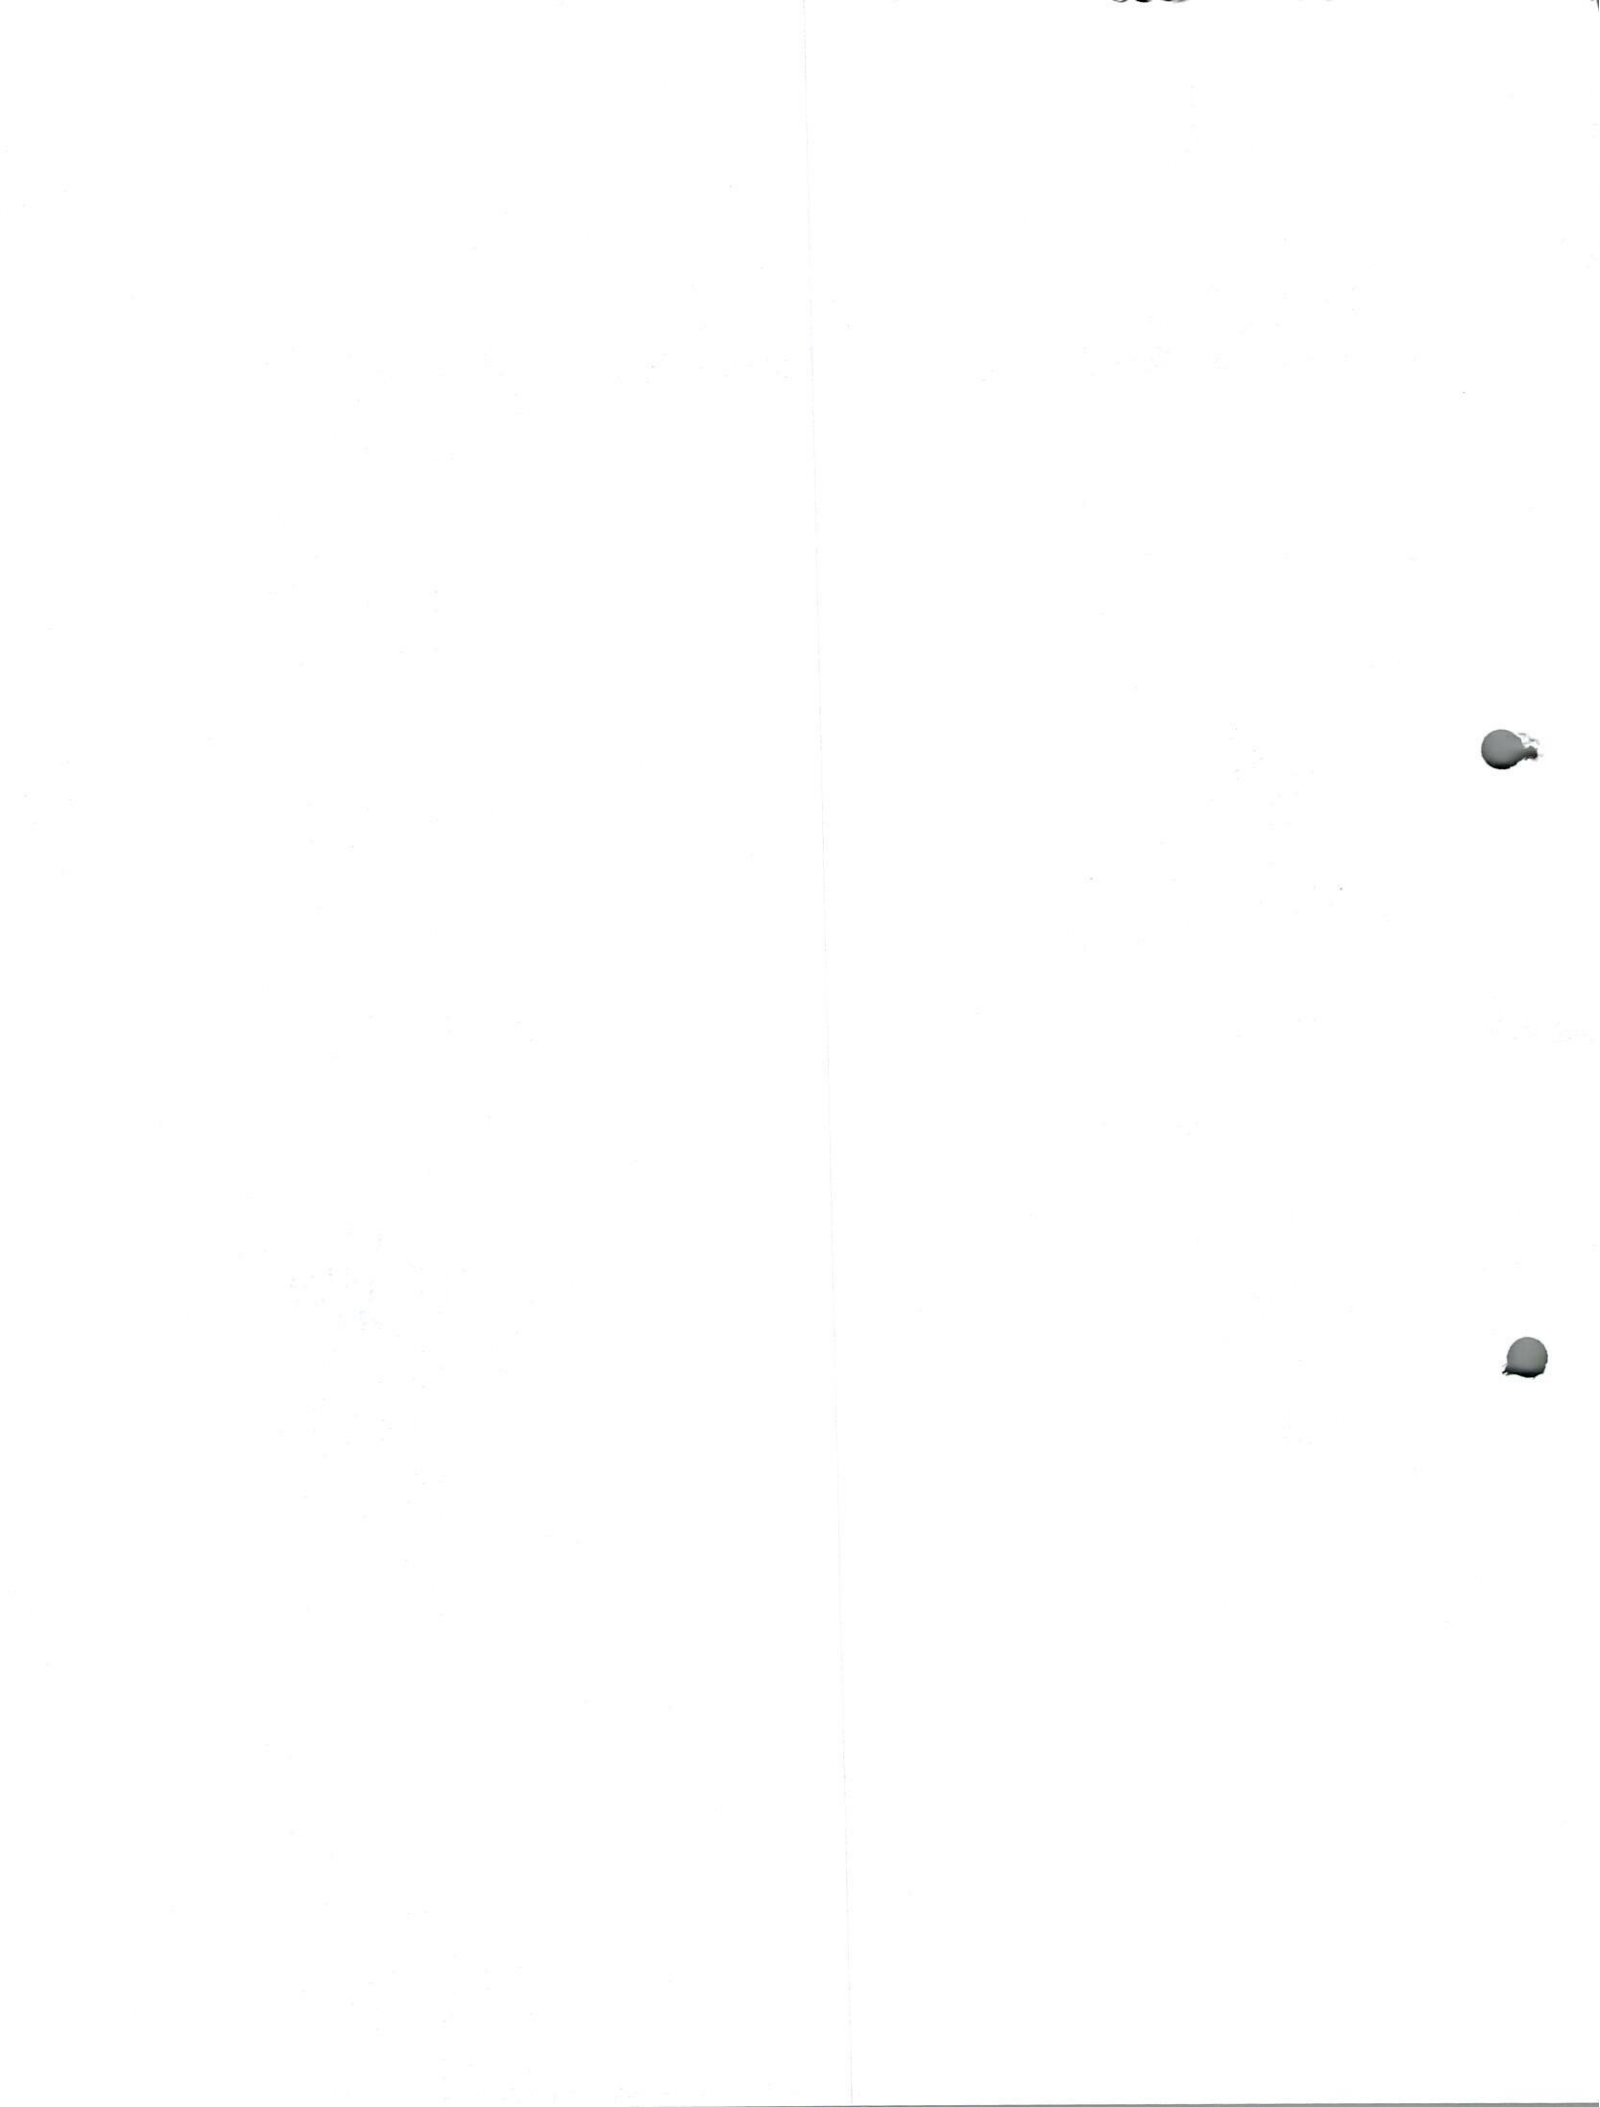

## ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 01

**CONTRATO N°:** 228 de 2023

**CONTRATISTA:** CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

**VALOR:** \$268.610.307

**ADICIÓN:** N/A

**RECURSOS:** CONVENIO 210/2023 MUNICIPIO DE SALAMINA

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2023 se reunieron los señores **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA** como contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 228 de 2023.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR DE ACUEDUCTO	Und.	\$ 198.070
NP 2	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION, PERFORACIONES Y ANCLAJE PARA BARRAS DE 3/8 INCLUYE EPOXIC	Und.	\$ 18.122

Los precios incluyen AU de 34%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


100

100

100


100

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.




---

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



---

**CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**  
CONTRATISTA




---

**JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA**  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



---

**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Jefe de planeación y proyectos  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO**

<b>NP 1 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR DE ACUEDUCTO</b>	TIPO	MEDIDA	RENDIMIENTO	PRECIOS	\$ 146.773,00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0,9	\$ 23.472,00	\$ 21.125,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0096	\$ 156.760,00	\$ 1.505,00
MATERIALES VARIOS PARA LA MOVILIZACION Y ALINEACION DEL MEDIDOR	Equipos	UND	1,03	\$ 3.446,00	\$ 3.549,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,3	\$ 3.030,00	\$ 909,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	3,9	\$ 1.586,00	\$ 6.185,00
ACARREO DE MANIZALES AL SITIO	Insumo	UND	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
CAJA RECTANGULAR HF CON LOGOTIPO	Insumo	UND	1	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
<b>AIU 34%</b>					<b>\$ 198.070,00</b>

<b>NP 2 - SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION , PERFORACIONES Y ANCLAJE PARA BARRAS DE 3/8 INCLUYE EPOXICO</b>	TIPO	MEDIDA	RENDIMIENTO	PRECIO	\$ 13.429,00
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,32	\$ 21.336,00	\$ 6.828,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0007	\$ 156.760,00	\$ 110,00
TALADRO ROTO PERCUTOR	Equipos	DIA	0,25	\$ 17.359,00	\$ 4.340,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	\$ 3.030,00	\$ 606,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,15	\$ 1.586,00	\$ 238,00
BROCA 3/8*21 HILTI	Insumo	UND	0,05	\$ 25.000,00	\$ 1.307,00
<b>AIU 34%</b>					<b>\$ 18.122,00</b>



CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA

C.C 1.053.769.363 DE MANIZALES





CONTRATO No.: 228-2023	ACTA No.: PARCIAL 01	FECHA CORTE: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS	FECHA INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIOS-SALAMINA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 268.610.307	SUSPENSIÓN: N/A.
CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	PRORROGA: N/A	REINICIO: N/A.
	SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA: 06 DE ENERO DE 2024

**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
1	DEMOLICIONES											
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomero	ml	165,00	\$ 10.943,0	\$ 1.805.595,0	0		125,70	\$ 1.375.535,0	125,70	\$ 1.375.535,0	76,18%
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	45,00	\$ 119.508,0	\$ 5.377.860,0	0		59,58	\$ 7.120.287,0	59,58	\$ 7.120.287,0	132,40%
4	EXCAVACION											
5	En material común de 0 a 2m	m³	132,00	\$ 37.749,0	\$ 4.982.868,0	0		32,40	\$ 1.223.068,0	32,40	\$ 1.223.068,0	24,55%
6	En conglomerado	m³	12,00	\$ 41.774,0	\$ 501.288,0	0		48,41	\$ 2.022.070,0	48,41	\$ 2.022.070,0	403,38%
7	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	186,00	\$ 46.975,0	\$ 8.737.350,0	0		124,19	\$ 5.833.590,0	124,19	\$ 5.833.590,0	66,77%
8	LLENOS											
9	Sub base para pavimento	m³	48,00	\$ 207.780,0	\$ 9.973.440,0	0		64,61	\$ 13.423.627,0	64,61	\$ 13.423.627,0	134,59%
10	CONCRETOS											
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m³	26,60	\$ 841.710,0	\$ 22.389.486,0	0		23,40	\$ 19.696.014,0	23,40	\$ 19.696.014,0	87,97%
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m³	35,00	\$ 1.143.080,0	\$ 40.007.800,0	0		39,78	\$ 45.471.722,0	39,78	\$ 45.471.722,0	113,66%
13	ACERO											
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapes en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	1.210,00	\$ 12.188,0	\$ 14.747.480,0	0		823,08	\$ 10.031.748,0	823,08	\$ 10.031.748,0	68,02%
NP	ITEMS NO PRESISTOS											
NP1	suministro transporte e instalación de caja hf para medidor de acueducto	UND		\$ 198.070,0		0		32,00	\$ 6.338.240,0	32,00	\$ 6.338.240,0	100,00%
NP2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION , PERFORACIONES Y ANCLAJE PARA BARRAS DE 3/8 INCLUYE EPOXICO	UND		\$ 18.122,0		0		376,00	\$ 6.813.872,0	376,00	\$ 6.813.872,0	100,00%
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 108.523.167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>\$ 119.349.773,0</b>	<b>\$ 119.349.773,0</b>				


**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
1	DEMOLICIONES											
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomero	ml	181,58	\$ 10.943,0	\$ 1.987.030,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	66,75	\$ 119.508,0	\$ 7.977.159,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
4	EXCAVACION											
5	En material común de 0 a 2m	m³	117,00	\$ 37.749,0	\$ 4.416.633,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
6	En conglomerado	m³	12,00	\$ 41.774,0	\$ 563.700,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
7	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	193,75	\$ 46.975,0	\$ 9.101.406,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
8	LLENOS											
9	Sub base para pavimento	m³	86,70	\$ 207.780,0	\$ 18.014.526,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
10	CONCRETOS											
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m³	21,00	\$ 841.710,0	\$ 17.675.910,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m³	62,20	\$ 1.143.080,0	\$ 71.099.576,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
13	ACERO											
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapes en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	2.400,00	\$ 12.188,0	\$ 29.251.200,0	0			\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 160.087.140,00</b>	<b>0,0</b>	<b>\$ 0,0</b>	<b>\$ 0,0</b>				


<b>COSTO TOTAL</b>	<b>\$ 268.610.307,0</b>	<b>\$ 0,0</b>	<b>\$ 119.349.773,0</b>	<b>\$ 119.349.773,0</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>\$ 199.044.318,0</b>	<b>\$ 0,0</b>	<b>\$ 88.439.995,0</b>	<b>\$ 88.439.995,0</b>
ADMINISTRACION %	29%	\$ 57.722.852,0	\$ 0,0	\$ 25.647.599,0
IMPREVISTOS %	0%	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
UTILIDADES %	5%	\$ 9.952.216,0	\$ 0,0	\$ 4.422.000,0
SUMA ANTES IVA		\$ 266.719.386,0	\$ 0,0	\$ 118.509.594,0
I. V. A. %	19%	\$ 1.890.921,0	\$ 0,0	\$ 840.180,0
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 268.610.307,0</b>	<b>\$ 0,0</b>	<b>\$ 119.349.774,0</b>	<b>\$ 119.349.774,0</b>
<b>TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 1</b>			<b>\$ 119.349.774,0</b>	


SON CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$119.349.774 ) MCTE.

  
CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA  
Contratista

  
Nombre: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA  
INGENIERO ZONA CENTRO NORTE  
EMPOCALDAS S.A. E.SP.



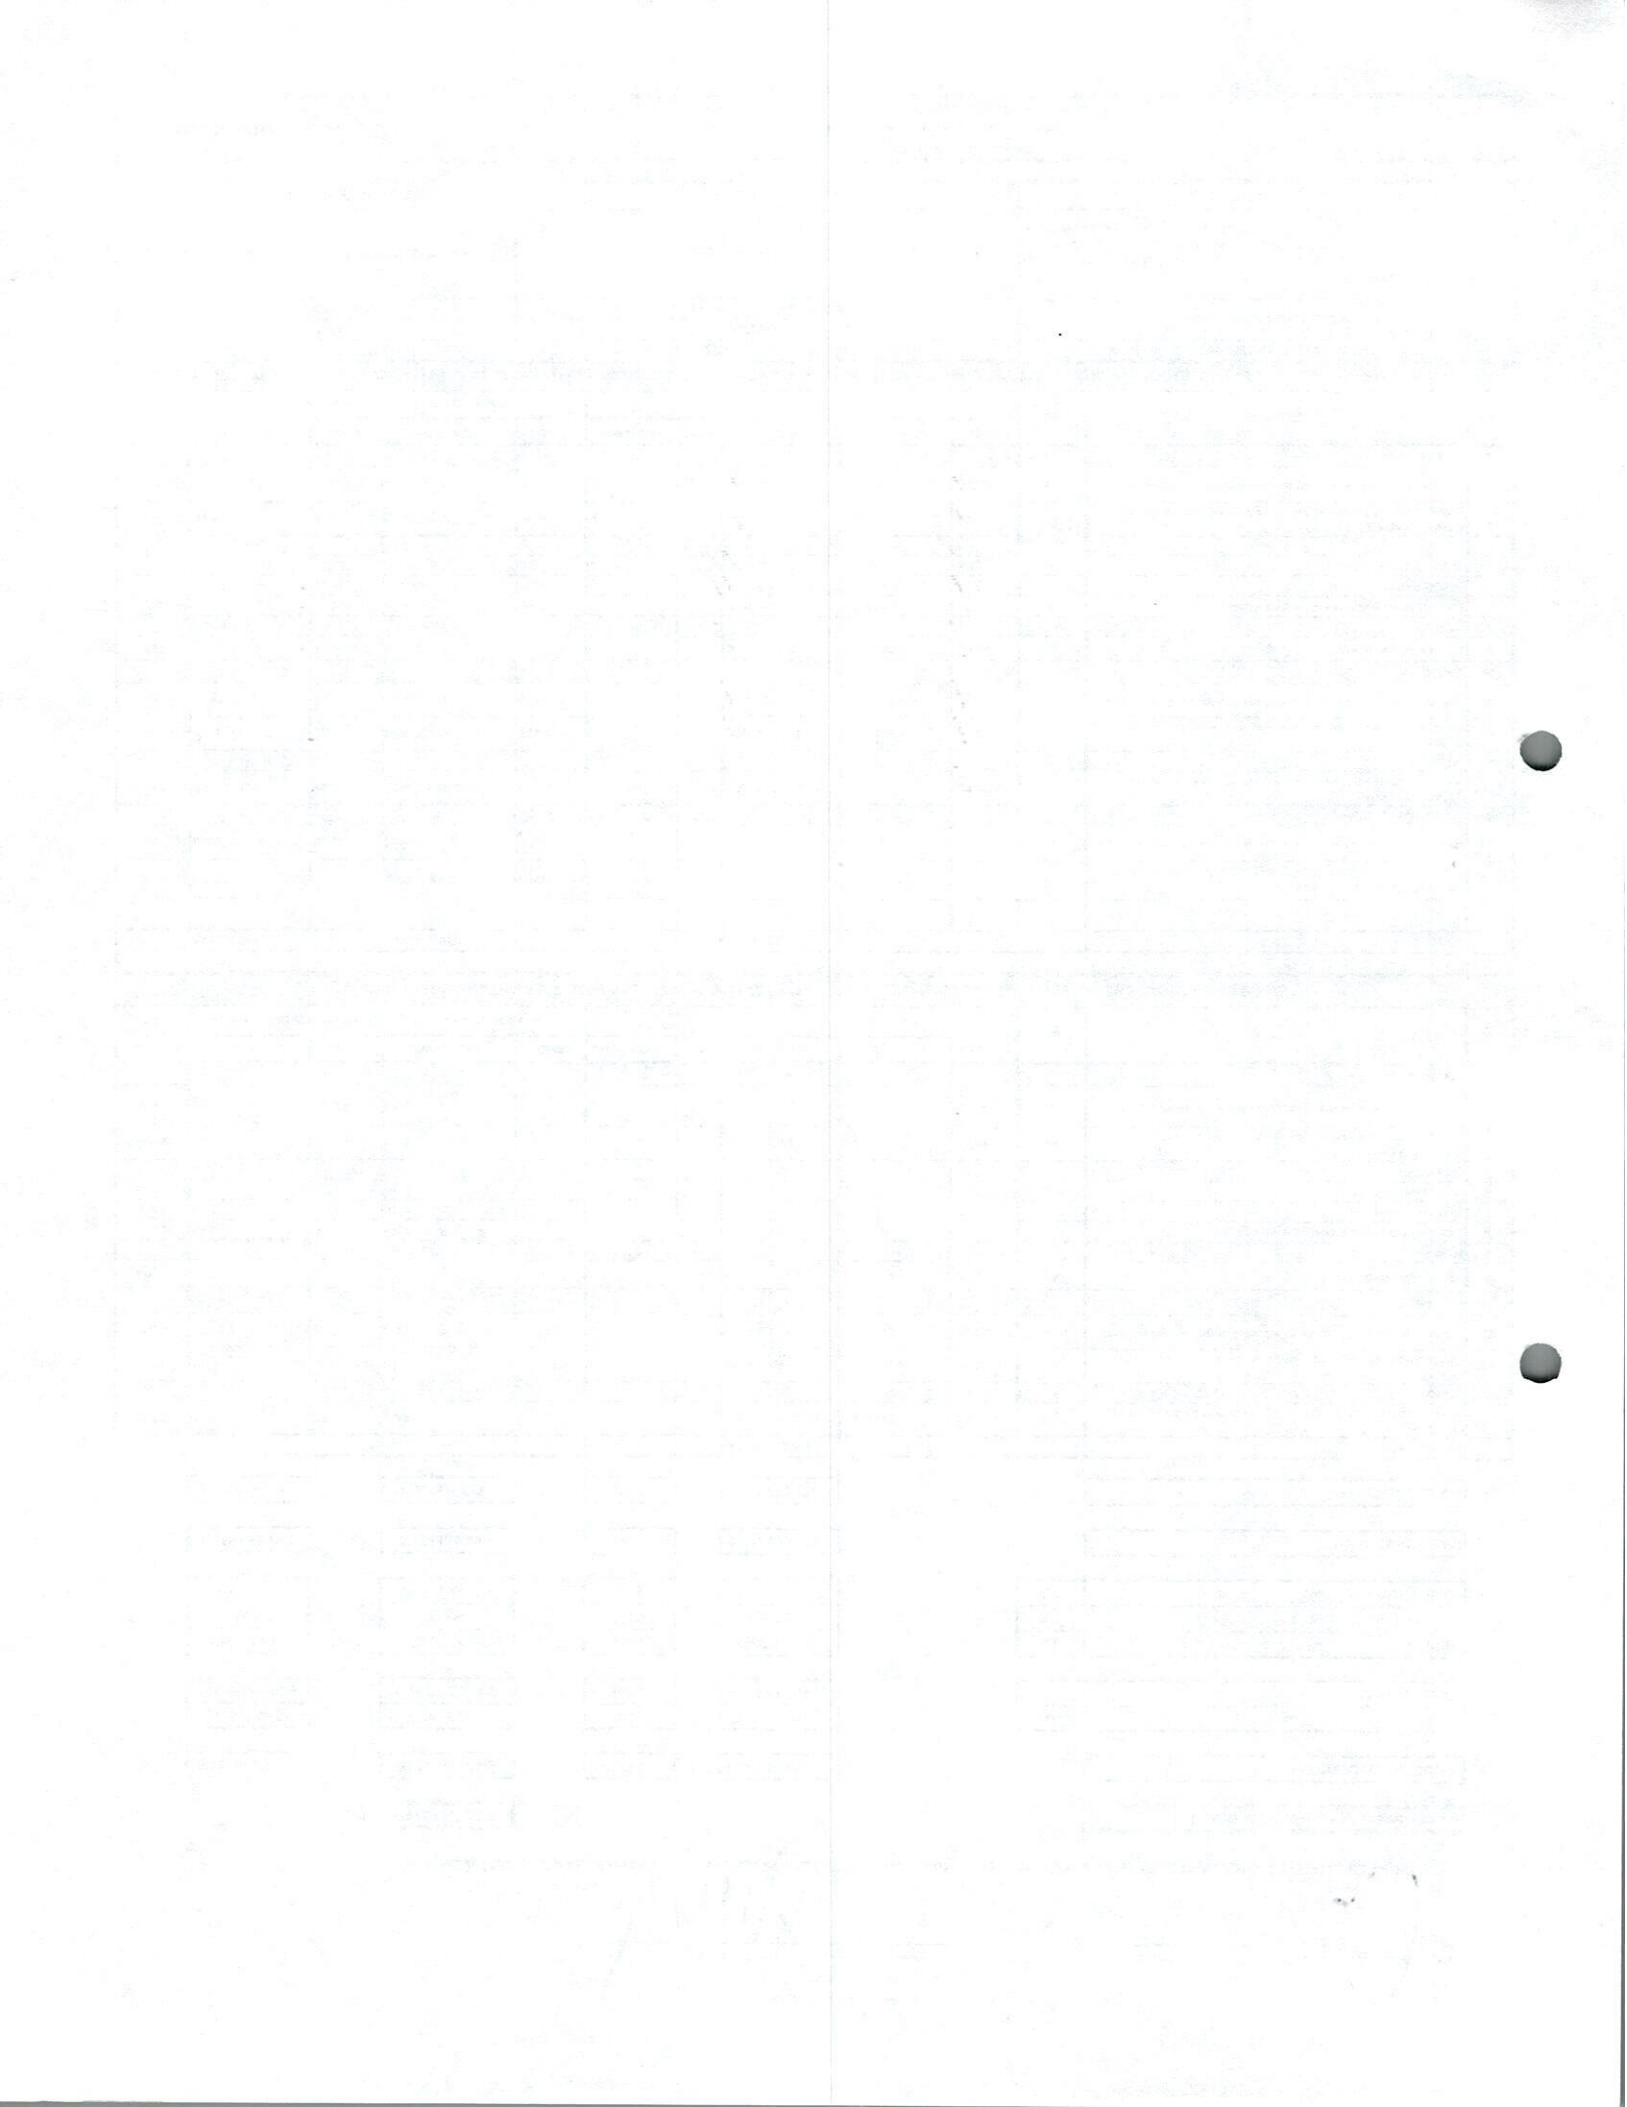

<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA- CALDAS -	<b>CONTROL CANTIDADES DE OBRA</b> INFORME PARA PAGO	
--	--	--

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

CONTRATO No: 228-2023 CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	PRE-ACTA : 1 FECHA INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
---	---

**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomero	ml	0	125,70	125,70


FECHA							ABSCISA				DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cantidad		LONGITUD	ML	ACUMULADO								
18	12			5,10	15,00		76,50	76,50	76,50							CORTES Y SELLOS JUNTAS DOS CARRILES	
18	12			39,00	1,00		39,00	39,00	115,50							CORTE Y SELLO EJE DE LA VIA	
18	12			5,10	2,00		10,20	10,20	125,70							CORTES INICIALES PARA DEMOLICION	
							0,00	0,00	125,70								
							0,00	0,00	125,70								
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>															125,70		


ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	0	59,58	59,58

FECHA										ABSCISA			DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO										
18	12			39,00	5,10	0,20	39,78	39,78	39,78							DEMOLICION PAVIMENTO VIA			
18	12			86,00	1,10	0,10	9,46	9,46	49,24							DEMOLICION ANDEN PARTE 1 - DERECHO			
18	12			86,00	1,10	0,10	9,46	9,46	58,70							DEMOLICION ANDEN PARTE 1 - IZQUIERDO			
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	58,92							DEMOLICION ANDEN ESQUINA 1			
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	59,14							DEMOLICION ANDEN ESQUINA 2			
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	59,36							DEMOLICION ANDEN ESQUINA 3			
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	59,58							DEMOLICION ANDEN ESQUINA 4			
							0,00	0,00	59,58										
							0,00	0,00	59,58										
							0,00	0,00	59,58										
							0,00	0,00	59,58										
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>															59,58				

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	En material común de 0 a 2m	m³	0	32,40	32,40

FECHA										ABSCISA			DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO										
18	12			86,00	0,90	0,20	15,48	15,48	15,48							PARA LA SUBBASE DEL ANDEN			
18	12			86,00	0,90	0,20	15,48	15,48	30,96							PARA LA SUBBASE DEL ANDEN			
18	12			2,00	0,90	0,20	0,36	0,36	31,32							PARA LA SUBBASE DEL ANDEN			
18	12			2,00	0,90	0,20	0,36	0,36	31,68							PARA LA SUBBASE DEL ANDEN			
18	12			2,00	0,90	0,20	0,36	0,36	32,04							PARA LA SUBBASE DEL ANDEN			
18	12			2,00	0,90	0,20	0,36	0,36	32,40							PARA LA SUBBASE DEL ANDEN			
							0,00	0,00	32,40										
							0,00	0,00	32,40										
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>															32,40				

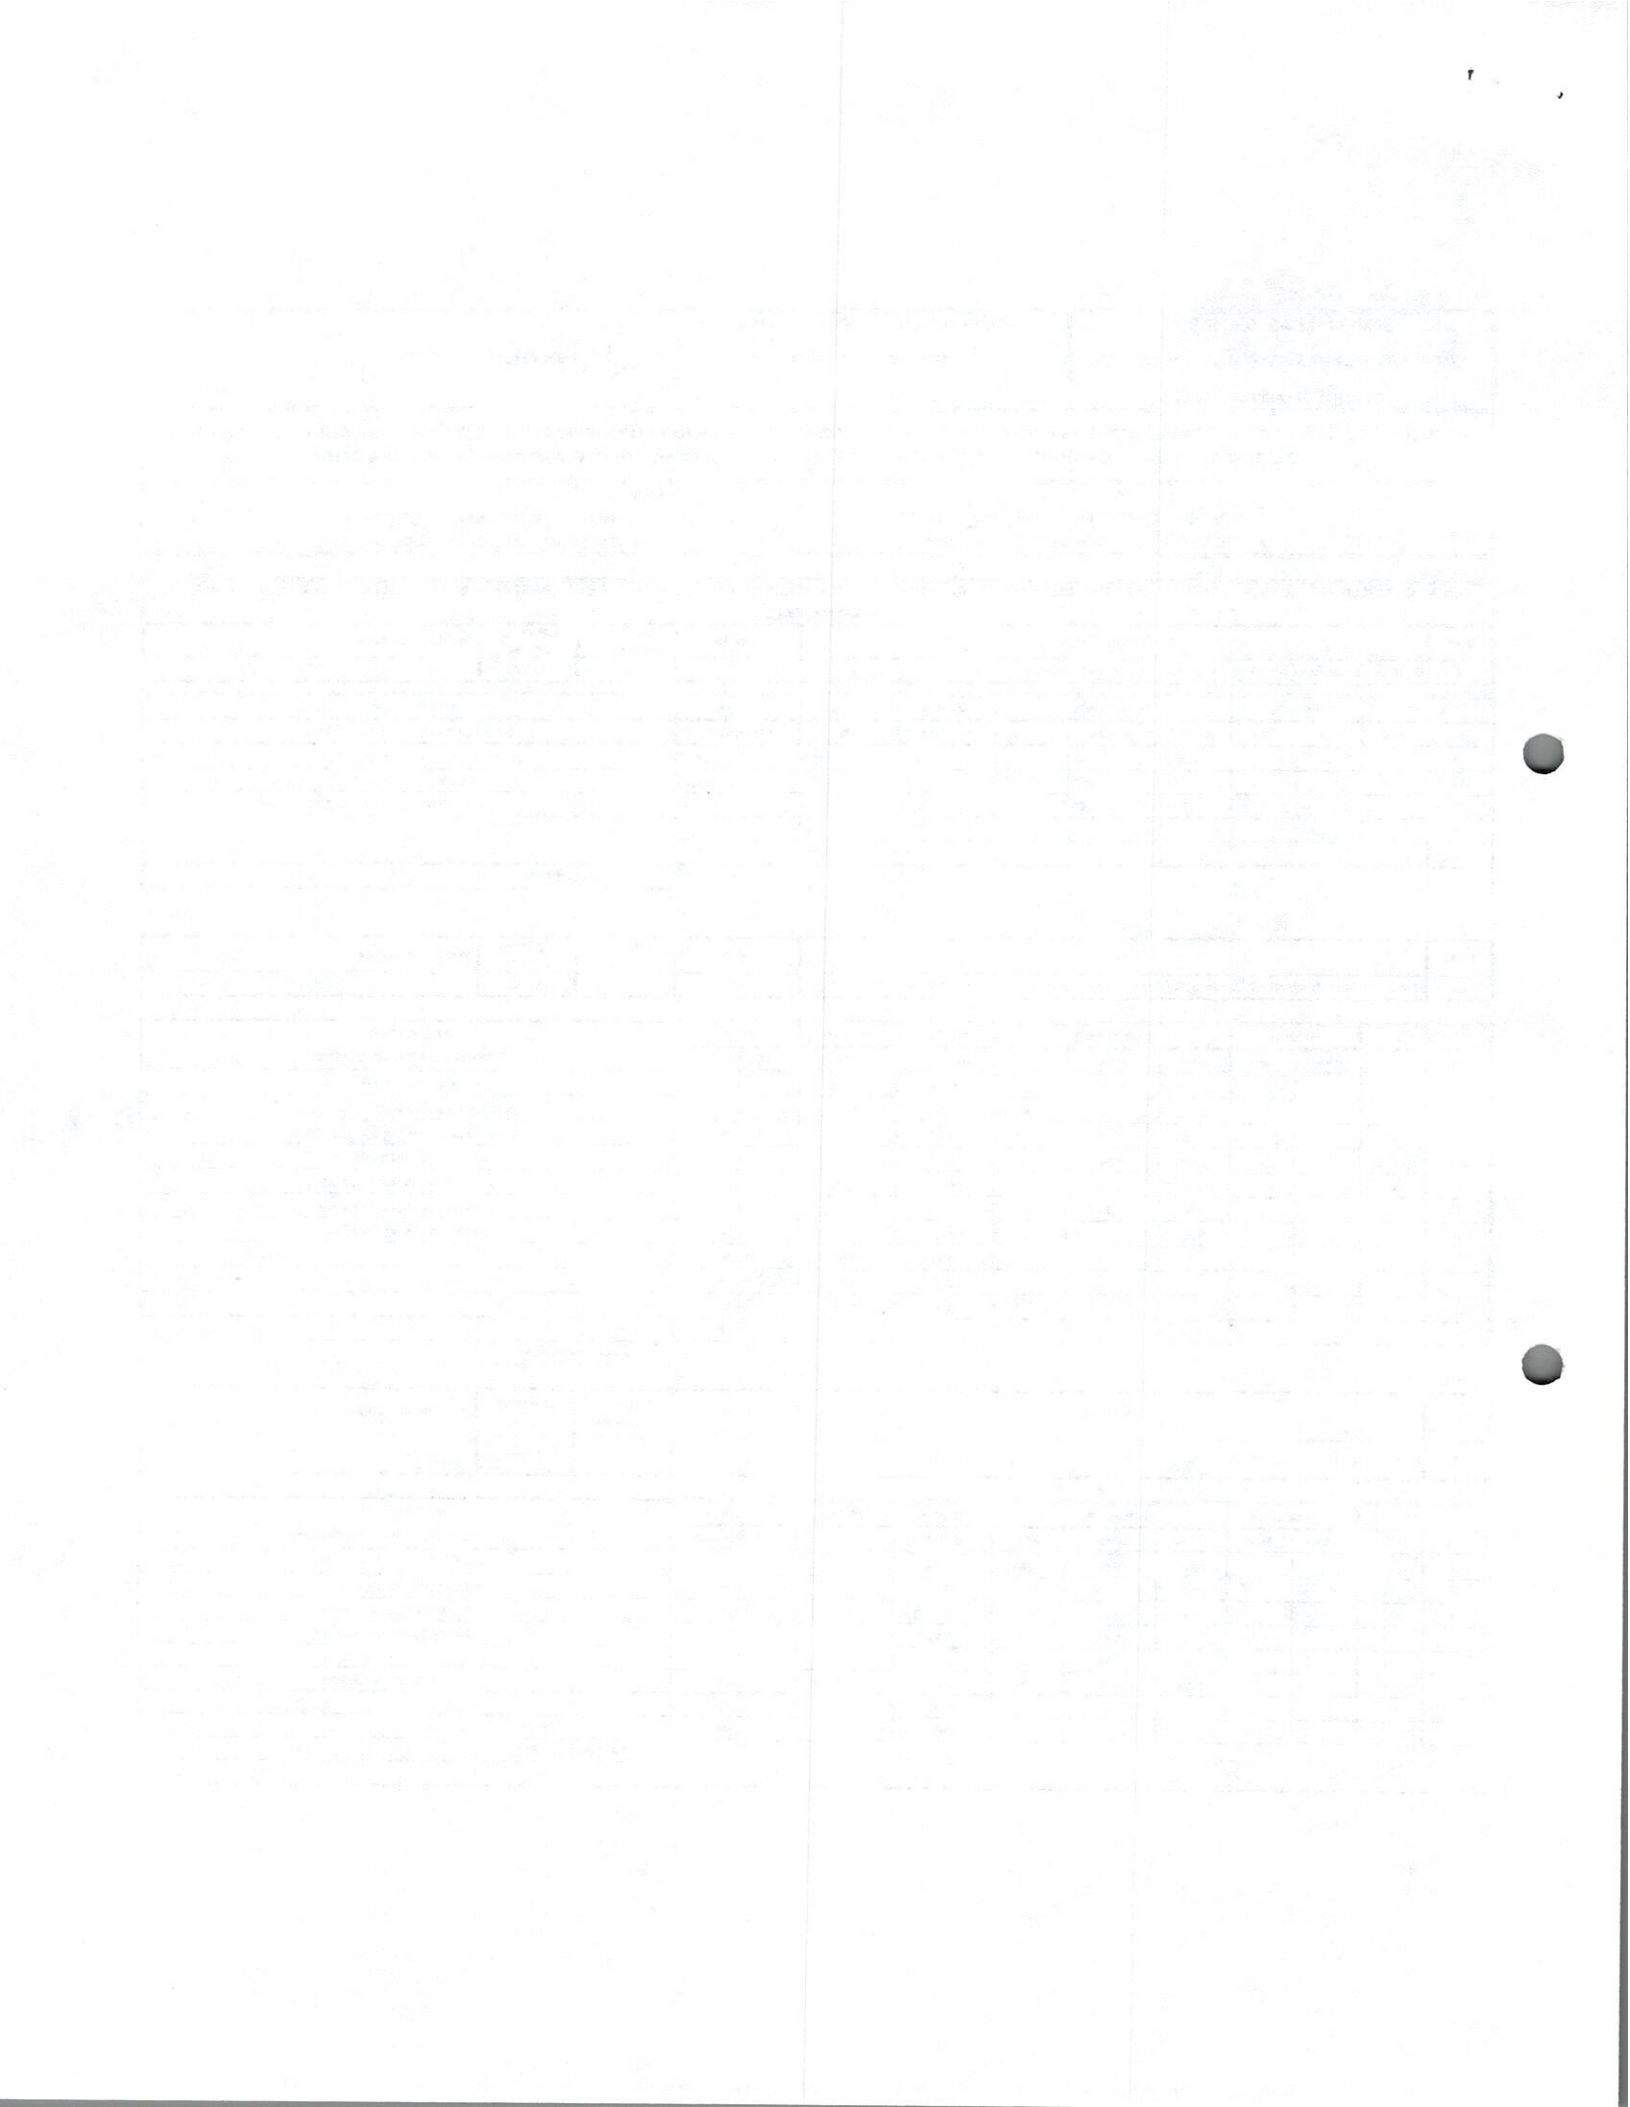

<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA- CALDAS -	<b>CONTROL CANTIDADES DE OBRA</b> INFORME PARA PAGO	
--	--	--

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

CONTRATO No: 228-2023	PRE-ACTA : 1
CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	FECHA INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEMS		UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	En conglomerado	m <sup>3</sup>	0	48,41	48,41


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO		
18	12			39,00	5,10	0,20	39,78	39,78	39,78	PARA LA SUBBASE DEL PAVIMENTO TODO EL TRAMO	
18	12			10,00	4,00	0,15	6,00	6,00	45,78	BACHE DE SUSTITUCION	
18	12			5,00	3,50	0,15	2,63	2,63	48,41	BACHE DE SUSTITUCION	
							0,00	0,00	48,41		
							0,00	0,00	48,41		
							0,00	0,00	48,41		
							0,00	0,00	48,41		
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>										48,41	


ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m <sup>3</sup>	0	124,19	124,19

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO		
18	12			39,00	5,10	0,20	39,78	39,78	39,78	DEMOLICION PAVIMENTO VIA	
18	12			86,00	1,10	0,10	9,46	9,46	49,24	DEMOLICION ANDEN PARTE 1 - DERECHO	
18	12			86,00	1,10	0,10	9,46	9,46	58,70	DEMOLICION ANDEN PARTE 1 - IZQUIERDO	
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	58,92	DEMOLICION ANDEN ESQUINA 1	
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	59,14	DEMOLICION ANDEN ESQUINA 2	
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	59,36	DEMOLICION ANDEN ESQUINA 3	
18	12			2,00	1,10	0,10	0,22	0,22	59,58	DEMOLICION ANDEN ESQUINA 4	
18	12			39,00	5,10	0,20	39,78	39,78	99,36	EXCAVACION PAVIMENTO PARTE 1	
18	12			10,00	4,00	0,15	6,00	6,00	105,36	BACHE DE SUSTITUCION	
18	12			5,00	3,50	0,15	2,63	2,63	107,99	BACHE DE SUSTITUCION	
18	12			86,00	0,90	0,10	7,74	7,74	115,73	Excavacion para anden	
18	12			86,00	0,90	0,10	7,74	7,74	123,47	Excavacion para anden	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	123,65	Excavacion para anden	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	123,83	Excavacion para anden	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	124,01	Excavacion para anden	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	124,19	Excavacion para anden	
							0,00	0,00	124,19		
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>										124,19	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Sub base para pavimento	m <sup>3</sup>	0	64,61	64,61

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO		
18	12			39,00	5,10	0,20	39,78	39,78	39,78	SUB BASE PAVIMENTO VIA	
18	12			10,00	4,00	0,15	6,00	6,00	45,78	BACHE DE SUSTITUCION	
18	12			5,00	3,50	0,15	2,63	2,63	48,41	BACHE DE SUSTITUCION	
18	12			86,00	0,90	0,10	7,74	7,74	47,52	SUB BASE ANDEN PARTE 1 - DERECHO	
18	12			86,00	0,90	0,10	7,74	7,74	55,26	SUB BASE ANDEN PARTE 1 - IZQUIERDO	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	55,44	SUB BASE ANDEN ESQUINA 1	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	55,62	SUB BASE ANDEN ESQUINA 2	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	55,80	SUB BASE ANDEN ESQUINA 3	
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	55,98	SUB BASE ANDEN ESQUINA 4	
							0,00	0,00	55,98		
							0,00	0,00	55,98		
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>										64,61	

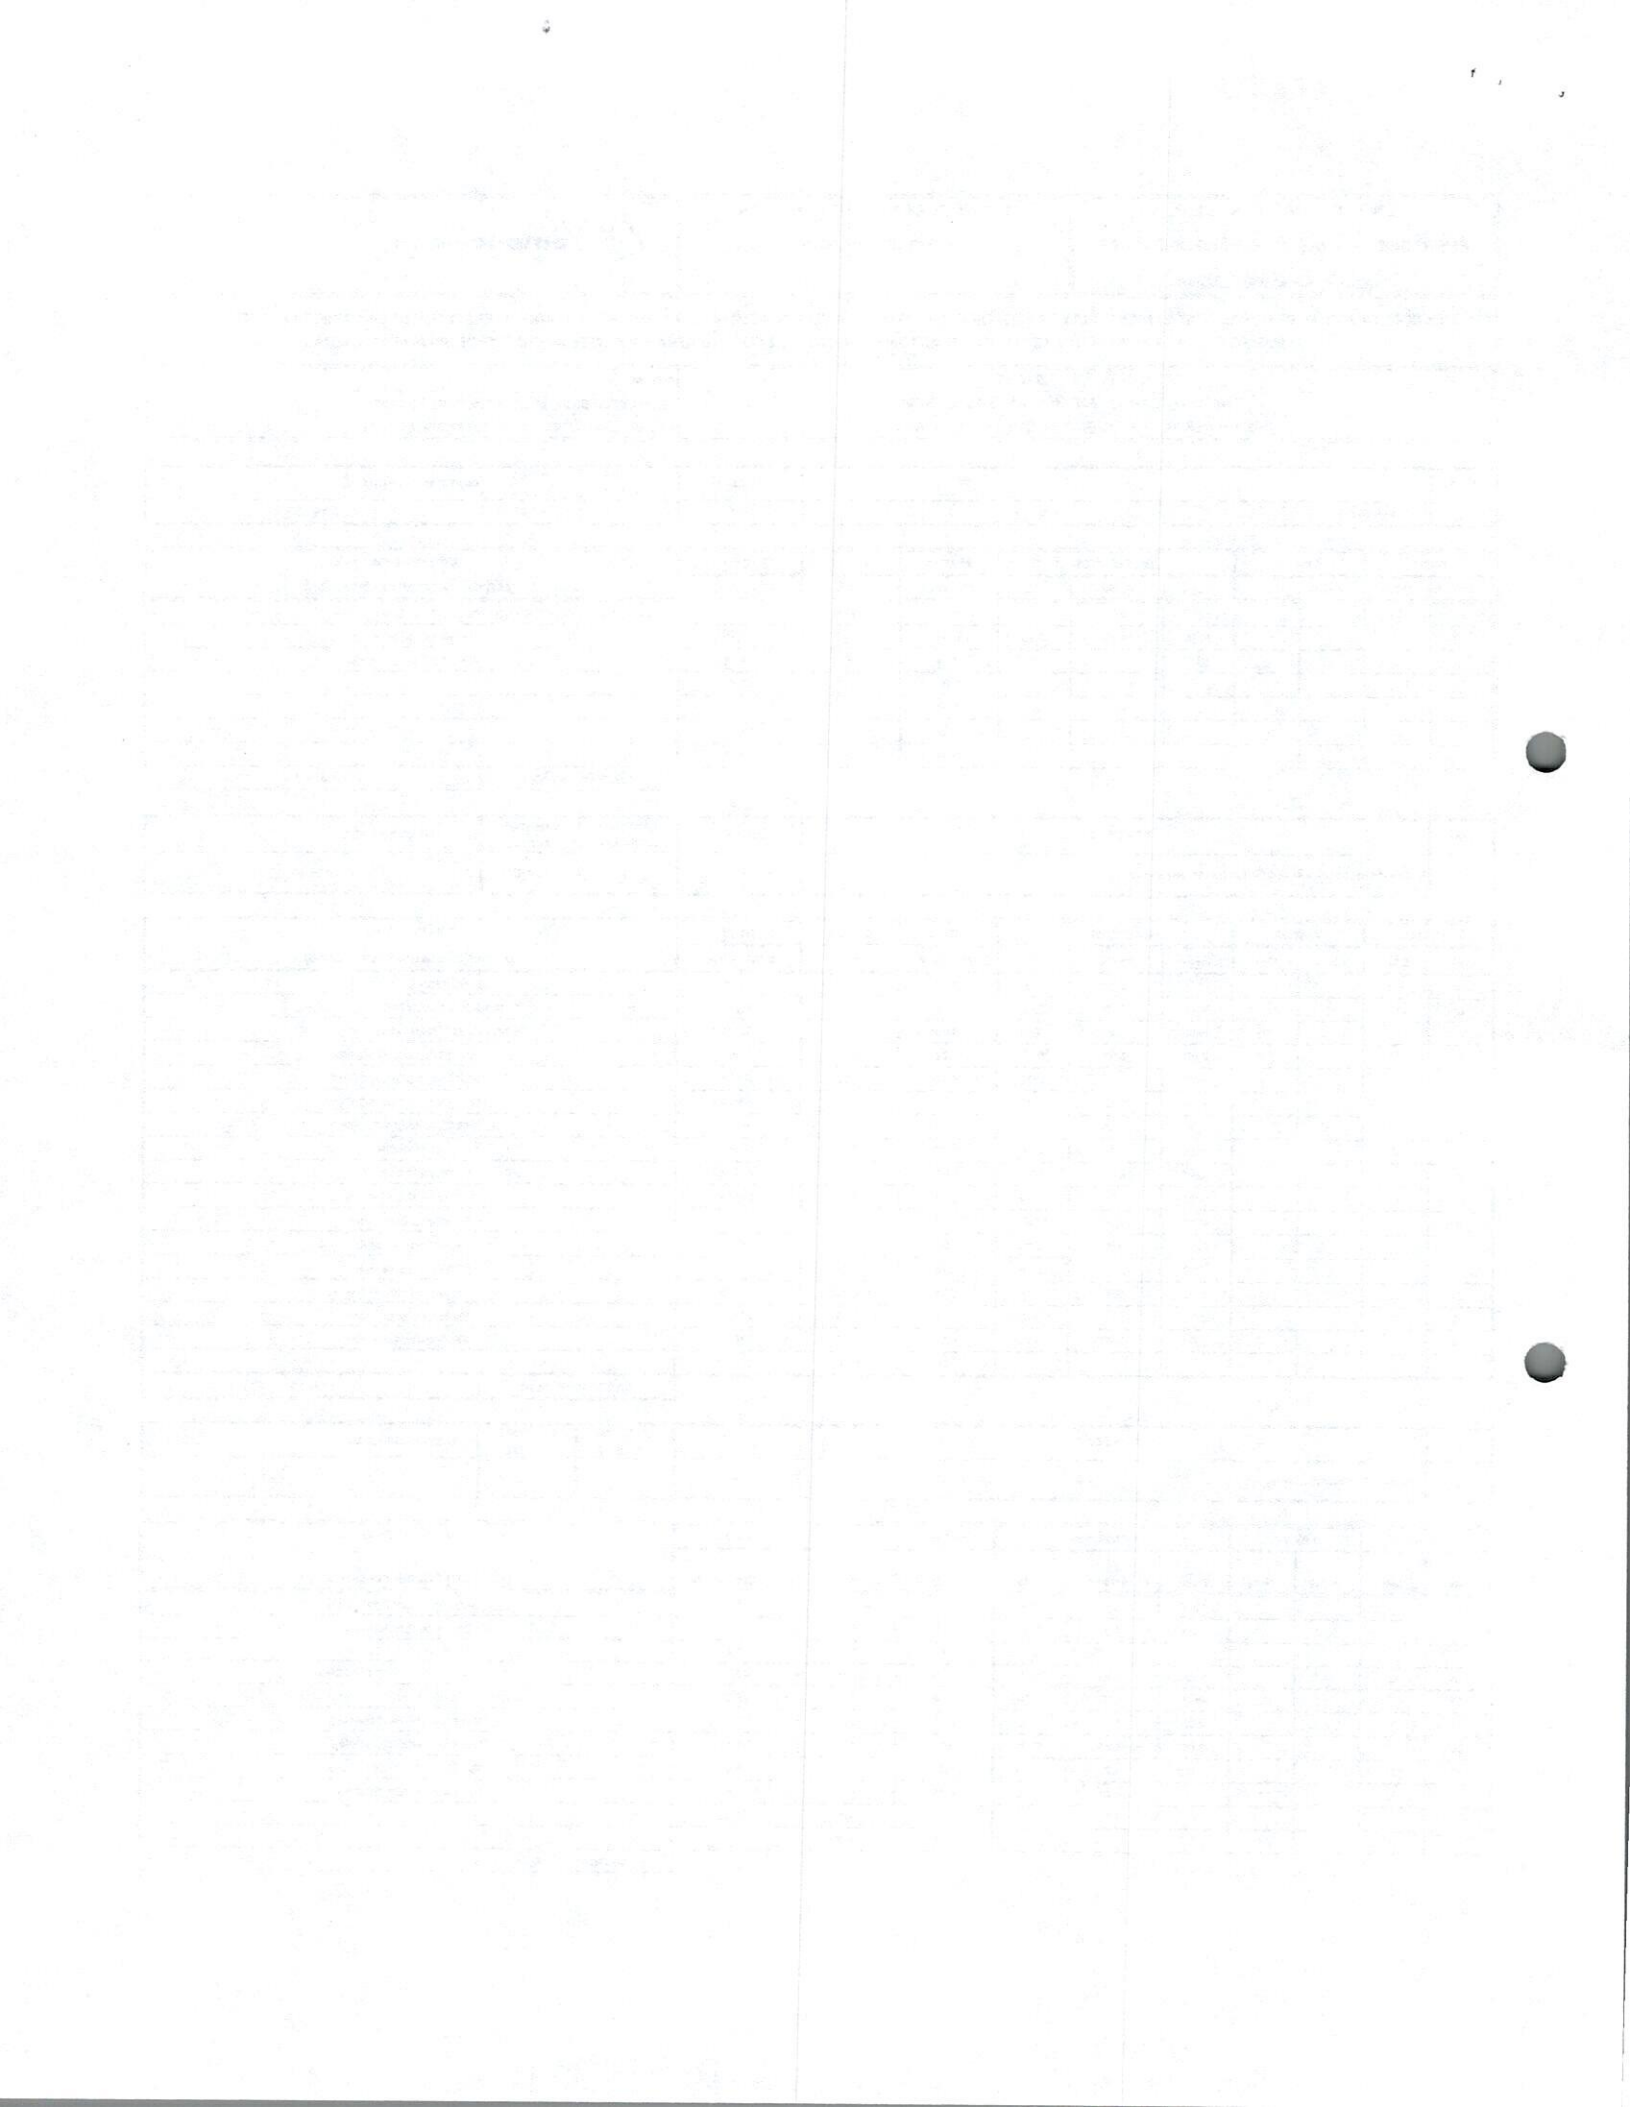

<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA- CALDAS -	<b>CONTROL CANTIDADES DE OBRA</b> INFORME PARA PAGO	
--	--	--

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

CONTRATO No: 228-2023	PRE-ACTA : 1
CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	FECHA INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m <sup>3</sup>	0	23,40	23,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
18	12			86,00	0,90	0,10	7,74	7,74	7,74	ANDEN PARTE 1 - DERECHO
18	12			86,00	0,90	0,10	7,74	7,74	15,48	ANDEN PARTE 1 - IZQUIERDO
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	15,66	ANDEN ESQUINA 1
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	15,84	ANDEN ESQUINA 2
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	16,02	ANDEN ESQUINA 3
18	12			2,00	0,90	0,10	0,18	0,18	16,20	ANDEN ESQUINA 4
18	12			180,00	0,20	0,20	7,20	7,20	23,40	SARDINELES
CANTIDAD DE PAGO									23,40	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m <sup>3</sup>	0	39,78	39,78


FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
18	12			39,00	5,10	0,20	39,78	39,78	39,78	PAVIMENTO VIA
							0,00	0,00	39,78	
							0,00	0,00	39,78	
							0,00	0,00	39,78	
							0,00	0,00	39,78	
							0,00	0,00	39,78	
CANTIDAD DE PAGO									39,78	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	0	823,08	823,08

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	CANT	KG/M	PESO	KILO	ACUMULADO	
18	12			0,40	135,00	3,00	162,00	162,00	162,00	DOVELAS CARRIL DERECHO
18	12			0,40	135,00	3,00	162,00	162,00	324,00	DOVELAS CARRIL IZQUIERDO
18	12			38,25	2,00	2,00	153,00	153,00	477,00	CANASTILLAS
18	12			1,50	39,00	1,00	58,50	58,50	535,50	PASADORES
18	12			86,00	2,00	1,00	172,00	172,00	707,50	HORIZONTAL SARDINELES
18	12			688,00	0,30	0,56	115,58	115,58	823,08	VERTICAL SARDINELES
							0,00	0,00	823,08	
							0,00	0,00	823,08	
							0,00	0,00	823,08	
CANTIDAD DE PAGO									823,08	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP1	suministro trasporte e instalacion de caja hf para medidor de acueducto	UND	0	32,00	32,00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	CANT		CANTIDAD	UNIDADES	ACUMULADO	
18	12				17,00		17,00	17,00	17,00	instalacion de cajas nuevas para medidores sobre anden derecho
18	12				15,00		15,00	15,00	32,00	instalacion de cajas nuevas para medidores sobre anden izquierdo
							0,00	0,00	32,00	
							0,00	0,00	32,00	
							0,00	0,00	32,00	
							0,00	0,00	32,00	
							0,00	0,00	32,00	
							0,00	0,00	32,00	
CANTIDAD DE PAGO									32,00	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA- CALDAS -	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	
---	---	--

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No: 228-2023	PRE-ACTA : 1
CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	FECHA INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP2	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION , PERFORACIONES Y ANCLAJE PARA BARRAS DE 3/8 INCLUYE EPOXICO	UND	0	376,00	376,00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD		MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	CANT	CANTIDAD	UNIDADES	ACUMULADO	
18	12				188,00	188,00	188,00	188,00	perforaciones para construccion de sardinel lado derecho
18	12				188,00	188,00	188,00	376,00	perforaciones para construccion de sardinel lado izquierdo
						0,00	0,00	376,00	
						0,00	0,00	376,00	
						0,00	0,00	376,00	
						0,00	0,00	376,00	
						0,00	0,00	376,00	
						0,00	0,00	376,00	
								CANTIDAD DE PAGO	376,00

**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico	ml	0	0,00	0,00


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
								CANTIDAD DE PAGO	0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
								CANTIDAD DE PAGO	0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	En material común de 0 a 2m	m³	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
								CANTIDAD DE PAGO	0,00	

<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA- CALDAS -	<b>CONTROL CANTIDADES DE OBRA</b> INFORME PARA PAGO	 <small>Comprometiendo siempre su bienestar</small>
--	--	---

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No: 228-2023	PRE-ACTA : 1
CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	FECHA INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	En conglomerado	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	


ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Sub base para pavimento	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	



<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA- CALDAS -	<b>CONTROL CANTIDADES DE OBRA</b> <b>INFORME PARA PAGO</b>	
--	---	--

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS**

CONTRATO No: 228-2023	PRE-ACTA : 1
CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	FECHA INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Concreto para pavimento 4ZMR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m³	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	TODO EL TRAMO DE PAVIMENTO
							0,00	0,00	0,00	PARTE BAHIA
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapes en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	CANT	KG/M	PESO	KILO	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

06-02-2024

FE

FE30

Factura electrónica

1053769363

Carlos Andrés Masso ...

890803239

EMPOCALDAS SA EPS

Aprobado con notificación

Factura Electrónica

5119,349,774
