
	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0240 DE 2020	Acta N°	1 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	134.170.180
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	134.170.180
NIT O CC	900.037.096-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00736 DEL 09/09/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	105.760.805
RP (#, rubro y fecha)	000867 DEL 28/10/2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	28.409.375
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE LA ADUCCIÓN SAN JUAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS	X	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e CBF, cuando aplique	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora	N/A	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A. 
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	X
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87069996517	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 90007095	1	CONSTRUCION INGENIERIA SAS	8	20	SEGUROS COLPATRIA - 114	4111	JURIDICA		
MUNIDEP	17-1	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
		CLL 22 2140	8003942	construccioningenieria@gmail.com					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-12	19337838	E	2020-12-23	19-MARQUETAJUA240	TOCOS	TOCOS	1.332.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	RET. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	19337838	2020-12-23	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	4.301.241	IBC SALUD	4.301.241
IBC RIESGOS	4.301.241	IBC CAJAS	4.301.241
IBC PARAF		IBC PARAF	0

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP (Administradoras: 3)				7	688.800	0	0	688.800	
PROTECCION	230201	800229739	0	1	98.400	0	0	98.400	
PORVENIR	230301	800224808	8	4	393.600	0	0	393.600	
COLFONOS	231001	800227840	6	2	186.800	0	0	186.800	
EPS (Administradoras: 6)				7	172.200	0	0	172.200	
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	24.600	0	0	24.600	
CODINEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	24.600	0	0	24.600	
FAMISANAR	EPS017	830035864	7	1	24.600	0	0	24.600	
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	24.600	0	0	24.600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	2	49.200	0	0	49.200	
ESSC ASMET SALUD	ESSCR2	900935126	7	1	24.600	0	0	24.600	
ARPA (Administradoras: 1)				7	289.600	0	0	289.600	
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	298.600	0	0	298.600	
CCF (Administradoras: 1)				7	172.200	0	0	172.200	
CCF DE CALDAS	CCF11	880806490	5	7	172.200	0	0	172.200	
Gran Total				7	1.332.800	0	0	1.332.800	



Reporte: Cambio Contratación Salud Segura

Resumen de Pago - FIC

RESUMEN DE PAGO, CONCEPTO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 00000000000000000000

Primer Nombre ó Razón Social: CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural): CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento: NIT

Digito de Verificación (Si es persona Jurídica): 1

Naturaleza Jurídica: Empresa, sociedad, empresa

Departamento: CAJICHA

Ciudad Capital: MANIZALES, CAJICHA

Dirección de Domicilio: Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE

Ciudad de Domicilio: Manizales

Localización: Manizales

Teléfono de Contacto: 3127652283

Correo electrónico: construtopingeneria@gmail.com

Código SIIF: 00000000000000000000

Regional: CAJICHA

Regional Centros SIIF: CAJICHA (00000000000000000000)

Número Licencia de Obra: 0240

Número Contrato de Obra: 0240

Nombre Obra: ADUCCIÓN SAN JUAN MARQUETALIA

Fecha Inicio Obra: 11/11/2020

Fecha Terminación Obra: 30/11/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: MARQUETALIA

Tipo FIC: FIC - II

Año Periodo a Pagar: 2020

Mes Periodo a Pagar: NOVIEMBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: 10.00

Costo Total Mano de Obra: 10.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 7

Valores Intereses Moratorios: 0.00

Aporte FIC: \$153.610.00

Aporte SENA: \$5.00

Valor del Pago: \$158.610.00

Total Pagado: \$153.610.00

Total a Pagar: \$153.610.00

Verifique sus datos antes de realizar el pago

Débito desde cuenta corrientes/ahorro



Pago con cuentas corrientes/ahorro de bancos en Colombia. Requiere que Usted tenga lengua habilitado el servicio con su banco para realizar transacciones en Internet.

Seleccione Entidad Financiera

Por favor seleccione tipo de persona:

- Portal Personas
- Portal Corporativo

Pago en Efectivo

BANCOLOMBIA

Imprimir el cupón y acercarse a las sucursales de la entidad bancaria correspondiente. Recuerde imprimir su cupón en una resolución de alta calidad

Pago con Cheque

BANCOLOMBIA

Imprimir el cupón y acercarse a las sucursales de la entidad bancaria correspondiente. Recuerde imprimir su cupón en una resolución de alta calidad

Recuerde verificar si el dinero fue debitado de su Cuenta Bancaria
Por seguridad no interrumpa la operación mientras se comunica con la Entidad Financiera.

Continuar

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 153.616,00

Número de aprobación
00570423

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
28/12/2020

Referencia 1
172.31.17.8

Hora del pago
04:18 PM

Referencia 2
01

Número de producto origen
*****6517

Referencia 3
CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
844570423

CONSTRUTOP INGENIERIA SAS

Regimen Común NIT. 900037096 -1
Calle 58 A No 24 - 28 Tel: 8914477 Cel 320-6939832
construtopingeneiria@gmail.com

Factura electrónica de venta No. ACP20

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS SA ESP		28/12/2020	\$ 105.760.805,00
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 23 75-82		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :		28/12/2020	
CIUDAD : MANIZALES		PAIS : COLOMBIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309501	COSTO DIRECTO		\$ 78.370.364,00		\$ 78.370.364,00
41309502	ADMINISTRACION		\$ 18.808.887,00		\$ 18.808.887,00
41309503	IMPREVISTOS		\$ 3.918.518,00		\$ 3.918.518,00
41309504	UTILIDAD		\$ 3.918.518,00		\$ 3.918.518,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 105.016.287,00	CxC # 1	Vence: 28/12/2020	\$ 105.760.805,00
IVA liquidado	\$ 3.918.518,00	19,00%	\$ 744.518,00			
VALOR TOTAL :			\$ 105.760.805,00			

VALOR (en letras) : CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Autorretención de renta (CREE 0.8%)
Resolución DIAN: 18764006913891. Prefijo: ACP. Rango: 1 al 300. Vigencia: 4/11/2020 hasta 4/11/2021.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 28/12/2020.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

XEliYiDybnGjLHfasnd6COStmHu9IKI+hXvd+N15D3XbPNOJ1PQYiT6551S2YbmUymzzz/33GjbjUV7eUd5FXmIE6nkaxL48ulwCy+3N317BxmymKiCeoQK
HD/68uTYRr/2u2VyL2iu5aw5HGociBwlfyNRXNeUcyu4b3o2MBE+3akCYhYQZATSRxwfm7E5OW20NhmKDXnrkJKvb1OlxJU2IJBAlOg9DypjntIToolY0jYeV
pCyo/h7TZJWl/vbXsjHhLqoZMS4eD4WWTEb1yGk7MlrDRmoG+rSLYikfu9j7owqYR3SZULfnd7i2eXZH0r6WTEuchHXvgaig==

CUFE: 1b3c9843b1841ddc99b2b77c22e9420edc2cc09eb4d95faacd2f7f633db385c67d0adefc5e0adfdf31838a8f8d255c1b

Fecha emisión: 2020-12-28 15:00:41

Fecha validación DIAN: 2020-12-28 15:34:08-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

EMPRESA
NIT
FECHA

9 A Z Z D E N O V D E 2 0 2 0

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPORTE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud			Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRE FUNCIONARIO	APELLIDOS	CARGO						8,5%	4,0%	12,00%	4,00%			
1	1599701020	Carlos A. Grimaldo	Grimaldo	AY	877.808	14	409.641	47.999	457.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>	
2	1174020	Uzuel M. Grando	Grando	AY	"	14	409.641	47.999	457.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>	
3	1055911381	Juan C. Ramirez	Ramirez	AY	"		409.641	47.999	457.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	Juan Carlos R	
4	1061016610	Daniel R. Vivas	Rivas	AY	"		409.641	47.999	457.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	Daniel R	
5	1142655335	Moto	Lepe	AY	"		409.641	47.999	457.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	Moto	
6	1655916408	Diego	Ramirez	AY	"		409.641	47.999							Diego	
7																
8																
														425.000		

->


EMPRESA

NIT

FECHA

DEL 23 DE JUNIO AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal			Días	Salario		Auxilio	Devengado	Salud			Pensión			NETO A PAGAR	FIRMA
		NOMBRE FUNCIONARIO	AFELUIDOS	CARGO		SUELDO	VLR DIAS TRABAJADOS			TRABAJADOS	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	8,5%	4,0%	12,00%		
1	15990414	Carlos A	6. radio	AY	877.803	1A	809.641	877.999	877.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>		
2	15991771	Uribe	6. radio	AY	877.803	1A	809.641	877.999	877.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>		
3	165591389	Diego C.	6. radio	AY	877.803	1A	809.641	877.999	877.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>		
4	106104680	Daniel	6. radio	AY	877.803	1A	809.641	877.999	877.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>		
5	114355336	Metz	6. radio	AY	877.803	1A	809.641	877.999	877.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>		
6	1055916408	Diego	6. radio	AY	877.803	1A	809.641	877.999	877.640	16.386	16.386	16.386	16.386	425.000	<i>[Signature]</i>		
7																	
8																	
														2.450.000			

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	10/12/2020	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0240/2020
Objeto:	Reposición de la aducción san Juan ubicada en el Municipio de Marquetalia Caldas
Nombre Contratista:	Construtop Ingeniería s.a.s
Representante legal:	Álvaro castaño pineda
Fecha del contrato:	28 de octubre del 2020
Plazo de ejecución:	30 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 134.170.180
Fecha de iniciación:	11 de noviembre del 2020
Fecha de suspensión:	08 de diciembre de 2020
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	10 de diciembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	79 %
Avance físico Acumulado	79 %


1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Marquetalia	Acueducto	1.032

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	19
Avance Porcentual:	63%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

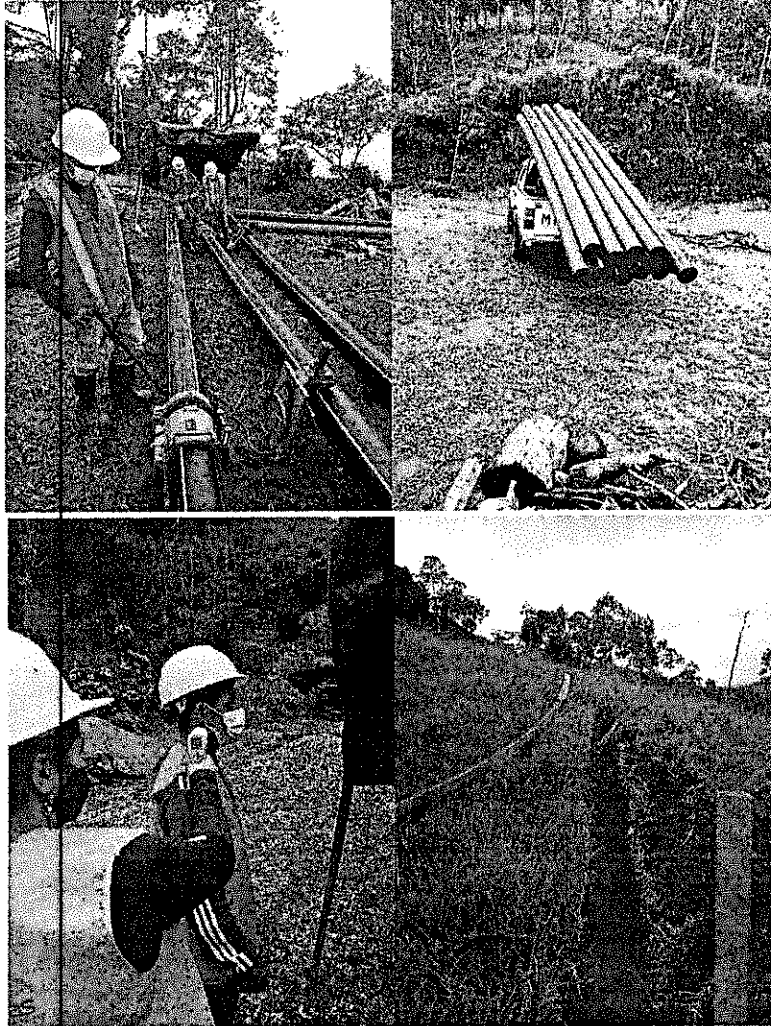


1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas dentro de la ejecución de la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 134.170.180
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 105.760.805
Porcentaje ejecutado en el periodo:	79 %
Inversión total ejecutada:	\$ 105.760.805
Porcentaje total ejecutado:	79 %

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-45-10104501	11/11/2020	14/03/2021	\$40.251.054.00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	SEGUROS DEL ESTADO S. A	42-45-101045501	11/11/2020	12/12/2023	\$ 26.834.036.00
Estabilidad y calidad de la obra	SEGUROS DEL ESTADO S. A	42-45-101045501	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 26.834.036.00
Responsabilidad civil extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S. A	42-40-101034719	11/11/2020	14/03/2021	\$ 40.251.054.00

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)


NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Carlos Alberto Giraldo	X	X	X	X	X
Víctor Manuel Giraldo	X	X	X	X	X
Diego Ramírez	X	X	X	X	X
Juan Carlos Ramírez	X	X	X	X	X
Edison Gómez	X	X	X	X	X
Daniel Rivera	X	X	X	X	X
Mateo López	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
16/11/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del Municipio de Marquetalia Caldas


	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra		x
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		x
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GF-32
Versión 2
Julio 2019

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

0240 DE 2020

Acta N°

1 PARCIAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1310130	MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	105.016.287	744.518	105.760.805

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

105.016.287

744.518

105.760.805

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE

INGENIERO DE ZONA
CARGO

FIRMA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P											
CONTRATO No: 0240 DEL 2020			ACTA No: 1 PARCIAL			FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020					
OBJETO: REPOSICIÓN DE LA ADUCCIÓN SAN JUAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS			FECHA INICIACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020			FECHA VENCIMIENTO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020					
MUNICIPIO: MARQUETALIA CALDAS			VALOR CONTRATO: \$ 51.584.037			VALOR CONTRATO + ADICION:					
CONTRATISTA: CONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S			VALOR OBRA: \$ 49.656.633								
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO CASTAÑO PINEDA			SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ			FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2020					
REPOSICIÓN ADUCCIÓN DE 8" EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA LA QUIEBRA MUNICIPIO DE MARQUETALIA											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 PARCIAL			% EJECUT			
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL				
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo	ml	400	997	398.800	492.00	490.524	123%			
1.2	Instalación de Valla institucional de 4 x 2	un	1	771.839	771.839	-	-	0%			
2	EXCAVACION										
2.1	En material Común 0 a 2 m	m3	200	27.812	5.562.400	221.14	6.150.346	111%			
2.2	En roca	m3	60	45.443	2.726.580	-	-				
2.3	Dispersión de material sobrante	m3	20	23.250	465.000	20	465.000	100%			
3	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO										
3.1	Instalación de tubería de polietileno de 8" PN 16	ml	400	54.835	21.934.000	492	26.978.820	123%			
3.2	Instalación de portaflechas	un	4	249.250	997.000	4	997.000				
3.3	Empalme a tubería existente	un	2	1.096.700	2.193.400	2	2.193.400	100%			
3.4	Instalación de válvula de 3"	un	1	179.460	179.460	1	179.460	100%			
3.5	Instalación de ventosas de 1"	un	2	348.950	697.900	2	697.900	100%			
3.6	Anciaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metalicos de 2 m largo c/u y alambre galvanizado	un	2	563.305	1.126.610	2	1.126.610	100%			
3.7	Sobre acarreo de tubería del lugar donde la deja el vehiculo al sitio	tubo	66.7	24.925.00	1.662.498	82	2.043.850	123%			
3.8	Cajas en concreto para valvulas y ventosas	un	3	1.345.950	4.037.850	-	-	0%			
4	LLENOS										
4.1	Lleno compactado con material de obra	m3	200	21.721	4.344.200	177.12	3.847.224	89%			
4.2	vehiculo para transporte de personal	dia	15	299.100	4.486.500	15	4.486.500	100%			

EMPOCALDAS S.A.E.S.P									
CONTRATO No: 0240 DEL 2020		ACTA No: 1 PARCIAL			FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020				
OBJETO: REPOSICIÓN DE LA ADUCCIÓN SAN JUAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS		FECHA INICIACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020			FECHA VENCIMIENTO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020				
MUNICIPIO: MARQUETALIA CALDAS		VALOR CONTRATO: 82.586.145			VALOR CONTRATO + ADICION:				
CONTRATISTA: CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S		VALOR OBRA: \$ 56.104.172							
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO CASTAÑO PINEDA		SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ			FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2020				
REPOSICIÓN ADUCCIÓN DE 8" EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA LA PALMA Y CAMINO REAL CAMINO SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA									
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 PARCIAL		% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo	ml	750	997	747.750	540	538.380	72%	
1.2	Instalacion de Valla institucional de 4 x 2	un	1	771.839	771.839	-	-	0%	
2	EXCAVACION								
2.1	En material Común 0 a 2 m	m3	375	27.812	10.429.500	180	5.006.160	48%	
2.2	En roca	m3	113	45.443	5.112.338	63	2.862.909		
2.3	Dispersion de material sobrante	m3	38	23.250	871.875	38	883.500	101%	
3	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO								
3.1	Instalacion de tubería de polietileno de 8" PN 16	ml	750	54.835	41.126.250	540	29.610.900	72%	
3.2	Instalacion de portaflanjes	un	4	249.250.00	997.000	4	997.000		
3.3	Empalme a tubería existente	un	2	1.096.700	2.193.400	2	2.193.400	100%	
3.4	Instalacion de valvula de 3"	un	1	179.460	179.460	1	179.460	100%	
3.5	Instalacion de ventosas de 1"	un	2	348.950	697.900	2	697.900	100%	
3.6	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metalicos de 2 m largo c/u y alambre galvanizado	un	2	563.305	1.126.610	2	1.126.610	100%	
3.7	Sobre acarreo de tubería del lugar donde la deja el vehiculo al sitio	tubo	66.7	24.925.00	1.662.498	90	2.243.250	135%	
3.8	Cajas en concreto para valvulas y ventosas	un	3	1.345.950	4.037.850	-	-	0%	
4	LLENOS								
4.1	Lleno compactado con material de obra	m3	375	21.721	8.145.375	243	5.278.203	65%	
4.2	vehiculo para transporte de personal	dia	15	299.100	4.486.500	15	4.486.500	100%	

COSTO TOTAL					82.586.145	56.104.172
COSTO DIRECTO					61.197.588	41.574.044
ADMINISTRACION	%	24			14.687.421	9.977.770
IMPREVISTOS	%	5			3.059.879	2.078.702
UTILIDADES	%	5			3.059.879	2.078.702
SUMIA ANTES DE IVA					82.004.768	55.709.219
IVA SOBRE UTILIDADES	%	19			581.377	394.953
TOTAL					82.586.145	56.104.172


RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		82.586.145
VALOR ADICION		-
VALOR ACTA 1 PARCIAL	56.104.172	
VALOR ACTAS	56.104.172	
SALDO NO EJECUTADO	26.481.973	
SUMAS IGUALES	82.586.145	82.586.145

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX QUINTERO SQUEZ
 SUPERVISOR
 EMPQCALDAS S.A. E.S.P


 CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
 ALVARO CASTAÑO PINEDA
 CONTRATISTA
