

CONSORCIO REDES ANSERMA



Anserma, 12 de Mayo de 2022

OF-03

Señores:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: CONTRATO No. 272 DE 2020 – OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL - SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO No. 272

Cordial saludo,

El motivo de la presente solicitud es con el fin de justificar la suspensión No. 3 al contrato de obra No. 272 que tiene el objeto de referencia y fecha de terminación el día 20 de mayo de 2022, en el cual se enfatizan las altas lluvias provenientes de las jornadas invernales durante este período impidiendo el avance en obra en las actividades de suministro e instalación de sumidero lineal, consolidación del pavimento y suministro e instalación de asfalto, por lo tanto, se solicita una suspensión de 27 días calendario para evitar que el plazo contractual finalice, y además, se realice el trámite administrativo y jurídico correspondiente a la legalización de la modificación contractual con respecto a la suspensión hasta el mes de junio.

Adicionalmente referente a los inconvenientes y retrasos en la ejecución, la tubería de 2" escaseo, por lo cual, debió solicitarse que se cambiará por tubería de 1 1/2" que si tenía EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por lo cual hubo un retraso en la entrega que afectó el cronograma de obra.



Calle 99 a # 36-21

e- mail: 3dingeneriayconstrucciones@gmail.com / Tel: 322 7605759
MANIZALES / CALDAS

2016


| FECHA | MARZO | |
|----------------|------------------|----------|
| | ESTADO DEL CLIMA | |
| | SOLEADO | LLUVIOSO |
| 1/03/2022 | X | |
| 2/03/2022 | | X |
| 3/03/2022 | | X |
| 4/03/2022 | X | |
| 5/03/2022 | | X |
| 6/03/2022 | | X |
| 7/03/2022 | X | |
| 8/03/2022 | | X |
| 9/03/2022 | | X |
| 10/03/2022 | | X |
| 11/03/2022 | X | |
| 12/03/2022 | | X |
| 13/03/2022 | X | |
| 14/03/2022 | | X |
| 15/03/2022 | | X |
| 16/03/2022 | | X |
| 17/03/2022 | X | |
| 18/03/2022 | X | |
| 19/03/2022 | | X |
| 20/03/2022 | | X |
| 21/03/2022 | | X |
| 22/03/2022 | X | |
| 23/03/2022 | | X |
| 24/03/2022 | | X |
| 25/03/2022 | X | |
| 26/03/2022 | X | |
| 27/03/2022 | | X |
| 28/03/2022 | | X |
| 29/03/2022 | | X |
| 30/03/2022 | X | |
| 31/03/2022 | | X |
| TOTALES (DÍAS) | 11 | 20 |

| FECHA | ABRIL | |
|----------------|------------------|----------|
| | ESTADO DEL CLIMA | |
| | SOLEADO | LLUVIOSO |
| 1/04/2022 | | X |
| 2/04/2022 | | X |
| 3/04/2022 | | X |
| 4/04/2022 | X | |
| 5/04/2022 | X | |
| 6/04/2022 | | X |
| 7/04/2022 | | X |
| 8/04/2022 | X | |
| 9/04/2022 | | X |
| 10/04/2022 | | X |
| 11/04/2022 | | X |
| 12/04/2022 | X | |
| 13/04/2022 | X | |
| 14/04/2022 | | X |
| 15/04/2022 | | X |
| 16/04/2022 | | X |
| 17/04/2022 | X | |
| 18/04/2022 | | X |
| 19/04/2022 | | X |
| 20/04/2022 | X | |
| 21/04/2022 | X | |
| 22/04/2022 | | X |
| 23/04/2022 | | X |
| 24/04/2022 | | X |
| 25/04/2022 | | X |
| 26/04/2022 | | X |
| 27/04/2022 | X | |
| 28/04/2022 | X | |
| 29/04/2022 | | X |
| 30/04/2022 | | X |
| TOTALES (DÍAS) | 10 | 20 |

| FECHA | MAYO | |
|----------------|------------------|----------|
| | ESTADO DEL CLIMA | |
| | SOLEADO | LLUVIOSO |
| 1/05/2022 | X | |
| 2/05/2022 | X | |
| 3/05/2022 | | X |
| 4/05/2022 | | X |
| 5/05/2022 | X | |
| 6/05/2022 | | X |
| 7/05/2022 | X | |
| 8/05/2022 | X | |
| 9/05/2022 | | X |
| 10/05/2022 | | X |
| 11/05/2022 | X | |
| 12/05/2022 | | X |
| 13/05/2022 | X | |
| 14/05/2022 | | X |
| 15/05/2022 | X | |
| TOTALES (DÍAS) | 8 | 7 |

Teniendo estadísticas del tiempo, durante 3 meses de ejecución en obra, desde el inicio de las actividades a la fecha vigente se evidencia la diferencia de las condiciones climáticas, representada en un 62% por días lluviosos y un 38% en días soleados o nublados, motivo por el cual afecta e impide el avance significativo en obra y atribuye a generar pérdidas de materiales o repetición de actividades.

CLIMA - ANSERMA, CALDAS

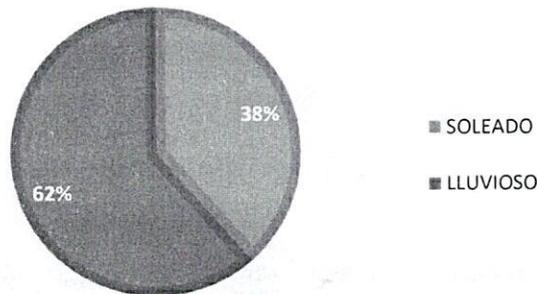



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA 03

| | |
|-------------|---|
| CONTRATO | 272 DE 2020 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO REDES ANSERMA |
| OBJETO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS |
| MUNICIPIO | ANSERMA – CALDAS |

En la ciudad de Manizales, a los trece (13) días del mes de mayo de 2022, se reunieron **JOHANN MANUEL SABOGAL R** Ingeniero de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **SANDRA MILENA ARENAS CARDONA**, Representante legal de CONSORCIO REDES ANSERMA, Contratista, con el fin de convenir la suspensión 03 del contrato 272 de 2020, que tiene por objeto: "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El contratista de obra, solicita la suspensión del contrato, dado a que como cumplimiento de los compromisos establecidos con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. entidad contratante y Alcaldía del Municipio de Anserma entidad cofinanciante del proyecto a través del Convenio interadministrativo 242 de 2020, se presentaron altas lluvias provenientes de las jornadas invernales durante este período impidiendo el avance en obra en las actividades de suministro e instalación de sumidero lineal, consolidación del pavimento y suministro e instalación de asfalto, razón por lo cual mediante comité de obra realizado el jueves 05 de mayo de 2022 por solicitud de Supervisión, Contratista y Municipio se suspenda las actividades de obra.
- Adicionalmente, la tubería de 2" escaseo, por lo cual, debió solicitarse que se cambiará por tubería de 1 1/2" que si tenía EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por lo cual hubo un retraso en la entrega que afectó el cronograma de obra.
- También el material de cantera ha tenido dificultades en su entrega por las lluvias presentadas constantemente impidiendo el cargue y transporte al lugar de obra, ya que el material pierde su condición requerida para instalación por el aumento de humedad natural, de ese modo existe negación de los transportadores ya que en su entrega se rechaza.

Por lo anterior las partes han decidido realizar la suspensión 03 de las obras del contrato 272 de 2020, por veintisiete (27) días calendario a partir de la fecha hasta tanto la solicitud de la administración municipal sea cumplida y se logre continuar la ejecución de actividades.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

📍 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales -Caldas
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 890 803 239-9



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO: 272 DE 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES ANSERMA
OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".
FECHA DE REINICIO 08 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACION 15 de junio de 2022

En el Municipio de Anserma - Caldas el ocho (08) de junio de 2022 se reunieron por una parte, el Ingeniero **JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ** Ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P Y **SANDRA MILENA ARENAS CARDONA**, Representante legal de CONSORCIO REDES ANSERMA, contratista, con el fin de convenir el reinicio del contrato 272 de 2020 que tiene por objeto: "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS". Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:


- Que el día 13 de mayo de 2022 se firmó acta de suspensión del contrato 272 de 2020 ya que para cumplir el objeto contractual del mismo se planteó una solicitud de adición en tiempo al contrato y en ese momento se encontraba en trámite.
- El 13 de mayo realizó esta modificación al contrato con una prórroga de 45 días, por lo cual se procede a dar reinicio el 08 de junio de 2022.

En virtud de lo anterior las partes han decidido reiniciar la obra del contrato 272/2020, teniendo en cuenta que ya se han solucionado y superado las causales que justificaban la suspensión del contrato.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron.


JOHANN MANUEL SABOGAL R.
Ingeniero zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


SANDRA MILENA ARENAS CARDONA
RL CONSORCIO REDES ANSERMA
contratista

 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 890 803 239-9

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

REINICIO No. 3



CONTRATO 272 DE 2020
 OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

OBJETO

LUGAR DE EJECUCIÓN ANSERMA
 VALOR \$728.739.420
 CONTRATISTA CONSORCIO REDES ANSERMA
 NIT 901442348-2

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE REINICIO HASTA 15/09/2022

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 730-47-994000012040
 PÓLIZA DE RCE No. 730-74-994000002463

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

| GARANTIA | CUMPLE | VIGENCIA | | VALOR AMPARADO |
|--|--------|--------------------------|-----------|-------------------|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | SI | 26-ene-21 | 15-sep-22 | \$ 326.745.040,80 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | SI | 26-ene-21 | 15-jun-25 | \$ 217.830.027,20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI | 05 AÑOS 00 MESES 00 DIAS | | \$ 217.830.027,20 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SI | 16-ago-22 | 15-sep-22 | \$ 326.745.041,00 |

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

| REQUISITOS LEGALIZACION | CUMPLE |
|----------------------------------|--------|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | NA |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | NA |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA | NA |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | NA |
| CLAUSULAS EXORBITANTES | NO |

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 272 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

10/06/2022

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
7300435166**

PÓLIZA No: 730 - 47 - 994000012040 ANEXO: 9

AGENCIA EXPEDIDORA: **BUCARAMANGA AURORA** COD. AGENCIA: 730 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| | | | | | |
|---------------------|-----|------|--------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 09 | 06 | 2022 | 09 | 06 | 2022 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO REDES ANSERMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.442.348-2**

DIRECCIÓN: CL 99 A 36 21 CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 3227605759

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|--|----------------|----------------|----------------|
| CONTRATO CUMPLIMIENTO | 26/01/2021 | 15/09/2022 | 326,745,040.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 26/01/2021 | 15/06/2025 | 217,830,027.20 |
| | VER NOTA | ACLARATORIA | 217,830,027.20 |

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

| | | | | |
|---------------|---|--|---|--------------|
| NIT 900398983 | - | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S. | - | PART: 80.00% |
| NIT 900889279 | - | 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | - | PART: 20.00% |

BENEFICIARIOS
NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION 03 DE FECHA 13 DE MAYO 2022, ACTA DE REINICIO DE FECHA 08 DE JUNIO 2022 SE MODIFICAN LOS AMPAROS DE LA POLIZA DE ACUERDO AL PRESENTE ANEXO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***762,405,095.20 | VALOR PRIMA: \$ *****0 | GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00 | IVA: \$ *****0 | TOTAL A PAGAR: \$ *****0 |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| NOMBRE INTERMEDIARIO MONARCA AGENCIA DE SEGUROS LTDA | CLAVE 9795 | %PART 100.00 | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-----------------|

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000730043516

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7300435174

PÓLIZA No: 730 -74 - 99400002463 ANEXO:9

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|-----------------------|------------------------------|-----|------|-------|----------------------|-----|------|-------|--------------------|-----|-----|--|
| AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA | | | | COD. AGE: 730 | | | | RAMO: 74 | | | | PAP: | | | |
| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIA | MES | AÑO | |
| 10 | 06 | 2022 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 16 | 08 | 2022 | 23:59 | 15 | 09 | 2022 | 23:59 | 30 | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE A LAS | | | | VIGENCIA HASTA A LAS | | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | | |
| MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL | | | | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|----------------------|----|------|-------|----------------------|----|------|-------|-------------------|----|------|-------|
| TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA | | | | VIGENCIA DEL ANEXO | | | | DIA MES AÑO HORAS | | | | DIA MES AÑO HORAS | | | |
| | | | | 16 | 08 | 2022 | 23:59 | 15 | 09 | 2022 | 23:59 | 15 | 09 | 2022 | 23:59 |
| | | | | VIGENCIA DESDE A LAS | | | | VIGENCIA HASTA A LAS | | | | DIAS | | | |

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO REDES ANSERMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.442.348-2**

DIRECCIÓN: **CL 99 A 36 21** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **3227605759**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

DIRECCIÓN: **CR 23 75 82** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **(6) 8867080**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** NIT : **890803239**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **CALDAS** CIUDAD: **ANSERMA**

DIRECCION: **CALLE 0 NO. -**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA: **-1-1**

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|-------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| CONTRATO | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | \$ 326,745,041.00 | | |
| | | 326,745,041.00 | | |

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS
NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION 03 DE FECHA 13 DE MAYO 2022, ACTA DE REINICIO DE FECHA 08 DE JUNIO 2022 SE MODIFICAN LOS AMPAROS DE LA POLIZA DE ACUERDO AL PRESENTE ANEXO.

PLO.....VIGENCIA DESDE 26/01/2021 VIGENCIA HASTA 15/09/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBRA NO.272 referente a OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA.

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***326,745,041.00 | VALOR PRIMA: \$ ***** | GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00 | IVA: \$ ***** | TOTAL A PAGAR: \$ ***** |
| INTERMEDIARIO | | COASEGURO CEDIDO | | |
| NOMBRE MONARCA AGENCIA DE SEGUROS LTDA | CLAVE 9795 | %PART 100.00 | NOMBRE COMPAÑIA | VALOR ASEGURADO |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000007000730043517

FIRMA TOMADOR *Sandra Milena Arenal C.*

Ahorar Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
